

大津信楽線付替工事ニュース

平成30年11月18日



パソコンは
QRコードを
読み込み
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新6号橋上部工工事
工期：平成30年1月26日～平成31年3月29日
(付替県道新6号橋の橋梁を施工します。)



先月でベント設備の基礎杭～ベント設備本体の組立まで完了し、10月末から橋げたの架設が始まりました。橋げたは当社の和歌山工場からトレーラーにて陸上輸送し、現場へ搬入します。搬入した橋げたは中段栈橋の120t吊クローラークレーンで上段栈橋まで荷上げし、100t吊クローラークレーンにて架設します。架設は11月中頃までに完了します。その後、橋げたまわりの足場組立、ベント設備の解体、道路の基礎部分となる床版コンクリートの打設作業と進めていきます。



ベント設備組立完了



橋げた荷上げ状況



橋げた架設状況

KHT 株式会社 駒井ハルテック

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生地先
【電話】0775-49-2633
【FAX】0775-49-2635



安全第一



大津信楽線付替工事ニュース

平成30年11月18日



パソコンはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)



工事箇所位置図



現場位置図



工事進捗と今後の予定

○今後の予定

11月中頃から重機による土砂の掘削・運搬作業が始まり掘削完了後、地盤改良工がスタートします。

地盤改良工は現地地盤とセメント系固化材を均質に混合攪拌し密実な改良柱体を築造するとともに、所定の強度確保を目指します。



地盤改良工使用機械


大津信楽線付替工事ニュース

平成30年11月18日




バックパ-は
QRコードを読み
込み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事
工 期：平成30年3月29日～平成31年3月29日

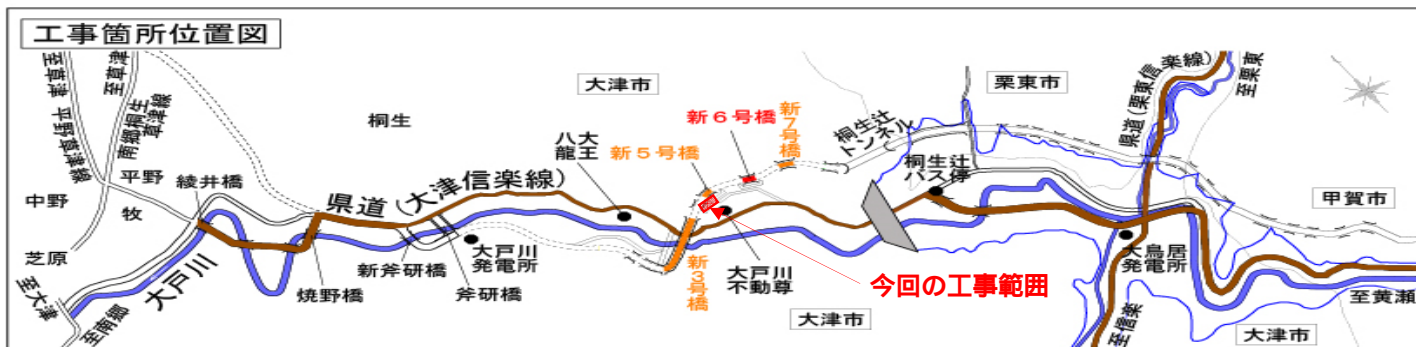

今回の工事について

新4号橋工事の施工の為、既設仮栈橋を延長します。

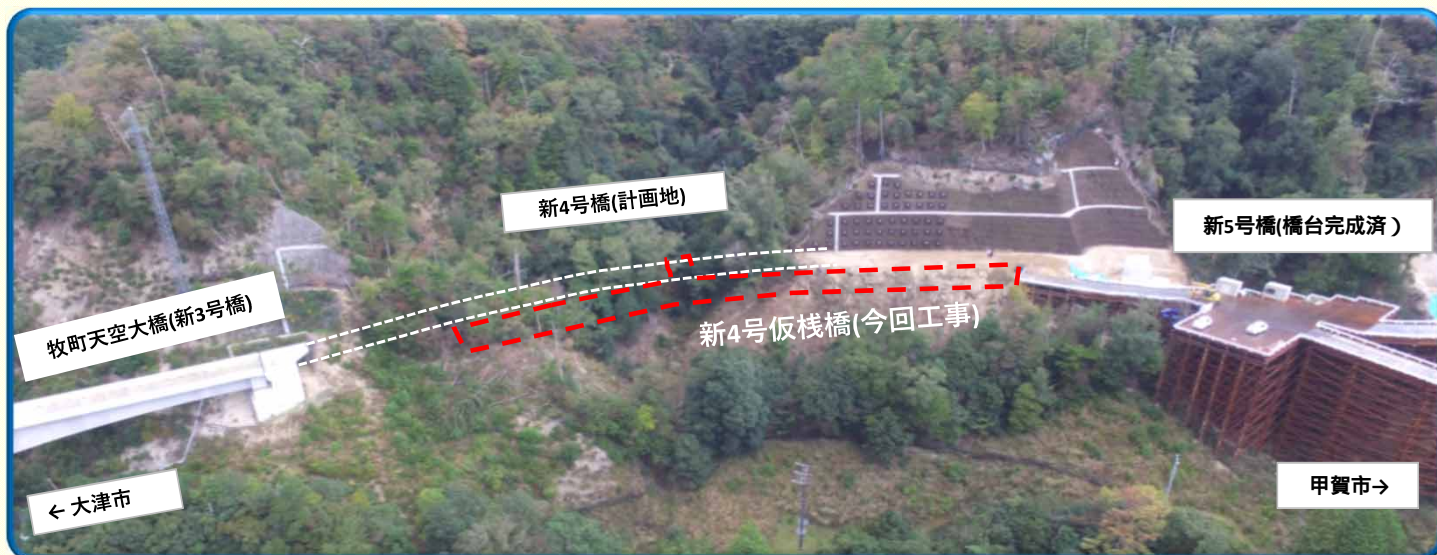

伐採が完了しました！！
伐採の際に発生した薪、ほだ木を無料配布しておりますので是非お立ち寄りください。



クローラクレーンの搬入と組立が終わりました。
工場製作中でした鋼材の準備も整い、上図の赤線部に仮栈橋の設置を行います！！



現場代理人：若林 毅
現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0202

