


★10月下旬に轟4号橋の橋梁中央部のコンクリート打設が完了しました。



定点写真-①  
浅見1号橋(仮称)

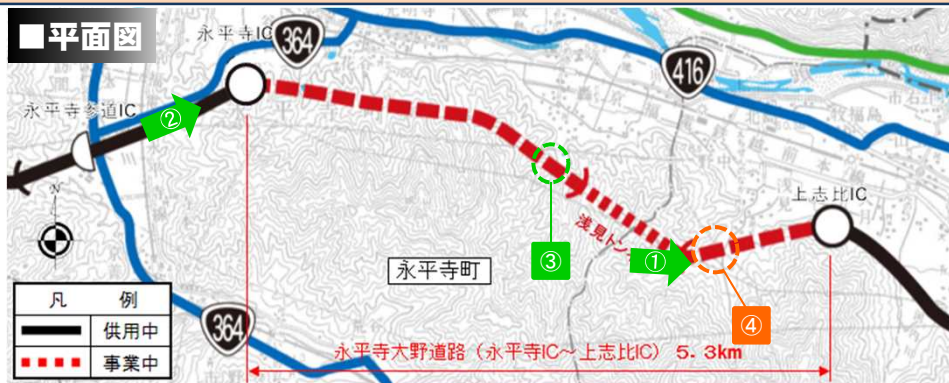

定点写真-②  
永平寺IC



P1橋脚(西側)



P2橋脚(東側)




定点写真-③:轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称)  
3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216m
- ・張出し状況 (完了)  
P1橋脚(西側): 11/11ブロック(39.5m)  
P2橋脚(東側): 11/11ブロック(39.5m)  
※張出しは柱頭部からの長さ
- ・上部工事の状況  
P1橋脚の張出については9月に完了、P2橋脚の張出も10月上旬に完了し、10月下旬には中央部がつながりました。(写真左)

写真-④:浅見1号橋(仮称)

- ・轟1号橋(仮称)の状況  
PCポータルラーメン橋(橋長約24.5m)のコンクリート橋の工事について、橋台及び主桁部のコンクリート打設が完了しました。  
今後は主桁部の支保や型枠の撤去、壁高欄部の施工を順次進めていきます。



(表示は本線部分の進捗を表したものです)  
(模式図のため現場状況と一致しない場合があります)
