



No.4-1
近畿地方整備局
事業評価監視委員会
平成29年度第6回

淀川水系直轄河川改修事業

- ・淀川水系直轄河川改修事業
 - 木津川上流直轄河川改修事業(上野遊水地)
 - 淀川特定構造物改築事業(阪神なんば線淀川橋梁)
- ・野洲川直轄河川改修事業
- ・猪名川直轄河川改修事業

【再評価】

平成30年1月15日

近畿地方整備局


目次

1. 淀川の概要
2. 河川整備の概要
3. 事業の必要性等に関する視点
 - (1) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
 - (2) 事業の効果等
 - (3) 事業の投資効果
 - (4) 事業の進捗状況
4. 事業の進捗の見込みの視点
5. コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
6. 関係自治体の意見等
7. 対応方針(原案)

淀川水系の説明方法

- 淀川水系直轄河川改修事業の事業評価では、従来から**上下流バランスが密接に関連する事業**については、水系一括して評価を実施。このうち、個別採択事業は単独での評価も実施。
- 上下流バランスにおいて密接な関係がない**猪名川、野洲川**の2事業については、それぞれ個別に評価を実施。
- このため、事業の進め方、河川整備の概要等は淀川水系全体として取りまとめを行っており、事業の投資効果について水系全体と個別事業のみで評価結果を説明する。

上下流バランスが密接に関連する事業：淀川水系直轄河川改修事業

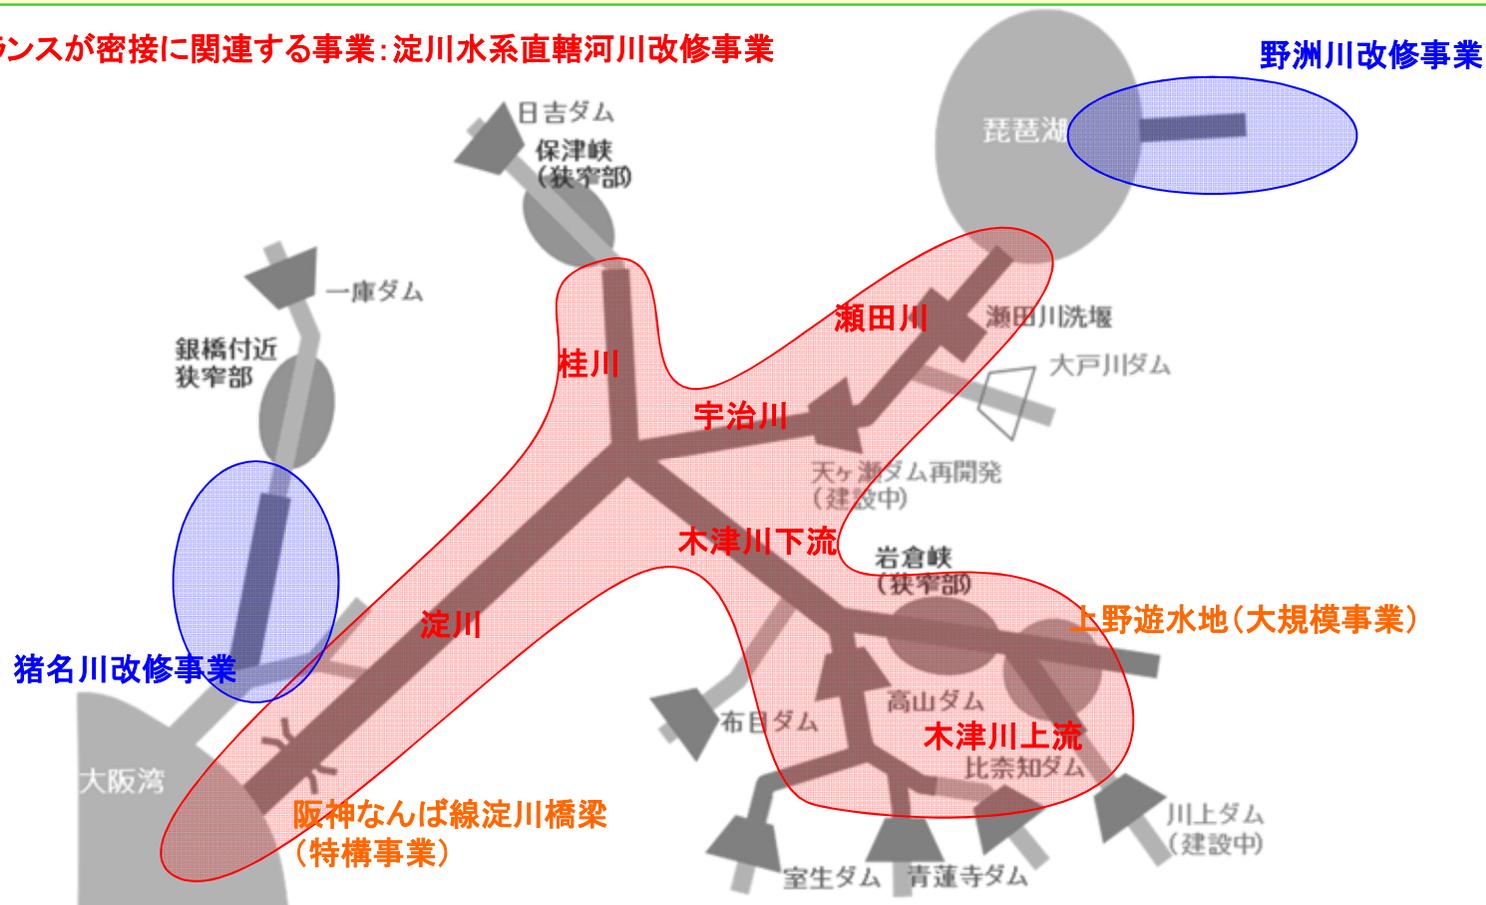

1. 淀川の概要(流域の概要)

- 淀川は、その源を滋賀県山間部に発し、琵琶湖から流れ出る瀬田川が滋賀県・京都府境から宇治川となり、途中、木津川、桂川を合流し大阪湾に注ぐ、流域面積8,240km²、幹川流路延長75km、流域内人口約1,099万人の一級河川。
- 流域は、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、三重県の2府4県に跨り、近畿地方の社会、経済、文化の基盤を成し、沿川には大阪市、京都市等の大都市を擁する。
- またオオサンショウウオやイタセンパラなどの貴重種が生育・生息するなど、多様な河川環境を呈し、下流部の高水敷は国営公園が整備され、水系全体で年間1,705万人が利用する空間。



1. 淀川の概要(出水の概要)

- 淀川では昭和28年台風13号による洪水(戦後最大洪水:枚方地点7,800m³/s)が発生し、宇治川左岸堤防(京都市向島地先)が決壊、猪名川では昭和35年の台風16号による洪水(戦後最大洪水:小戸1,400m³/s)が発生し、左岸堤防(伊丹市酒井地先)が決壊するなど、甚大な被害が発生。
- 平成25年台風18号では、戦後最大クラスの洪水となり、桂川では堤防から越水し、甚大な被害が発生した。

■既往洪水の概要

発生年月	発生原因	河川名・地点名 流量(m ³ /s)	被害の状況
明治18年6月7日	台風	淀川・枚方地点 (4,300)	浸水家屋約76,000戸
大正6年10月1日	台風	淀川・枚方地点 (4,600)	浸水家屋約44,000戸
昭和28年9月25日	台風13号	淀川・枚方地点 (7,800)	浸水家屋約56,000戸
昭和34年8月14日	台風7号	野洲川・野洲地点 2,200	浸水家屋約19,500戸 死者4人
昭和34年9月27日	台風15号 (伊勢湾台風)	淀川・枚方地点 8,000	浸水家屋約38,000戸
昭和35年8月30日	台風16,18号 梅雨前線	淀川・枚方地点 3,800	浸水家屋約38,000戸
昭和40年9月17日	台風24号	淀川・枚方地点 6,900	浸水家屋約71,000戸
昭和42年7月7日	台風7号 梅雨前線	猪名川・小戸地点 1,400	浸水家屋約93,400戸 死者2人
昭和47年9月17日	台風20号	淀川・枚方地点 5,200	浸水家屋約71,000戸
昭和57年8月2日	台風10号	淀川・枚方地点 6,300	浸水家屋約11,000戸
昭和58年9月24日	台風10号	猪名川・小戸地点 1,300	浸水家屋約3,200戸
平成16年10月20日	台風23号	淀川・枚方地点 4,500	浸水家屋約560戸
平成25年9月15～ 16日	台風18号	淀川・枚方地点 9,500	浸水家屋約3,400戸

※流量の()は、破堤あり。 ※地点流量は実績流量。

S28年9月洪水での
宇治川向島の被害状況



宇治川左岸向島堤及び右岸支川芥川、松尾川等が破堤

S28年9月洪水での
木津川上野地区の被害状況



上野地区及び名張地区で甚大な被害が発生

S28年9月洪水での
野洲川洲本地区の被害状況



野洲川南流左岸堤防の決壊により、流出全壊半壊家屋1,700戸、死者3名の被害

S34年9月伊勢湾台風での
名張川夏見地区の被害状況



名張地区で数カ所の決壊氾濫が発生。橋の流出が相次ぎ、市街地全域が浸水

S35年8月洪水での
口酒井地区下流の浸水状況



伊丹市口酒井地区で堤防が30mにわたって決壊し、多数の家屋に床上浸水の被害

H25年9月洪水での
桂川久我橋付近の状況




京都市久我地区で、堤防からの越水が発生。水防活動により堤防決壊を防いだ

1. 淀川の概要(改修の経緯)

- 淀川は明治18年の大洪水を契機に淀川改良工事に着手し、新淀川の開削、瀬田川洗堰の築造、宇治川の付替などを実施し、概ね今日の淀川の流路を形成。
- その後、昭和29年に策定した淀川水系改修基本計画においてダムによる洪水調節を計画に取り入れ、昭和36年に瀬田川洗堰を改築、昭和39年に天ヶ瀬ダムを竣工。また、昭和40年には淀川水系工事実施基本計画を策定し、これまで野洲川放水路、淀川大堰、高規格堤防等を順次整備。
- 猪名川では、昭和44年に下流部の捷水路を整備(戸ノ内(昭和37年完成)、利倉(昭和44年完成))昭和57年に猪名川流域整備計画を策定し総合治水対策を実施。
- また、平成19年に淀川水系河川整備基本方針、平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

淀川改修の経緯

明治29年	: 淀川改良工事着手
大正7年	: 淀川改修増補工事着手
昭和14年	: 淀川修補工事着手
昭和28年9月	: 台風13号(戦後最大洪水)
昭和29年	: 淀川水系改修基本計画策定
昭和34年9月	: 台風15号(伊勢湾台風)
昭和35年8月	: 台風16号
昭和40年	: 淀川水系工事実施基本計画策定
昭和46年	: 淀川水系工事実施基本計画改定
昭和57年8月	: 台風10号
平成16年10月	: 台風23号
平成19年	: 淀川水系河川整備基本方針策定
平成21年 3月	: 淀川水系河川整備計画策定
平成25年9月	: 台風18号
平成26年	: 桂川緊急治水対策実施

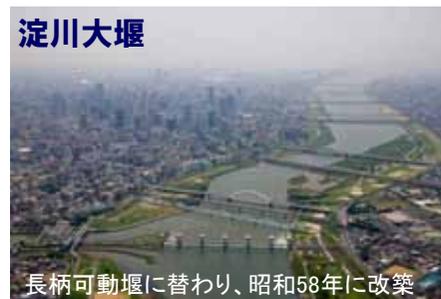

2. 河川整備の概要(治水計画の経緯)

- 明治29年に直轄事業として淀川の本格的な改修工事を開始。
- 昭和46年に淀川水系工事実施基本計画を改訂し、淀川本川で12,000m³/sの計画を策定
- 平成19年に淀川水系河川整備基本方針を策定。
- 平成21年に淀川水系河川整備計画を策定。

治水計画の経緯

- ・明治18年6月(低気圧) 4,300m³/s(枚方)
- ・明治29年 河川法制定

明治29年 淀川改良工事
計画高水流量 5,560m³/s(枚方)

- ・大正6年10月 台風4,600 m³/s(枚方)

大正7年 淀川改修増補工事
計画高水流量 5,560m³/s(枚方)

昭和14年 淀川修補工事
計画高水流量 6,950m³/s(枚方)

- ・昭和28年 台風13号7,800 m³/s(枚方)

昭和29年 淀川水系改修基本計画
計画高水流量 6,950m³/s(枚方)

- ・昭和36年 瀬田川洗堰完成(着工 昭和32年)
- ・昭和39年 天ヶ瀬ダム完成(着工 昭和36年)

- ・昭和39年 新河川法制定
- ・昭和40年 淀川水系工事実施基本計画

昭和46年 淀川水系工事実施基本計画
計画高水流量 12,000m³/s(枚方)

- ・平成5年 日吉ダム着工(完成 平成10年)
- ・平成9年 河川法改正
- ・平成16年 台風23号4,500 m³/s(枚方)

平成19年 淀川水系河川整備基本方針
計画高水流量 12,000m³/s(枚方1/200)

平成21年 淀川水系河川整備計画
河道配分流量 10,700m³/s(枚方)


- ・平成25年 台風18号9,500 m³/s(枚方)
- ・平成26年 桂川緊急治水対策事業

2. 河川整備の概要(河川整備計画の主な事業内容)

- 平成21年3月に策定した淀川水系河川整備計画での目標は以下のとおり。
 淀川:整備のいかなる段階においても、計画規模以下の洪水に対して計画高水位以下の水位で安全に流下させる。
 宇治川・桂川・木津川:戦後最大の洪水である昭和28年台風13号洪水を計画高水位以下の水位で安全に流下させる。
 猪名川:戦後最大の洪水である昭和35年台風16号洪水を計画高水位以下の水位で安全に流下させる。
 瀬田川:琵琶湖の後期放流に対応するため、大戸川合流点より下流において1,500m³/sの流下能力を確保する。

■ 河川整備計画の主な事業内容

淀川水系では、中上流の河川整備による下流への浸水リスクを増加させずに水系全体の治水安全度を向上させる整備を実施

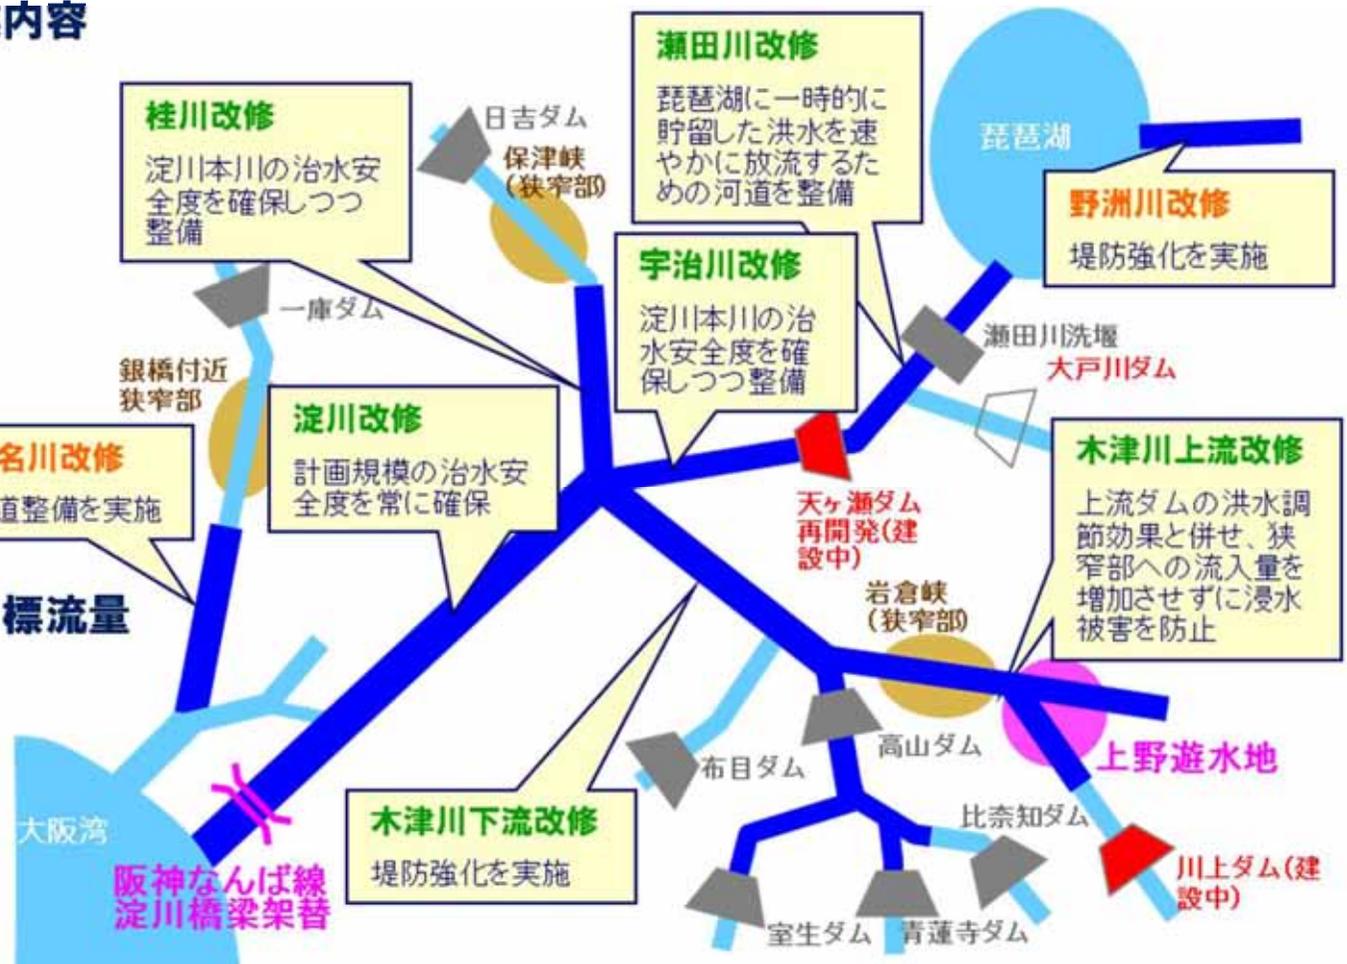


■ 河川整備計画における目標流量


河川名	基準地点	整備計画 目標流量
淀川	枚方	10,700m ³ /s
猪名川	小戸	2,100m ³ /s

2. 河川整備の概要(事業の進め方)

- 中上流部の治水安全度を向上させると、流出量が増大し下流への負担が増。(右図参照)
- 下流への流出量を抑制しつつ、中上流部の浸水被害を解消するためには、上野遊水地と川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、大戸川ダムが必要。また、阪神なんば線橋梁架替による下流淀川の流下能力向上が必要。

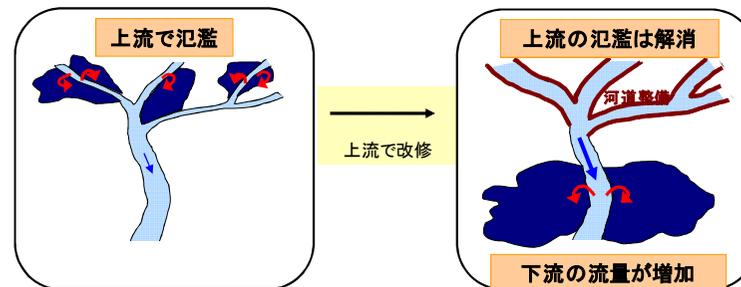

<安全度評価>

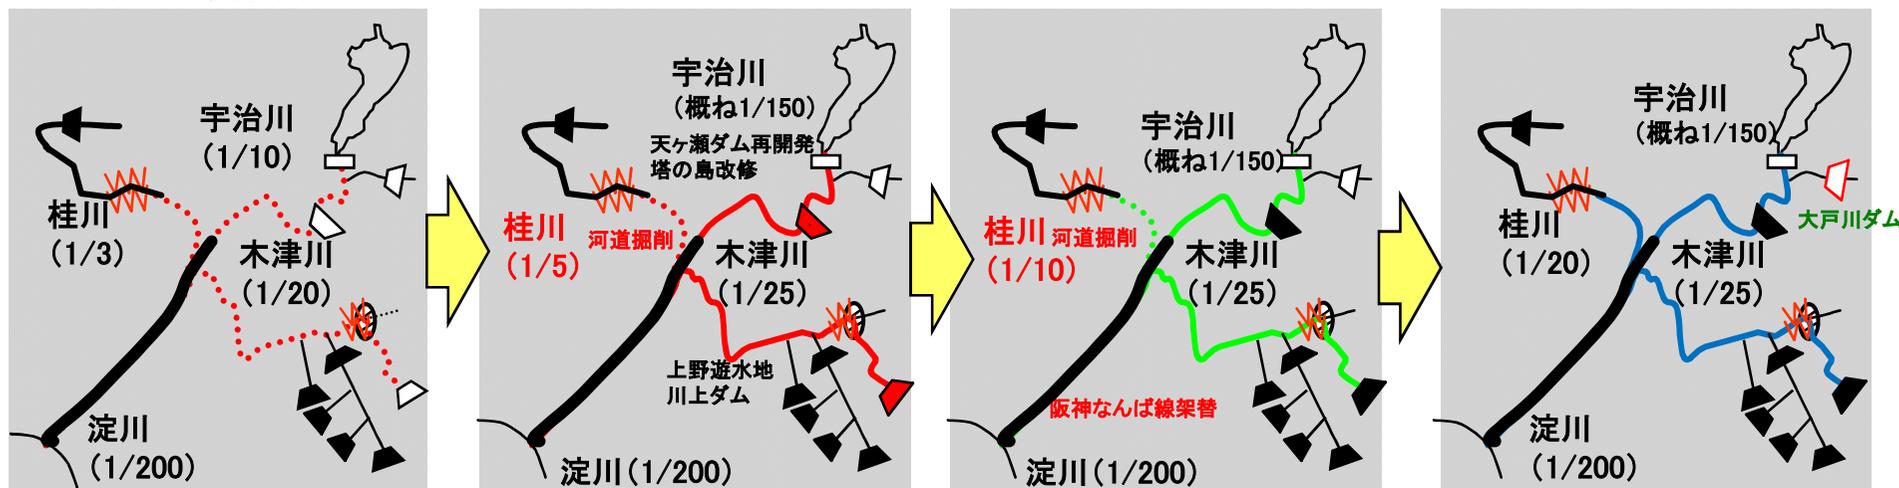

<計画策定時>


第1段階
 <天ヶ瀬ダム再開発・川上ダム・上野遊水地>

第2段階
 <阪神なんば線架替>

第3段階
 <大戸川ダム※>

※大戸川ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討。

◇下流の安全度を確保しつつ、上下流でリスクを分担



下流(淀川)から整備

淀川の上限水位(計画高水位)を超えない範囲で中上流部を整備
 淀川の上限水位(計画高水位)を超えないよう阪神なんば線架替やダムでの貯留を行う
 ※各段階で水系全体の治水安全度がパレート改善となるよう進めていく。


さらに、流域全体の安全度の向上

2. 河川整備の概要(事業展開:桂川筋)

○ 河川改修では、中上流部の治水安全度を向上させると、流出量が増大し下流への負担が増加する。

① 桂川では、水系内で最も安全度が低いため、整備計画策定以降、これまで下流の淀川本川に影響の無い範囲で改修を実施してきた。

② 更なる改修に向けては、淀川本川の阪神なんば線淀川橋梁の架替により、淀川本川の流下能力を増強させ、桂川の平成16年対応河道を整備する。

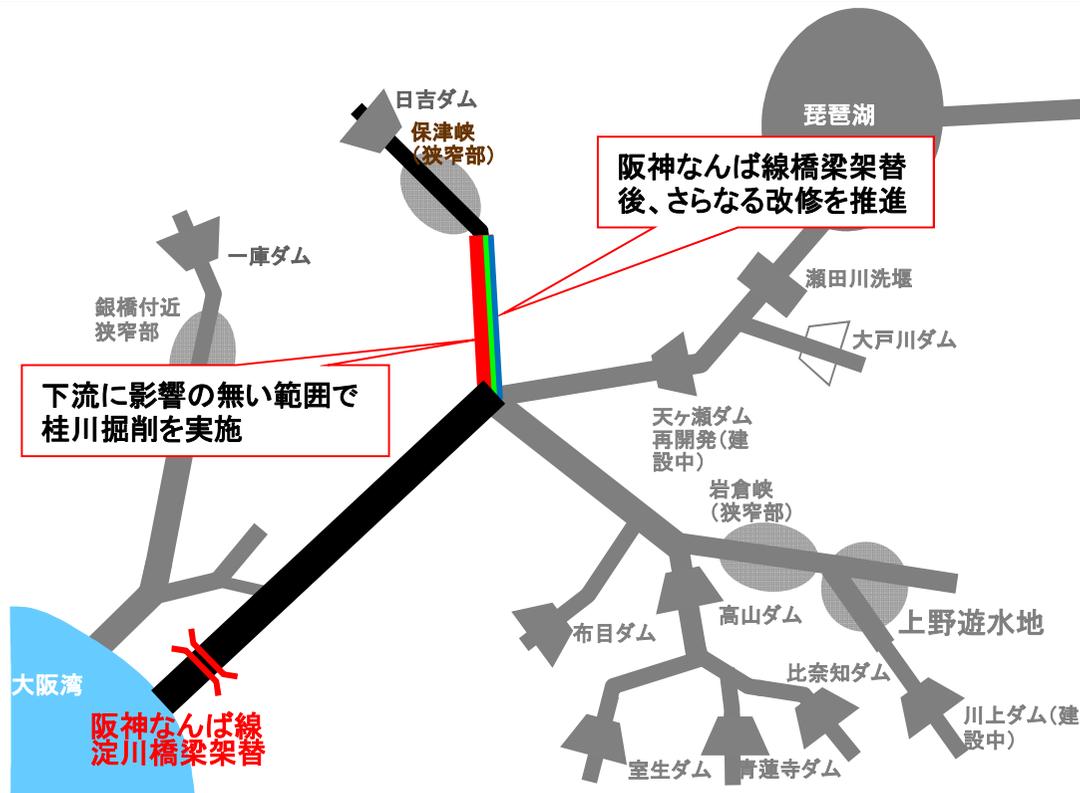

	整備メニュー	第1段階 (H20~H34)	第2段階 (H35~H43)	第3段階 (H44~H49)
淀川	阪神なんば線淀川橋梁架替 宇治川塔の島改修 淀川堤防強化 天ヶ瀬ダム再開発【ダム事業】 大戸川ダム【ダム事業(付替県道含む)】	H29 当面整備 →	→	→
桂川	桂川大下津地区引堤 桂川河道掘削	緊急治水対策(H31) →	H16出水対応 →	S28出水対応 →


2. 河川整備の概要(事業展開:宇治川筋)

○ 宇治川では効率的な天ヶ瀬ダムを活用と琵琶湖の早期水位低減に向けた事業を実施。

① 宇治川本川では、戦後最大洪水を安全に流下させることと、琵琶湖の後期放流に対応するため、塔の島地区の改修を実施。

② 塔の島地区の改修後、洪水後の琵琶湖の水位を早期に低下させるため、天ヶ瀬ダム再開発を実施。

③ 更には、洪水後の琵琶湖の水位を早期に低下させるため、瀬田川河道掘削及び鹿跳溪谷対策を実施する。

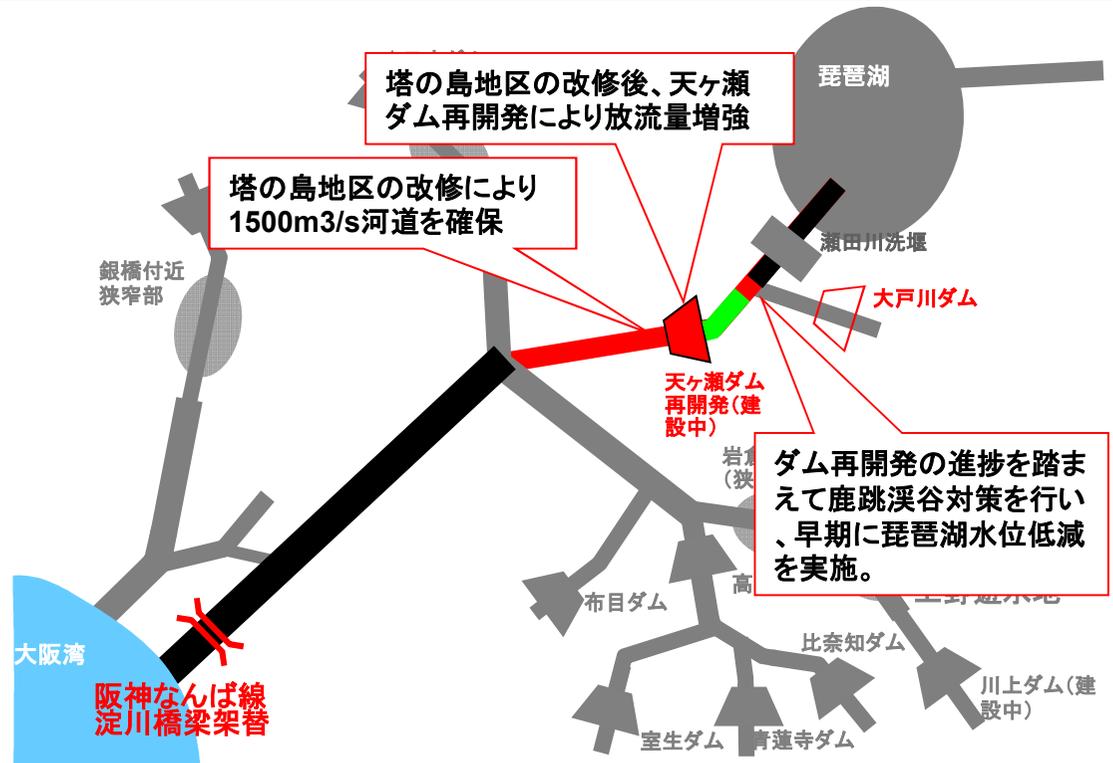

	整備メニュー	第1段階 (H20~H34) H29	第2段階 (H35~H43) H42	第3段階 (H44~H49)
淀川	阪神なんば線淀川橋梁架替 宇治川塔の島改修 淀川堤防強化 天ヶ瀬ダム再開発【ダム事業】 大戸川ダム【ダム事業(付替県道含む)】	Red arrows for bridge replacement, island renovation, and dike reinforcement. Grey arrow for Taki no Seki Dam redevelopment. Dotted grey arrow for Ohtsu River Dam.	Green arrow for Taki no Seki Dam redevelopment. Dotted grey arrow for Ohtsu River Dam.	Dotted grey arrow for Ohtsu River Dam.
瀬田川	瀬田川河道掘削 鹿跳溪谷対策 瀬田川洗堰耐震対策等	Red arrow for channel excavation. Red arrow for Kamehiko Gorge countermeasures.	Green arrow for Kamehiko Gorge countermeasures. Green arrow for Setagawa Wash堰 seismic countermeasures.	Green arrow for Setagawa Wash堰 seismic countermeasures.


2. 河川整備の概要(事業展開:木津川筋)

○ 河川改修では、中上流部の治水安全度を向上させると、流出量が増大し下流への負担が増加する。

① 木津川では、上流部に上野遊水地を整備すると共に、木津川上流部の河道掘削を実施。

② 川上ダム整備後に更なる上野地区の安全度を向上させるため、服部川の河道掘削を実施する。

○ 名張川においては、高山ダム上流の河道掘削であるため、上流ダムの放流量の調節を踏まえ、継続して改修を推進。

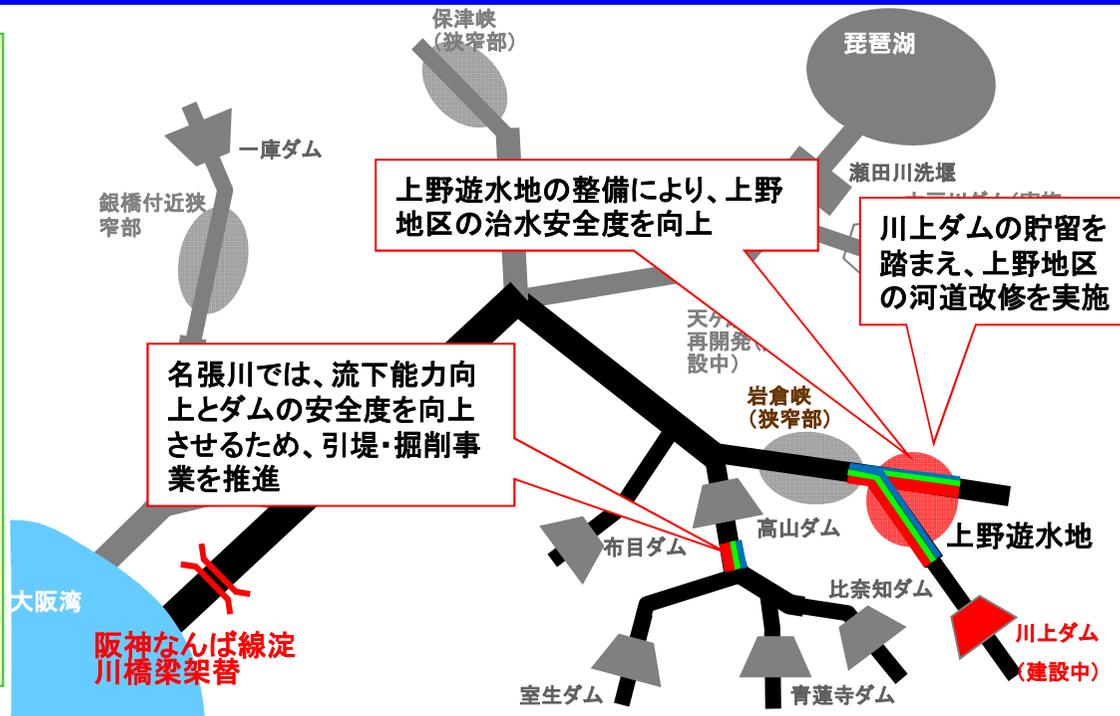

	整備メニュー	第1段階 (H20~H34)	第2段階 (H35~H43)	第3段階 (H44~H49)
淀川	阪神なんば線淀川橋梁架替 淀川堤防強化 天ヶ瀬ダム再開発【ダム事業】 大戸川ダム【ダム事業(付替県道含む)】	H29 当面整備 →	→	→
木津川下流	木津川下流堤防強化	→		
木津川上流	上野遊水地 木津川・服部川河道掘削 川上ダム【ダム事業】 名張川河道改修(引堤・掘削)	→	→	→

2. 河川整備の概要(実施スケジュール)

淀川水系河川整備計画では、最も安全度の低い桂川改修を優先して実施するため、流域全体のバランスを踏まえ、下流の整備及び上流域での貯留施設との時期を鑑み、河川改修を推進。

(大戸川ダム本体工事については、中・上流部の河川改修の進捗状況とその影響を検証しながら実施時期を検討中)

○第1段階(H20～H34)

- ・淀川本川では、上流の河川改修による流量増に対応するため、下流部の阪神なんば線橋梁架替に着手。
- ・桂川では、現在の淀川本川の流下能力内の対応として、大規模な河道掘削を実施しているが、平成25年台風18号でも浸水被害が発生しており、緊急対策特定区間として位置付け、スピードアップした改修を実施。
- ・瀬田川においては琵琶湖の後期放流対応に向けた河道掘削を行うとともに、宇治川塔の島地区改修と天ヶ瀬ダム再開発の事業進捗を踏まえ、鹿跳溪谷対策を実施。
- ・上野地区においては、木津川掘削による下流への流量増を踏まえ、上野遊水地を先行して整備を実施。上野遊水地運用開始後、遊水地の洪水調節機能の向上及び上野地区の治水安全度向上に向け、木津川・服部川の河道掘削を実施。
- ・名張地区において、整備計画目標流量に対する流下能力確保のため、河道掘削、樹木伐採及び引堤を実施。
- ・猪名川では、戦後最大洪水である昭和35年台風16号洪水を安全に流下させる河道掘削を完成。

○第2段階(H35～H43)

- ・淀川本川では、上流の河川改修による流量増に対応するため、下流部の阪神なんば線橋梁架替を完了。
- ・桂川では、川上ダムによる淀川本川の流量低減及び阪神なんば線橋梁架替事業を踏まえ、平成16年台風23号洪水規模の流量を安全に流下させる河道掘削及び引堤事業を実施。
- ・上野地区において、川上ダム完成後、引き続き服部川の河道掘削を実施。
- ・名張地区において、引き続き河道掘削、樹木伐採及び引堤を実施。

○第3段階(H44～H49)

- ・戦後最大洪水である昭和28年台風13号洪水規模の流量を安全に流下させるため、桂川河道改修等を実施。
- ・上野地区において、引き続き服部川の河道掘削、引堤を実施。
- ・名張地区において、引き続き河道掘削、樹木伐採及び引堤を実施。

2. 河川整備の概要(実施スケジュール)

	整備メニュー	第1段階 (H20~H34)	第2段階 (H35~H43)	第3段階 (H44~H49)
淀川	阪神なんば線淀川橋梁架替	H29 当面整備		
	宇治川塔の島改修	→	→	
	淀川堤防強化	→		
	天ヶ瀬ダム再開発【ダム事業】	→		
	大戸川ダム【ダム事業(付替県道含む)】	→	→	→
瀬田川	瀬田川河道掘削	→		
	鹿跳溪谷対策		→	
	瀬田川洗堰耐震対策等		→	
桂川	桂川大下津地区引堤	→		
	桂川河道掘削	緊急治水対策(H31)	H16出水対応	S28出水対応
木津川下流	木津川下流堤防強化	→		
木津川上流	上野遊水地	→		
	木津川・服部川河道掘削		→	→
	川上ダム【ダム事業】	→		
	名張川河道改修(引堤・掘削)	→	→	→
野洲川	野洲川堤防強化(水防拠点)	→		
猪名川	猪名川・藻川河道掘削	→		
	堤防強化(堤防拡幅、防災拠点)	→	→	


2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

淀川

- 淀川本川では、堤防の強化を実施するとともに、南海・東南海地震に対応した河川管理施設の耐震・津波対策、超過洪水対策としての高規格堤防整備を実施。
- 引き続き、更なる上流の改修に対して、現況の治水安全度を確保するため、阪神なんば線淀川橋梁架替を推進。

【凡例】

- 黒字: H26以降実施(H26~H29)
- 赤字: 第1段階(H30~H34)当面
- 緑字: 第2段階(H35~H43)
- 青字: 第3段階(H44~H49)

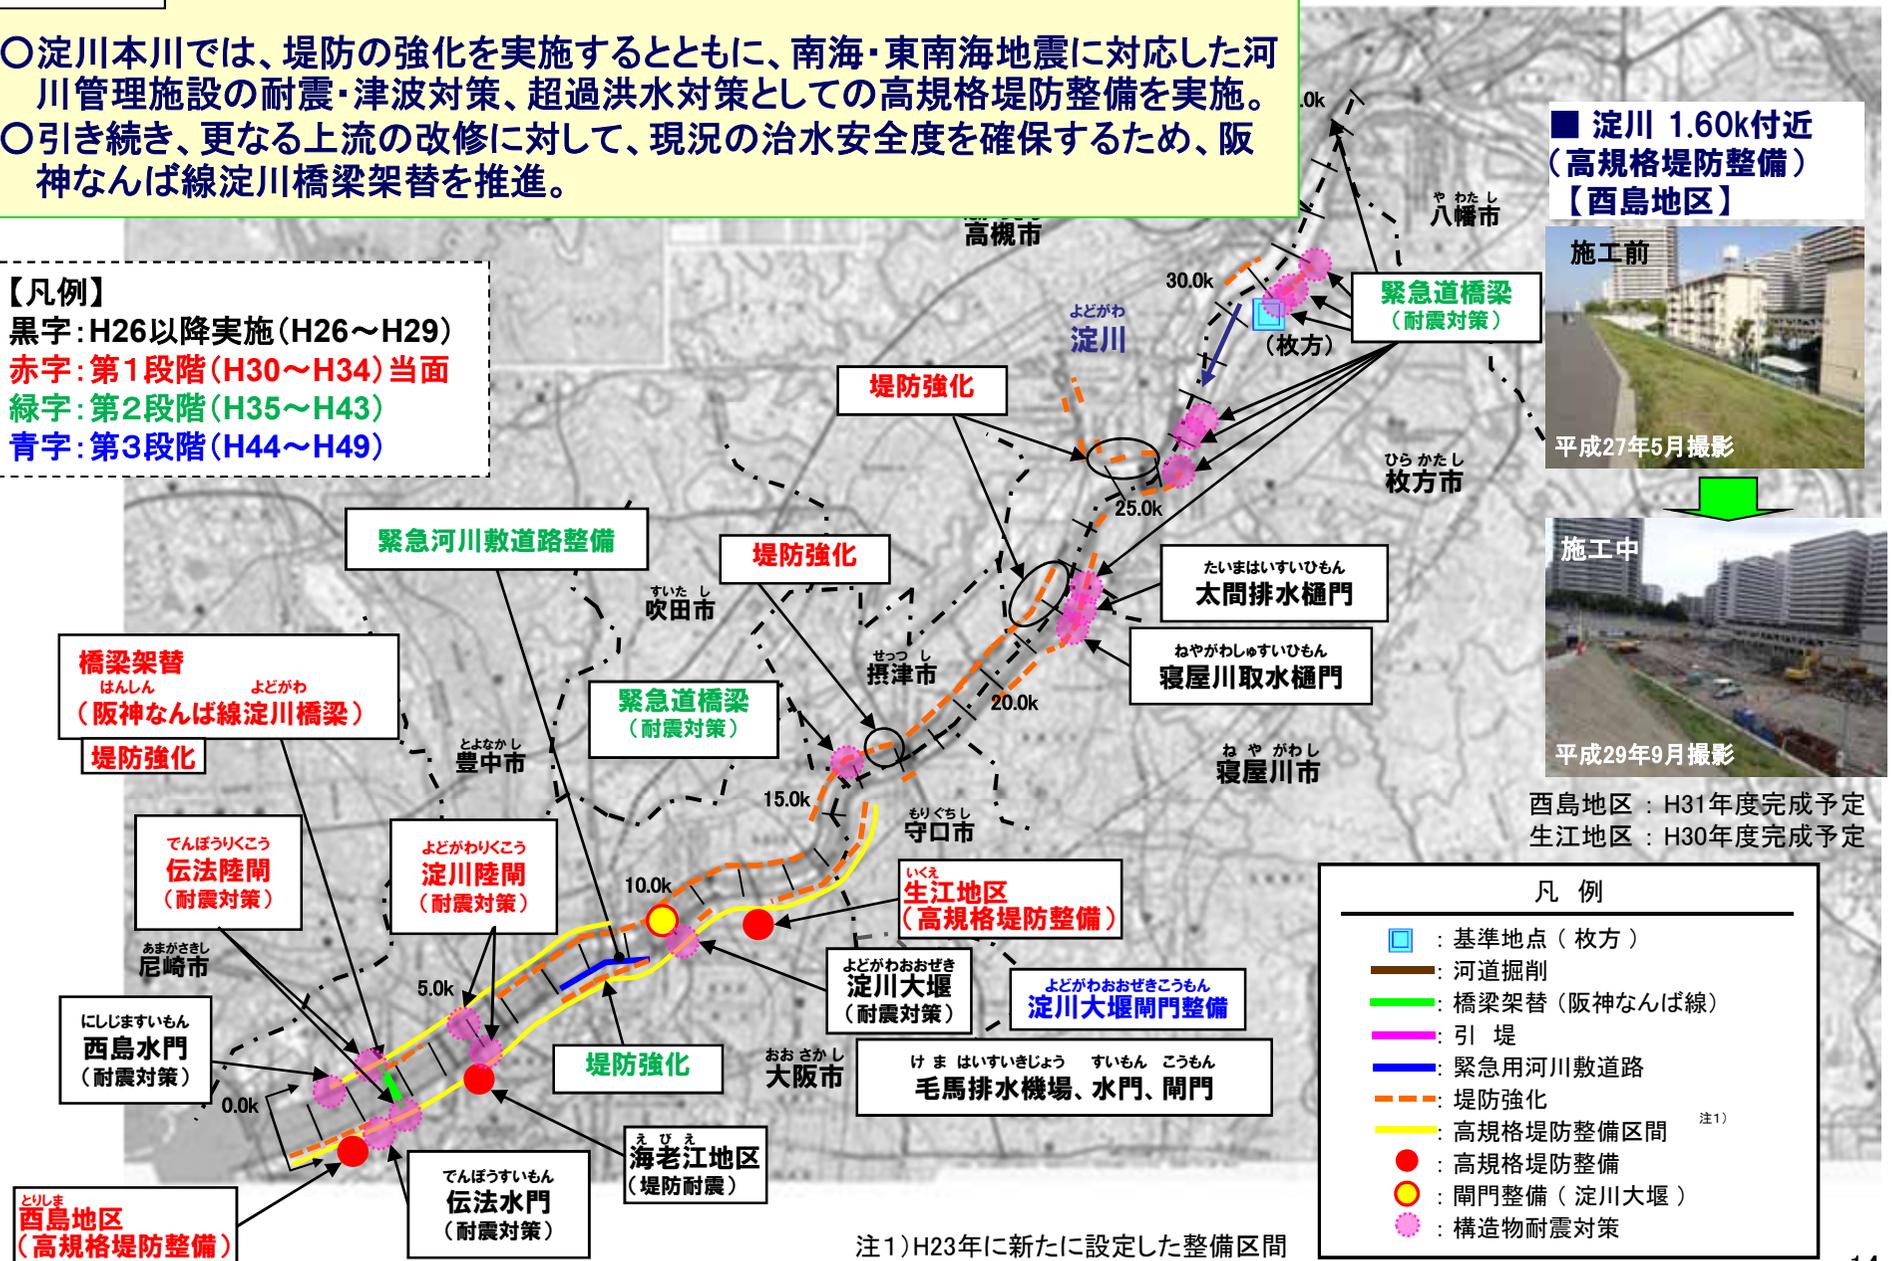

2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

桂川

- 桂川は、現況の治水安全度が最も低いため、引堤事業を含む大規模な河道改修を上下流バランスを踏まえ、実施。
- なお、平成25年台風18号洪水で堤防から越水したため、緊急対策特定区間を位置付け、スピードアップした改修を実施中。

■ 桂川 5.4k付近（河道改修）


掘削前



掘削状況



■ 桂川 17.8k付近（6号井堰撤去）

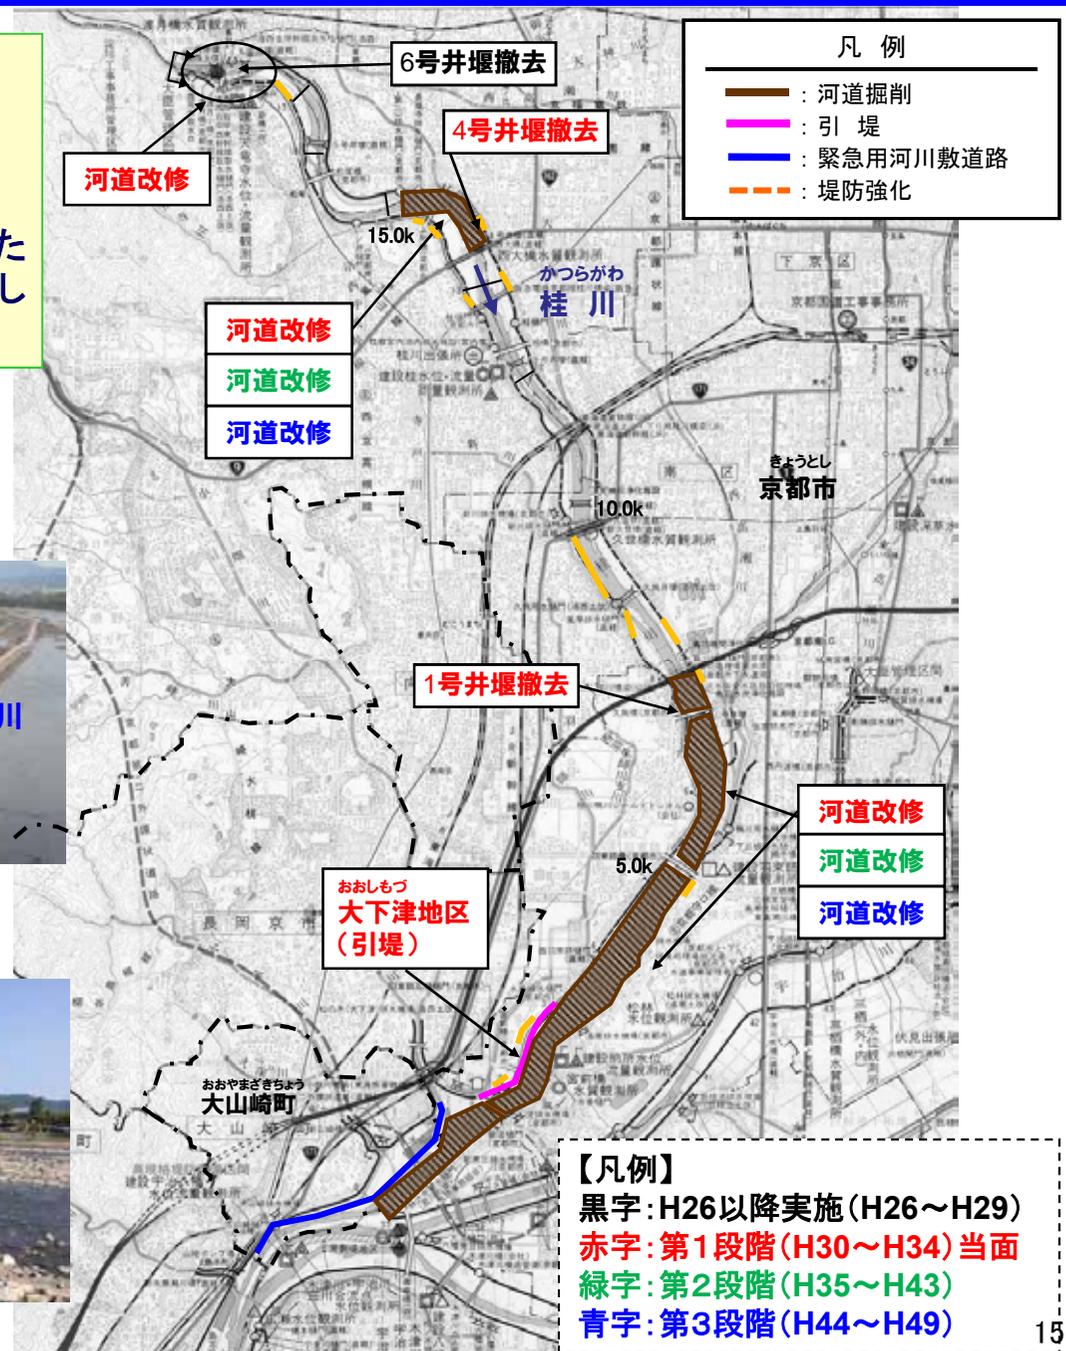


2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

宇治川

- 整備計画に位置付けた堤防強化工事は完了。
- 上流部の塔の島地区では世界遺産の平等院等の景観にも配慮した改修を実施中。

■ 宇治川 51k付近（塔の島改修）

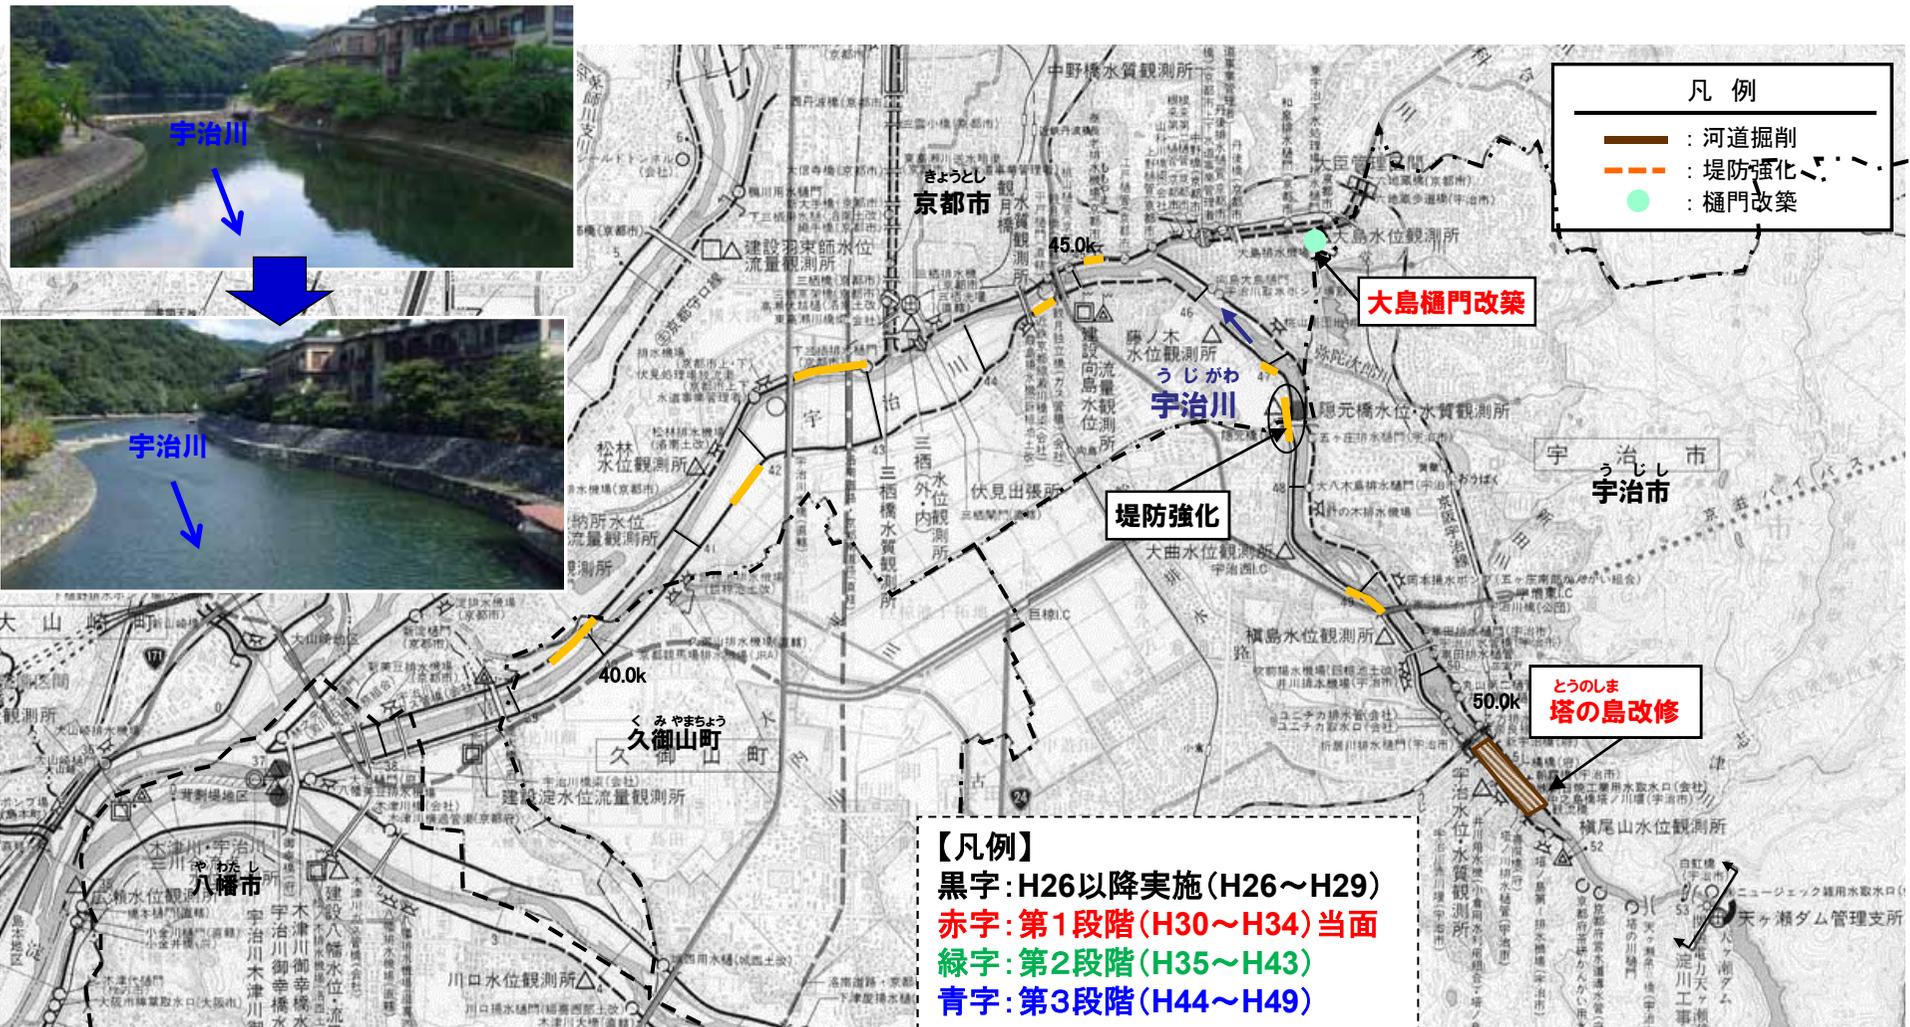

2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

木津川下流

○堤防強化工事を継続して実施中。

【凡例】

黒字: H26以降実施(H26~H29)


赤字: 第1段階(H30~H34)当面

緑字: 第2段階(H35~H43)

青字: 第3段階(H44~H49)



■木津川2.6k付近(堤防強化)



2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

瀬田川

- 現況の治水安全度を確保しつつ、河道掘削を実施中。
- 宇治川塔の島地区改修と天ヶ瀬ダム再開発の事業進捗を踏まえ鹿跳溪谷対策を実施する。


【凡例】

黒字：H26以降実施(H26～H29)

赤字：第1段階(H30～H34)当面

緑字：第2段階(H35～H43)

青字：第3段階(H44～H49)

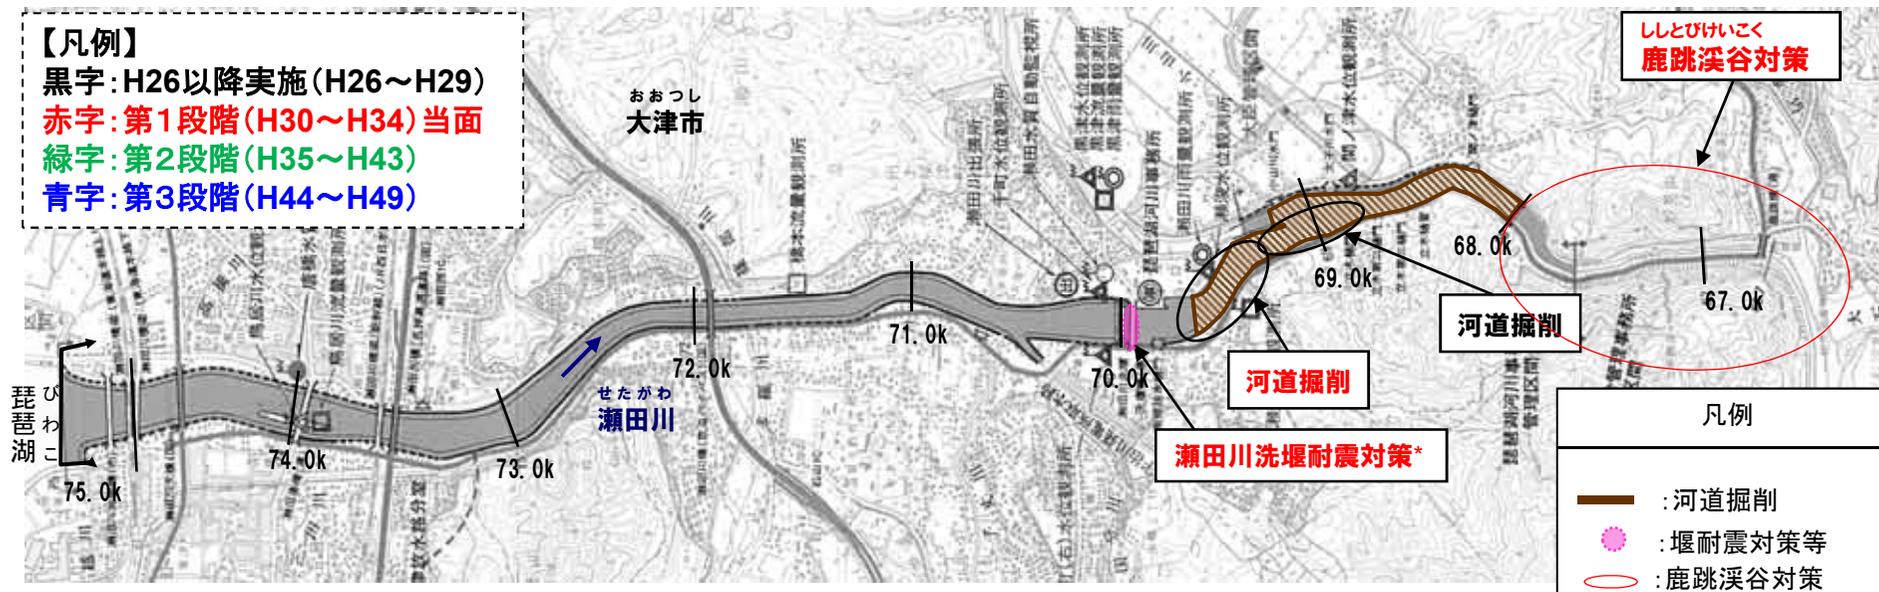

■ 瀬田川 69.2k付近（河道掘削）


※瀬田川洗堰改築検討等含む。



2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)

木津川上流

- 上野遊水地の整備を完了させ、平成27年に遊水地の運用を開始。
- 平成29年度末時点までに、上野遊水地の附帯施設の整備を行い、木津川の河道掘削を推進。

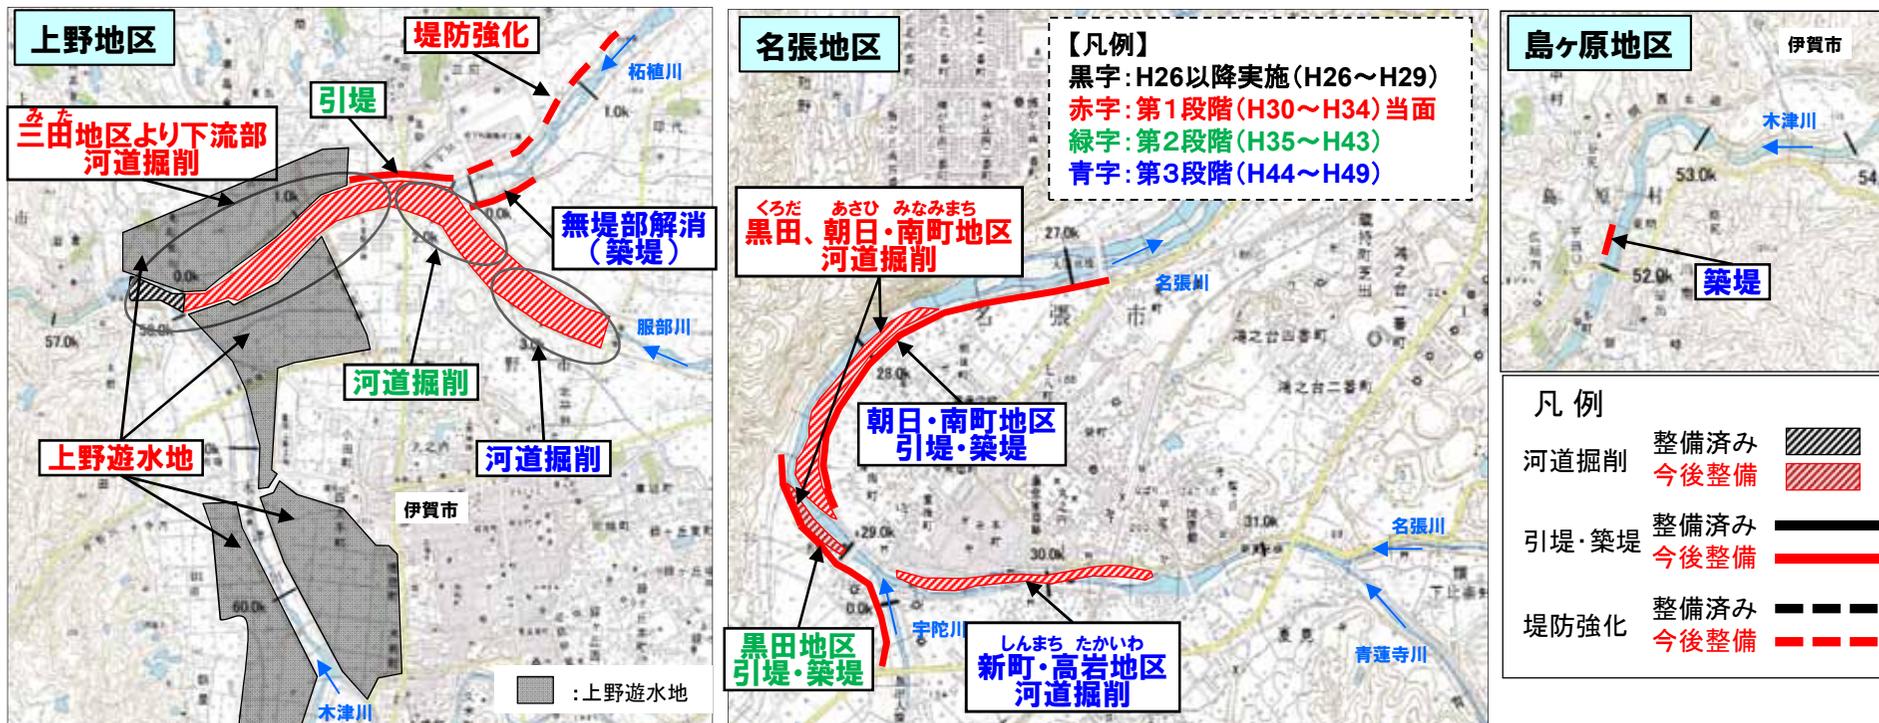

上野遊水地整備



囲ぎょう堤整備と新居橋架け替え


2. 河川整備の概要(阪神なんば線淀川橋梁架替)

- 洪水疎通能力を著しく低下させ、また橋梁が堤防高より低いため、高潮時に陸閘を閉鎖している阪神なんば線淀川橋梁を平成29年度から架替事業に着手し、淀川下流部の流下能力を向上。



■事業箇所鳥瞰図



構造令の規定	→	現橋梁
径間長50m以上	→	約16m
橋脚数15本以内	→	39本
河積阻害率5%以内	→	約10%



■現況橋梁写真

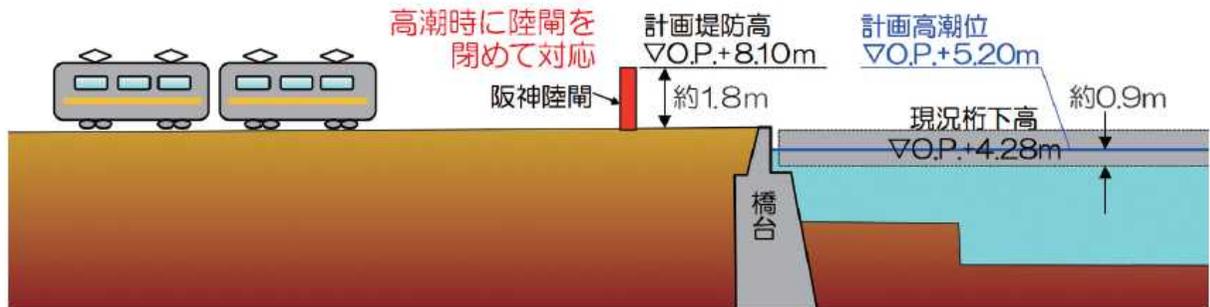

2. 河川整備の概要(宇治川塔の島改修)

- 天ヶ瀬ダム再開発後の洪水流量、琵琶湖の後期放流(1,500m³/s)に対応し、沿川の歴史的景観を保持しつつ河道掘削を実施し、流下能力を向上。平成29年度には塔の島の護岸が概成。

■事業箇所鳥瞰図




平成26年11月撮影

写真①




平成29年7月撮影

■改修横断面図

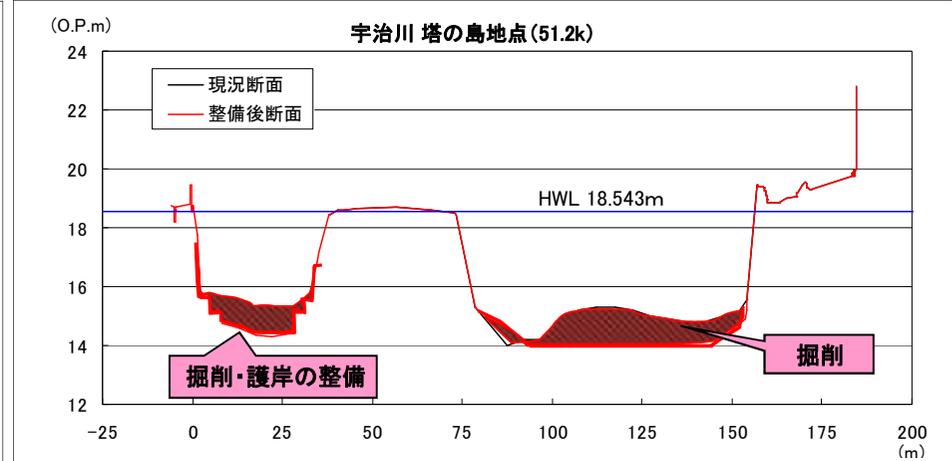

■水位縦断面図(戦後最大流量(1,500m³/s)を対象とした水位低減効果)

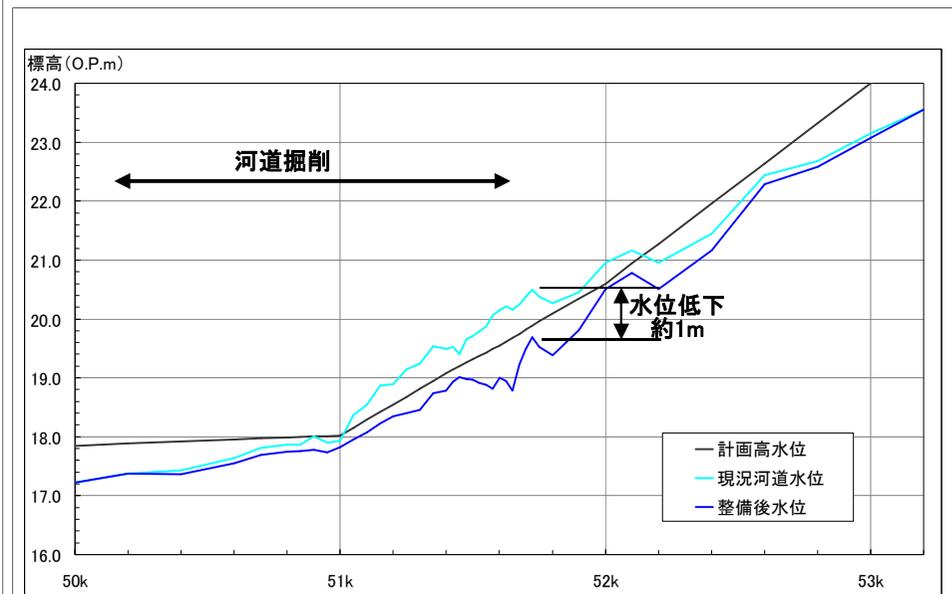

2. 河川整備の概要(桂川河道掘削・引堤)

○ 淀川本川への流量増を踏まえ、上流の貯留施設や阪神なんば線架替事業により、上下流バランスを考慮しつつ、大規模な河道掘削及び引き堤事業を段階的に実施。

■事業箇所鳥瞰図

大下津引堤事業



写真①



河道掘削事業


久我地区




嵐山地区



■改修横断面図

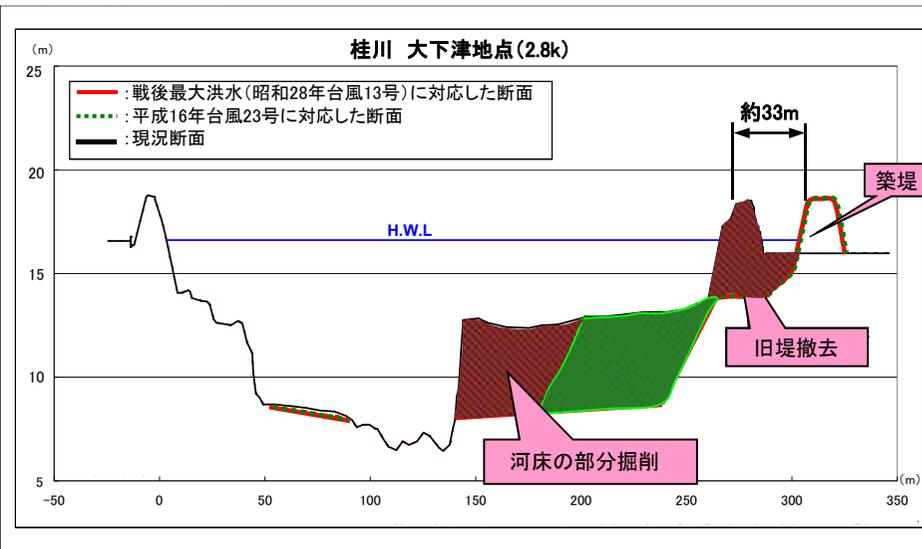

■水位縦断面図(戦後最大流量(3,600m³/s)を対象とした水位低減効果)

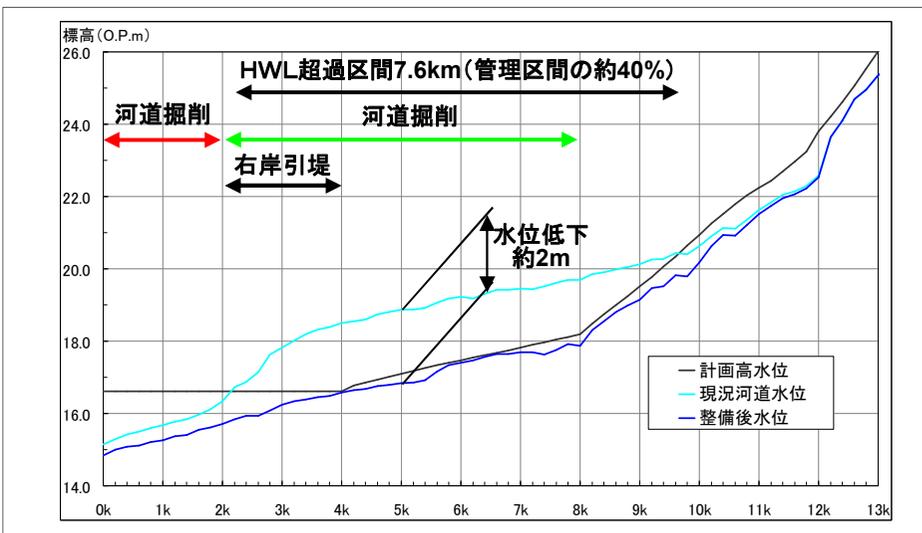


2. 河川整備の概要(瀬田川河道掘削)

○琵琶湖の後期放流(1,500m³/s)に対応するため、瀬田川洗堰下流区間の河道掘削を実施し、流下能力を向上。


■事業箇所鳥瞰図



■改修横断面図

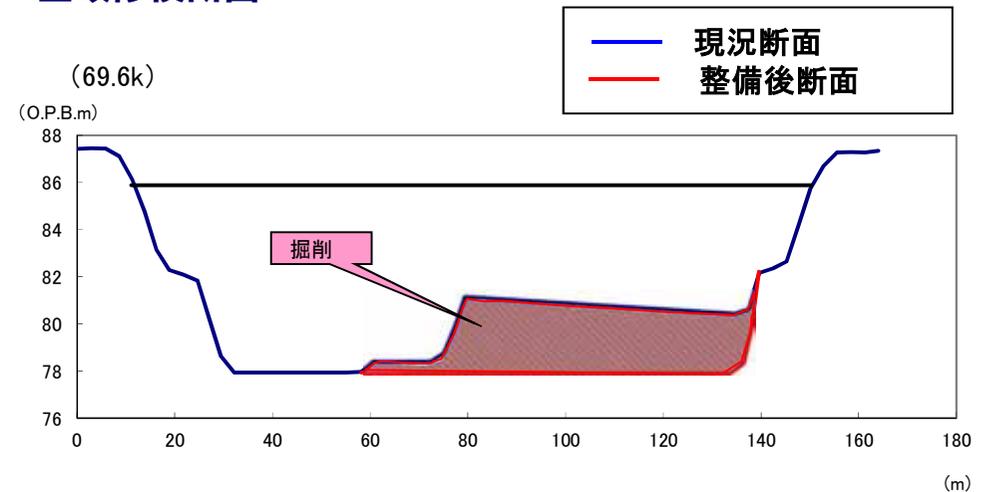

■水位縦断面図(水位低減効果)

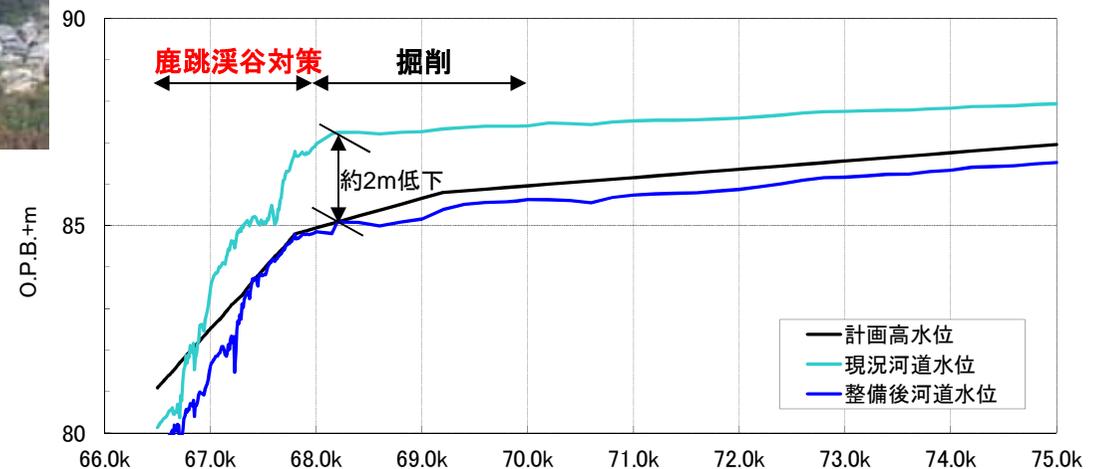

※鹿跳渓谷対策を含めた水位低減効果

3. 事業の必要性等に関する視点(事業を巡る社会経済情勢等の変化)

地域の開発状況、地域の協力体制

淀川水系5河川(猪名川・野洲川を除く)

- 淀川の氾濫源を含む沿川26市6町2村の近5カ年(平成23年から平成28年まで)の総人口は0.2%増、総世帯数は3.4%増、総資産額は1.0%増であり、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。
- 大正6年に発生した淀川大塚切れ(高槻市大塚の堤防決壊)から今年で100年目を迎え、高槻市でシンポジウム及び流域の首長による淀川サミットが開催され、淀川流域の将来のあり方について、上下流・左右岸が一体となった議論を継続することを示した『淀川宣言』が発表されました。



淀川沿川の市町の総人口・総世帯数

	H23	H28	増減
総人口 (人)	7,593,172	7,607,464	0.2%増
総世帯数 (世帯)	3,414,966	3,532,735	3.4%増

淀川沿川の市町の総資産額

	H23	H28	増減
総資産額 (兆円)	140	141	1.0%増

■淀川サミットの開催

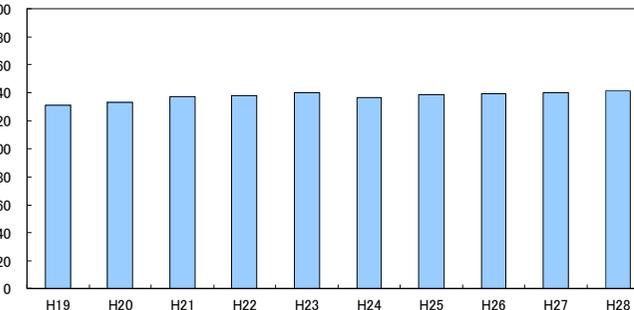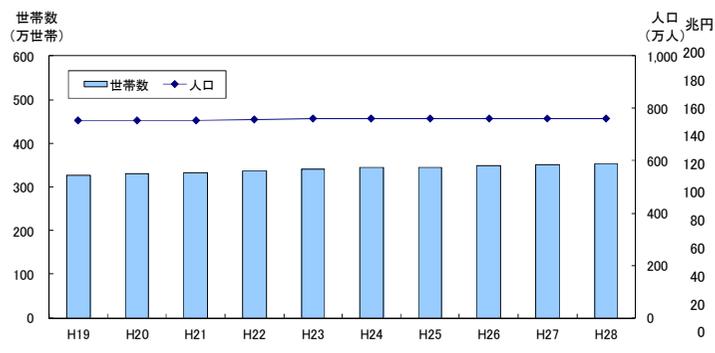

※大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、摂津市、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、島本町、大山崎町、久御山町、井手町、精華町、笠置町、南山城村、宇陀市、山添村、伊賀市、名張市、大津市、の人口・世帯数の合計

※大阪市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、摂津市、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、島本町、大山崎町、久御山町、井手町、精華町、笠置町、南山城村、宇陀市、山添村、伊賀市、名張市、大津市の資産額の合計



淀川宣言

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)


【災害発生時の影響】

- 桂川の現況(平成30年度時点)では、戦後最大洪水の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により1,800 haが浸水し、浸水家屋は約3.6万戸、被害額は2兆円と推定。

【災害発生時の危険度】


- 桂川において、河積不足や一部堤防不足箇所により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安全度に対して整備途上である。特に、下流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が予想される。

■現況河道(平成29年度時点)における氾濫想定(戦後最大洪水)

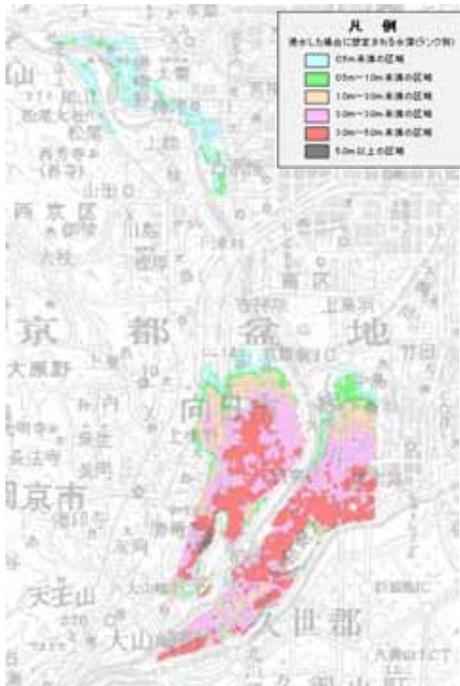

浸水面積	約 1,800ha
浸水区域内人口	約 89,800人
浸水区域内家屋数	約 35,700戸
被害総額	約 2兆100億円

■流下能力図

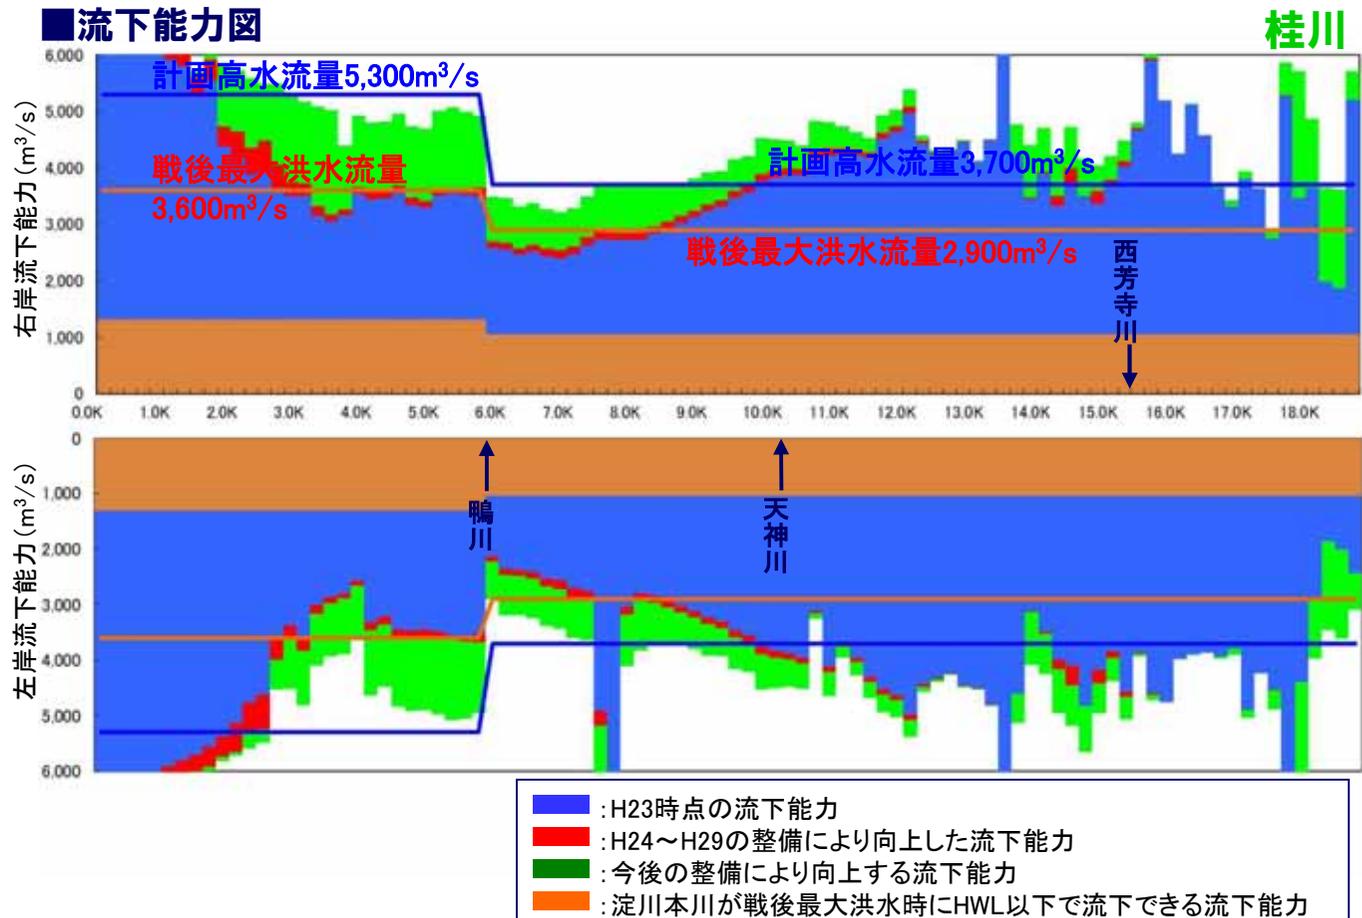

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

【災害発生時の影響】

○ 宇治川の現況(平成30年度時点)では、戦後最大洪水の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により1,650haが浸水し、浸水家屋は約3万戸、被害額は5千億円と推定。

【災害発生時の危険度】

○ 宇治川において、河積不足により、治水安全度が低い箇所があり、整備計画の目標安全度に対して整備途上である。特に、左岸中流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が予想される。

■現況河道(平成29年度時点)における氾濫想定(戦後最大洪水)


凡例	
浸水した場合に想定される水深(平均値)	
0.5m未満の区域	0.5m~1.0m未満の区域
1.0m~2.0m未満の区域	2.0m~3.0m未満の区域
3.0m~5.0m未満の区域	5.0m以上の区域



浸水面積	約 1,650ha
浸水区域内人口	約 76,200人
浸水区域内家屋数	約 30,600戸
被害総額	約 5,100億円

■流下能力図

宇治川

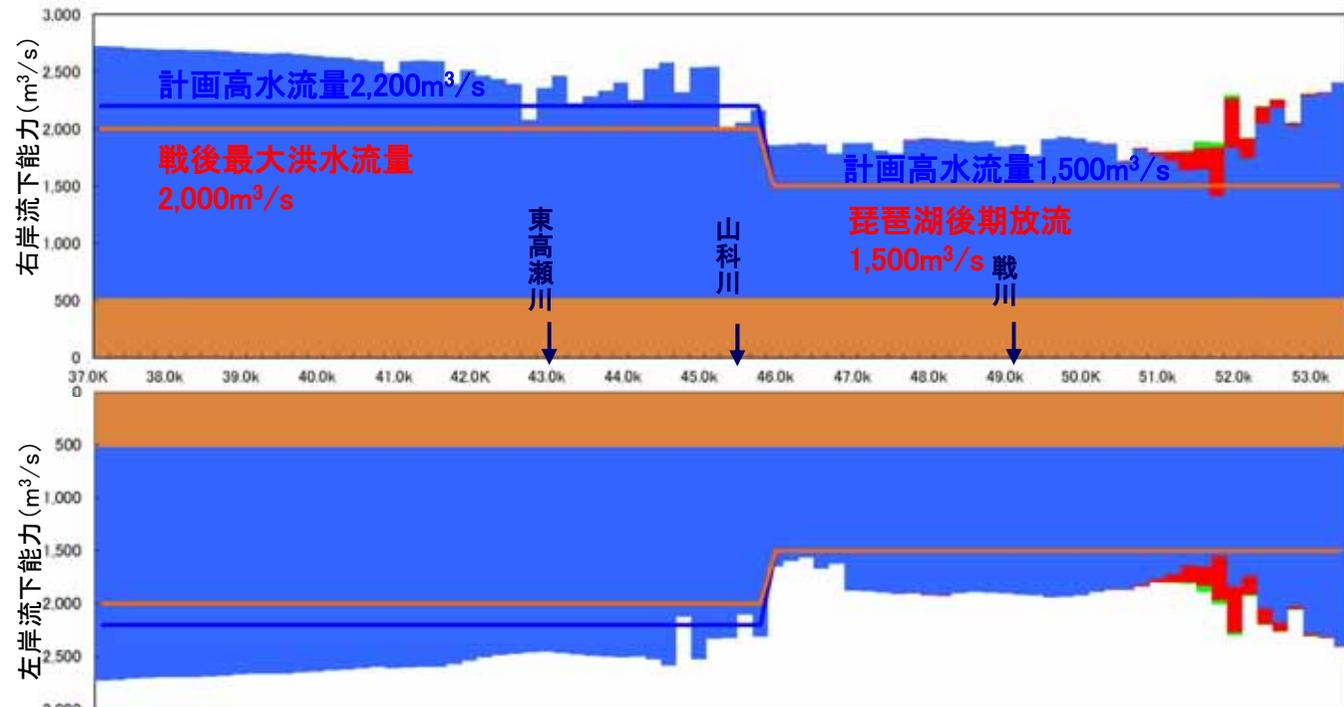

- : H23時点の流下能力
- : H24~H29の整備により向上した流下能力
- : 今後の整備により向上する流下能力
- : 淀川本川が戦後最大洪水時にHWL以下で流下できる流下能力

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)


【災害発生時の影響】

○ 淀川の現況(平成30年度時点)では、計画規模洪水相当の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により2,700haが浸水し、浸水家屋は15万戸、被害額は7兆800億円と推定。

【災害発生時の危険度】


○ 淀川において、阪神なんば線橋梁箇所による河積阻害により、治水安全度の低い箇所で、整備計画の目標安全度に対して整備途上である。特に、下流部には資産が集中しており、ひとたび氾濫すれば甚大な被害が予想される。

■現況河道(平成29年度時点)における氾濫想定(計画規模洪水)

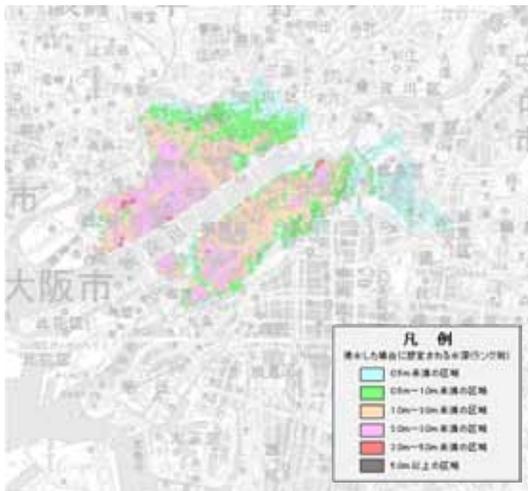

浸水面積 約2,700ha
 浸水区域内人口 約305,600人
 浸水区域内家屋数 約154,000戸
 被害総額 約7兆800億円

■流下能力図

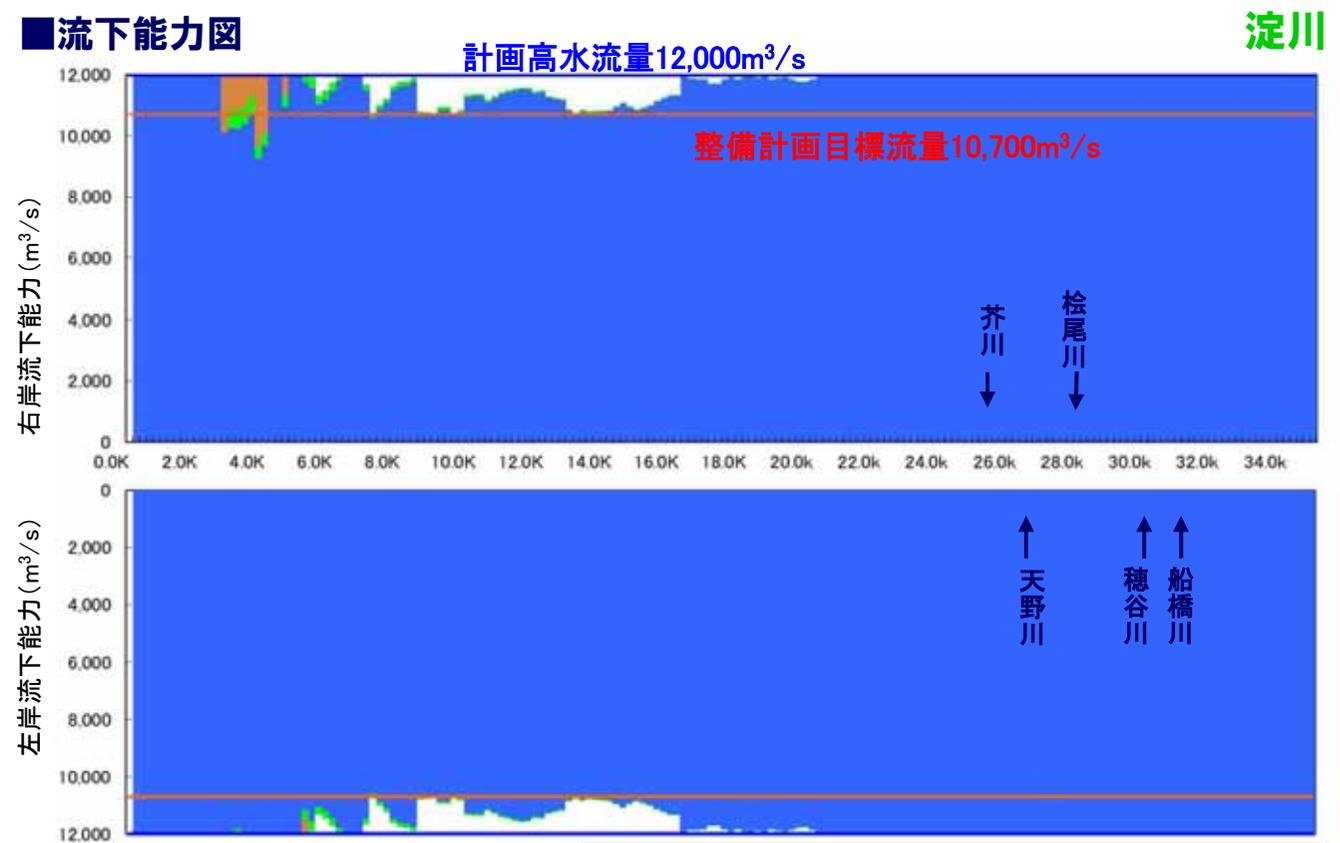

■ : H23時点の流下能力
 ■ : H24~H29の整備により向上した流下能力
 ■ : 今後の整備により向上する流下能力
 ■ : 堤防の質的整備によりHWL以下で流下できる流下能力


3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

- 桂川の現況の治水安全度は約1/5であり、戦後最大洪水の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約1,800haが浸水し浸水家屋は約3.6万戸、被害額は2兆円と推測。
- 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、治水安全度は1/20まで向上し、戦後最大洪水における浸水被害は解消。

桂川

■戦後最大洪水

現況河道における氾濫想定

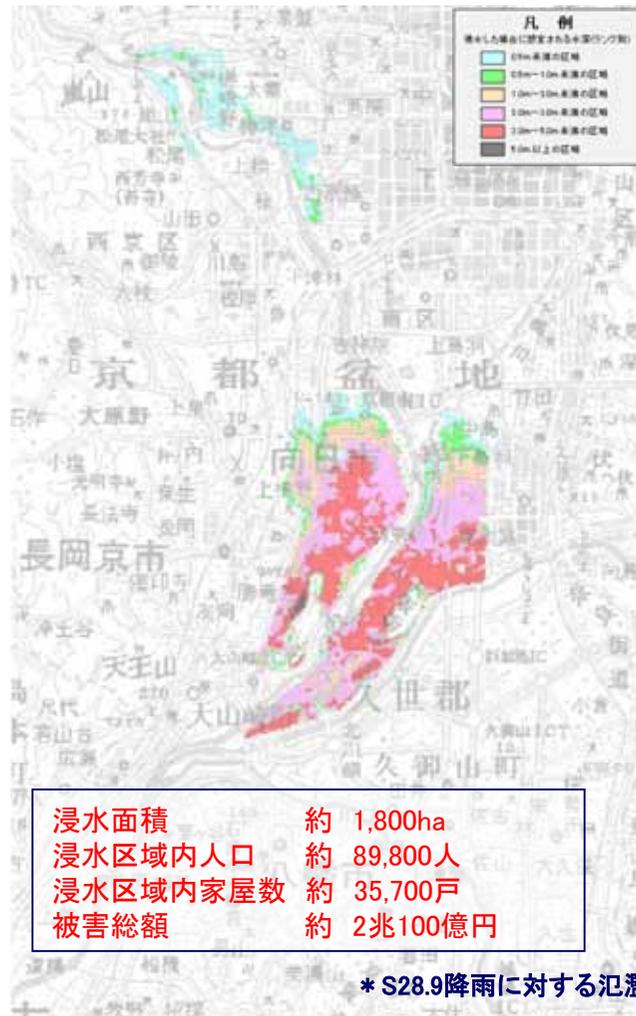

整備後河道における氾濫想定




3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

- 宇治川の現況の治水安全度は約1/10であり、戦後最大洪水の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約1,650haが浸水し浸水家屋は約3万戸、被害額は5千億円と推測。
- 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、戦後最大洪水における浸水被害は解消。


■戦後最大洪水

宇治川

現況河道における氾濫想定

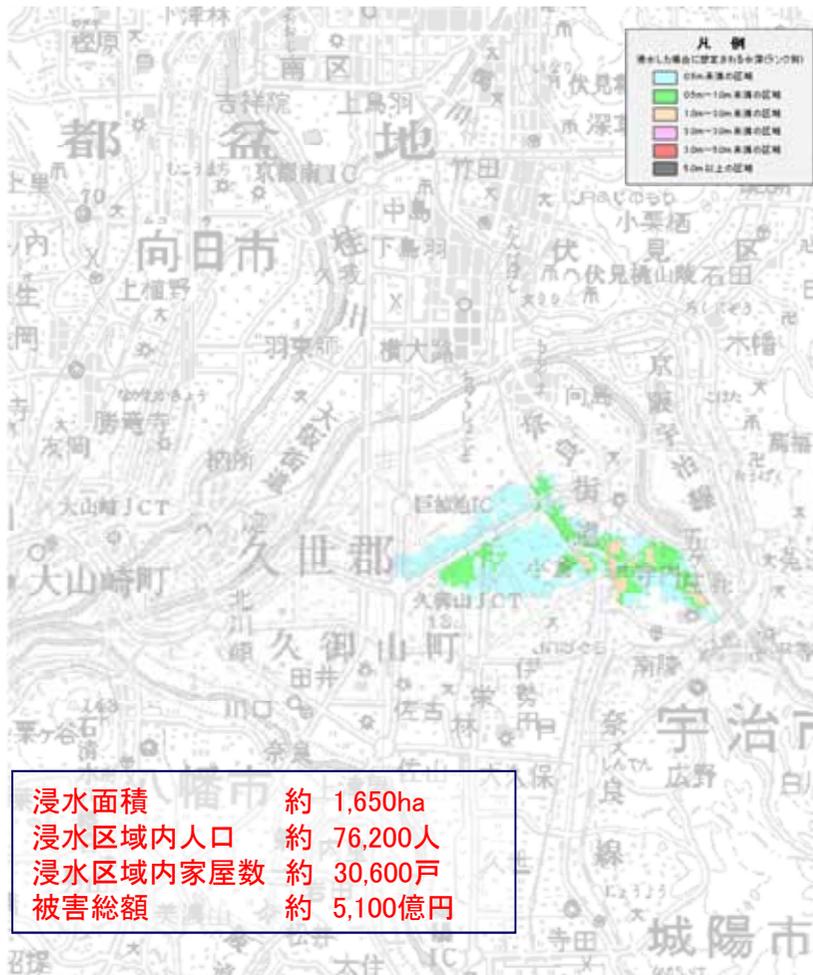

整備後河道における氾濫想定

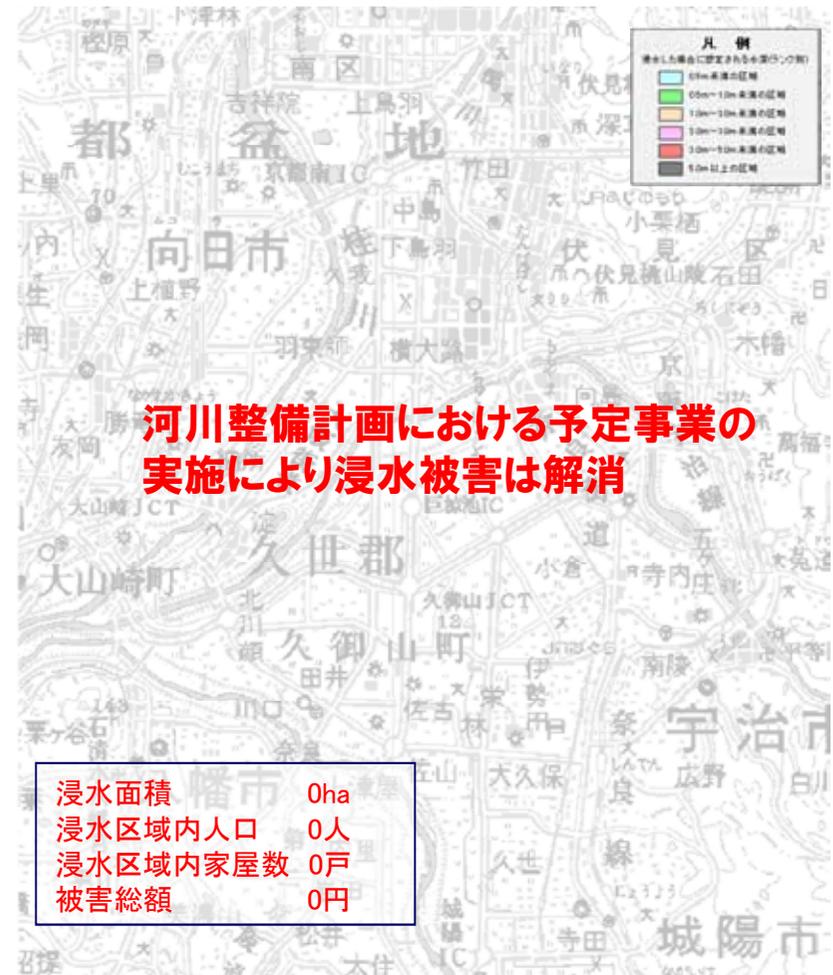

河川整備計画における予定事業の実施により浸水被害は解消

* S28.9降雨に対する氾濫解析結果

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)



- 上野地区において、上野遊水地は運用開始したものの、河道掘削が完了していないことから、戦後最大洪水が生じた場合、堤防の破堤により約300haが浸水し、浸水家屋は約900戸、被害額は700億円と推測。
- 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、戦後最大洪水における浸水被害は解消。

■戦後最大洪水

上野遊水地

現況河道における氾濫想定

整備後河道における氾濫想定

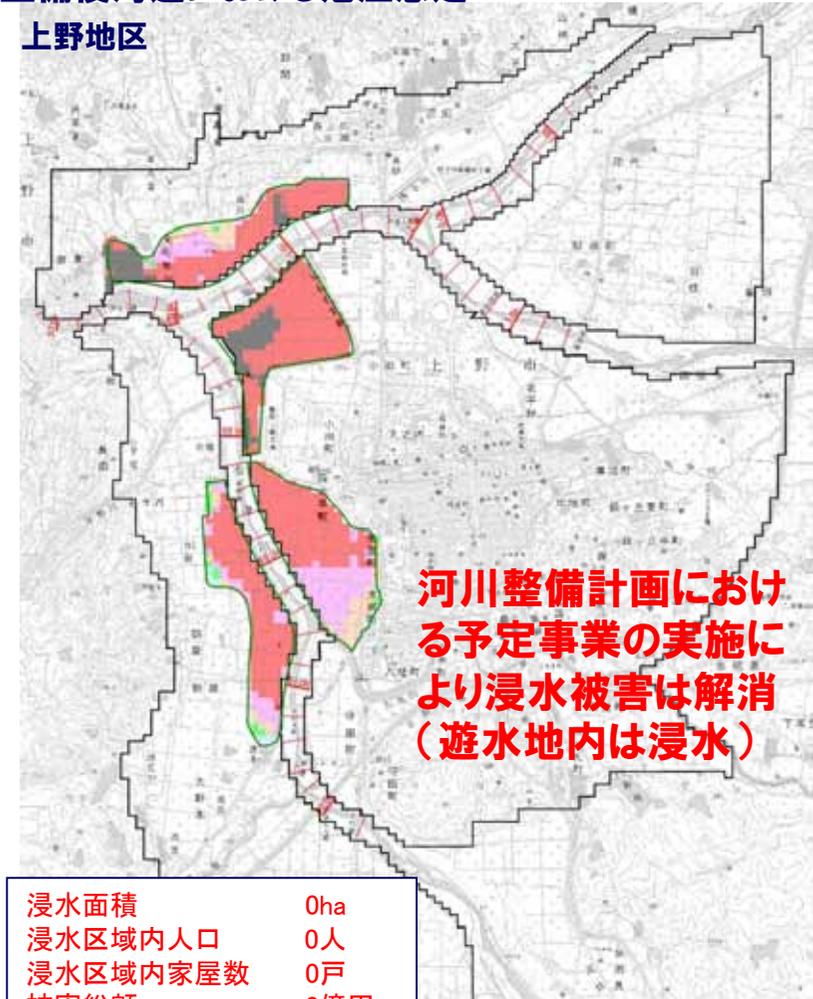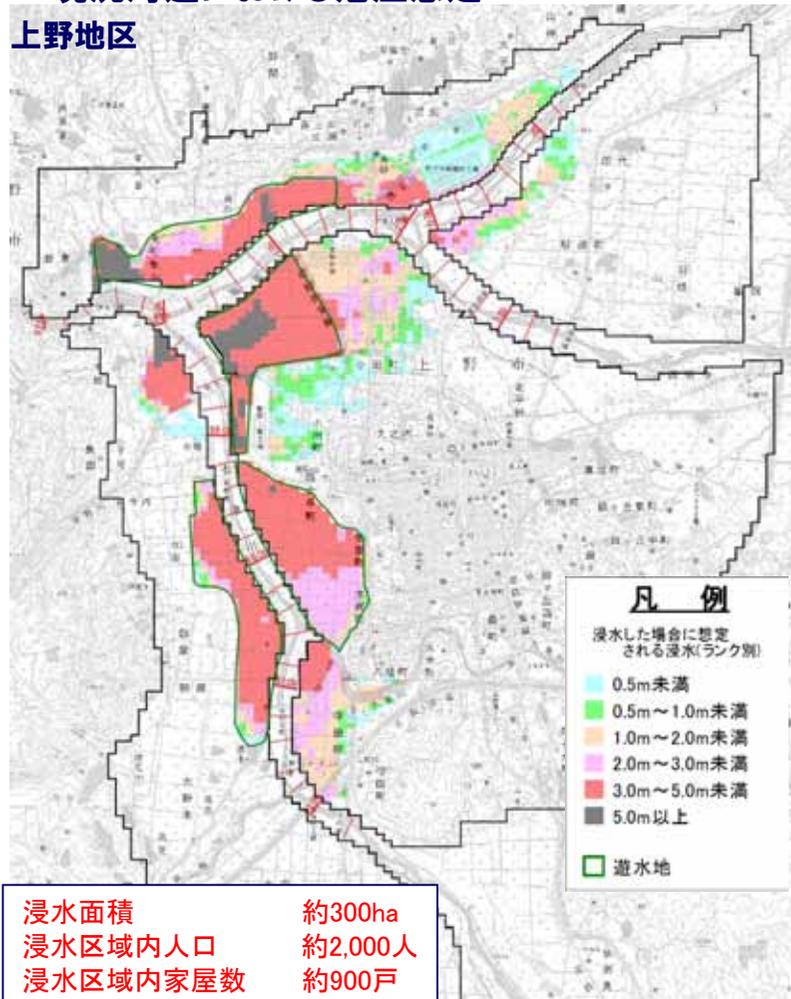



* S28.9降雨に対する氾濫解析結果

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

- 淀川の現況の治水安全度は上流で氾濫することもあり、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させることが出来るが、先行して中上流の河道改修を行った場合、計画規模洪水を計画高水位以下で流下させる事は出来ず、堤防の破堤により2,700haが浸水。浸水家屋は約15万戸、被害額は7兆800億円と推測。
- 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は解消。

■ 計画規模洪水

現況河道における氾濫想定

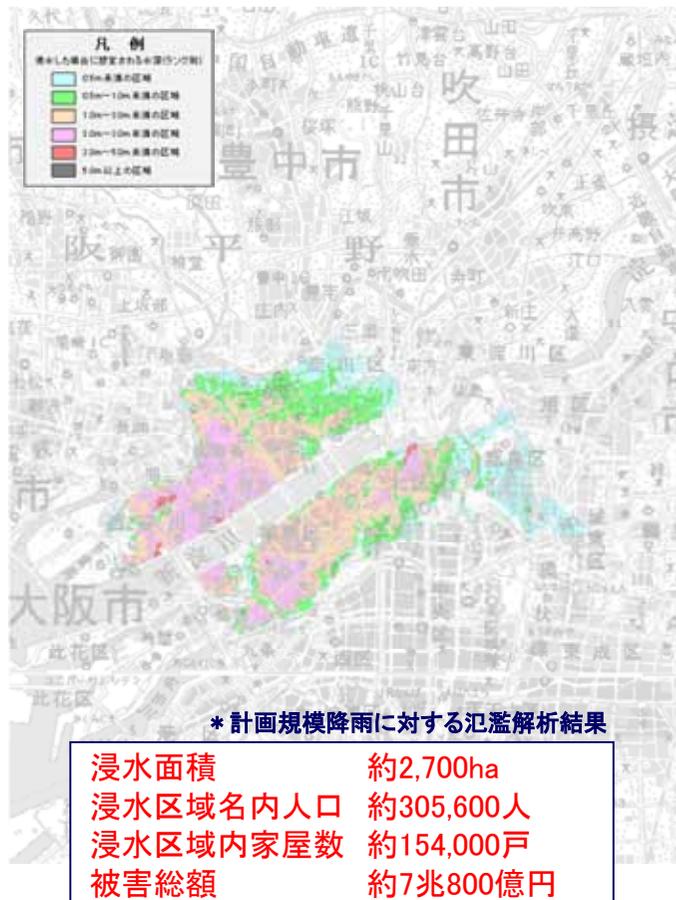

淀川(阪神なんば線淀川橋梁架替)

整備後河道における氾濫想定



※淀川本川は計画規模の安全度を有しているため、戦後最大規模による浸水被害は発生しない。
 ※便益の計算においてはスライドダウン評価をおこなっている。

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○治水経済調査マニュアル(案)(平成17年4月 河川局)に基づき算出した淀川水系5河川(野洲川・猪名川除く)の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

		事業全体	残事業
■ 便益(B)	①便益	35,467億円	26,214億円
	②残存価値	10億円	10億円
	総便益(①+②)	35,477億円	26,223億円
■ 費用(C)	③建設費	2,571億円	1,410億円
	④維持管理費	1,896億円	1,497億円
	総費用(③+④)	4,467億円	2,907億円
■ 費用便益比(B/C)		7.9	9.0

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

※当分析はH27国勢調査の全体あるいは詳細な結果が未公表であるため、現時点で最新のH22の調査結果を用いて算出しているが、H27国勢調査のうち既に公表されている一部の結果からB/Cを仮算出した場合、全体(8.0)残事業(9.1)となる。

淀川水系5河川(野洲川・猪名川除く)

■ 算出条件等

評価基準年

: 平成29年

施設完成後の供用期間

: 50年

建設費(現在価値化前)

: 2,908億円

(残事業 : 1,943億円)

維持管理費(現在価値化前)

: 4,371億円

(残事業 : 4,367億円)

■ 感度分析結果(費用便益比(B/C))

	基本	残事業		残工期		資産	
		+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
事業全体	7.9	7.6	8.3	7.9	8.0	8.7	7.2
残事業	9.0	8.4	9.7	9.6	8.6	9.8	8.1

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○前々回※の事業評価(平成23年)と今回の事業再評価(平成29年)における費用便益比(B/C)の差の要因は以下のとおり。

総便益(B); 事業を前倒したことにより効果の早期発現したため

総費用(C); 平成25年台風18号に伴う対応や土壌汚染対応、平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえて、堤防強化箇所及び堤防決壊までの時間を引き延ばす対策を追加したため

※前回評価は、費用対効果分析を省略

■ 費用対効果の分析(前回との比較)

淀川水系5河川(野洲川・猪名川除く)

項目	平成23年度 再評価	平成29年度 再評価	変化倍率	主な要因
B/C	7.5	7.9	約1.05倍	<ul style="list-style-type: none"> 下記総費用と総便益の関係による
総便益(B)	25,488億円	35,477億円	約1.39倍	<ul style="list-style-type: none"> 事業を前倒したことによる効果の早期発現によるため。
	[109,073億円]※1	[122,288億円]※1	約1.12倍	
総費用(C)	3,411億円	4,467億円	約1.31倍	<ul style="list-style-type: none"> H25台風に伴う堤防漏水対応、桂川の土壌汚染対応により費用が増加したため。 平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえ、堤防決壊までの時間を引き延ばす対策(堤防強化)の追加により費用が増加したため。
	[7,138億円]※2 (うち事業費 2,972億円)	[7,811億円]※2 (うち事業費 3,119億円)	約1.09倍	

※1 [] 現在価値化前の総便益

※2 [] 現在価値化前の事業費+維持管理費

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○ 治水経済調査マニュアル(案)(平成17年4月 河川局)に基づき算出した淀川水系木津川上流河川上野遊水地事業の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり。

■費用対効果分析結果

		事業全体	残事業
■便益(B)	①便益	6,380億円	378億円
	②残存価値	0.7億円	0.3億円
	総便益(①+②)	6,381億円	378億円
■費用(C)	③建設費	2,058億円	63億円
	④維持管理費	65億円	18億円
	総費用(③+④)	2,122億円	81億円
■費用便益比(B/C)		3.0	4.7

■算出条件等

上野遊水地事業

評価基準年:平成29年度
 施設完成後の評価期間:50年
 建設費: 696億円
 (残事業費: 90億円)
 維持管理費:71億円
 (残事業費: 53億円)

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

■感度分析結果(費用便益比(B/C))

	基本	残事業費		残工期		資産	
		+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
事業全体	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	2.7
残事業	4.7	4.3	5.1	4.7	4.6	5.1	4.2

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○前々回※の事業評価(平成23年)と今回の事業再評価(平成29年)における費用便益比(B/C)の差の要因は以下のとおり。

総便益(B); 氾濫区域内の家屋資産額の増加による被害額(期待値)の増加したため

※前回評価は、費用対効果分析を省略

■ 費用対効果の分析(前回との比較)

上野遊水地

項目	平成23年度 再評価	平成29年度 再評価	変化倍率	主な要因
B/C	2.5	3.0	約1.20倍	<ul style="list-style-type: none"> 下記総費用と総便益の関係による
総便益 (B)	4,030億円	6,381億円	約1.58倍	<ul style="list-style-type: none"> 氾濫区域内の家屋資産額が増加し、被害額(期待値)が増加したため。
	[8,020億円]※1	[10,368億円]※1	約1.29倍	
総費用(C)	1,596億円	2,122億円	約1.33倍	—
	[786億円]※2 (うち事業費717億円)	[794億円]※2 (うち事業費717億円)	約1.01倍	

※1 [] 現在価値化前の総便益

※2 [] 現在価値化前の事業費+維持管理費

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○治水経済調査マニュアル(案)(平成17年4月 河川局)に基づき算出した阪神なんば線事業の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

阪神なんば線

		事業全体	残事業
■ 便益(B)	①便益	796億円	796億円
	②残存価値	－億円	－億円
	総便益(①+②)	796億円	796億円
■ 費用(C)	③建設費	387億円	347億円
	④維持管理費	－億円	－億円
	総費用(③+④)	387億円	347億円
■ 費用便益比(B/C)		2.1	2.3

■ 算出条件等

評価基準年
：平成29年
施設完成後の供用期間
：50年
建設費(現在価値化前)
：497億円
(残事業：468億円)
維持管理費(現在価値化前)
：－億円
(残事業：－億円)

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

※事業全体はH12年の事業化してからの費用を含む

■ 感度分析結果(費用便益比(B/C))

	基本	残事業		残工期		資産	
		+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
事業全体	2.1	1.9	2.3	2.0	2.1	2.3	1.9
残事業	2.3	2.1	2.5	2.2	2.3	2.5	2.1

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○前々回※の事業評価(平成23年)と今回の事業再評価(平成29年)における費用便益比(B/C)の差の要因は以下のとおり。

総便益(B); 氾濫範囲の減少に伴い減額したため

※前回評価は、費用対効果分析を省略

■ 費用対効果の分析(前回との比較)

阪神なんば線

項目	平成23年度 再評価	平成29年度 再評価	変化倍率	主な要因
B/C	2.6	2.1	約0.81倍	• 下記総費用と総便益の関係による
総便益(B)	1,040億円	796億円	約0.77倍	• 氾濫範囲の減少に伴い、被害額(期待値)が減少したため。
	[3,727億円]※1	[3,206億円]※1	約0.86倍	
総費用(C)	403億円	387億円※2	約0.96倍	—
	[500億円]※2 (うち事業費500億円)	[497億円]※2 (うち事業費500億円)	約1.00倍	


※1 [] 現在価値化前の総便益

※2 [] 現在価値化前の事業費

2. 河川整備の概要(H26事業評価以降の実施した主な整備内容)


野洲川

○ 堤防強化工事を継続して実施するとともに、水防拠点の整備を推進。

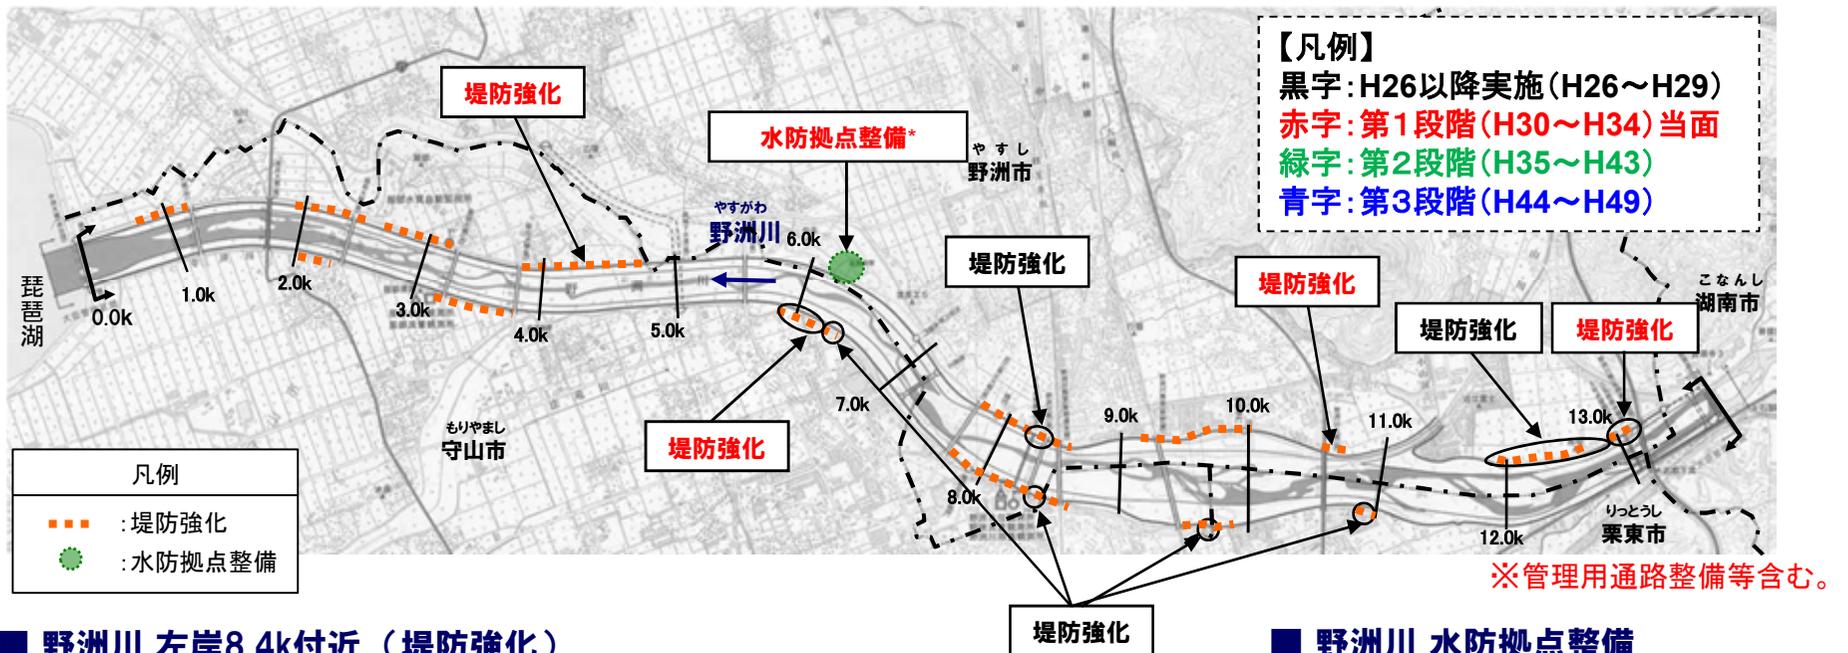

野洲川 左岸8.4k付近（堤防強化）

施工前



施工後



野洲川 水防拠点整備

整備イメージ




3. 事業の必要性等に関する視点(事業を巡る社会経済情勢等の変化)

地域の開発状況、地域の協力体制


- 野洲川の氾濫想定区域を含む市町村人口は、約39万人で、近5ヶ年(平成23年～平成28年)で約2%増と微増となっているが、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。
- 野洲川沿川は、既存の鉄道、主要国道、高速道路等主要な交通網が整備されており、近年、野洲リバーサイドタウン、イオンタウン野洲等の住宅や商業施設が開発され、今後も住宅都市としての更なる発展が期待される地域である。
- 国、県、市等が連携・協力して、防災・減災等について情報共有し、野洲川の浸水を想定した安全なまちづくりについて意見交換を行う場として「野洲川地域安全懇談会」(平成27年12月設置)を設置し、「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取組を推進。

野洲川沿川の市の総人口・総世帯

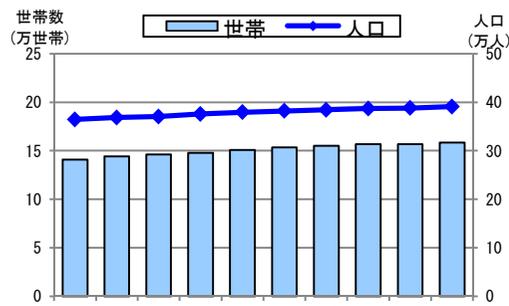


※想定はん濫区域を含む市町村：草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市。出典：滋賀県推計人口年報

野洲川沿川の市の総資産額

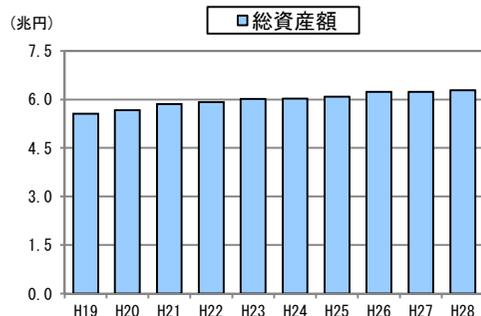


※総資産額：国勢調査、事業所・企業統計調査、経済センサス-基礎調査、作物統計のデータを元に治水経済マニュアル(案)により算出

野洲川沿川の開発状況

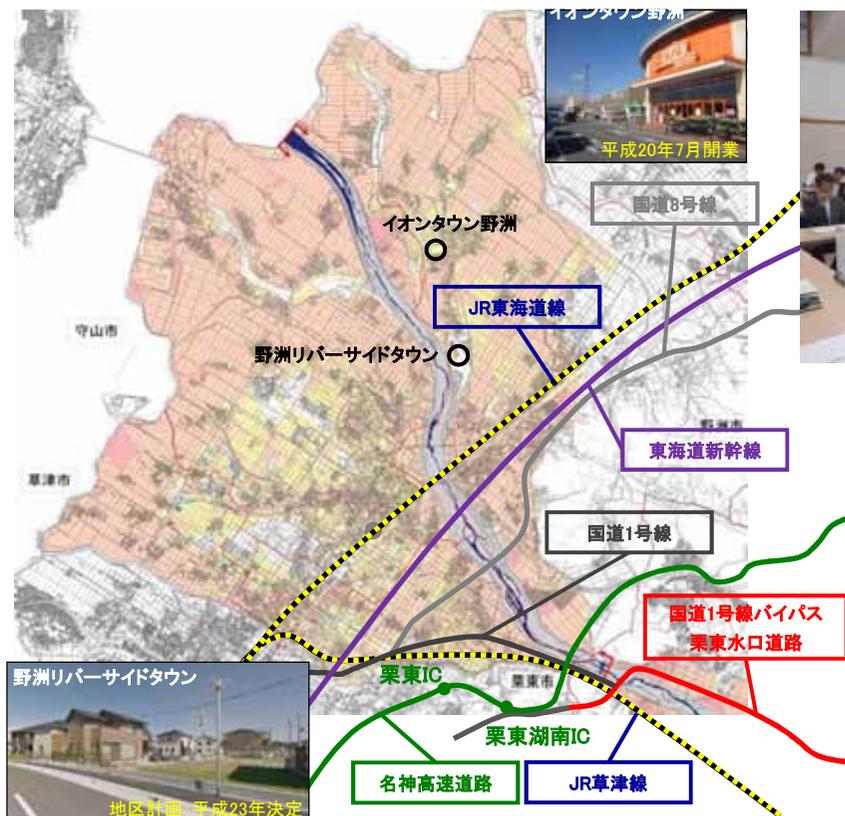

野洲川地域安全懇談会の状況




3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

- 野洲川が現況河道の状態では、計画規模(1/100)の降雨が生じた場合、堤防の決壊等により約702haが浸水し浸水家屋は約4,160戸、被害額は約415億円と推測。
- 河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は解消。

野洲川

現況河道における氾濫想定
(計画規模1/100の降雨)

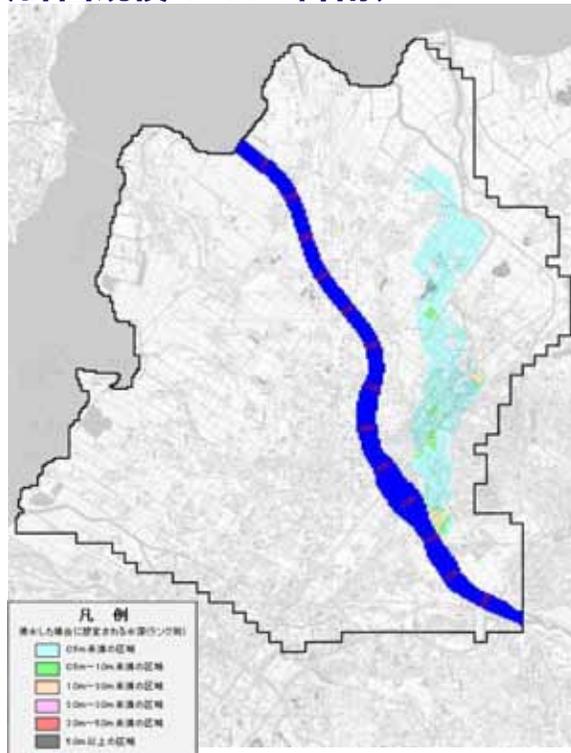

浸水面積	約 702 ha
浸水区域内人口	約 11,000 人
浸水区域内家屋数	約 4,160 戸
被害総額	約 415 億円

整備後河道における氾濫想定
(計画規模1/100の降雨)



浸水面積	0 ha
浸水区域内人口	0 人
浸水区域内家屋数	0 戸
被害総額	0 億円

※計画規模1/100に対する浸水区域は、裏法すべりによる堤防決壊を考慮

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○治水経済調査マニュアル(案)(平成17年4月 河川局)に基づき算出した野洲川改修事業の「事業全体」、「残事業」の費用便益比は以下のとおり。

■ 費用対効果分析結果

		事業全体	残事業
■ 便益(B)	①便益	1,366億円	156億円
	②残存価値	0.2億円	0.1億円
	総便益(①+②)	1,366億円	156億円
■ 費用(C)	③建設費	42億円	15億円
	④維持管理費	94億円	100億円
	総費用(③+④)	136億円	115億円
■ 費用便益比(B/C)		10.0	1.4

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

■ 算出条件等

野洲川

評価基準年
：平成29年
施設完成後の供用期間
：50年
建設費（現在価値化前）
：38億円
（残事業：17億円）
維持管理費（現在価値化前）
：188億円
（残事業：254億円）

■ 感度分析結果(費用便益比(B/C))

	基本	残事業		残工期		資産	
		+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
事業全体	10.0	9.9	10.1	10.5	9.5	11.0	9.1
残事業	1.4	1.3	1.4	1.6	1.1	1.5	1.2

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○前々回※の事業評価(平成23年)と今回の事業再評価(平成29年)における費用便益比(B/C)の差の要因は以下のとおり。

総便益(B); 事業区間の見直し及び氾濫区域内の家屋資産額の増加による被害額(期待値)の増加によるため

総費用(C); 堤防強化整備箇所の見直しに伴う減額によるため

※前回評価は、費用対効果分析を省略

■ 費用対効果の分析(前回との比較 事業全体)

野洲川

項目	平成23年度 ^{※3} 再評価	平成29年度 再評価	変化倍率	主な要因
B/C	8.6	10.0	約1.16倍	• 下記総便益と総費用の関係による
総便益(B)	497億円	1,366億円	約2.75倍	• 事業区間の見直し及び氾濫区域内の家屋資産額の増加による被害額(期待値)の増加によるため。
	[1,893億円] ^{※1}	[2,993億円] ^{※1}	約1.58倍	
総費用(C)	58億円	136億円	約2.34倍	• 堤防強化整備箇所の見直しに伴う減額によるため。
	[99億円] ^{※2} (うち事業費 48億円)	[239億円] ^{※2} (うち事業費 40億円)	約2.41倍	

※1 [] 現在価値化前の総便益

※2 [] 現在価値化前の事業費+維持管理費

2. 河川整備の概要(前回事業評価(平成26年)以降に実施した主な整備内容)

猪名川


- 流下能力向上のために床固改築(天端の切り下げ)、旧堰撤去を含む河道掘削を実施。



3. 事業の必要性等に関する視点(事業を巡る社会経済情勢等の変化)

- 猪名川の氾濫原を含む沿川市の近5ヶ年(平成23年～平成28年)での総人口は約130万人で、ほぼ横ばい。総世帯数は2.0%増、総資産額も1.0%増にとどまっており、河川改修事業の必要性について著しい変化はない。
- 国、市等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的として、平成28年度に「猪名川・藻川の大規模氾濫に関する減災対策協議会」を実施し、「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組方針を決定。
- 猪名川流域総合治水対策協議会(近畿地方整備局長、大阪府副知事、兵庫県副知事、流域10市町村、水資源機構で構成)では、猪名川流域で土地の適正な利用計画等総合的な治水対策のための諸施策を協力して推進。

■猪名川沿川の市の総人口

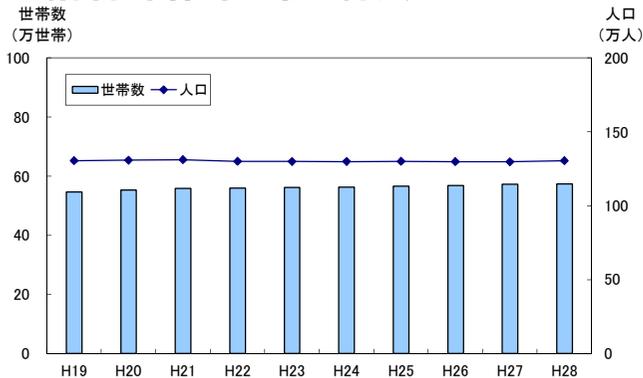


	H23	H28	増減
総人口 (人)	1,298,841	1,303,990	0.4%増
総世帯数 (世帯)	561,928	573,438	2.0%増

※【大阪府】豊中市、池田市 【兵庫県】川西市、尼崎市、伊丹市の人口・世帯数の合計

※出典: 国勢調査(H22、H27)、大阪府統計年鑑および兵庫県統計書(H22、H27以外)

■猪名川沿川の市の総資産額

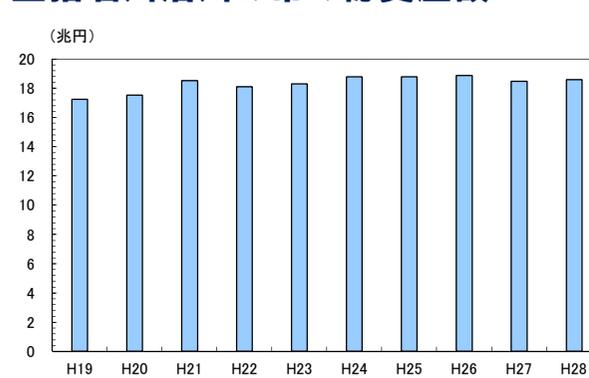

	H23	H28	増減
総資産額 (兆円)	18.8	19.0	1.0%増

※【大阪府】豊中市、池田市 【兵庫県】川西市、尼崎市、伊丹市の資産額の合計

※出典: 事業所・企業統計(H18)、経済センサス(基礎調査-H21、H26、活動調査-H24)、作物統計(H19~H28)、治水経済調査マニュアル(案)各種資産評価単価及びデフレレーター(H29年2月改正)

※統計値が存在しない年は、前年の値で補完

■猪名川・藻川の大規模氾濫に関する減災対策協議会の状況




■猪名川流域総合治水対策協議会の状況



3. 事業の必要性等に関する視点(事業の効果等)

- 河川整備計画において予定している規模(昭和35年8月洪水)の降雨が生じた場合、堤防の破堤により約1,090haが浸水し浸水家屋は約31,100戸、被害額は約4,700億円と推測されるが、河川整備計画において予定している事業を実施することにより、浸水被害は解消される。

■戦後最大洪水 現況河道における氾濫想定

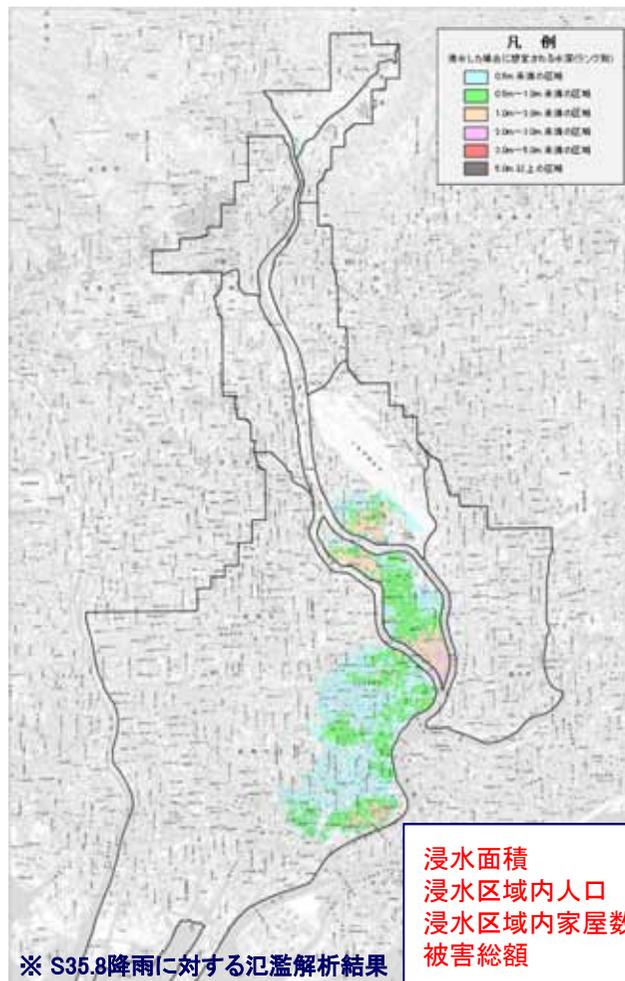

整備後河道における氾濫想定



猪名川

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○ 治水経済調査マニュアル(案)(平成17年4月 河川局)に基づき算出した淀川水系猪名川の「事業全体」、「残事業」の費用便益費は、以下のとおり。

■費用対効果分析結果

		事業全体	残事業
■便益(B)	①便益	4,109億円	397億円
	②残存価値	1億円	0.9億円
	総便益(①+②)	4,110億円	398億円
■費用(C)	③建設費	180億円	31億円
	④維持管理費	87億円	29億円
	総費用(③+④)	267億円	60億円
■費用便益比(B/C)		15.4	6.7

■算出条件等

猪名川

評価基準年：平成29年度
 施設完成後の評価期間：50年
 建設費：152億円
 (残事業費：37億円)
 維持管理費：168億円
 (残事業費：78億円)

※便益・費用は、現在価値化した値である。

※便益・費用の合計値は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

■感度分析結果(費用便益比(B/C))

	基本	残事業費		残工期		資産	
		+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
事業全体	15.4	15.2	15.6	15.6	15.2	16.9	13.9
残事業	6.7	6.3	7.0	6.9	6.4	7.3	6.0

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)

○前々回※の事業評価(平成23年)と今回の事業再評価(平成29年)における費用便益比(B/C)の差の要因は以下のとおり。

総便益(B); 事業を前倒したことにより効果の早期発現や氾濫区域内の家屋資産額の増加による被害額(期待値)の増加したため

総費用(C); 平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえて、堤防強化箇所及び堤防決壊までの時間を引き延ばす対策を追加したため

※前回評価は、費用対効果分析を省略

■ 費用対効果の分析(前回との比較)

猪名川

項目	平成23年度 再評価	平成29年度 再評価	変化倍率	主な要因
B/C	13.9	15.4	約1.11倍	• 下記総費用と総便益の関係による
総便益 (B)	2,321億円	4,110億円	約1.77倍	<ul style="list-style-type: none"> • 事業を前倒したことによる効果の早期発現によるため。 • 氾濫区域内の家屋資産額が増加し、被害額(期待値)が増加したため。
	[9,203億円]※1	[9,794億円]※1	約1.06倍	
総費用 (C)	167億円	267億円	約1.60倍	<ul style="list-style-type: none"> • 平成27年9月の関東・東北豪雨を踏まえ、堤防決壊までの時間を引き延ばす対策(堤防強化)の追加により費用が増加したため。
	[255億円]※2 (うち事業費 145億円)	[340億円]※2 (うち事業費 160億円)	約1.33倍	

※1 [] 現在価値化前の総便益

※2 [] 現在価値化前の事業費+維持管理費

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)桂川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 戦後最大洪水が発生した場合、事業実施により桂川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、戦後最大洪水)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	73,443人	0人
	避難率40%	44,066人	0人
	避難率80%	14,689人	0人


<現況>

<整備後>



河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消

※ S28.9降雨に対する氾濫解析結果



※浸水浸50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数


■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、戦後最大洪水)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	61,232人	0人


<現況>

<整備後>

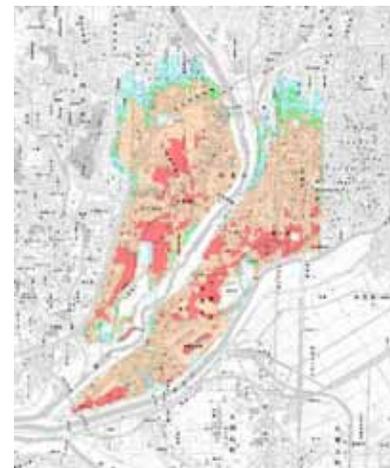

河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消

※ S28.9降雨に対する氾濫解析結果



※浸水浸70cm以上(コンセントの設置高さ)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)桂川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/150)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、桂川直轄管理区間内で最大孤立者数が18,949人(避難率40%)、電力の停止による影響人口が23,802人軽減される。



■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	95,056人	63,475人
	避難率40%	57,034人	38,085人
	避難率80%	19,011人	12,695人

<整備前>

<整備後>

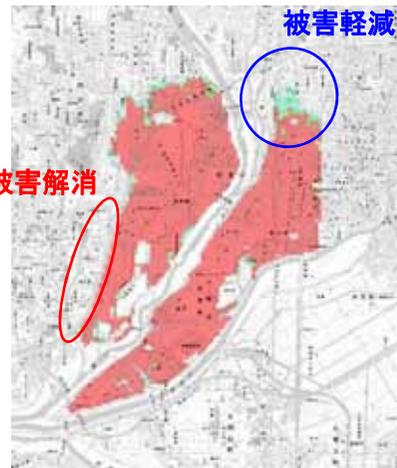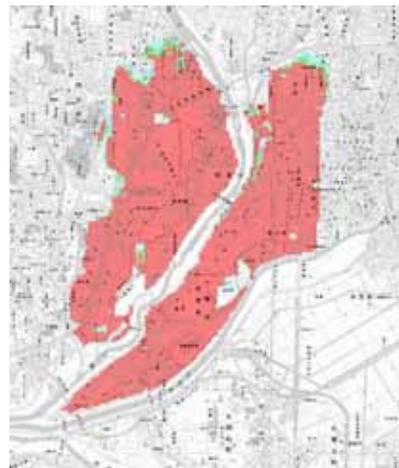

浸水深

30cm未満の区域
30～50cm未満の区域 (災害時要援護者の避難が困難となる水位)
50cm以上の区域 (災害時要援護者以外の避難が困難となる水位)

※浸水深50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数



■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	79,059人	55,257人

<整備前>

<整備後>

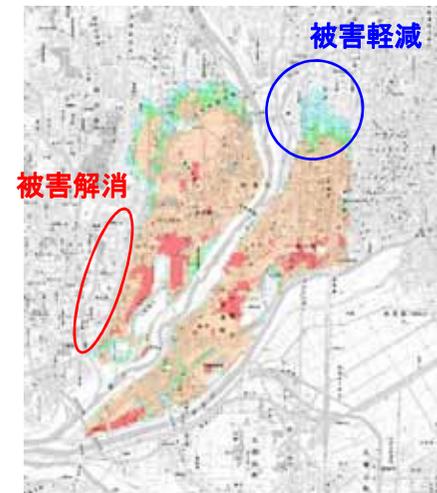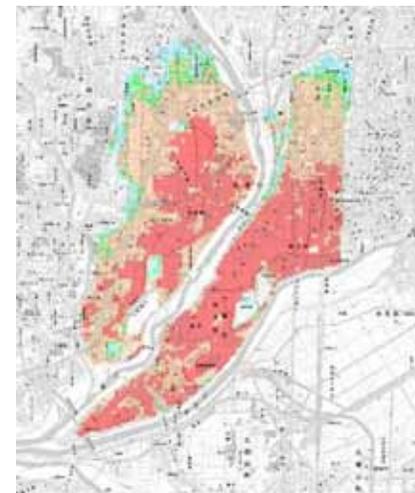

浸水深

70cm未満の区域 (停電が発生しない水位)
70～100cm未満の区域 (屋内配線が停電する水位)
100cm～340cmの区域 (集合住宅等の棟全体が停電する水位)
340cm以上の区域 (浸水深に応じて階数毎に停電が発生する水位)

※浸水深70cm以上(コンセントの設置高)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)宇治川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 戦後最大洪水が発生した場合、事業実施により宇治川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、戦後最大洪水)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	5,909人	0人
	避難率40%	3,545人	0人
	避難率80%	1,182人	0人

<現況>

<整備後>



※S28.9降雨に対する氾濫解析結果



河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消

浸水深

30cm未満の区域	(停電が発生しない水位)
30～50cm未満の区域	(災害時要援護者の避難が困難となる水位)
50cm以上の区域	(災害時要援護者以外の避難が困難となる水位)

※浸水深50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数

■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、戦後最大洪水)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	2,700人	0人

<現況>

<整備後>



※ S28.9降雨に対する氾濫解析結果



河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消

浸水深

70cm未満の区域	(停電が発生しない水位)
70～100cm未満の区域	(屋内配線が停電する水位)
100cm～340cmの区域	(集合住宅等の棟全体が停電する水位)
340cm以上の区域	(浸水深に応じて階数毎に停電が発生する水位)

※浸水深70cm以上(コンセントの設置高さ)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)宇治川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/150)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、宇治川直轄管理区間内で最大孤立者数が30人(避難率40%)軽減されるが、電力の停止による影響人口は変化しない。

■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

		整備前	整備後
最大孤立者数 [※]	避難率0%	6,031人	5,982人
	避難率40%	3,619人	3,589人
	避難率80%	1,206人	1,196人

<整備前>

<整備後>



浸水深

- 30cm未満の区域
- 30~50cm未満の区域 (災害時要保護者の避難が困難となる水位)
- 50cm以上の区域 (災害時要保護者以外の避難が困難となる水位)

※浸水浸50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数

■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	2,729人	2,729人

<整備前>

<整備後>



※水深は減少しているが、電力停止の閾値間での減少のため、影響人口に変動がない

浸水深

- 70cm未満の区域 (停電が発生しない水位)
- 70~100cm未満の区域 (屋内配線が停電する水位)
- 100cm~340cmの区域 (集合住宅等の棟全体が停電する水位)
- 340cm以上の区域 (浸水深に応じて階数毎に停電が発生する水位)

※浸水浸70cm以上(コンセントの設置高)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)木津川上流

■貨幣換算が困難な効果等による評価

- 水害の被害指標分析の手引きに準じて、河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 戦後最大洪水が発生した場合、事業実施により上野地区で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

■最大孤立者数




(最大孤立者数に係る浸水区分、戦後最大洪水)

		整備前	整備後
最大 ※ 孤立者数	避難率 0%	約 6,375 人	0人
	避難率 40%	約 3,824 人	0人
	避難率 80%	約 1,275人	0人

■電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、戦後最大洪水)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 ※	約 6,252 人	0人

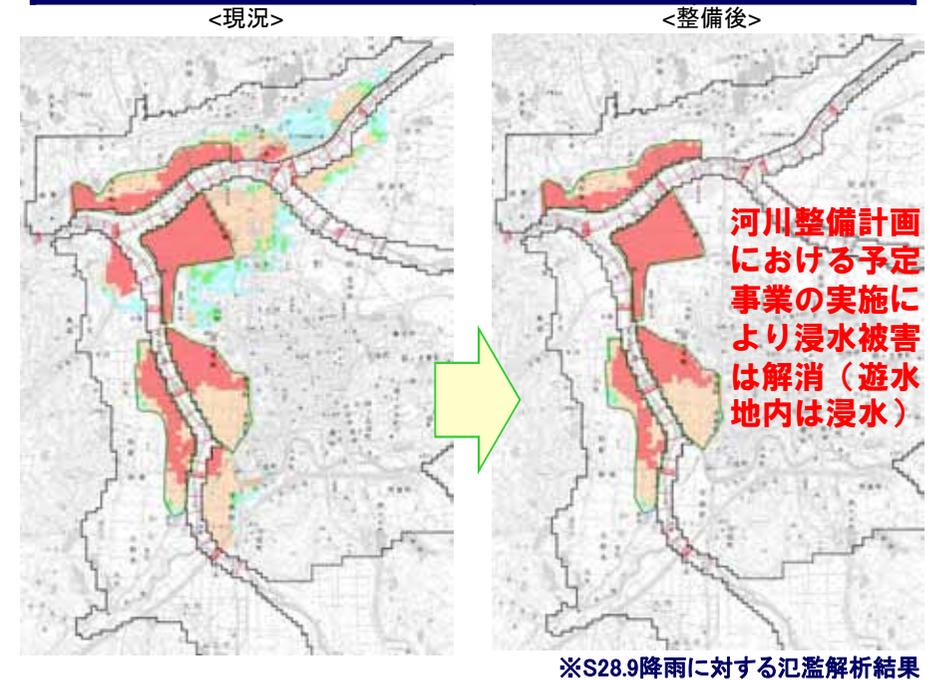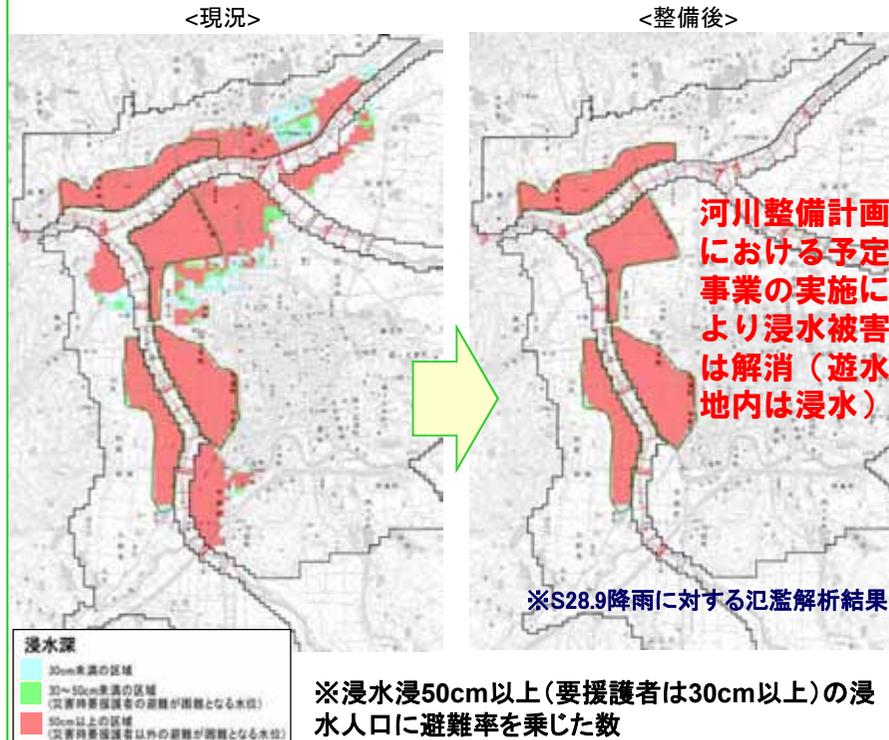

※浸水浸70cm以上(コンセントの設置高)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)木津川上流

■貨幣換算が困難な効果等による評価

- 水害の被害指標分析の手引きに準じて、河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/100)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、上野地区の最大孤立者数が128人(避難率40%)、電力の停止による影響人口が294人軽減される。

■最大孤立者数



(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/100規模の降雨)

		整備前	整備後
最大 孤立者数 [※]	避難率 0%	約 9,241 人	約 9,027 人
	避難率 40%	約 5,544 人	約 5,415 人
	避難率 80%	約 1,848 人	約 1,805 人

■電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/100規模の降雨)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	約 9,696 人	約 9,402 人

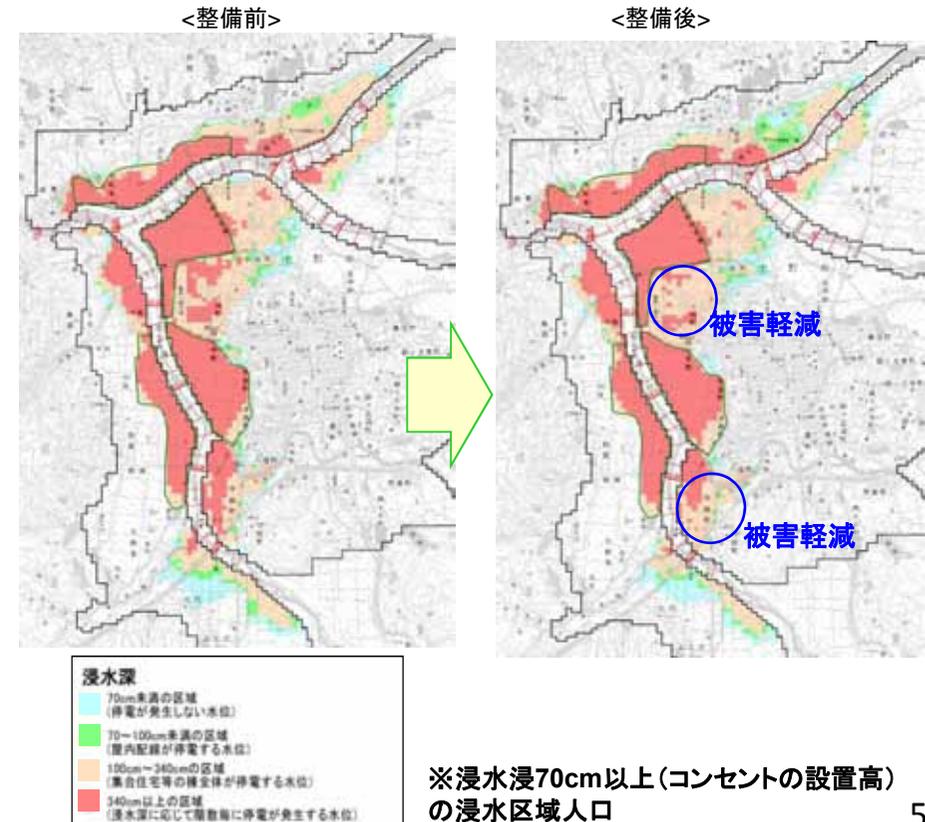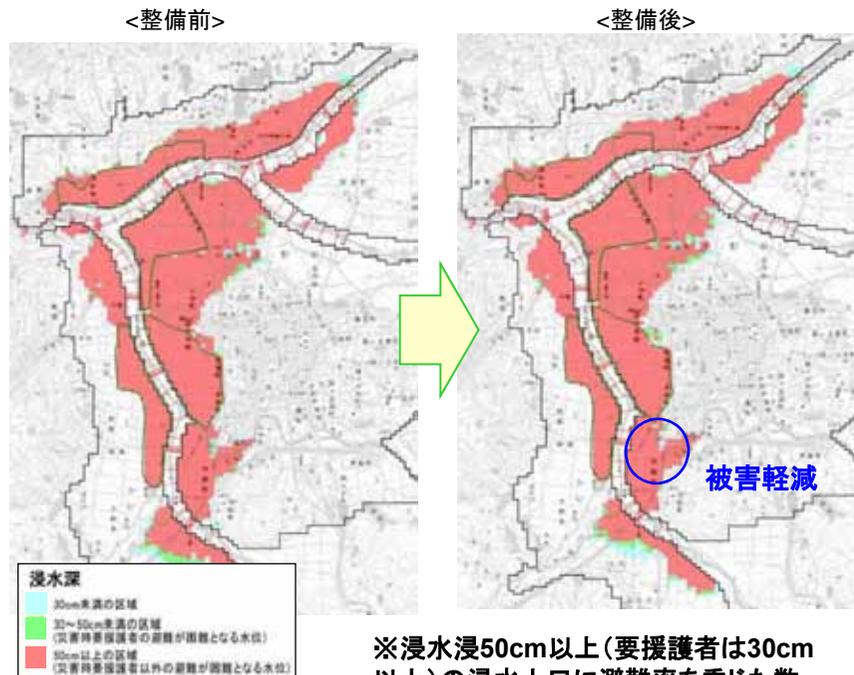

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)淀川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/200)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、淀川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。


■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	296,934人	0人
	避難率40%	178,163人	0人
	避難率80%	59,390人	0人

<現況>

<整備後>

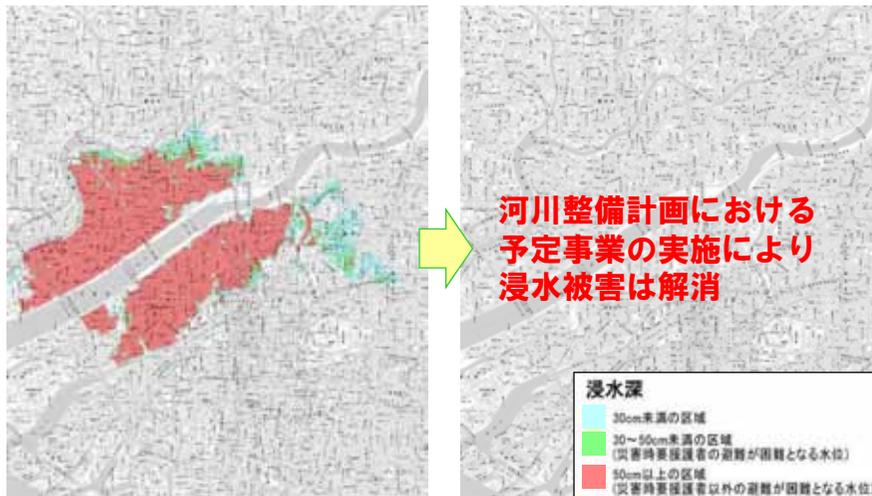

※浸水浸50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数


■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/150規模の降雨)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口※	233,926人	0人

<現況>

<整備後>

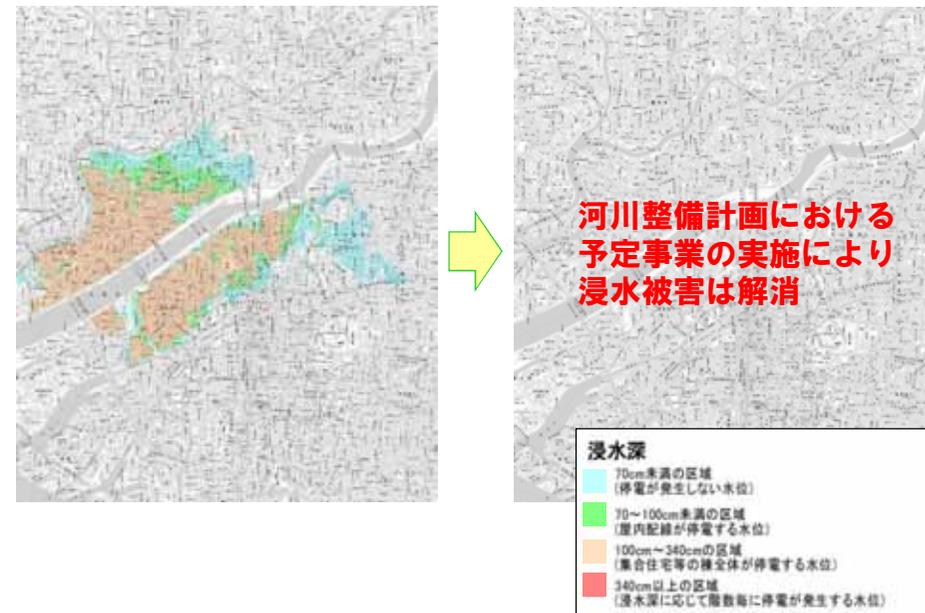

※浸水浸70cm以上(コンセントの設置高)の浸水区域人口

※淀川本川は計画規模の安全度を有しているため、戦後最大規模による浸水被害は発生しない。
 ※便益の計算においてはスライドダウン評価をおこなっている。

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)野洲川

■貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて、河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/100)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、野洲川直轄管理区間内で洪水はん濫による浸水被害は解消される。

■最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/100規模の降雨)

		整備前	整備後
最大 ※ 孤立者数	避難率 0%	約 5,582 人	0 人
	避難率 40%	約 3,349 人	0 人
	避難率 80%	約 1,116 人	0 人

■電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/100規模の降雨)


	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	約 1,600 人	0 人

<現況>

<整備後>



河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消




※浸水浸50cm以上(要援護者は30cm以上)の浸水人口に避難率を乗じた数

<現況>

<整備後>



河川整備計画における
予定事業の実施により
浸水被害は解消



※浸水浸70cm以上(コンセントの設置高)の浸水区域人口

※野洲川は計画規模の安全度を有しているため、戦後最大規模による浸水被害は発生しない。

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)猪名川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 戦後最大洪水が発生した場合、事業実施により洪水はん濫による浸水被害は解消される。

■ 最大孤立者数

(最大孤立者数に係る浸水区分、戦後最大洪水)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	18,062人	0人
	避難率40%	10,837人	0人
	避難率80%	3,612人	0人

<現況>

<整備後>





■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、戦後最大洪水)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	8,280人	0人

<現況>

<整備後>

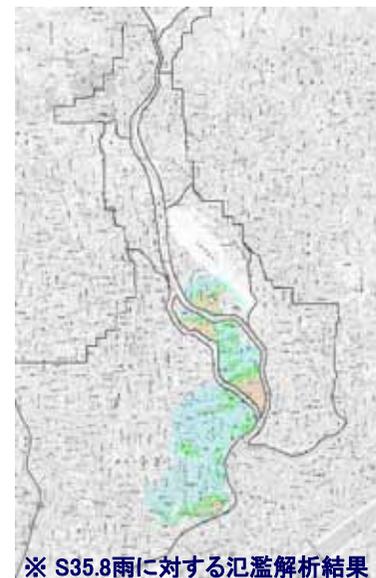

※浸水浸70cm以上(コンセントの設置
 高)の浸水区域人口

3. 事業の必要性等に関する視点(事業の投資効果)猪名川

■ 貨幣換算が困難な効果等による評価

- 「水害の被害指標分析の手引き」に準じて河川整備による「人的被害」と「ライフラインの停止による波及被害」の軽減効果を算定。
- 計画規模(1/200)の降雨による洪水が発生した場合、事業実施により、猪名川直轄管理区間内で最大孤立者数が7,696人(避難率40%)、電力の停止による影響人口が13,407人軽減される。

■ 最大孤立者数



(最大孤立者数に係る浸水区分、計画規模1/200規模の降雨)

		整備前	整備後
※ 最大孤立者数	避難率0%	49,838人	37,010人
	避難率40%	29,904人	22,208人
	避難率80%	9,970人	7,404人

■ 電力の停止による影響人口

(電力の停止に係る浸水区分、計画規模1/200規模の降雨)

	整備前	整備後
電力の停止による影響人口 [※]	37,073人	23,666人

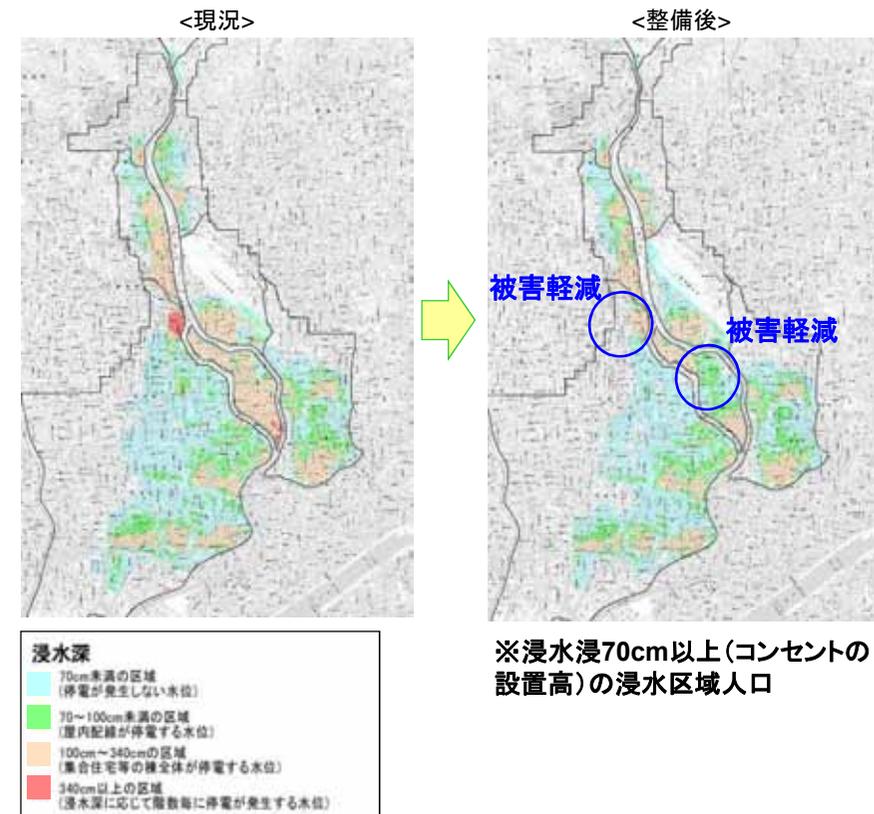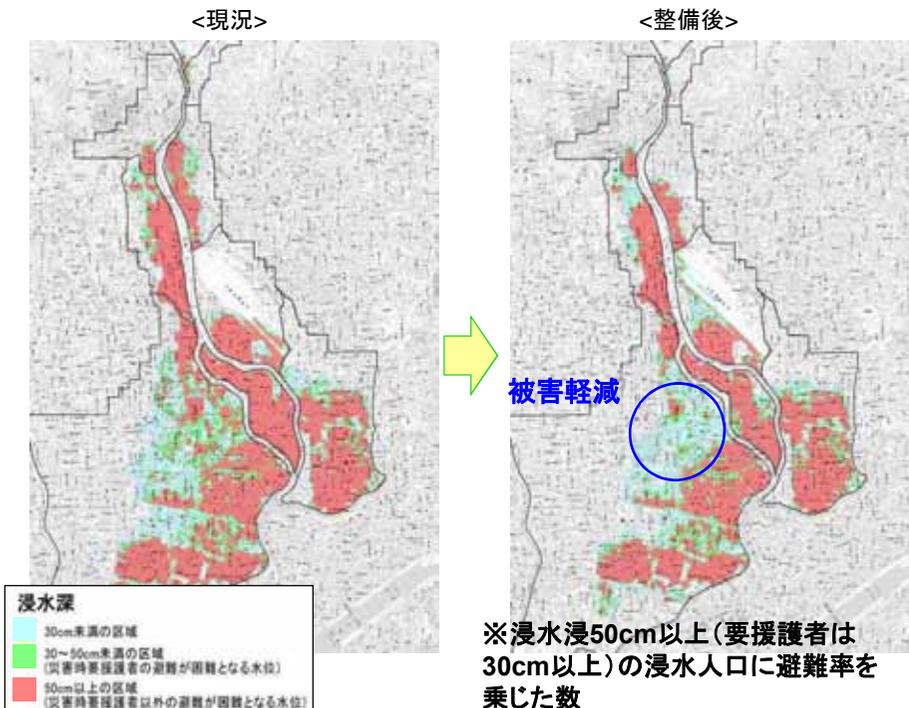


4. 事業の進捗の見込みの視点

- 淀川水系河川整備計画では、戦後最大洪水を目標とし、上下流バランスを確保しつつ、流域全体の治水安全度を向上させる河道改修を位置付け。
- 現在、新堤整備予定箇所の約7割が築堤済みであり、約9割において、流下能力を確保済。
- 整備計画により、管内の堤防強化(質的整備)を実施するとともに、概ね6割の堤防が完成堤防となる予定。
- 河川整備計画は平成21年3月に策定しており、引き続き事業の進捗をチェックし、沿川住民との合意形成を図りつつ、社会情勢の変化に留意のうえ、計画的に事業を進め早期効果発現を図る。

淀川水系5河川(猪名川・野洲川を除く)


整備計画で整備する新堤防の延長(km)

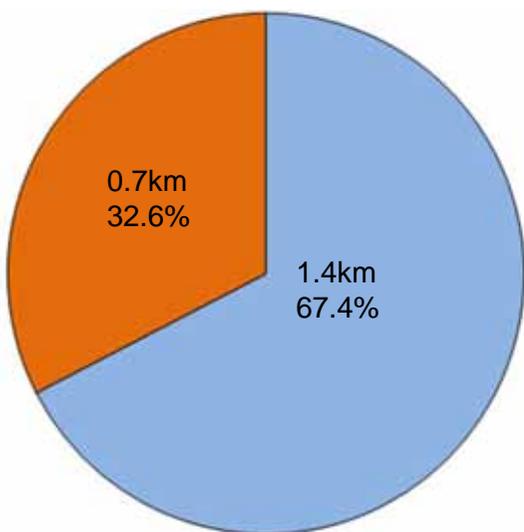

- 平成29年度までの築堤延長
- 概ね20年後に完成する築堤延長

* 整備計画で予定している新堤の築堤延長


堤防整備延長(km)

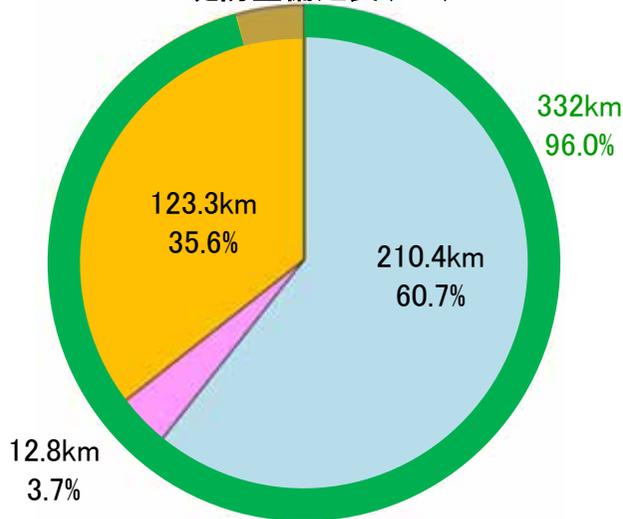

- 現況における完成堤防
- 概ね20年後に堤防は完成
- 現況における暫定堤防
- 堤防の質的整備の対策済区間

- * 所要の高さ、断面の両方を確保済みの区間延長
- * 暫定堤防は高さ、断面のいずれかが不足する堤防

流下能力確保延長(km)

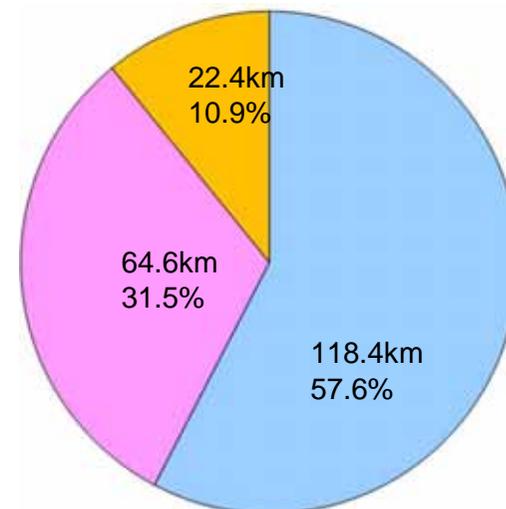

- 現況における計画高水流量確保
- 現況における戦後最大流量確保
- 概ね20年後に戦後最大流量確保

- * 流下能力確保済み区間延長(堤防整備状況を考慮)の左右岸の平均
- * HWL評価で算出
- * 桂川・宇治川・木津川は、戦後最大洪水に対応した流下能力図を基に算出。

5. コスト縮減や代替案等の可能性の視点(コスト縮減)

- 河川整備におけるコスト縮減については、これまでも、施設撤去工事における発生土の有効利用や伐採木の無料配付等、あらゆる場面でコスト縮減に努めてきました。
- 今後も河川整備の実施にあたっては、新技術の開発や施工方法の工夫、他事業者との計画調整等によりコスト縮減を図ることとしています。

■ 発生土を高規格堤防盛土に有効利用

庭窪旧及び守口市の市旧取水施設撤去工事で発生する残土を西島地区高規格堤防盛土に活用予定。
高規格堤防盛土約8,000m³を発生土を用いる事で約0.5億のコスト縮減予定。



■ 伐採木の無料配布

高水敷きの伐採木を無料配付し、処分費を削減。



■ ヤギによる堤防除草

淀川水系では更なる維持管理費の縮減にむけ、ヤギによる堤防除草を試験的に実施。

■ 堤防除草の有効活用によるコスト縮減

通常の除草費用(1m²あたり約35.0円)

除草	集草	積込・荷卸	運搬	処分
7.91	7.27	8.00	3.79	8.00

縮減率35%のコスト縮減

刈草ロール化の除草費用(1m²あたり約22.8円)


除草	集草	ロール化	ラッピング	積込荷卸	運搬
7.91	7.27	2.88	1.02	2.51	1.25

※数値は1m²当たり単価(工事費)

【刈草ロール化の取り組み】
堤防除草で刈った草をロール化することで、処分費の節約となり、**約35%のコスト縮減**が可能となった。

【草刈ロールの主な利用方法】
・家畜の飼料の利用
・畜産用の敷わらに利用
・堆肥化し農園資材として利用

【草刈ロール化工程(イメージ写真)】

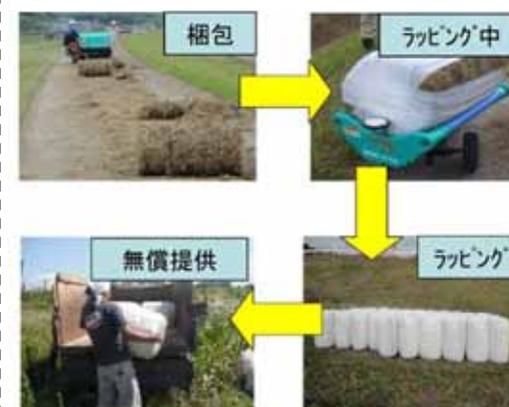

6. 関係自治体の意見等

三重県知事（平成29年11月16日付け 県土第26-25号）

対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

本事業は、木津川流域及び名張川流域の治水安全度を向上し、洪水被害を軽減するために重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、河川整備計画に基づき、効率的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。

滋賀県知事（平成29年11月21日付け 滋広政第200号）

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。

琵琶湖周辺の浸水被害の軽減が図られるよう琵琶湖の後期放流対策としての事業効果の早期発現に向けて、さらなる整備促進をお願いしたい。なお、事業推進にあたって必要な予算の確保とともに、より一層のコスト縮減に取り組んでいただきたい。

大阪府知事（平成29年11月24日付け 河整第1714号）

「対応方針（原案）」案については異存ありません。但し、以下の事項を要請します。

大阪府域の治水安全度を低下させないよう整備手順に配慮すること。

また、「淀川の減災に係る取組方針」に基づき、堤防強化等の治水対策について、早期に完成させること。併せて水害対応タイムラインの作成や、避難訓練及び氾濫時の長期湛水への対応計画の策定など、ソフト対策について国が率先して連携を図り、計画的な取組を早期に進めること。

阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完成すること。

伝法陸閘及び淀川陸閘等の耐震対策に早期に着手すること。

神崎川の治水安全度を踏まえ、猪名川直轄河川改修事業を実施すること。

事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行うとともに、更なるコスト縮減を図ること。

6. 関係自治体の意見等

京都府知事（平成29年12月22日付け 9河第347号）

事業継続の対応方針原案(案)に異論はない。

なお、事業費増額は府民の負担増につながることから大変遺憾であり、今後の事業実施に当たっては、最新技術を積極的に取り入れ、更なる費用の縮減に努められるとともに、引き続き関係自治体と連携を図りながら事業を推進し早期完成を図られたい。

特に、桂川は淀川三川のうち最も治水安全度が低いことから、上下流バランスはもちろん、三川間のバランスも考慮しつつ、優先的に整備すべきであり、京都府管理区間を含めた桂川流域全体の治水安全度が早期かつ着実に向上するよう進められたい。

兵庫県知事（平成29年11月21日付け 土第1527号）

一級河川猪名川の流域は、京都府、大阪府、兵庫県に跨り、特に兵庫県内は尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町など人口・資産の集積が著しい地域である。

ひとたび洪水災害に見舞われると甚大な被害が想定されていることに加え、近年、各地で発生しているゲリラ豪雨などへの対応も喫緊の課題となっている。

このため、猪名川の治水安全度の早期向上は地域の強い願いであり、沿線住民の安全・安心を確保するため、淀川水系河川整備計画等に基づき、目標である戦後最大規模の洪水に対する浸水被害の解消に向けた河道掘削や堤防強化対策など、一層の事業促進を図られたい。

7. 対応方針(原案)

対応方針(原案)

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗の見込みに関する視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断でき、かつ、コスト縮減や代替案等の可能性の視点による再評価により事業の見直しを図る必要がないと判断できることから「事業継続が妥当」である。



No.4-2
近畿地方整備局
事業評価監視委員会
平成29年度第6回

淀川水系直轄河川改修事業

【再評価】

平成30年1月
近畿地方整備局

目次

淀川水系直轄河川改修事業	・・・p1
木津川上流直轄河川改修事業(上野遊水地)	・・・p269
淀川特定構造物改築事業(阪神なんば線淀川橋梁)	・・・p315
野洲川直轄河川改修事業	・・・p355
猪名川直轄河川改修事業	・・・p401

淀川水系直轄河川改修事業

淀川直轄河川改修事業

桂川直轄河川改修事業


瀬田川直轄河川改修事業

木津川下流直轄河川改修事業

木津川上流直轄河川改修事業


様式 - 1

様式－1 氾濫ブロック分割図（淀川、宇治川、桂川、木津川下流）

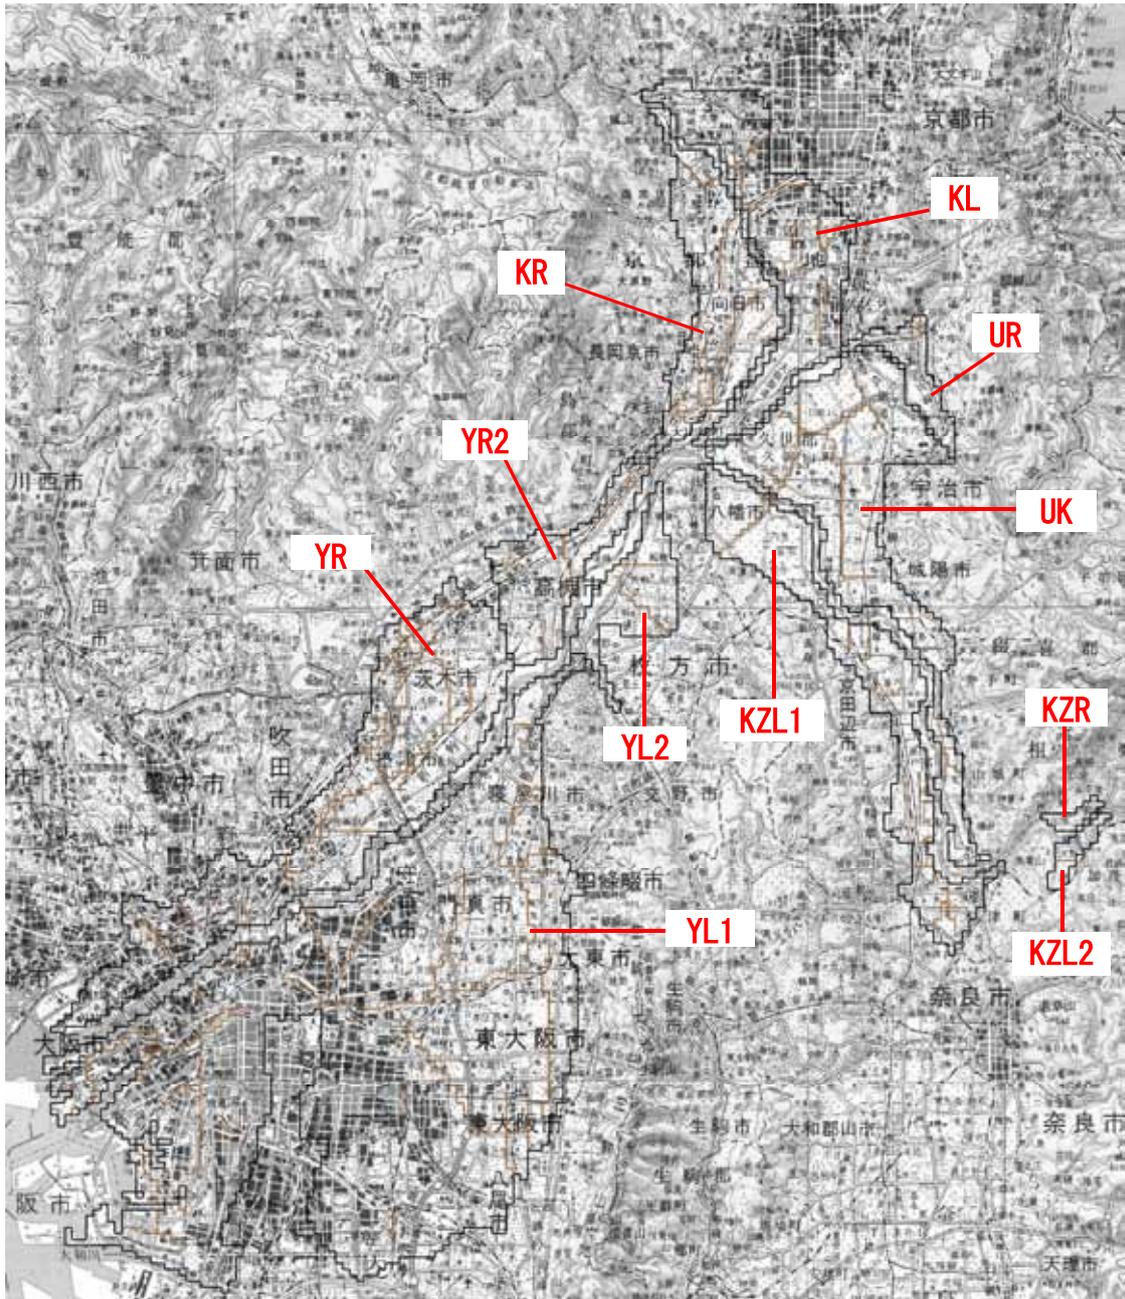


様式－1 氾濫ブロック分割図（木津川上流）


【木津川上流、拓殖川、服部川】

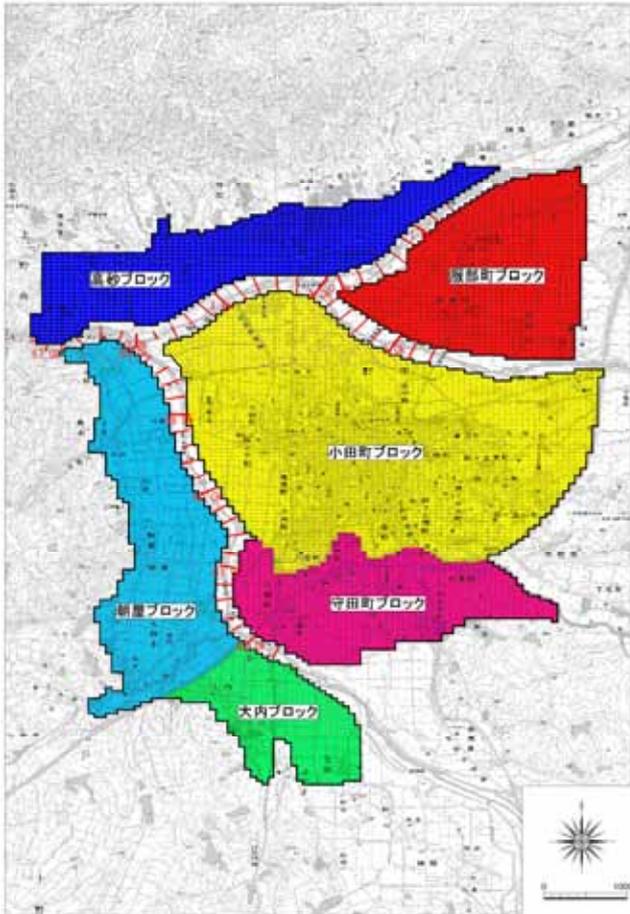

【木津川上流】

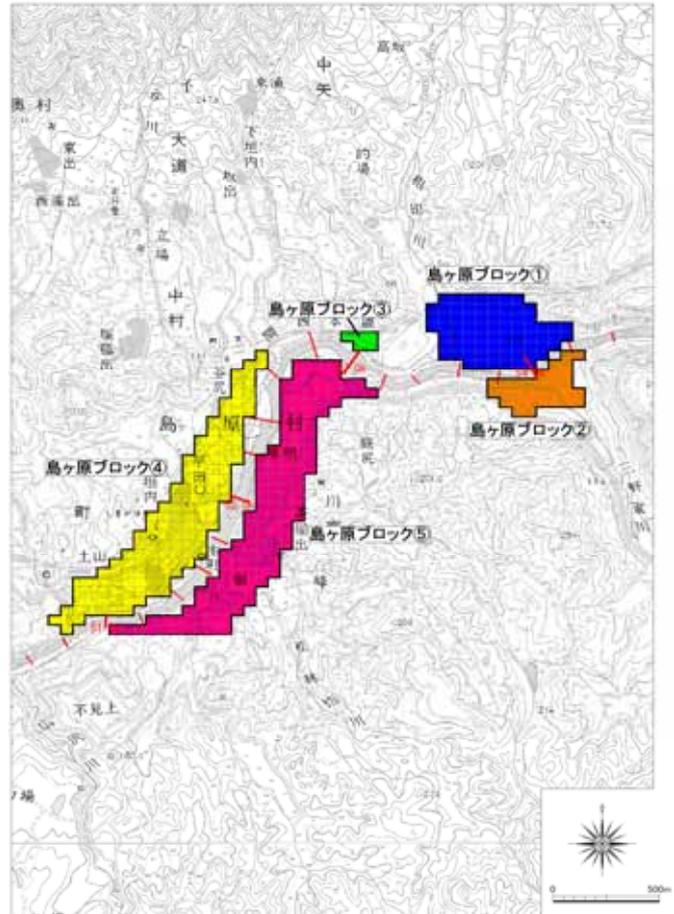


【木津川上流】

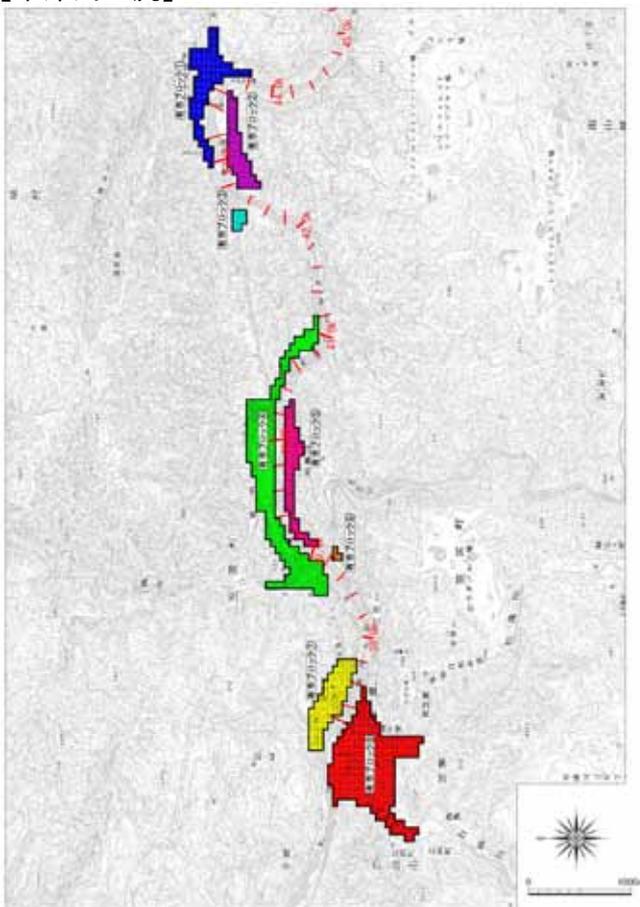


様式－１ 氾濫ブロック分割図（名張川）


【名張川、宇陀川、青蓮寺川】

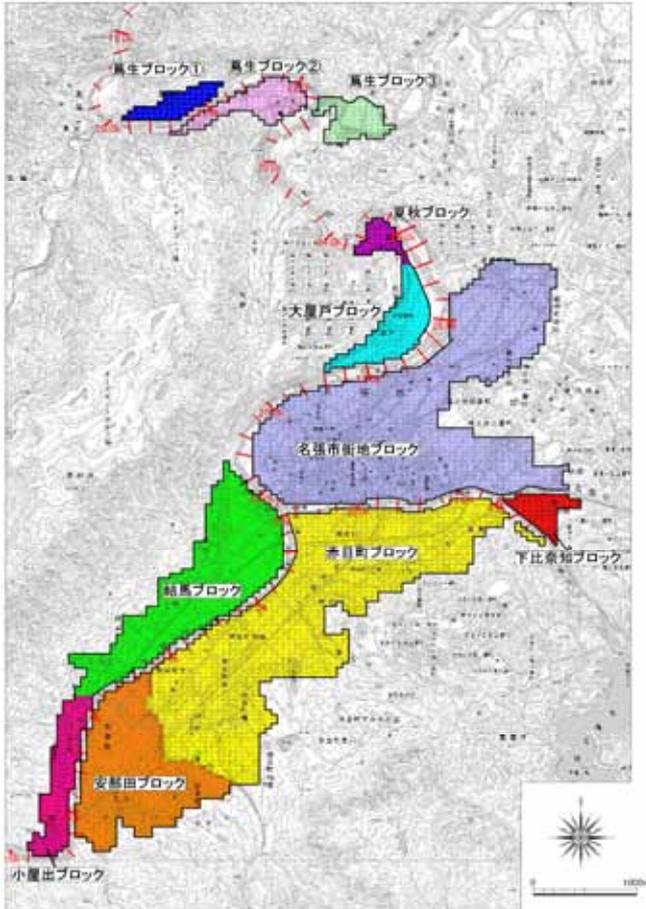


【宇陀川】

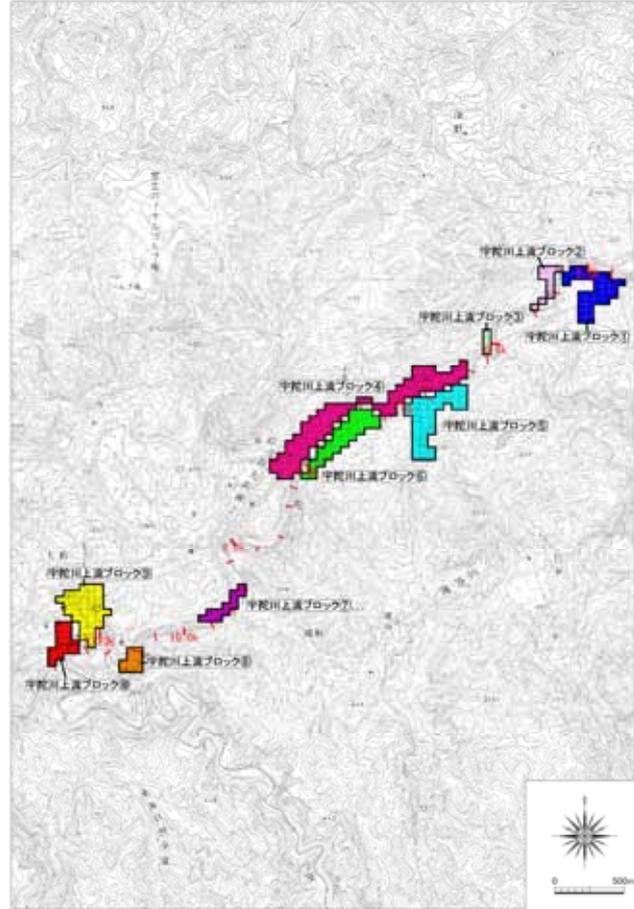

【名張川】

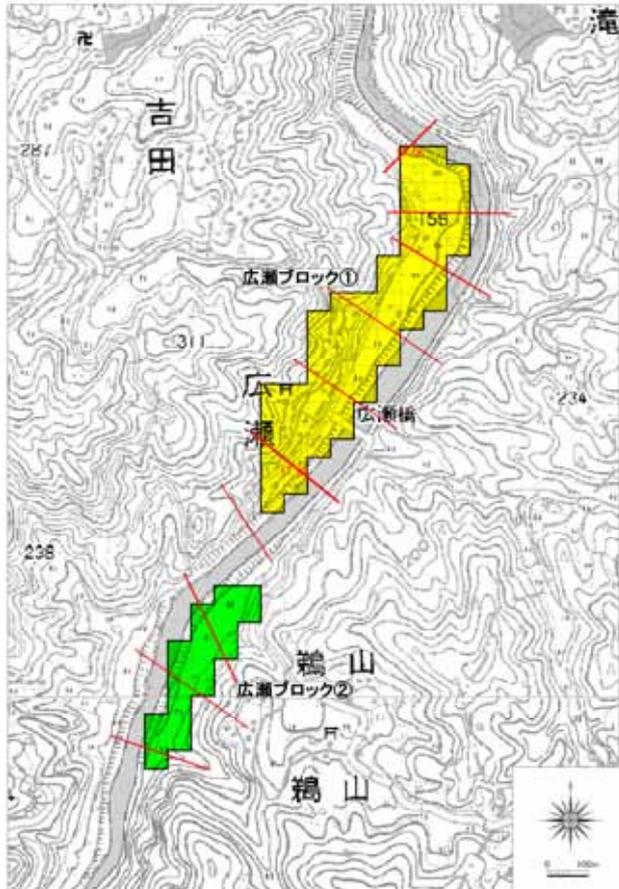

様式1 氾濫ブロック分割図（瀬田川）

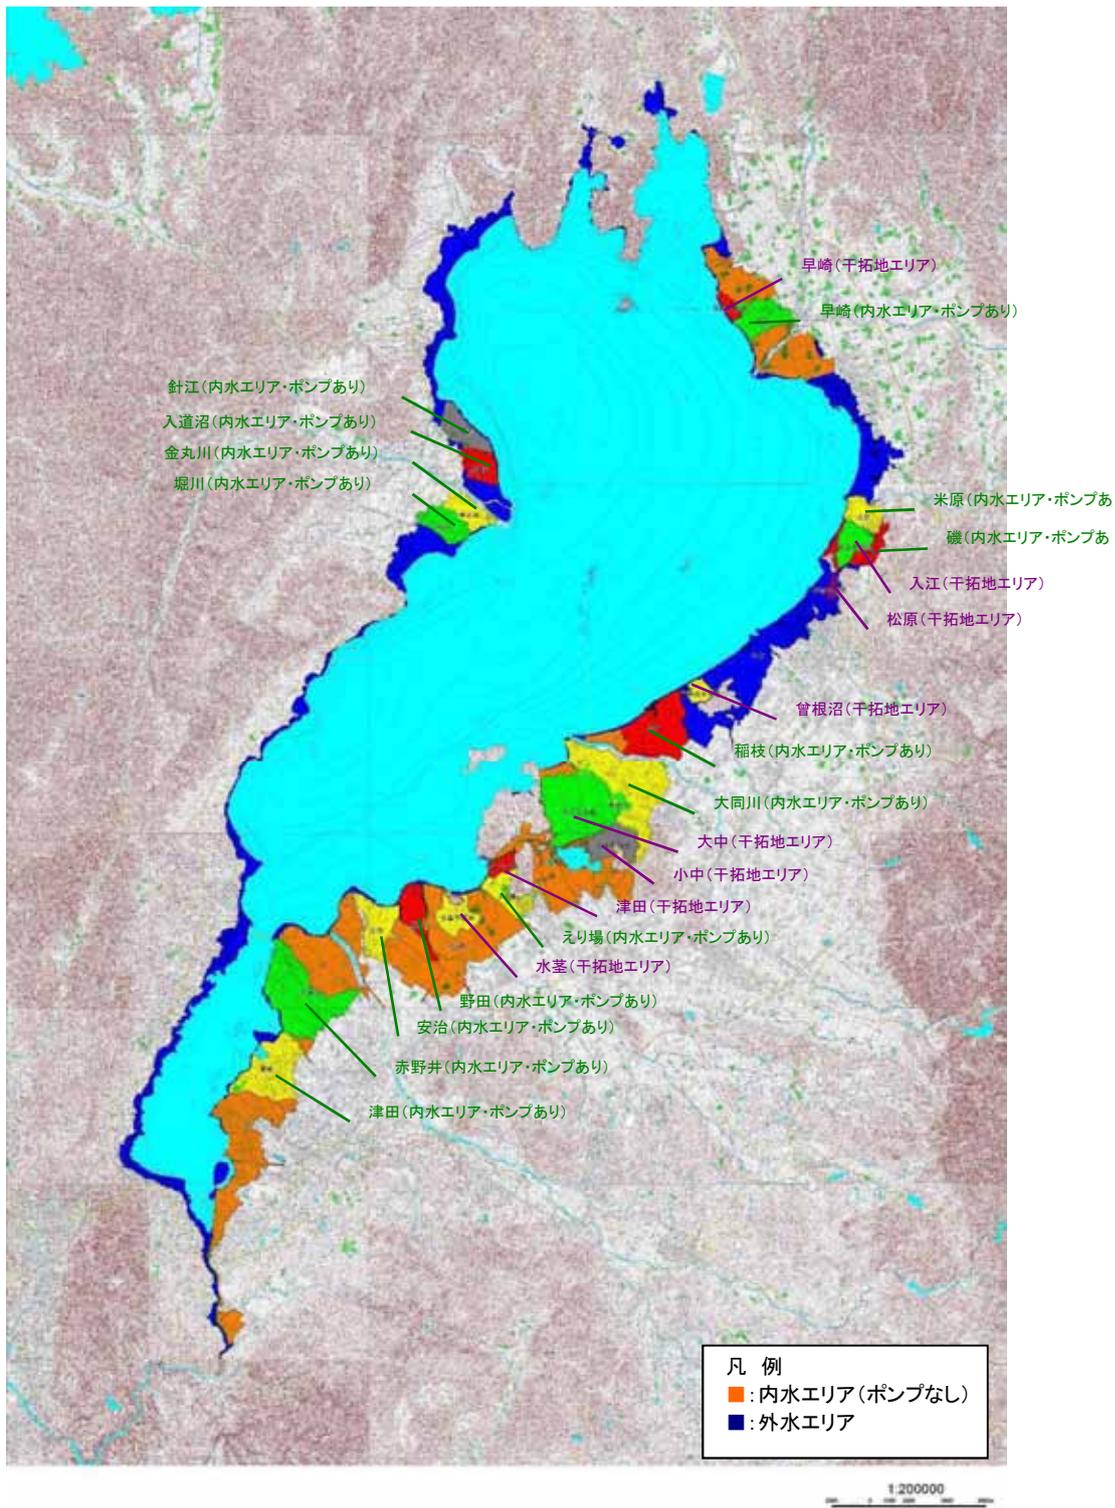

様式－2

様式-2

資産データ

水系名：淀川水系

河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川

国勢調査年：平成22年

事業所統計調査年：平成26年

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額（百万円）						農作物被害額（百万円）			一般資産額等 合計	備考	
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類別に算出) (世帯)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
YL1-1	6,933	772,439	409,766	1,176,217	134	5,341	0	0	10,895,170	5,328,593	4,938,423	1,768,248	211	68	22,930,713	0	0	0	22,930,713	
YL1-2	17,035	2,088,921	919,557	955,167	1,442	11,582	222	12	23,627,977	11,957,916	3,446,013	1,781,666	2,275	730	40,816,577	180	69	249	40,816,826	
YL2	1,261	106,729	44,364	30,389	180	535	104	12	1,090,490	576,906	97,076	36,316	284	91	1,801,163	84	66	150	1,801,313	
YR1-1	2,869	379,693	195,524	237,917	135	2,554	0	0	5,209,654	2,542,599	825,715	416,656	213	68	8,994,905	0	0	0	8,994,905	
YR1-2	4,432	381,726	163,755	157,700	479	2,059	273	0	4,200,211	2,129,476	580,950	270,138	755	243	7,181,773	221	0	221	7,181,994	
YR2	1,888	143,891	60,781	63,954	224	689	185	10	1,406,134	790,391	267,080	87,875	353	113	2,551,946	150	54	204	2,552,150	
UKZ	5,273	197,480	77,629	91,648	1,101	1,047	1,688	337	2,110,523	1,009,490	318,287	178,241	1,738	558	3,618,837	1,429	1,415	2,844	3,621,681	
KL	3,817	297,839	136,569	191,684	706	1,569	99	12	3,161,475	1,775,938	759,797	370,322	1,113	358	6,069,003	84	49	133	6,069,136	
UR	673	46,336	18,705	14,992	95	194	7	15	391,262	243,245	48,547	22,868	149	48	706,119	6	61	67	706,186	
KR	3,066	223,432	89,811	83,628	612	1,079	300	7	2,174,362	1,167,907	289,528	157,104	965	310	3,790,176	254	31	285	3,790,461	
KZL1	3,738	88,416	35,735	40,001	766	489	1,576	144	984,649	464,698	142,281	62,485	1,208	388	1,655,709	1,334	607	1,941	1,657,650	
KZL2	251	4,207	1,497	1,255	47	14	109	2	27,463	19,468	3,649	1,523	74	24	52,201	93	9	102	52,303	
KZR	145	451	151	86	19	2	58	13	4,706	1,959	251	213	31	10	7,170	49	53	102	7,272	
合計	51,380	4,731,560	2,153,844	3,044,638	5,940	27,154	4,621	563	55,284,076	28,008,586	11,717,597	5,153,655	9,369	3,009	100,176,292	3,884	2,414	6,298	100,182,590	

様式-2 資産データ 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川・柘植川・服部川 国勢調査年: 平成22年 事業所統計調査年: 平成26年

ブロック名	ブロック面積 (km ²)	一般資産等基礎数量										一般資産額						農作物資産			一般資産額等合計 (百万円)	備考			
		人口 (人)	一般世帯数 (世帯)	1~2階世帯 (世帯)	3~5階世帯 (世帯)	6~10階世帯 (世帯)	11~14階世帯 (世帯)	15階以上世帯 (世帯)	事業所従業員 (人)	農漁家 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)			小計 (百万円)		
														償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)								
高砂ブロック	2.804	2,964	1,145	1,081	26	38	0	0	1,523	27	306,253	1.1034	0.0554	57,326	14,891	5,905	4,857	42	13	83,032	91	16	107	83,139	
朝屋ブロック	3.275	1,784	530	525	5	0	0	0	712	46	141,641	2.2455	0.0422	26,522	6,895	2,002	1,427	73	23	36,942	185	12	198	37,140	
大内ブロック	1.743	569	212	174	33	5	0	0	259	22	64,105	1.1807	0.0974	11,989	2,758	1,226	821	34	11	16,839	97	28	125	16,965	
小田町ブロック	8.168	25,184	10,639	9,157	1,298	183	0	0	17,766	137	3,209,799	1.0534	0.1030	600,128	138,365	53,170	27,589	217	69	819,538	87	30	116	819,654	
守田町ブロック	3.014	3,110	1,274	1,017	219	37	0	0	2,346	30	234,561	0.9626	0.0211	43,918	16,570	13,937	2,087	48	15	76,575	79	6	86	76,661	
服部町ブロック	3.639	1,384	499	444	55	0	0	0	987	24	147,895	2.6626	0.1158	27,678	6,486	2,545	1,175	38	12	37,934	220	33	253	38,187	
小田遊水池	0.624	42	18	15	2	0	0	0	45	0	66,049	0.4065	0.0528	12,361	230	167	142	0	0	12,901	34	15	49	12,950	
木興遊水池	0.706	69	33	16	17	0	0	0	6	1	38,693	0.5702	0.0290	7,263	432	18	12	1	0	7,727	47	8	55	7,782	
長田遊水池	0.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919	0.4962	0.0581	1,484	0	0	0	0	0	1,484	41	17	58	1,542	
新居遊水池	0.602	4	2	2	0	0	0	0	4	0	44,980	0.5796	0.0079	8,430	23	15	13	0	0	8,482	48	2	50	8,532	
合計	22.643	34,995	14,299	12,398	1,636	263	0	0	23,593	286	4,104,254	9.2081	0.4349	767,561	185,965	78,785	37,956	452	143	1,070,860	759	125	885	1,071,746	

様式-2 資産データ 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川・宇陀川・青蓮寺川 国勢調査年: 平成22年 事業所統計調査年: 平成26年

ブロック名	ブロック面積 (km ²)	一般資産等基礎数量										一般資産額						農作物資産			一般資産額等合計 (百万円)	備考			
		人口 (人)	一般世帯数 (世帯)	1~2階世帯 (世帯)	3~5階世帯 (世帯)	6~10階世帯 (世帯)	11~14階世帯 (世帯)	15階以上世帯 (世帯)	事業所従業員 (人)	農漁家 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)			小計 (百万円)		
														償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)								
広瀬ブロック①	0.172	124	29	29	0	0	0	0	29	3	16,283	0.0211	0.0370	2,927	375	39	30	5	2	3,377	2	17	19	3,396	
広瀬ブロック②	0.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394	0.0264	0.0000	251	0	0	0	0	0	251	2	0	2	253	
篤生ブロック①	0.169	108	27	27	0	0	0	0	30	3	5,372	0.1452	0.0079	1,008	351	48	18	5	2	1,431	12	2	14	1,446	
篤生ブロック②	0.286	172	60	60	0	0	0	0	32	9	6,880	0.0713	0.0053	1,286	780	111	105	14	5	2,301	6	2	7	2,308	
篤生ブロック③	0.230	2	0	0	0	0	0	0	74	0	744	0.1822	0.0079	139	6	321	296	0	0	762	15	2	17	779	
夏秋ブロック	0.114	190	61	61	0	0	0	0	11	0	3,653	0.0106	0.0396	684	797	27	10	1	0	1,519	1	11	12	1,531	
大屋戸ブロック	0.381	922	367	323	32	12	0	0	173	5	21,608	0.0898	0.0422	4,044	4,779	531	243	8	2	9,607	7	12	20	9,627	
名張市街地ブロック	3.606	8,830	3,853	3,221	475	156	0	0	5,678	62	695,465	0.8765	0.0211	130,068	50,110	18,213	6,897	98	31	205,418	72	6	78	205,497	
結馬ブロック	1.506	1,127	390	380	8	3	0	0	517	24	49,736	0.6890	0.2719	9,334	5,073	1,596	817	37	12	16,869	57	78	135	17,005	
小屋出ブロック	0.413	452	148	147	1	0	0	0	148	8	22,364	0.0739	0.0475	4,189	1,929	333	199	12	4	6,666	6	14	20	6,685	
赤目町ブロック	3.556	5,169	1,925	1,698	89	138	0	0	2,718	53	307,273	1.3622	0.1426	57,487	25,034	7,956	3,843	84	27	94,431	112	41	154	94,584	
安部田ブロック	1.345	853	324	310	14	0	0	0	117	12	62,801	0.9033	0.0265	11,767	4,207	396	222	19	6	16,618	75	8	82	16,700	
下比奈知ブロック	0.167	104	48	38	9	0	0	0	139	0	10,410	0.0422	0.0475	1,947	619	537	122	0	0	3,225	3	14	17	3,242	
宇陀川上流ブロック①	0.082	18	5	5	0	0	0	0	11	0	184	0.0158	0.0000	35	70	31	22	1	0	158	1	0	1	160	
宇陀川上流ブロック②	0.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0.0000	0.0000	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	70	
宇陀川上流ブロック③	0.011	20	6	6	0	0	0	0	1	0	0	0.0053	0.0000	0	84	4	3	1	0	92	0	0	0	92	
宇陀川上流ブロック④	0.233	316	101	101	0	0	0	0	56	6	27,621	0.0529	0.0027	4,965	1,314	119	96	9	3	6,507	4	1	6	6,512	
宇陀川上流ブロック⑤	0.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0689	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	
宇陀川上流ブロック⑥	0.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0398	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
宇陀川上流ブロック⑦	0.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0159	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	
宇陀川上流ブロック⑨	0.101	172	59	59	0	0	0	0	79	2	26,375	0.0000	0.0000	4,740	764	181	87	3	1	5,776	0	0	0	5,776	
宇陀川上流ブロック⑩	0.050	17	6	6	0	0	0	0	8	0	3,768	0.0159	0.0000	677	76	18	9	0	0	781	1	0	1	782	
合計	12.778	18,596	7,409	6,471	628	309	0	0	9,821	187	1,262,301	4.6923	0.7156	235,618	96,368	30,461	13,019	297	95	375,859	385	215	601	376,461	

ブロック名	ブロック面積 (km ²)	一般資産等基礎数量											一般資産額						農作物資産			一般資産額等合計 (百万円)	備考		
		人口 (人)	一般世帯数 (世帯)	1~2階世帯 (世帯)	3~5階世帯 (世帯)	6~10階世帯 (世帯)	11~14階世帯 (世帯)	15階以上世帯 (世帯)	事業所従業員 (人)	農漁家 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	事業所資産 (百万円)		農漁家資産 (百万円)		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)				
														家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							償却 (百万円)	在庫 (百万円)
島ヶ原ブロック①	0.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1294	0.0370	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	21	21	
島ヶ原ブロック②	0.087	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099	0.0528	0.0000	392	0	0	0	0	0	392	4	0	4	397		
島ヶ原ブロック③	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島ヶ原ブロック④	0.365	636	193	193	0	0	0	146	8	37,387	0.0898	0.0000	7,001	2,508	340	192	13	4	10,059	7	0	7	10,066		
島ヶ原ブロック⑤	0.388	382	117	117	0	0	0	83	5	26,059	0.0713	0.0106	4,874	1,517	195	109	8	2	6,705	6	3	9	6,714		
有市ブロック①	0.201	262	119	119	0	0	0	147	2	15,835	0.0000	0.0000	3,195	1,542	958	161	4	1	5,861	0	0	0	5,861		
有市ブロック②	0.111	121	46	46	0	0	0	32	4	12,518	0.0000	0.0000	2,523	593	197	53	6	2	3,373	0	0	0	3,373		
有市ブロック③	0.021	18	6	6	0	0	0	1	1	0	0.0000	0.0000	0	78	6	6	1	0	91	0	0	0	91		
有市ブロック④	0.486	424	165	165	0	0	0	95	4	44,177	0.1346	0.0000	8,906	2,150	328	199	7	2	11,591	11	0	11	11,602		
有市ブロック⑤	0.132	4	2	2	0	0	0	0	0	1,767	0.0739	0.0000	356	22	0	0	0	0	378	6	0	6	385		
有市ブロック⑥	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有市ブロック⑦	0.169	163	62	62	0	0	0	51	1	5,296	0.0000	0.0000	1,069	810	288	55	2	1	2,224	0	0	0	2,224		
有市ブロック⑧	0.526	668	261	261	0	0	0	180	3	24,023	0.0871	0.0211	4,848	3,393	522	297	5	1	9,066	7	9	16	9,082		
合計	2.701	2,678	971	971	0	0	0	735	28	169,161	0.6389	0.0686	33,164	12,613	2,834	1,072	46	13	49,740	52	23	74	49,816		

様式-2

資産データ

水系名：淀川水系

河川名：瀬田川

国勢調査年：平成22年

事業所統計調査年：平成26年

エリア	氾濫ブロック	ブロック面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額							一般資産額等合計 (百万円)	備考			
			人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類別 別に算出) (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)			水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)
												償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)						
内水エリア (ポンプあり)	早崎	409	1,407	397	221	40	46,311	304	15	8,679	5,156	435	285	64	20	14,639	260	23	283	14,922	
	米原	266	3,060	1,161	1,244	52	135,599	162	13	25,411	15,097	4,248	2,257	82	26	47,121	138	20	158	47,279	
	磯	245	2,795	976	2,371	53	114,037	96	5	21,371	12,696	8,067	3,393	83	27	45,637	82	8	90	45,727	
	稲枝	831	3,104	897	440	80	104,730	676	11	19,626	11,660	1,045	757	126	41	33,255	579	16	595	33,850	
	大同川	1,293	9,992	3,220	1,860	152	376,136	925	12	70,488	41,877	4,321	2,887	240	77	119,890	791	19	810	120,700	
	えり場	344	8,497	2,951	2,695	68	344,644	170	17	64,586	38,371	6,368	4,046	107	34	113,512	145	26	171	113,683	
	野田	330	374	101	46	11	11,782	240	25	2,208	1,312	177	174	18	6	3,895	205	38	243	4,138	
	安治	441	1,390	376	303	58	43,926	325	24	8,232	4,891	1,035	562	92	30	14,842	278	36	314	15,156	
	赤野井	1,155	13,493	4,164	3,745	215	486,400	661	25	91,151	54,154	7,937	4,482	340	109	158,173	565	38	603	158,776	
	津田	745	6,009	1,808	2,652	80	211,221	492	5	39,583	23,517	9,248	5,654	126	41	78,169	421	8	429	78,598	
	堀川	338	2,507	770	506	75	89,936	227	10	16,854	10,013	1,251	930	119	38	29,205	194	15	209	29,414	
	入道沼	286	1,239	402	552	17	46,950	213	0	8,798	5,227	1,847	1,588	27	9	17,496	182	0	182	17,678	
	針江	328	1,647	585	707	36	68,383	192	4	12,815	7,613	2,756	2,612	56	18	25,870	164	6	170	26,040	
金丸川	274	1,435	490	339	26	57,199	207	3	10,719	6,368	1,185	860	41	13	19,186	177	5	182	19,368		
内水エリア (ポンプなし)	7,673	93,032	31,282	31,549	1,307	3,653,782	4,742	394	684,719	406,796	93,682	50,623	2,063	662	1,238,545	4,054	597	4,651	1,243,196		
外水エリア	6,998	189,479	75,678	100,017	1,039	8,839,222	2,703	150	1,656,470	984,120	413,521	123,162	1,641	527	3,179,441	2,311	227	2,538	3,181,979		
小計	21,956	339,460	125,258	149,247	3,309	14,630,258	12,335	713	2,741,710	1,628,868	557,123	204,272	5,225	1,678	5,138,876	10,546	1,082	11,628	5,150,504		
干拓地エリア	大中	1,131	883	215	220	127	25,086	959	101	4,701	2,793	544	271	201	64	8,574	821	154	975	9,549	
	入江	282	1,050	378	349	16	44,201	231	1	8,283	4,921	841	349	25	8	14,427	198	2	200	14,627	
	津田	115	0	0	311	0	0	3	81	0	0	1,424	1,363	0	0	2,787	2	123	125	2,912	
	水荃	305	150	47	105	3	5,547	273	1	1,040	618	775	410	5	2	2,850	233	2	235	3,085	
	小中	349	470	142	134	27	16,562	305	0	3,104	1,844	367	305	42	14	5,676	261	0	261	5,937	
	曾根沼	124	24	6	5	1	741	80	26	139	82	14	9	1	0	245	68	39	107	352	
	早崎	85	46	6	40	0	759	57	0	142	84	69	29	0	0	324	49	0	49	373	
松原	73	909	324	178	4	37,868	36	3	7,097	4,216	2,926	279	6	2	14,526	31	5	36	14,562		
小計	2,464	3,532	1,118	1,342	178	130,764	1,944	213	24,506	14,558	6,960	3,015	280	90	49,409	1,663	325	1,988	51,397		
合計	24,420	342,992	126,376	150,589	3,487	14,761,022	14,279	926	2,766,216	1,643,426	564,083	207,287	5,505	1,768	5,188,285	12,209	1,407	13,616	5,201,901		

様式－3

様式-3 被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川

流量規模：1/50

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川

流量規模：1/60

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	12,830.3	4,819.4	2,404.1	801.3	5.2	2.3	20,862.6	44.7	1.6	46.3	35,341.1	936.0	315.3	506.0	821.3	346.6	0.0	2,103.8	58,353.9	
合計	12,848.2	4,826.0	2,409.9	802.8	5.2	2.3	20,894.3	44.7	1.6	46.3	35,394.8	939.9	316.6	508.3	824.8	347.8	0.0	2,112.5	58,447.9	

水系名：淀川 河川名：宇治川

流量規模：1/70

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,251.7	4,996.6	2,487.5	829.7	5.3	2.4	21,573.1	45.7	1.6	47.3	36,544.7	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	60,331.7	
合計	13,269.5	5,003.2	2,493.3	831.2	5.3	2.4	21,604.8	45.7	1.6	47.3	36,598.3	963.1	327.8	520.2	848.0	364.2	0.0	2,175.3	60,425.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川

流量規模：1/80

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,490.3	5,108.2	2,536.0	846.2	5.4	2.4	21,988.5	46.1	1.6	47.8	37,248.3	973.5	333.6	525.6	859.2	372.8	0.0	2,205.5	61,490.1	
合計	13,508.1	5,114.7	2,541.8	847.7	5.4	2.4	22,020.1	46.1	1.6	47.8	37,302.0	977.5	334.9	527.8	862.7	374.0	0.0	2,214.2	61,584.1	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/100

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,297.0	5,369.7	2,667.5	883.1	5.6	2.5	23,225.4	48.2	1.6	49.9	39,343.7	1,021.4	353.1	557.6	910.8	394.6	0.0	2,326.8	64,945.8	
合計	14,314.9	5,376.2	2,673.3	884.6	5.6	2.5	23,257.1	48.2	1.6	49.9	39,397.3	1,025.3	354.4	559.9	914.3	395.8	0.0	2,335.5	65,039.8	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/130

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,879.6	5,591.2	2,747.7	909.9	5.8	2.6	24,136.8	49.9	1.6	51.5	40,887.7	1,044.7	363.7	570.7	934.4	407.4	0.0	2,386.6	67,462.6	
合計	14,897.4	5,597.7	2,753.5	911.4	5.8	2.6	24,168.5	49.9	1.6	51.5	40,941.3	1,048.7	365.0	573.0	938.0	408.6	0.0	2,395.3	67,556.6	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/150

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	36.3	13.3	11.4	3.0	0.0	0.0	64.0	0.0	0.0	0.0	108.5	7.5	2.6	4.6	7.1	2.3	0.0	17.0	189.4	
UKZ	15,014.8	5,635.6	2,760.6	915.7	5.8	2.6	24,335.0	50.4	1.6	52.0	41,223.3	1,047.7	365.8	572.2	938.1	409.8	0.0	2,395.5	68,005.8	
合計	15,051.1	5,648.9	2,772.0	918.6	5.8	2.6	24,399.0	50.4	1.6	52.0	41,331.7	1,055.2	368.4	576.8	945.2	412.1	0.0	2,412.5	68,195.2	

様式-3 被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,113.4	5,301.4	2,644.5	881.4	5.7	2.5	22,948.9	49.2	1.8	51.0	38,875.2	936.0	315.3	506.0	821.3	346.6	0.0	2,103.9	63,979.0	
合計	14,133.0	5,308.6	2,650.9	883.0	5.7	2.5	22,983.7	49.2	1.8	51.0	38,934.2	940.0	316.6	508.3	824.9	347.8	0.0	2,112.7	64,081.6	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,576.8	5,496.3	2,736.2	912.7	5.8	2.6	23,730.4	50.2	1.8	52.0	40,199.2	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	66,148.2	
合計	14,596.4	5,503.5	2,742.6	914.3	5.8	2.6	23,765.2	50.2	1.8	52.0	40,258.2	963.1	327.9	520.2	848.1	364.2	0.0	2,175.4	66,250.8	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,839.3	5,619.0	2,789.6	930.8	5.9	2.6	24,187.2	50.8	1.8	52.6	40,973.2	973.5	333.6	525.6	859.2	372.8	0.0	2,205.5	67,418.5	
合計	14,858.9	5,626.2	2,796.0	932.4	5.9	2.6	24,222.0	50.8	1.8	52.6	41,032.2	977.5	334.9	527.9	862.8	374.0	0.0	2,214.3	67,521.1	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 整備計画着手時河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	15,726.7	5,906.7	2,934.2	971.4	6.2	2.8	25,548.0	53.1	1.8	54.9	43,278.1	1,021.4	353.1	557.6	910.7	394.6	0.0	2,326.7	71,207.7	
合計	15,746.3	5,913.9	2,940.6	973.0	6.2	2.8	25,582.8	53.1	1.8	54.9	43,337.1	1,025.4	354.4	559.9	914.3	395.8	0.0	2,335.5	71,310.3	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 整備計画着手時河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	16,367.5	6,150.3	3,022.5	1,000.9	6.3	2.9	26,550.4	54.8	1.8	56.6	44,976.4	1,044.7	363.7	570.7	934.4	407.4	0.0	2,386.5	73,969.9	
合計	16,387.1	6,157.5	3,028.9	1,002.5	6.3	2.9	26,585.2	54.8	1.8	56.6	45,035.4	1,048.7	365.0	573.0	938.0	408.6	0.0	2,395.3	74,072.5	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 整備計画着手時河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	39.9	14.7	12.6	3.3	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	119.3	7.5	2.6	4.6	7.2	2.3	0.0	17.0	206.8	
UKZ	16,516.3	6,199.1	3,036.6	1,007.2	6.4	2.9	26,768.5	55.4	1.8	57.2	45,345.6	1,047.7	365.8	572.2	938.0	409.8	0.0	2,395.5	74,566.8	
合計	16,556.2	6,213.8	3,049.2	1,010.5	6.4	2.9	26,839.0	55.4	1.8	57.2	45,464.9	1,055.2	368.4	576.8	945.2	412.1	0.0	2,412.5	74,773.6	

様式-3 被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	11,547.3	4,337.5	2,163.7	721.2	4.6	2.1	18,776.4	40.2	1.5	41.7	31,807.0	936.0	315.3	506.0	821.3	346.6	0.0	2,103.9	52,729.0	
合計	11,563.3	4,343.4	2,168.9	722.5	4.6	2.1	18,804.8	40.2	1.5	41.7	31,855.3	940.0	316.6	508.3	824.9	347.8	0.0	2,112.7	52,814.5	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	11,926.5	4,497.0	2,238.7	746.7	4.8	2.1	19,415.8	41.1	1.5	42.6	32,890.2	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	54,515.2	
合計	11,942.5	4,502.9	2,243.9	748.0	4.8	2.1	19,444.2	41.1	1.5	42.6	32,938.5	963.1	327.9	520.2	848.1	364.2	0.0	2,175.4	54,600.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	12,141.3	4,597.4	2,282.4	761.6	4.8	2.2	19,789.7	41.5	1.5	43.0	33,523.5	973.5	333.6	525.6	859.2	372.8	0.0	2,205.5	55,561.7	
合計	12,157.3	4,603.3	2,287.6	762.9	4.8	2.2	19,818.1	41.5	1.5	43.0	33,571.8	977.5	334.9	527.9	862.8	374.0	0.0	2,214.3	55,647.2	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 整備計画着手時河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	12,867.3	4,832.7	2,400.7	794.8	5.0	2.3	20,902.8	43.4	1.5	44.9	35,409.3	1,021.4	353.1	557.6	910.7	394.6	0.0	2,326.7	58,683.7	
合計	12,883.3	4,838.6	2,405.9	796.1	5.0	2.3	20,931.2	43.4	1.5	44.9	35,457.6	1,025.4	354.4	559.9	914.3	395.8	0.0	2,335.5	58,769.2	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 整備計画着手時河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	13,391.6	5,032.1	2,473.0	819.0	5.2	2.3	21,723.2	44.9	1.5	46.4	36,798.9	1,044.7	363.7	570.7	934.4	407.4	0.0	2,386.5	60,955.0	
合計	13,407.6	5,038.0	2,478.2	820.3	5.2	2.3	21,751.6	44.9	1.5	46.4	36,847.2	1,048.7	365.0	573.0	938.0	408.6	0.0	2,395.3	61,040.5	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 整備計画着手時河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	32.7	12.0	10.3	2.7	0.0	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	97.6	7.5	2.6	4.6	7.2	2.3	0.0	17.0	172.3	
UKZ	13,513.3	5,072.0	2,484.5	824.1	5.2	2.3	21,901.4	45.3	1.5	46.8	37,101.0	1,047.7	365.8	572.2	938.0	409.8	0.0	2,395.5	61,444.7	
合計	13,546.0	5,084.0	2,494.8	826.8	5.2	2.3	21,959.1	45.3	1.5	46.8	37,198.6	1,055.2	368.4	576.8	945.2	412.1	0.0	2,412.5	61,617.0	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/50

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/60

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	11.9	4.4	3.9	1.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	35.8	2.6	0.8	1.5	2.4	0.8	0.0	5.8	62.7	
UKZ	12,676.0	4,772.0	2,380.2	794.3	5.1	2.3	20,629.8	44.1	1.6	45.8	34,946.8	928.4	312.4	501.4	813.7	342.9	0.0	2,085.1	57,707.4	
合計	12,687.9	4,776.3	2,384.1	795.3	5.1	2.3	20,650.9	44.1	1.6	45.8	34,982.5	931.1	313.2	502.9	816.1	343.7	0.0	2,090.9	57,770.1	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/70

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,146.4	4,969.7	2,459.6	820.6	5.3	2.4	21,403.9	45.4	1.6	47.1	36,258.1	948.1	323.5	512.7	836.1	358.5	0.0	2,142.8	59,851.8	
合計	13,164.3	4,976.2	2,465.4	822.1	5.3	2.4	21,435.6	45.4	1.6	47.1	36,311.7	952.1	324.8	514.9	839.7	359.7	0.0	2,151.5	59,945.9	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/80

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,334.8	5,033.8	2,504.8	835.9	5.3	2.4	21,716.9	45.8	1.6	47.4	36,788.4	964.0	329.4	520.1	849.6	367.3	0.0	2,180.9	60,733.6	
合計	13,352.6	5,040.3	2,510.6	837.4	5.3	2.4	21,748.6	45.8	1.6	47.4	36,842.0	968.0	330.7	522.4	853.1	368.5	0.0	2,189.6	60,827.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 H29未河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対 価	代替活動等	小計					
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,070.6	5,294.8	2,642.3	875.1	5.6	2.5	22,890.9	47.7	1.6	49.3	38,777.0	1,014.0	349.8	552.8	902.5	391.1	0.0	2,307.7	64,024.9	
合計	14,088.4	5,301.4	2,648.1	876.6	5.6	2.5	22,922.6	47.7	1.6	49.3	38,830.7	1,018.0	351.0	555.0	906.1	392.3	0.0	2,316.4	64,118.9	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 H29未河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対 価	代替活動等	小計					
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,766.8	5,568.0	2,737.7	906.5	5.8	2.6	23,987.3	49.5	1.6	51.1	40,634.4	1,041.6	362.4	568.9	931.2	406.0	0.0	2,378.9	67,051.7	
合計	14,784.7	5,574.5	2,743.5	908.0	5.8	2.6	24,019.0	49.5	1.6	51.1	40,688.0	1,045.6	363.6	571.1	934.8	407.3	0.0	2,387.6	67,145.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 H29未河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対 価	代替活動等	小計					
UR	36.3	13.3	11.4	3.0	0.0	0.0	64.0	0.0	0.0	0.0	108.5	7.5	2.6	4.6	7.1	2.3	0.0	17.0	189.4	
UKZ	14,982.5	5,625.2	2,758.2	914.7	5.8	2.6	24,288.9	50.2	1.6	51.8	41,145.3	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.0	67,880.1	
合計	15,018.7	5,638.5	2,769.7	917.7	5.8	2.6	24,353.0	50.2	1.6	51.8	41,253.8	1,054.7	368.1	576.3	944.4	411.9	0.0	2,411.0	68,069.5	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/50

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/60

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	13.1	4.8	4.3	1.1	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	39.3	2.6	0.8	1.5	2.3	0.8	0.0	5.7	68.3	
UKZ	13,943.6	5,249.2	2,618.2	873.8	5.6	2.5	22,692.9	48.6	1.8	50.4	38,441.5	928.4	312.4	501.4	813.8	342.9	0.0	2,085.1	63,269.9	
合計	13,956.7	5,254.0	2,622.5	874.9	5.6	2.5	22,716.2	48.6	1.8	50.4	38,480.8	931.0	313.2	502.9	816.1	343.7	0.0	2,090.8	63,338.2	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/70

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,461.1	5,466.7	2,705.5	902.6	5.8	2.6	23,544.3	50.0	1.8	51.8	39,883.9	948.1	323.5	512.7	836.2	358.5	0.0	2,142.8	65,622.8	
合計	14,480.7	5,473.9	2,711.9	904.2	5.8	2.6	23,579.1	50.0	1.8	51.8	39,942.9	952.1	324.8	515.0	839.8	359.7	0.0	2,151.6	65,725.4	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/80

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,668.3	5,537.1	2,755.3	919.5	5.8	2.6	23,888.6	50.4	1.8	52.2	40,467.2	964.0	329.4	520.1	849.5	367.3	0.0	2,180.8	66,588.8	
合計	14,687.9	5,544.3	2,761.7	921.1	5.8	2.6	23,923.4	50.4	1.8	52.2	40,526.2	968.0	330.7	522.4	853.1	368.5	0.0	2,189.6	66,691.4	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 H29末河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	15,477.7	5,824.3	2,906.6	962.6	6.1	2.7	25,180.0	52.4	1.8	54.2	42,654.7	1,014.0	349.8	552.8	902.6	391.1	0.0	2,307.7	70,196.6	
合計	15,497.3	5,831.5	2,913.0	964.2	6.1	2.7	25,214.8	52.4	1.8	54.2	42,713.7	1,018.0	351.1	555.1	906.2	392.3	0.0	2,316.5	70,299.2	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 H29末河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	16,243.5	6,124.7	3,011.5	997.1	6.3	2.8	26,385.9	54.4	1.8	56.2	44,697.8	1,041.6	362.4	568.9	931.3	406.0	0.0	2,378.9	73,518.8	
合計	16,263.1	6,131.9	3,017.9	998.7	6.3	2.8	26,420.7	54.4	1.8	56.2	44,756.8	1,045.6	363.7	571.2	934.9	407.2	0.0	2,387.7	73,621.4	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 H29末河道：資産+10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	39.9	14.7	12.6	3.3	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	119.3	7.5	2.6	4.6	7.2	2.3	0.0	17.0	206.8	
UKZ	16,480.7	6,187.7	3,034.0	1,006.1	6.4	2.9	26,717.8	55.2	1.8	57.0	45,259.9	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.1	74,428.8	
合計	16,520.6	6,202.4	3,046.6	1,009.4	6.4	2.9	26,788.3	55.2	1.8	57.0	45,379.2	1,054.7	368.1	576.4	944.5	411.9	0.0	2,411.1	74,635.6	

様式-3 被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								小計	代替活動等					
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								小計	代替活動等					
UR	10.7	3.9	3.5	0.9	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	32.2	2.6	0.8	1.5	2.3	0.8	0.0	5.7	56.9	
UKZ	11,408.4	4,294.8	2,142.2	714.9	4.6	2.0	18,566.9	39.7	1.5	41.2	31,452.1	928.4	312.4	501.4	813.8	342.9	0.0	2,085.1	52,145.3	
合計	11,419.1	4,298.7	2,145.7	715.8	4.6	2.0	18,585.9	39.7	1.5	41.2	31,484.3	931.0	313.2	502.9	816.1	343.7	0.0	2,090.8	52,202.2	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								小計	代替活動等					
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	11,831.8	4,472.7	2,213.6	738.5	4.7	2.1	19,263.4	40.9	1.5	42.4	32,632.3	948.1	323.5	512.7	836.2	358.5	0.0	2,142.8	54,080.9	
合計	11,847.8	4,478.6	2,218.8	739.8	4.7	2.1	19,291.8	40.9	1.5	42.4	32,680.6	952.1	324.8	515.0	839.8	359.7	0.0	2,151.6	54,166.4	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								小計	代替活動等					
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	12,001.3	4,530.4	2,254.4	752.3	4.8	2.1	19,545.3	41.2	1.5	42.7	33,109.5	964.0	329.4	520.1	849.5	367.3	0.0	2,180.8	54,878.3	
合計	12,017.3	4,536.3	2,259.6	753.6	4.8	2.1	19,573.7	41.2	1.5	42.7	33,157.8	968.0	330.7	522.4	853.1	368.5	0.0	2,189.6	54,963.8	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/100

H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	12,663.5	4,765.4	2,378.1	787.6	5.0	2.2	20,601.8	42.9	1.5	44.4	34,899.3	1,014.0	349.8	552.8	902.6	391.1	0.0	2,307.7	57,853.2	
合計	12,679.5	4,771.3	2,383.3	788.9	5.0	2.2	20,630.2	42.9	1.5	44.4	34,947.6	1,018.0	351.1	555.1	906.2	392.3	0.0	2,316.5	57,938.7	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/130

H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	13,290.1	5,011.2	2,463.9	815.8	5.2	2.3	21,588.5	44.5	1.5	46.0	36,570.9	1,041.6	362.4	568.9	931.3	406.0	0.0	2,378.9	60,584.3	
合計	13,306.1	5,017.1	2,469.1	817.1	5.2	2.3	21,616.9	44.5	1.5	46.0	36,619.2	1,045.6	363.7	571.2	934.9	407.2	0.0	2,387.7	60,669.8	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/150

H29末河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	32.7	12.0	10.3	2.7	0.0	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	97.6	7.5	2.6	4.6	7.2	2.3	0.0	17.0	172.3	
UKZ	13,484.2	5,062.7	2,482.4	823.2	5.2	2.3	21,860.0	45.1	1.5	46.6	37,030.8	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.1	61,331.5	
合計	13,516.9	5,074.7	2,492.7	825.9	5.2	2.3	21,917.7	45.1	1.5	46.6	37,128.4	1,054.7	368.1	576.4	944.5	411.9	0.0	2,411.1	61,503.8	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/50

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/60

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	11.9	4.4	3.9	1.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	35.8	2.6	0.8	1.5	2.4	0.8	0.0	5.8	62.7	
UKZ	12,386.3	4,680.1	2,310.1	775.7	5.1	2.2	20,159.5	43.9	1.6	45.5	34,150.1	896.9	300.7	482.9	783.6	328.8	0.0	2,009.3	56,364.4	
合計	12,398.2	4,684.4	2,314.0	776.7	5.1	2.2	20,180.6	43.9	1.6	45.5	34,185.8	899.5	301.5	484.4	785.9	329.6	0.0	2,015.1	56,427.1	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/70

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,073.9	4,916.7	2,437.0	811.5	5.3	2.3	21,246.8	45.4	1.6	47.0	35,991.9	943.7	319.9	511.0	830.9	352.9	0.0	2,127.5	59,413.2	
合計	13,091.8	4,923.2	2,442.8	813.0	5.3	2.3	21,278.4	45.4	1.6	47.0	36,045.5	947.6	321.2	513.3	834.4	354.1	0.0	2,136.2	59,507.2	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/80

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	13,259.1	4,996.6	2,487.5	829.7	5.3	2.4	21,580.5	45.8	1.6	47.4	36,557.2	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	60,351.7	
合計	13,276.9	5,003.2	2,493.3	831.2	5.3	2.4	21,612.1	45.8	1.6	47.4	36,610.8	963.1	327.8	520.2	848.0	364.2	0.0	2,175.3	60,445.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 整備計画河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,048.9	5,294.8	2,642.3	875.1	5.6	2.5	22,869.2	47.4	1.6	49.1	38,740.2	1,014.0	349.8	552.8	902.5	391.1	0.0	2,307.7	63,966.2	
合計	14,066.7	5,301.4	2,648.1	876.6	5.6	2.5	22,900.8	47.4	1.6	49.1	38,793.9	1,018.0	351.0	555.0	906.1	392.3	0.0	2,316.4	64,060.2	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 整備計画河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	17.8	6.5	5.8	1.5	0.0	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	53.6	4.0	1.3	2.3	3.5	1.2	0.0	8.7	94.0	
UKZ	14,724.9	5,544.2	2,726.9	903.0	5.7	2.6	23,907.3	49.4	1.6	51.0	40,498.9	1,038.3	360.9	566.8	927.8	404.5	0.0	2,370.6	66,827.8	
合計	14,742.7	5,550.8	2,732.7	904.5	5.7	2.6	23,939.0	49.4	1.6	51.0	40,552.5	1,042.3	362.2	569.1	931.3	405.7	0.0	2,379.3	66,921.8	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 整備計画河道 (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	29.7	10.9	9.7	2.5	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	0.0	89.4	6.6	2.1	3.8	5.9	2.0	0.0	14.5	156.7	
UKZ	14,939.9	5,625.2	2,758.2	914.7	5.8	2.6	24,246.4	50.1	1.6	51.7	41,073.3	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.0	67,765.4	
合計	14,969.6	5,636.1	2,767.9	917.2	5.8	2.6	24,299.2	50.1	1.6	51.7	41,162.7	1,053.8	367.7	575.6	943.2	411.6	0.0	2,408.6	67,922.1	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/50

整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等								
			償却	在庫	償却	在庫								小計								
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/60

整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等						
			償却	在庫	償却	在庫								小計						
UR	13.1	4.8	4.3	1.1	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	0.0	39.3	2.6	0.8	1.5	2.3	0.8	0.0	5.7	68.3	
UKZ	13,625.0	5,148.1	2,541.1	853.3	5.6	2.5	22,175.6	48.3	1.8	50.1	37,565.1	896.9	300.7	482.9	783.6	328.8	0.0	2,009.3	61,800.1	
合計	13,638.1	5,152.9	2,545.4	854.4	5.6	2.5	22,198.9	48.3	1.8	50.1	37,604.4	899.5	301.5	484.4	785.9	329.6	0.0	2,015.0	61,868.4	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/70

整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等						
			償却	在庫	償却	在庫								小計						
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,381.3	5,408.4	2,680.7	892.7	5.8	2.6	23,371.5	49.9	1.8	51.7	39,591.1	943.7	319.9	511.0	830.9	352.9	0.0	2,127.5	65,141.8	
合計	14,400.9	5,415.6	2,687.1	894.3	5.8	2.6	23,406.3	49.9	1.8	51.7	39,650.1	947.7	321.2	513.3	834.5	354.1	0.0	2,136.3	65,244.4	

水系名：淀川

河川名：宇治川

流量規模：1/80

整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等						
			償却	在庫	償却	在庫								小計						
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	14,585.0	5,496.3	2,736.2	912.7	5.8	2.6	23,738.6	50.4	1.8	52.2	40,212.9	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	66,170.3	
合計	14,604.6	5,503.5	2,742.6	914.3	5.8	2.6	23,773.4	50.4	1.8	52.2	40,271.9	963.1	327.9	520.2	848.1	364.2	0.0	2,175.4	66,272.9	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	15,453.8	5,824.3	2,906.6	962.6	6.1	2.7	25,156.1	52.2	1.8	54.0	42,614.3	1,014.0	349.8	552.8	902.6	391.1	0.0	2,307.7	70,132.1	
合計	15,473.4	5,831.5	2,913.0	964.2	6.1	2.7	25,190.9	52.2	1.8	54.0	42,673.3	1,018.0	351.1	555.1	906.2	392.3	0.0	2,316.5	70,234.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	19.6	7.2	6.4	1.6	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	59.0	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	102.6	
UKZ	16,197.4	6,098.6	2,999.6	993.3	6.3	2.8	26,298.0	54.3	1.8	56.1	44,548.8	1,038.3	360.9	566.8	927.7	404.5	0.0	2,370.5	73,273.4	
合計	16,217.0	6,105.8	3,006.0	994.9	6.3	2.8	26,332.8	54.3	1.8	56.1	44,607.8	1,042.3	362.2	569.1	931.3	405.7	0.0	2,379.3	73,376.0	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 整備計画河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	32.7	12.0	10.6	2.7	0.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	98.3	6.6	2.1	3.8	5.9	2.0	0.0	14.5	170.8	
UKZ	16,433.9	6,187.7	3,034.0	1,006.1	6.4	2.9	26,671.0	55.1	1.8	56.9	45,180.6	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.1	74,302.6	
合計	16,466.6	6,199.7	3,044.6	1,008.8	6.4	2.9	26,729.0	55.1	1.8	56.9	45,278.9	1,053.8	367.6	575.6	943.2	411.6	0.0	2,408.6	74,473.4	

様式-3 被害額

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/50 整備計画河道：資産-10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
UR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
UKZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/60 整備計画河道：資産-10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	10.7	3.9	3.5	0.9	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	32.2	2.6	0.8	1.5	2.3	0.8	0.0	5.7	56.9	
UKZ	11,147.7	4,212.1	2,079.1	698.1	4.6	2.0	18,143.6	39.5	1.5	41.0	30,735.1	896.9	300.7	482.9	783.6	328.8	0.0	2,009.3	50,929.0	
合計	11,158.4	4,216.0	2,082.6	699.0	4.6	2.0	18,162.6	39.5	1.5	41.0	30,767.3	899.5	301.5	484.4	785.9	329.6	0.0	2,015.0	50,985.9	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/70 整備計画河道：資産-10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	11,766.5	4,425.0	2,193.3	730.4	4.7	2.1	19,122.0	40.8	1.5	42.3	32,392.7	943.7	319.9	511.0	830.9	352.9	0.0	2,127.5	53,684.5	
合計	11,782.5	4,430.9	2,198.5	731.7	4.7	2.1	19,150.4	40.8	1.5	42.3	32,441.0	947.7	321.2	513.3	834.5	354.1	0.0	2,136.3	53,770.0	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/80 整備計画河道：資産-10% (単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	11,933.1	4,497.0	2,238.7	746.7	4.8	2.1	19,422.4	41.2	1.5	42.7	32,901.5	959.1	326.6	517.9	844.5	363.0	0.0	2,166.6	54,533.2	
合計	11,949.1	4,502.9	2,243.9	748.0	4.8	2.1	19,450.8	41.2	1.5	42.7	32,949.8	963.1	327.9	520.2	848.1	364.2	0.0	2,175.4	54,618.7	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/100 整備計画河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	12,644.0	4,765.4	2,378.1	787.6	5.0	2.2	20,582.3	42.7	1.5	44.2	34,866.2	1,014.0	349.8	552.8	902.6	391.1	0.0	2,307.7	57,800.4	
合計	12,660.0	4,771.3	2,383.3	788.9	5.0	2.2	20,610.7	42.7	1.5	44.2	34,914.5	1,018.0	351.1	555.1	906.2	392.3	0.0	2,316.5	57,885.9	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/130 整備計画河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	16.0	5.9	5.2	1.3	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	48.3	4.0	1.3	2.3	3.6	1.2	0.0	8.8	85.5	
UKZ	13,252.4	4,989.8	2,454.2	812.7	5.2	2.3	21,516.6	44.4	1.5	45.9	36,449.0	1,038.3	360.9	566.8	927.7	404.5	0.0	2,370.5	60,382.0	
合計	13,268.4	4,995.7	2,459.4	814.0	5.2	2.3	21,545.0	44.4	1.5	45.9	36,497.3	1,042.3	362.2	569.1	931.3	405.7	0.0	2,379.3	60,467.5	

水系名：淀川 河川名：宇治川 流量規模：1/150 整備計画河道：資産－10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施 設等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UR	26.7	9.8	8.7	2.2	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	80.5	6.6	2.1	3.8	5.9	2.0	0.0	14.5	142.4	
UKZ	13,445.9	5,062.7	2,482.4	823.2	5.2	2.3	21,821.7	45.0	1.5	46.5	36,965.9	1,047.2	365.5	571.8	937.3	409.6	0.0	2,394.1	61,228.2	
合計	13,472.6	5,072.5	2,491.1	825.4	5.2	2.3	21,869.1	45.0	1.5	46.5	37,046.4	1,053.8	367.6	575.6	943.2	411.6	0.0	2,408.6	61,370.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	5,521.3	1,074.6	1,393.7	422.9	1.2	0.5	8,414.2	15.3	0.0	15.3	14,253.7	441.3	69.7	110.6	180.3	113.7	0.0	735.2	23,418.4	
KL	11,216.4	5,232.3	8,585.8	2,020.2	5.2	2.3	27,062.2	13.2	4.0	17.2	45,843.3	1,916.9	316.2	505.1	821.2	513.6	0.0	3,251.7	76,174.4	
合計	16,737.6	6,306.9	9,979.6	2,443.0	6.4	2.8	35,476.4	28.5	4.0	32.5	60,097.0	2,358.2	385.9	615.6	1,001.5	627.3	0.0	3,987.0	99,592.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	99,824.6	52,995.6	28,364.4	12,316.1	42.2	20.4	193,563.3	49.7	6.4	56.1	327,896.2	6,744.7	2,481.9	2,473.8	4,955.7	2,934.1	0.0	14,634.4	536,150.0	
KL	62,186.4	48,281.7	42,807.4	13,926.2	40.8	19.8	167,262.4	19.9	11.6	31.5	283,342.3	9,358.6	2,460.9	2,608.3	5,069.2	3,878.3	0.0	18,306.1	468,942.2	
合計	162,011.1	101,277.2	71,171.7	26,242.3	83.0	40.3	360,825.6	69.6	18.0	87.6	611,238.5	16,103.2	4,942.9	5,082.0	10,024.9	6,812.4	0.0	32,940.5	1,005,092.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	136,257.7	73,191.3	35,531.0	16,447.6	60.7	27.2	261,515.5	52.7	7.0	59.7	443,007.2	8,799.1	3,365.3	3,007.7	6,373.0	4,087.2	0.0	19,259.3	723,841.7	
KL	97,371.9	77,582.4	58,167.8	21,504.1	67.4	30.0	254,723.5	20.3	15.9	36.2	431,501.4	13,817.2	3,909.4	3,434.8	7,344.1	6,132.4	0.0	27,293.8	713,554.9	
合計	233,629.6	150,773.7	93,698.8	37,951.7	128.1	57.2	516,239.0	73.0	22.9	95.9	874,508.6	22,616.3	7,274.7	6,442.4	13,717.1	10,219.7	0.0	46,553.1	1,437,396.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	161,971.8	88,746.0	39,998.3	19,351.2	74.9	31.8	310,174.1	54.0	7.3	61.3	525,434.9	10,399.7	4,006.8	3,316.4	7,323.2	4,896.4	0.0	22,619.3	858,289.5	
KL	126,008.0	98,264.9	66,728.4	26,064.9	87.0	36.8	317,189.9	21.9	16.1	38.0	537,319.6	17,255.4	5,059.3	4,353.6	9,412.9	7,737.6	0.0	34,405.9	888,953.4	
合計	287,979.8	187,010.9	106,726.8	45,416.1	161.9	68.5	627,364.0	75.9	23.4	99.3	1,062,754.4	27,655.1	9,066.1	7,670.1	16,736.1	12,634.0	0.0	57,025.2	1,747,242.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	192,183.6	106,491.6	45,862.1	23,206.3	89.9	36.8	367,870.2	56.8	7.6	64.3	623,172.1	12,581.6	4,808.6	3,732.3	8,540.9	5,891.3	0.0	27,013.8	1,018,120.4	
KL	160,719.2	121,371.5	76,282.8	31,333.0	109.0	44.5	389,860.0	22.5	18.3	40.8	660,422.7	21,403.2	6,326.4	5,252.8	11,579.2	9,439.9	0.0	42,422.2	1,092,745.7	
合計	352,902.8	227,863.1	122,144.9	54,539.2	198.9	81.3	757,730.2	79.2	25.9	105.1	1,283,594.8	33,984.8	11,135.0	8,985.1	20,120.1	15,331.1	0.0	69,436.0	2,110,866.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	221,614.0	119,884.7	51,842.4	26,472.7	101.8	40.9	419,956.6	59.4	7.7	67.2	711,406.3	14,982.3	5,528.9	4,253.3	9,782.1	6,654.5	0.0	31,419.0	1,162,849.1	
KL	185,585.8	136,682.5	82,542.4	34,810.3	123.8	50.1	439,794.9	22.6	19.6	42.1	745,012.4	24,409.0	7,182.7	5,790.3	12,973.0	10,391.6	0.0	47,773.7	1,232,623.1	
合計	407,199.8	256,567.2	134,384.8	61,283.0	225.6	91.0	859,751.5	82.0	27.3	109.3	1,456,418.8	39,391.3	12,711.6	10,043.6	22,755.2	17,046.2	0.0	79,192.7	2,395,472.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	235,553.6	127,135.3	57,586.2	28,929.7	106.5	42.7	449,354.0	60.5	7.9	68.4	761,205.5	16,330.4	5,868.0	4,506.5	10,374.5	7,042.4	0.0	33,747.4	1,244,375.3	
KL	196,135.9	143,531.8	85,448.0	36,481.7	130.1	52.5	461,779.9	22.6	19.6	42.2	782,255.1	25,822.5	7,562.1	6,014.0	13,576.1	10,804.9	0.0	50,203.5	1,294,280.7	
合計	431,689.5	270,667.1	143,034.2	65,411.4	236.6	95.2	911,133.9	83.1	27.6	110.6	1,543,460.6	42,152.9	13,430.1	10,520.5	23,950.6	17,847.3	0.0	83,950.8	2,538,655.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画着手時河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	269,521.1	146,624.8	72,652.7	37,498.8	116.0	46.3	526,459.8	61.5	7.9	69.4	891,822.7	20,834.0	6,784.0	5,095.3	11,879.3	8,129.5	0.0	40,842.8	1,459,194.7	
KL	217,150.9	156,350.9	90,904.5	39,467.5	141.8	56.9	504,072.5	22.9	19.8	42.6	853,898.7	28,420.7	8,324.7	6,557.1	14,881.8	11,592.6	0.0	54,895.0	1,412,908.8	
合計	486,672.0	302,975.7	163,557.3	76,966.3	257.8	103.2	1,030,532.3	84.4	27.7	112.0	1,745,721.4	49,254.7	15,108.7	11,652.4	26,761.1	19,722.0	0.0	95,737.8	2,872,103.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	6,073.4	1,182.1	1,533.1	465.1	1.3	0.6	9,255.6	16.9	0.0	16.9	15,679.0	441.3	69.7	110.6	180.3	113.7	0.0	735.3	25,686.8	
KL	12,338.0	5,755.6	9,444.4	2,222.2	5.7	2.5	29,768.4	14.5	4.4	18.9	50,427.6	1,916.9	316.2	505.1	821.3	513.6	0.0	3,251.8	83,466.7	
合計	18,411.4	6,937.7	10,977.5	2,687.3	7.0	3.1	39,024.0	31.4	4.4	35.8	66,106.6	2,358.2	385.9	615.7	1,001.6	627.3	0.0	3,987.1	109,153.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	109,807.1	58,295.1	31,200.8	13,547.7	46.4	22.5	212,919.6	54.7	7.0	61.7	360,685.8	6,744.7	2,481.9	2,473.8	4,955.7	2,934.1	0.0	14,634.5	588,301.6	
KL	68,405.1	53,109.8	47,088.1	15,318.9	44.9	21.8	183,988.6	21.9	12.8	34.7	311,676.5	9,358.6	2,460.9	2,608.3	5,069.2	3,878.3	0.0	18,306.1	514,005.9	
合計	178,212.2	111,404.9	78,288.9	28,866.6	91.3	44.3	396,908.2	76.6	19.8	96.4	672,362.3	16,103.3	4,942.8	5,082.1	10,024.9	6,812.4	0.0	32,940.6	1,102,307.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	149,883.5	80,510.4	39,084.1	18,092.4	66.7	29.9	287,667.0	58.0	7.7	65.7	487,307.9	8,799.1	3,365.3	3,007.7	6,373.0	4,087.2	0.0	19,259.3	794,299.9	
KL	107,109.0	85,340.6	63,984.6	23,654.5	74.1	33.0	280,195.8	22.3	17.5	39.8	474,651.6	13,817.2	3,909.4	3,434.8	7,344.2	6,132.4	0.0	27,293.8	782,181.0	
合計	256,992.5	165,851.0	103,068.7	41,746.9	140.8	62.9	567,862.8	80.3	25.2	105.5	961,959.5	22,616.3	7,274.7	6,442.5	13,717.2	10,219.6	0.0	46,553.1	1,576,480.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	178,169.0	97,620.6	43,998.2	21,286.3	82.4	35.0	341,191.5	59.4	8.0	67.4	577,978.3	10,399.7	4,006.8	3,316.4	7,323.2	4,896.4	0.0	22,619.3	941,856.5	
KL	138,608.8	108,091.4	73,401.2	28,671.4	95.7	40.4	348,908.9	24.1	17.7	41.8	591,051.5	17,255.4	5,059.3	4,353.6	9,412.9	7,737.6	0.0	34,405.9	974,408.1	
合計	316,777.8	205,712.0	117,399.4	49,957.7	178.1	75.4	690,100.4	83.5	25.7	109.2	1,169,029.8	27,655.1	9,066.1	7,670.0	16,736.1	12,634.0	0.0	57,025.2	1,916,264.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	211,402.0	117,140.8	50,448.3	25,526.9	98.9	40.4	404,657.3	62.4	8.3	70.7	685,489.3	12,581.6	4,808.6	3,732.3	8,540.9	5,891.3	0.0	27,013.8	1,117,231.1	
KL	176,791.2	133,508.6	83,911.1	34,466.3	119.9	49.0	428,846.1	24.7	20.1	44.8	726,465.0	21,403.2	6,326.4	5,252.8	11,579.2	9,439.9	0.0	42,422.3	1,197,778.2	
合計	388,193.2	250,649.4	134,359.4	59,993.2	218.8	89.4	833,503.4	87.1	28.4	115.5	1,411,954.3	33,984.8	11,135.0	8,985.1	20,120.1	15,331.2	0.0	69,436.1	2,315,009.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	243,775.4	131,873.2	57,026.7	29,119.9	112.0	45.0	461,952.2	65.4	8.5	73.9	782,547.0	14,982.3	5,528.9	4,253.3	9,782.2	6,654.5	0.0	31,419.0	1,275,992.1	
KL	204,144.4	150,350.7	90,796.6	38,291.4	136.1	55.1	483,774.3	24.8	21.5	46.3	819,513.7	24,409.0	7,182.7	5,790.3	12,973.0	10,391.6	0.0	47,773.6	1,351,107.9	
合計	447,919.8	282,223.9	147,823.3	67,411.3	248.1	100.1	945,726.5	90.2	30.0	120.2	1,602,060.7	39,391.3	12,711.6	10,043.6	22,755.2	17,046.1	0.0	79,192.6	2,627,100.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	259,108.9	139,848.8	63,344.8	31,822.7	117.2	47.0	494,289.4	66.6	8.7	75.3	837,326.1	16,330.4	5,868.0	4,506.5	10,374.5	7,042.4	0.0	33,747.3	1,365,438.1	
KL	215,749.5	157,885.0	93,992.8	40,129.8	143.1	57.7	507,957.9	24.8	21.6	46.4	860,480.6	25,822.5	7,562.1	6,014.0	13,576.1	10,804.9	0.0	50,203.5	1,418,688.4	
合計	474,858.4	297,733.8	157,337.6	71,952.5	260.3	104.7	1,002,247.3	91.4	30.3	121.7	1,697,806.7	42,152.9	13,430.1	10,520.5	23,950.6	17,847.3	0.0	83,950.8	2,784,126.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画着手時河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	296,473.2	161,287.3	79,918.0	41,248.7	127.6	51.0	579,105.8	67.7	8.7	76.4	981,005.0	20,834.0	6,784.0	5,095.3	11,879.3	8,129.5	0.0	40,842.8	1,601,030.0	
KL	238,866.0	171,985.9	99,995.0	43,414.3	156.0	62.6	554,479.8	25.2	21.7	46.9	939,288.5	28,420.7	8,324.7	6,557.1	14,881.8	11,592.6	0.0	54,895.1	1,548,710.3	
合計	535,339.2	333,273.2	179,913.0	84,663.0	283.6	113.6	1,133,585.6	92.9	30.4	123.3	1,920,293.5	49,254.7	15,108.7	11,652.4	26,761.1	19,722.1	0.0	95,737.9	3,149,740.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	4,969.2	967.1	1,254.3	380.6	1.1	0.5	7,572.8	13.8	0.0	13.8	12,828.3	441.3	69.7	110.6	180.3	113.7	0.0	735.3	21,150.2	
KL	10,094.7	4,709.1	7,727.3	1,818.2	4.6	2.1	24,356.0	11.9	3.6	15.5	41,259.0	1,916.9	316.2	505.1	821.3	513.6	0.0	3,251.8	68,882.3	
合計	15,063.9	5,676.2	8,981.6	2,198.8	5.7	2.6	31,928.8	25.7	3.6	29.3	54,087.3	2,358.2	385.9	615.7	1,001.6	627.3	0.0	3,987.1	90,032.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	89,842.2	47,696.0	25,527.9	11,084.5	38.0	18.4	174,207.0	44.8	5.7	50.5	295,106.6	6,744.7	2,481.9	2,473.8	4,955.7	2,934.1	0.0	14,634.5	483,998.6	
KL	55,967.8	43,453.5	38,526.6	12,533.6	36.7	17.9	150,536.1	17.9	10.4	28.3	255,008.1	9,358.6	2,460.9	2,608.3	5,069.2	3,878.3	0.0	18,306.1	423,878.6	
合計	145,810.0	91,149.5	64,054.5	23,618.1	74.7	36.3	324,743.1	62.7	16.1	78.8	550,114.7	16,103.3	4,942.8	5,082.1	10,024.9	6,812.4	0.0	32,940.6	907,877.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	122,631.9	65,872.2	31,977.9	14,802.9	54.6	24.5	235,364.0	47.4	6.3	53.7	398,706.5	8,799.1	3,365.3	3,007.7	6,373.0	4,087.2	0.0	19,259.3	653,383.5	
KL	87,634.7	69,824.1	52,351.0	19,353.7	60.7	27.0	229,251.2	18.3	14.3	32.6	388,351.3	13,817.2	3,909.4	3,434.8	7,344.2	6,132.4	0.0	27,293.8	644,928.9	
合計	210,266.6	135,696.3	84,328.9	34,156.6	115.3	51.5	464,615.2	65.7	20.6	86.3	787,057.8	22,616.3	7,274.7	6,442.5	13,717.2	10,219.6	0.0	46,553.1	1,298,312.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	145,774.6	79,871.4	35,998.5	17,416.1	67.4	28.6	279,156.6	48.6	6.6	55.2	472,891.4	10,399.7	4,006.8	3,316.4	7,323.2	4,896.4	0.0	22,619.3	774,722.5	
KL	113,407.2	88,438.4	60,055.6	23,458.4	78.3	33.1	285,471.0	19.7	14.5	34.2	483,587.6	17,255.4	5,059.3	4,353.6	9,412.9	7,737.6	0.0	34,405.9	803,498.7	
合計	259,181.8	168,309.8	96,054.1	40,874.5	145.7	61.7	564,627.6	68.3	21.1	89.4	956,479.0	27,655.1	9,066.1	7,670.0	16,736.1	12,634.0	0.0	57,025.2	1,578,221.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	172,965.2	95,842.5	41,275.9	20,885.6	80.9	33.1	331,083.2	51.1	6.8	57.9	560,854.9	12,581.6	4,808.6	3,732.3	8,540.9	5,891.3	0.0	27,013.8	919,009.8	
KL	144,647.3	109,234.3	68,654.6	28,199.7	98.1	40.1	350,874.1	20.2	16.5	36.7	594,380.4	21,403.2	6,326.4	5,252.8	11,579.2	9,439.9	0.0	42,422.3	987,713.5	
合計	317,612.5	205,076.8	109,930.5	49,085.3	179.0	73.2	681,957.3	71.3	23.3	94.6	1,155,235.3	33,984.8	11,135.0	8,985.1	20,120.1	15,331.2	0.0	69,436.1	1,906,723.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	199,452.6	107,896.3	46,658.2	23,825.4	91.7	36.8	377,961.0	53.5	7.0	60.5	640,265.7	14,982.3	5,528.9	4,253.3	9,782.2	6,654.5	0.0	31,419.0	1,049,706.2	
KL	167,027.2	123,014.2	74,288.2	31,329.3	111.4	45.1	395,815.4	20.3	17.6	37.9	670,511.2	24,409.0	7,182.7	5,790.3	12,973.0	10,391.6	0.0	47,773.6	1,114,138.1	
合計	366,479.8	230,910.5	120,946.4	55,154.7	203.1	81.9	773,776.4	73.8	24.6	98.4	1,310,776.9	39,391.3	12,711.6	10,043.6	22,755.2	17,046.1	0.0	79,192.6	2,163,844.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	211,998.2	114,421.8	51,827.6	26,036.7	95.9	38.4	404,418.6	54.5	7.1	61.6	685,085.0	16,330.4	5,868.0	4,506.5	10,374.5	7,042.4	0.0	33,747.3	1,123,312.5	
KL	176,522.3	129,178.6	76,903.2	32,833.5	117.1	47.2	415,601.9	20.3	17.7	38.0	704,029.6	25,822.5	7,562.1	6,014.0	13,576.1	10,804.9	0.0	50,203.5	1,169,873.0	
合計	388,520.5	243,600.4	128,730.8	58,870.2	213.0	85.6	820,020.5	74.8	24.8	99.6	1,389,114.6	42,152.9	13,430.1	10,520.5	23,950.6	17,847.3	0.0	83,950.8	2,293,185.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画着手時河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	242,569.0	131,962.3	65,387.5	33,748.9	104.4	41.7	473,813.8	55.4	7.1	62.5	802,640.4	20,834.0	6,784.0	5,095.3	11,879.3	8,129.5	0.0	40,842.8	1,317,359.5	
KL	195,435.8	140,715.8	81,814.1	35,520.8	127.6	51.2	453,665.3	20.6	17.8	38.4	768,508.8	28,420.7	8,324.7	6,557.1	14,881.8	11,592.6	0.0	54,895.1	1,277,107.6	
合計	438,004.8	272,678.1	147,201.6	69,269.7	232.0	92.9	927,479.1	76.0	24.9	100.9	1,571,149.2	49,254.7	15,108.7	11,652.4	26,761.1	19,722.1	0.0	95,737.9	2,594,467.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	11,146.5	5,222.4	8,564.7	2,014.6	5.1	2.3	26,955.5	13.2	4.0	17.1	45,662.7	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	75,873.0	0.0
合計	11,146.5	5,222.4	8,564.7	2,014.6	5.1	2.3	26,955.5	13.2	4.0	17.1	45,662.7	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	75,873.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	78,129.3	40,909.9	22,008.1	8,949.9	33.8	16.7	150,047.7	46.2	5.1	51.3	254,180.8	5,143.3	1,878.5	2,033.0	3,911.5	2,179.2	0.0	11,234.1	415,513.9	0.0
KL	54,673.8	42,593.6	38,996.2	12,421.1	35.5	17.4	148,737.5	19.7	9.1	28.8	251,961.3	8,517.3	2,178.2	2,393.1	4,571.2	3,455.8	0.0	16,544.3	417,272.0	0.0
合計	132,803.1	83,503.5	61,004.2	21,371.0	69.3	34.2	298,785.2	65.9	14.2	80.1	506,142.1	13,660.6	4,056.7	4,426.1	8,482.8	5,635.0	0.0	27,778.4	832,785.9	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	122,947.8	65,874.4	33,190.2	15,079.8	53.6	24.8	237,170.6	51.6	7.0	58.6	401,767.0	8,090.9	3,060.8	2,838.0	5,898.9	3,692.4	0.0	17,682.1	656,678.4	0.0
KL	89,789.9	70,560.5	55,331.2	19,990.7	60.1	27.5	235,759.9	20.3	15.2	35.5	399,377.1	12,816.3	3,582.1	3,266.2	6,848.3	5,621.1	0.0	25,285.7	660,458.3	0.0
合計	212,737.7	136,434.9	88,521.4	35,070.5	113.7	52.3	472,930.5	71.9	22.3	94.1	801,144.2	20,907.1	6,642.9	6,104.3	12,747.2	9,313.5	0.0	42,967.8	1,317,136.6	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	142,838.0	77,101.3	36,631.0	17,118.8	64.6	28.5	273,782.2	53.2	7.0	60.2	463,787.1	9,140.2	3,521.7	3,090.1	6,611.8	4,293.5	0.0	20,045.6	757,675.1	0.0
KL	107,635.4	86,750.4	61,759.6	23,502.6	77.1	33.3	279,758.4	20.3	16.0	36.3	473,910.5	15,182.1	4,329.0	3,646.8	7,975.8	6,807.2	0.0	29,965.0	783,670.2	0.0
合計	250,473.4	163,851.7	98,390.6	40,621.4	141.7	61.8	553,540.6	73.5	23.0	96.5	937,697.6	24,322.3	7,850.7	6,736.9	14,587.6	11,100.7	0.0	50,010.6	1,541,345.3	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	168,618.8	92,656.1	41,367.3	20,240.0	78.0	32.8	322,993.1	54.8	7.6	62.4	547,150.3	10,944.0	4,182.9	3,412.3	7,595.2	5,122.8	0.0	23,661.9	893,867.7	
KL	138,227.6	108,003.8	70,429.6	28,260.1	96.7	40.0	345,057.9	21.9	16.4	38.3	584,527.9	18,761.6	5,525.3	4,564.1	10,089.4	8,460.5	0.0	37,311.5	966,935.6	
合計	306,846.4	200,660.0	111,796.9	48,500.1	174.7	72.9	668,051.0	76.7	23.9	100.7	1,131,678.1	29,705.6	9,708.2	7,976.4	17,684.6	13,583.3	0.0	60,973.5	1,860,803.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	192,579.8	106,461.6	45,843.3	23,136.5	89.6	36.7	368,147.4	56.6	7.6	64.2	623,641.7	12,588.2	4,841.6	3,819.9	8,661.5	5,901.4	0.0	27,151.1	1,019,004.4	
KL	164,358.0	124,732.6	77,332.4	32,129.4	113.7	46.1	398,712.2	22.4	18.7	41.1	675,418.3	22,051.3	6,472.2	5,193.4	11,665.6	9,651.3	0.0	43,368.2	1,117,539.7	
合計	356,937.8	231,194.2	123,175.7	55,265.9	203.3	82.8	766,859.6	79.0	26.3	105.3	1,299,060.0	34,639.5	11,313.8	9,013.4	20,327.1	15,552.6	0.0	70,519.3	2,136,544.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	204,750.3	112,231.9	48,156.4	24,503.4	95.1	38.6	389,775.7	57.6	7.7	65.4	660,279.9	13,594.7	5,134.2	4,015.7	9,149.9	6,235.5	0.0	28,980.1	1,079,101.1	
KL	180,464.6	133,243.2	81,086.7	34,013.0	120.8	48.9	428,977.1	22.6	19.3	41.9	726,687.2	23,714.3	6,999.5	5,695.0	12,694.6	10,193.2	0.0	46,602.1	1,202,308.2	
合計	385,214.9	245,475.1	129,243.1	58,516.4	215.9	87.4	818,752.8	80.2	27.1	107.3	1,386,967.1	37,309.0	12,133.8	9,710.7	21,844.5	16,428.7	0.0	75,582.2	2,281,409.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H29末河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	226,548.6	122,279.9	53,225.6	27,086.1	103.5	41.5	429,285.2	59.8	7.9	67.7	727,209.0	15,363.4	5,647.5	4,354.4	10,002.0	6,783.7	0.0	32,149.0	1,188,710.9	
KL	201,081.8	146,630.1	86,598.5	37,103.6	133.0	53.5	471,600.6	22.6	19.7	42.2	798,891.4	26,302.1	7,718.0	6,134.8	13,852.8	10,970.9	0.0	51,125.8	1,321,660.0	
合計	427,630.5	268,910.1	139,824.1	64,189.7	236.5	95.1	900,885.8	82.3	27.6	109.9	1,526,100.4	41,665.5	13,365.5	10,489.2	23,854.8	17,754.5	0.0	83,274.8	2,510,370.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	12,261.1	5,744.6	9,421.2	2,216.0	5.6	2.5	29,651.0	14.5	4.4	18.9	50,228.9	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	83,136.4	
合計	12,261.1	5,744.6	9,421.2	2,216.0	5.6	2.5	29,651.0	14.5	4.4	18.9	50,228.9	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	83,136.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	85,942.2	45,000.9	24,208.9	9,844.9	37.2	18.4	165,052.5	50.9	5.6	56.5	279,598.9	5,143.3	1,878.5	2,033.0	3,911.5	2,179.2	0.0	11,234.0	455,941.9	
KL	60,141.2	46,852.9	42,895.8	13,663.2	39.1	19.2	163,611.4	21.7	10.0	31.7	277,157.4	8,517.3	2,178.2	2,393.1	4,571.3	3,455.8	0.0	16,544.4	457,344.9	
合計	146,083.4	91,853.8	67,104.7	23,508.1	76.3	37.6	328,663.9	72.6	15.6	88.2	556,756.3	13,660.6	4,056.7	4,426.1	8,482.8	5,635.0	0.0	27,778.4	913,286.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	135,242.6	72,461.8	36,509.2	16,587.8	58.9	27.3	260,887.6	56.8	7.7	64.5	441,943.7	8,090.9	3,060.8	2,838.0	5,898.8	3,692.4	0.0	17,682.1	720,577.9	
KL	98,768.9	77,616.6	60,864.3	21,989.7	66.1	30.3	259,335.9	22.3	16.8	39.1	439,314.9	12,816.3	3,582.1	3,266.2	6,848.3	5,621.1	0.0	25,285.7	723,975.6	
合計	234,011.5	150,078.4	97,373.5	38,577.5	125.0	57.6	520,223.5	79.1	24.5	103.6	881,258.6	20,907.2	6,642.9	6,104.2	12,747.1	9,313.5	0.0	42,967.8	1,444,553.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	157,121.9	84,811.4	40,294.1	18,830.7	71.0	31.3	301,160.4	58.5	7.7	66.2	510,165.8	9,140.2	3,521.7	3,090.1	6,611.8	4,293.5	0.0	20,045.5	831,437.9	
KL	118,398.9	95,425.5	67,935.6	25,852.8	84.8	36.7	307,734.3	22.4	17.6	40.0	521,301.5	15,182.1	4,329.0	3,646.8	7,975.8	6,807.2	0.0	29,965.1	859,040.9	
合計	275,520.8	180,236.9	108,229.7	44,683.5	155.8	68.0	608,894.7	80.9	25.3	106.2	1,031,467.3	24,322.3	7,850.7	6,736.9	14,587.6	11,100.7	0.0	50,010.6	1,690,478.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	185,480.7	101,921.8	45,504.0	22,264.0	85.8	36.1	355,292.4	60.3	8.3	68.6	601,865.3	10,944.0	4,182.9	3,412.3	7,595.2	5,122.8	0.0	23,662.0	980,888.3	
KL	152,050.4	118,804.2	77,472.6	31,086.1	106.3	44.0	379,563.6	24.1	18.0	42.1	642,980.6	18,761.6	5,525.3	4,564.1	10,089.4	8,460.5	0.0	37,311.5	1,059,897.8	
合計	337,531.1	220,726.0	122,976.6	53,350.1	192.1	80.1	734,856.0	84.4	26.3	110.7	1,244,845.9	29,705.6	9,708.2	7,976.4	17,684.6	13,583.3	0.0	60,973.5	2,040,786.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	211,837.8	117,107.8	50,427.6	25,450.1	98.6	40.3	404,962.2	62.3	8.3	70.6	686,005.9	12,588.2	4,841.6	3,819.9	8,661.5	5,901.4	0.0	27,151.1	1,118,189.8	
KL	180,793.8	137,205.8	85,065.6	35,342.4	125.1	50.7	438,583.4	24.6	20.6	45.2	742,960.1	22,051.3	6,472.2	5,193.4	11,665.6	9,651.3	0.0	43,368.2	1,224,956.9	
合計	392,631.6	254,313.6	135,493.2	60,792.5	223.7	91.0	843,545.6	86.9	28.9	115.8	1,428,966.0	34,639.5	11,313.8	9,013.3	20,327.1	15,552.7	0.0	70,519.3	2,343,146.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	225,225.3	123,455.1	52,972.1	26,953.7	104.6	42.4	428,753.2	63.4	8.5	71.9	726,307.9	13,594.7	5,134.2	4,015.7	9,149.9	6,235.5	0.0	28,980.1	1,184,113.1	
KL	198,511.0	146,567.5	89,195.4	37,414.3	132.8	53.7	471,874.7	24.8	21.3	46.1	799,355.9	23,714.3	6,999.5	5,695.0	12,694.5	10,193.2	0.0	46,602.0	1,317,878.7	
合計	423,736.3	270,022.6	142,167.5	64,368.0	237.4	96.1	900,627.9	88.2	29.8	118.0	1,525,663.8	37,309.0	12,133.7	9,710.7	21,844.4	16,428.7	0.0	75,582.1	2,501,991.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H29末河道：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	249,203.5	134,507.9	58,548.1	29,794.7	113.8	45.7	472,213.7	65.7	8.7	74.4	799,929.9	15,363.4	5,647.5	4,354.4	10,001.9	6,783.7	0.0	32,149.0	1,304,367.0	
KL	221,190.0	161,293.2	95,258.3	40,814.0	146.3	58.9	518,760.7	24.8	21.6	46.4	878,780.5	26,302.1	7,718.0	6,134.8	13,852.8	10,970.9	0.0	51,125.8	1,448,713.4	
合計	470,393.5	295,801.1	153,806.4	70,608.7	260.1	104.6	990,974.4	90.5	30.3	120.8	1,678,710.4	41,665.5	13,365.5	10,489.2	23,854.7	17,754.6	0.0	83,274.8	2,753,080.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	10,031.8	4,700.1	7,708.2	1,813.1	4.6	2.1	24,259.9	11.8	3.6	15.4	41,096.4	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	68,609.3	0.0
合計	10,031.8	4,700.1	7,708.2	1,813.1	4.6	2.1	24,259.9	11.8	3.6	15.4	41,096.4	1,908.1	315.0	502.9	817.9	511.6	0.0	3,237.6	68,609.3	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	70,316.3	36,818.9	19,807.3	8,054.9	30.4	15.1	135,042.9	41.6	4.6	46.2	228,762.8	5,143.3	1,878.5	2,033.0	3,911.5	2,179.2	0.0	11,234.0	375,085.9	0.0
KL	49,206.4	38,334.2	35,096.5	11,179.0	32.0	15.7	133,863.8	17.7	8.2	25.9	226,765.2	8,517.3	2,178.2	2,393.1	4,571.3	3,455.8	0.0	16,544.4	377,199.3	0.0
合計	119,522.7	75,153.1	54,903.8	19,233.9	62.4	30.8	268,906.7	59.3	12.8	72.1	455,528.0	13,660.6	4,056.7	4,426.1	8,482.8	5,635.0	0.0	27,778.4	752,285.2	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	110,653.0	59,287.0	29,871.2	13,571.8	48.2	22.3	213,453.5	46.5	6.3	52.8	361,590.3	8,090.9	3,060.8	2,838.0	5,898.8	3,692.4	0.0	17,682.1	592,778.7	0.0
KL	80,810.9	63,504.5	49,798.1	17,991.6	54.1	24.8	212,184.0	18.2	13.7	31.9	359,439.4	12,816.3	3,582.1	3,266.2	6,848.3	5,621.1	0.0	25,285.7	596,941.0	0.0
合計	191,463.9	122,791.5	79,669.3	31,563.4	102.3	47.1	425,637.5	64.7	20.0	84.7	721,029.7	20,907.2	6,642.9	6,104.2	12,747.1	9,313.5	0.0	42,967.8	1,189,719.7	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	128,554.2	69,391.2	32,967.9	15,407.0	58.1	25.6	246,404.0	47.8	6.3	54.1	417,408.4	9,140.2	3,521.7	3,090.1	6,611.8	4,293.5	0.0	20,045.5	683,912.0	0.0
KL	96,871.8	78,075.4	55,583.7	21,152.3	69.4	30.0	251,782.6	18.3	14.4	32.7	426,519.4	15,182.1	4,329.0	3,646.8	7,975.8	6,807.2	0.0	29,965.1	708,299.8	0.0
合計	225,426.0	147,466.6	88,551.6	36,559.3	127.5	55.6	498,186.6	66.1	20.7	86.8	843,927.8	24,322.3	7,850.7	6,736.9	14,587.6	11,100.7	0.0	50,010.6	1,392,211.8	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	151,756.9	83,390.5	37,230.6	18,216.0	70.2	29.5	290,693.7	49.3	6.8	56.1	492,435.2	10,944.0	4,182.9	3,412.3	7,595.2	5,122.8	0.0	23,662.0	806,847.0	
KL	124,404.8	97,203.5	63,386.7	25,434.1	87.0	36.0	310,552.1	19.7	14.7	34.4	526,075.1	18,761.6	5,525.3	4,564.1	10,089.4	8,460.5	0.0	37,311.5	873,973.1	
合計	276,161.7	180,594.0	100,617.3	43,650.1	157.2	65.5	601,245.8	69.0	21.5	90.5	1,018,510.3	29,705.6	9,708.2	7,976.4	17,684.6	13,583.3	0.0	60,973.5	1,680,820.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	173,321.8	95,815.5	41,259.0	20,822.8	80.6	33.0	331,332.7	51.0	6.8	57.8	561,277.5	12,588.2	4,841.6	3,819.9	8,661.5	5,901.4	0.0	27,151.1	919,819.1	
KL	147,922.2	112,259.3	69,599.1	28,916.5	102.3	41.5	358,840.9	20.2	16.8	37.0	607,876.4	22,051.3	6,472.2	5,193.4	11,665.6	9,651.3	0.0	43,368.2	1,010,122.5	
合計	321,244.0	208,074.8	110,858.1	49,739.3	182.9	74.5	690,173.6	71.2	23.6	94.8	1,169,153.9	34,639.5	11,313.8	9,013.3	20,327.1	15,552.7	0.0	70,519.3	1,929,941.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	184,275.3	101,008.7	43,340.8	22,053.0	85.6	34.7	350,798.1	51.9	7.0	58.9	594,251.9	13,594.7	5,134.2	4,015.7	9,149.9	6,235.5	0.0	28,980.1	974,089.0	
KL	162,418.1	119,918.9	72,978.1	30,611.7	108.7	44.0	386,079.5	20.3	17.4	37.7	654,018.4	23,714.3	6,999.5	5,695.0	12,694.5	10,193.2	0.0	46,602.0	1,086,737.6	
合計	346,693.4	220,927.6	116,318.9	52,664.7	194.3	78.7	736,877.6	72.2	24.4	96.6	1,248,270.3	37,309.0	12,133.7	9,710.7	21,844.4	16,428.7	0.0	75,582.1	2,060,826.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H29河道：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	203,893.8	110,051.9	47,903.0	24,377.5	93.1	37.4	386,356.7	53.8	7.1	60.9	654,488.1	15,363.4	5,647.5	4,354.4	10,001.9	6,783.7	0.0	32,149.0	1,073,054.7	
KL	180,973.6	131,967.1	77,938.6	33,393.3	119.7	48.2	424,440.5	20.3	17.7	38.0	719,002.2	26,302.1	7,718.0	6,134.8	13,852.8	10,970.9	0.0	51,125.8	1,194,606.5	
合計	384,867.4	242,019.0	125,841.6	57,770.8	212.8	85.6	810,797.2	74.1	24.8	98.9	1,373,490.3	41,665.5	13,365.5	10,489.2	23,854.7	17,754.6	0.0	83,274.8	2,267,661.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	7,543.6	3,116.3	5,527.4	1,204.3	3.2	1.4	17,396.2	12.6	3.9	16.5	29,469.0	1,155.4	192.6	314.8	507.5	297.5	0.0	1,960.4	48,842.0	0.0
合計	7,543.6	3,116.3	5,527.4	1,204.3	3.2	1.4	17,396.2	12.6	3.9	16.5	29,469.0	1,155.4	192.6	314.8	507.5	297.5	0.0	1,960.4	48,842.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	41,086.0	18,608.7	10,903.0	3,916.3	18.9	8.7	74,541.7	39.3	2.7	42.0	126,273.6	2,758.9	885.3	1,248.4	2,133.7	972.7	0.0	5,865.3	206,722.5	0.0
KL	21,632.1	13,527.3	16,864.8	4,376.8	13.0	6.1	56,420.1	14.0	6.2	20.2	95,575.6	3,815.0	735.7	1,083.5	1,819.1	1,180.2	0.0	6,814.3	158,830.2	0.0
合計	62,718.1	32,136.0	27,767.8	8,293.1	32.0	14.8	130,961.7	53.3	8.8	62.2	221,849.2	6,573.9	1,621.0	2,331.8	3,952.8	2,152.9	0.0	12,679.6	365,552.7	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	104,841.3	55,867.4	29,515.7	12,959.0	44.6	21.4	203,249.4	50.2	6.4	56.6	344,304.5	7,063.3	2,616.4	2,565.3	5,181.7	3,106.1	0.0	15,351.1	562,961.6	0.0
KL	75,256.9	57,862.6	49,051.1	16,734.7	48.5	23.1	198,976.9	20.2	13.3	33.5	337,066.8	10,921.6	2,961.1	2,931.6	5,892.7	4,635.6	0.0	21,449.9	557,527.0	0.0
合計	180,098.3	113,730.0	78,566.8	29,693.7	93.1	44.6	402,226.3	70.4	19.7	90.1	681,371.3	17,984.9	5,577.5	5,496.9	11,074.4	7,741.8	0.0	36,801.0	1,120,488.7	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	127,082.6	68,253.4	33,900.3	15,515.2	55.9	25.6	244,832.9	51.8	7.0	58.9	414,747.0	8,314.7	3,162.3	2,892.7	6,055.0	3,822.7	0.0	18,192.4	677,831.2	0.0
KL	96,178.6	76,571.4	57,767.3	21,304.5	66.1	29.5	251,917.4	20.3	15.6	35.9	426,747.8	13,689.0	3,862.0	3,409.1	7,271.1	6,067.3	0.0	27,027.4	705,728.5	0.0
合計	223,261.2	144,824.7	91,667.6	36,819.6	122.0	55.1	496,750.3	72.1	22.7	94.8	841,494.8	22,003.7	7,024.2	6,301.8	13,326.1	9,890.0	0.0	45,219.8	1,383,559.6	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	156,704.3	85,703.6	38,986.9	18,616.7	72.2	30.9	300,114.6	53.7	7.3	61.0	508,394.2	9,973.8	3,883.0	3,265.5	7,148.5	4,733.1	0.0	21,855.4	830,425.2	
KL	125,469.2	97,747.9	66,562.6	25,992.3	86.5	36.6	315,895.0	21.9	16.1	38.0	535,126.0	17,180.9	5,030.6	4,325.8	9,356.4	7,705.4	0.0	34,242.7	885,301.7	
合計	282,173.5	183,451.6	105,549.5	44,608.9	158.7	67.5	616,009.7	75.5	23.4	99.9	1,043,520.1	27,154.7	8,913.6	7,591.2	16,504.8	12,438.5	0.0	56,098.1	1,715,726.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	184,805.4	102,116.9	44,363.5	22,172.3	85.6	35.3	353,578.9	56.1	7.6	63.7	598,962.6	12,056.7	4,642.4	3,719.9	8,362.3	5,647.4	0.0	26,066.4	978,671.6	
KL	155,259.5	118,526.7	75,015.2	30,742.4	106.8	43.7	379,694.2	22.3	18.1	40.4	643,201.9	20,862.2	6,143.0	5,035.8	11,178.8	9,251.9	0.0	41,292.9	1,064,229.4	
合計	340,064.9	220,643.6	119,378.6	52,914.7	192.3	79.0	733,273.1	78.4	25.6	104.1	1,242,164.5	32,918.9	10,785.5	8,755.7	19,541.1	14,899.3	0.0	67,359.3	2,042,901.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	196,826.2	108,591.2	46,484.0	23,565.8	91.7	37.4	375,596.2	57.0	7.6	64.5	636,260.0	12,865.8	4,944.5	3,885.8	8,830.3	6,017.7	0.0	27,713.9	1,039,634.6	
KL	173,141.6	129,061.3	79,211.5	32,903.5	116.4	47.2	414,481.4	22.5	19.1	41.6	702,131.4	22,775.9	6,754.7	5,577.7	12,332.4	9,908.7	0.0	45,017.0	1,161,671.5	
合計	369,967.8	237,652.6	125,695.5	56,469.2	208.1	84.5	790,077.7	79.5	26.7	106.2	1,338,391.4	35,641.7	11,699.2	9,463.6	21,162.8	15,926.5	0.0	72,730.9	2,201,306.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	218,808.9	118,795.1	51,136.0	26,109.7	100.9	40.6	414,991.1	59.0	7.7	66.7	702,994.8	14,735.6	5,464.8	4,236.7	9,701.5	6,593.2	0.0	31,030.3	1,149,083.0	
KL	194,152.2	142,179.1	84,798.5	35,942.1	127.3	51.6	457,250.9	22.6	19.6	42.1	774,582.9	25,276.9	7,471.0	6,029.1	13,500.1	10,679.2	0.0	49,456.1	1,281,332.1	
合計	412,961.2	260,974.2	135,934.5	62,051.8	228.3	92.2	872,242.0	81.5	27.3	108.8	1,477,577.8	40,012.5	12,935.8	10,265.8	23,201.6	17,272.4	0.0	80,486.4	2,430,415.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	8,297.9	3,427.9	6,080.1	1,324.7	3.5	1.5	19,135.6	13.8	4.3	18.1	32,415.9	1,155.4	192.6	314.8	507.4	297.5	0.0	1,960.3	53,529.9	
合計	8,297.9	3,427.9	6,080.1	1,324.7	3.5	1.5	19,135.6	13.8	4.3	18.1	32,415.9	1,155.4	192.6	314.8	507.4	297.5	0.0	1,960.3	53,529.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	45,194.6	20,469.6	11,993.3	4,308.0	20.8	9.6	81,995.9	43.2	2.9	46.1	138,901.0	2,758.9	885.3	1,248.4	2,133.7	972.7	0.0	5,865.3	226,808.3	
KL	23,795.3	14,880.1	18,551.2	4,814.4	14.3	6.7	62,062.0	15.4	6.8	22.2	105,133.1	3,815.0	735.7	1,083.5	1,819.2	1,180.2	0.0	6,814.4	174,031.7	
合計	68,989.9	35,349.7	30,544.5	9,122.4	35.1	16.3	144,057.9	58.6	9.7	68.3	244,034.1	6,573.9	1,621.0	2,331.9	3,952.9	2,152.9	0.0	12,679.7	400,840.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	115,325.4	61,454.1	32,467.2	14,254.9	49.1	23.6	223,574.3	55.2	7.0	62.2	378,735.0	7,063.3	2,616.4	2,565.3	5,181.7	3,106.1	0.0	15,351.1	617,722.6	
KL	82,782.6	63,648.9	53,956.2	18,408.1	53.3	25.4	218,874.5	22.2	14.6	36.8	370,773.4	10,921.6	2,961.1	2,931.6	5,892.7	4,635.6	0.0	21,449.9	611,134.6	
合計	198,108.0	125,103.0	86,423.4	32,663.0	102.4	49.0	442,448.8	77.4	21.6	99.0	749,508.4	17,984.9	5,577.5	5,496.9	11,074.4	7,741.7	0.0	36,801.0	1,228,857.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	139,790.8	75,078.7	37,290.4	17,066.7	61.5	28.1	269,316.2	57.0	7.7	64.7	456,221.7	8,314.7	3,162.3	2,892.7	6,055.0	3,822.7	0.0	18,192.4	743,795.0	
KL	105,796.5	84,228.5	63,544.0	23,434.9	72.7	32.5	277,109.1	22.3	17.2	39.5	469,422.6	13,689.0	3,862.0	3,409.1	7,271.1	6,067.3	0.0	27,027.4	773,598.6	
合計	245,587.3	159,307.2	100,834.4	40,501.6	134.2	60.6	546,425.3	79.3	24.9	104.2	925,644.3	22,003.7	7,024.3	6,301.8	13,326.1	9,890.0	0.0	45,219.8	1,517,393.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	172,374.7	94,274.0	42,885.6	20,478.3	79.4	34.0	330,126.0	59.0	8.0	67.0	559,233.6	9,973.8	3,883.0	3,265.5	7,148.5	4,733.1	0.0	21,855.4	911,282.0	
KL	138,016.1	107,522.7	73,218.8	28,591.5	95.1	40.2	347,484.4	24.1	17.7	41.8	588,638.6	17,180.9	5,030.6	4,325.8	9,356.4	7,705.4	0.0	34,242.7	970,407.5	
合計	310,390.8	201,796.7	116,104.4	49,069.8	174.5	74.2	677,610.4	83.1	25.7	108.8	1,147,872.2	27,154.7	8,913.6	7,591.3	16,504.9	12,438.5	0.0	56,098.1	1,881,689.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	203,285.9	112,328.6	48,799.8	24,389.5	94.1	38.8	388,936.7	61.7	8.3	70.0	658,858.8	12,056.7	4,642.4	3,719.9	8,362.3	5,647.4	0.0	26,066.4	1,073,931.9	
KL	170,785.5	130,379.4	82,516.7	33,816.7	117.4	48.0	417,663.7	24.5	19.9	44.4	707,522.1	20,862.2	6,143.0	5,035.8	11,178.8	9,251.9	0.0	41,292.9	1,166,523.1	
合計	374,071.4	242,708.0	131,316.5	58,206.2	211.5	86.8	806,600.4	86.2	28.2	114.4	1,366,380.9	32,918.9	10,785.4	8,755.7	19,541.1	14,899.3	0.0	67,359.3	2,240,455.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	216,508.9	119,450.4	51,132.4	25,922.4	100.8	41.1	413,156.0	62.7	8.3	71.0	699,886.0	12,865.8	4,944.5	3,885.8	8,830.3	6,017.7	0.0	27,713.8	1,140,826.8	
KL	190,455.7	141,967.5	87,132.6	36,193.8	128.0	51.9	455,929.5	24.8	21.0	45.8	772,344.6	22,775.9	6,754.7	5,577.7	12,332.4	9,908.7	0.0	45,017.0	1,273,336.9	
合計	406,964.6	261,417.9	138,265.0	62,116.2	228.8	93.0	869,085.5	87.5	29.3	116.8	1,472,230.6	35,641.7	11,699.2	9,463.5	21,162.7	15,926.4	0.0	72,730.8	2,414,163.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	240,689.8	130,674.6	56,249.6	28,720.6	111.0	44.6	456,490.2	64.9	8.5	73.4	773,294.3	14,735.6	5,464.8	4,236.7	9,701.5	6,593.2	0.0	31,030.3	1,260,888.2	
KL	213,567.5	156,397.0	93,278.3	39,536.4	140.1	56.8	502,976.1	24.8	21.5	46.3	852,041.2	25,276.9	7,471.0	6,029.1	13,500.1	10,679.2	0.0	49,456.2	1,404,519.8	
合計	454,257.3	287,071.6	149,527.9	68,257.0	251.1	101.4	959,466.3	89.7	30.0	119.7	1,625,335.5	40,012.5	12,935.8	10,265.8	23,201.6	17,272.4	0.0	80,486.5	2,665,408.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	6,789.2	2,804.7	4,974.6	1,083.9	2.8	1.3	15,656.5	11.3	3.5	14.8	26,522.1	1,155.4	192.6	314.8	507.4	297.5	0.0	1,960.3	44,153.7	
合計	6,789.2	2,804.7	4,974.6	1,083.9	2.8	1.3	15,656.5	11.3	3.5	14.8	26,522.1	1,155.4	192.6	314.8	507.4	297.5	0.0	1,960.3	44,153.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	36,977.4	16,747.8	9,812.7	3,524.7	17.0	7.8	67,087.4	35.4	2.4	37.8	113,646.3	2,758.9	885.3	1,248.4	2,133.7	972.7	0.0	5,865.3	186,636.8	
KL	19,468.9	12,174.6	15,178.3	3,939.1	11.7	5.5	50,778.1	12.6	5.5	18.1	86,018.0	3,815.0	735.7	1,083.5	1,819.2	1,180.2	0.0	6,814.4	143,628.6	
合計	56,446.3	28,922.4	24,991.0	7,463.8	28.7	13.3	117,865.5	48.0	7.9	55.9	199,664.3	6,573.9	1,621.0	2,331.9	3,952.9	2,152.9	0.0	12,679.7	330,265.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	94,357.2	50,280.6	26,564.1	11,663.1	40.2	19.3	182,924.5	45.2	5.7	50.9	309,874.1	7,063.3	2,616.4	2,565.3	5,181.7	3,106.1	0.0	15,351.1	508,200.6	
KL	67,731.2	52,076.4	44,146.0	15,061.2	43.6	20.8	179,079.2	18.2	12.0	30.2	303,360.1	10,921.6	2,961.1	2,931.6	5,892.7	4,635.6	0.0	21,449.9	503,919.4	
合計	162,088.4	102,357.0	70,710.1	26,724.3	83.8	40.1	362,003.7	63.4	17.7	81.1	613,234.2	17,984.9	5,577.5	5,496.9	11,074.4	7,741.7	0.0	36,801.0	1,012,120.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	114,374.3	61,428.0	30,510.3	13,963.6	50.3	23.0	220,349.5	46.7	6.3	53.0	373,272.3	8,314.7	3,162.3	2,892.7	6,055.0	3,822.7	0.0	18,192.4	611,867.2	
KL	86,560.8	68,914.2	51,990.6	19,174.0	59.5	26.6	226,725.7	18.3	14.1	32.4	384,073.0	13,689.0	3,862.0	3,409.1	7,271.1	6,067.3	0.0	27,027.4	637,858.5	
合計	200,935.1	130,342.2	82,500.9	33,137.6	109.8	49.6	447,075.2	65.0	20.4	85.4	757,345.3	22,003.7	7,024.3	6,301.8	13,326.1	9,890.0	0.0	45,219.8	1,249,725.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	141,033.9	77,133.3	35,088.2	16,755.0	65.0	27.8	270,103.2	48.3	6.6	54.9	457,554.8	9,973.8	3,883.0	3,265.5	7,148.5	4,733.1	0.0	21,855.4	749,568.3	
KL	112,922.3	87,973.1	59,906.3	23,393.0	77.8	32.9	284,305.4	19.7	14.5	34.2	481,613.4	17,180.9	5,030.6	4,325.8	9,356.4	7,705.4	0.0	34,242.7	800,195.7	
合計	253,956.2	165,106.4	94,994.5	40,148.0	142.8	60.7	554,408.6	68.0	21.1	89.1	939,168.2	27,154.7	8,913.6	7,591.3	16,504.9	12,438.5	0.0	56,098.1	1,549,764.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	166,324.8	91,905.2	39,927.1	19,955.1	77.0	31.8	318,221.0	50.5	6.8	57.3	539,066.3	12,056.7	4,642.4	3,719.9	8,362.3	5,647.4	0.0	26,066.4	883,411.0	
KL	139,733.6	106,674.1	67,513.7	27,668.2	96.1	39.3	341,725.0	20.1	16.3	36.4	578,881.7	20,862.2	6,143.0	5,035.8	11,178.8	9,251.9	0.0	41,292.9	961,936.0	
合計	306,058.4	198,579.3	107,440.8	47,623.3	173.1	71.1	659,946.0	70.6	23.1	93.7	1,117,948.0	32,918.9	10,785.4	8,755.7	19,541.1	14,899.3	0.0	67,359.3	1,845,347.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	177,143.6	97,732.1	41,835.6	21,209.2	82.5	33.6	338,036.6	51.3	6.8	58.1	572,634.0	12,865.8	4,944.5	3,885.8	8,830.3	6,017.7	0.0	27,713.8	938,442.5	
KL	155,827.4	116,155.2	71,290.3	29,613.1	104.8	42.5	373,033.3	20.3	17.2	37.5	631,918.3	22,775.9	6,754.7	5,577.7	12,332.4	9,908.7	0.0	45,017.0	1,050,006.1	
合計	332,971.0	213,887.3	113,125.9	50,822.3	187.3	76.1	711,069.9	71.6	24.0	95.6	1,204,552.3	35,641.7	11,699.2	9,463.5	21,162.7	15,926.4	0.0	72,730.8	1,988,448.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

緊特河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	196,928.0	106,915.6	46,022.4	23,498.7	90.8	36.5	373,492.0	53.1	7.0	60.1	632,695.4	14,735.6	5,464.8	4,236.7	9,701.5	6,593.2	0.0	31,030.3	1,037,277.8	
KL	174,737.0	127,961.2	76,318.6	32,347.9	114.6	46.4	411,525.7	20.3	17.6	37.9	697,124.6	25,276.9	7,471.0	6,029.1	13,500.1	10,679.2	0.0	49,456.2	1,158,144.4	
合計	371,665.0	234,876.8	122,341.0	55,846.6	205.4	82.9	785,017.7	73.4	24.6	98.0	1,329,820.0	40,012.5	12,935.8	10,265.8	23,201.6	17,272.4	0.0	80,486.5	2,195,422.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	3,964.8	1,045.2	2,732.8	542.9	1.0	0.5	8,287.2	10.4	3.0	13.4	14,038.5	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	23,332.7	
合計	3,964.8	1,045.2	2,732.8	542.9	1.0	0.5	8,287.2	10.4	3.0	13.4	14,038.5	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	23,332.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	12,786.4	6,940.3	9,109.1	2,164.7	6.1	2.8	31,009.5	13.3	4.0	17.3	52,530.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.4	87,193.2	
合計	12,786.4	6,940.3	9,109.1	2,164.7	6.1	2.8	31,009.5	13.3	4.0	17.3	52,530.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.4	87,193.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	93,305.6	49,358.6	26,718.8	11,406.5	39.3	19.3	180,848.1	48.5	6.1	54.6	306,356.7	6,296.5	2,306.4	2,353.6	4,660.0	2,710.7	0.0	13,667.1	500,926.4	
KL	60,897.3	47,375.5	42,247.8	13,705.2	40.0	19.5	164,285.2	19.9	11.1	30.9	278,299.1	9,244.9	2,419.0	2,573.5	4,992.5	3,817.2	0.0	18,054.7	460,669.9	
合計	154,202.8	96,734.0	68,966.6	25,111.7	79.3	38.8	345,133.3	68.4	17.2	85.5	584,655.7	15,541.4	4,725.4	4,927.1	9,652.5	6,527.9	0.0	31,721.8	961,596.3	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	114,705.6	61,275.6	31,593.1	14,138.5	49.4	23.2	221,785.5	51.1	6.7	57.9	375,704.7	7,637.9	2,864.1	2,725.2	5,589.3	3,436.1	0.0	16,663.3	614,211.4	
KL	82,006.4	63,335.6	51,953.8	18,220.4	52.8	24.9	215,593.9	20.2	14.5	34.7	365,215.9	11,726.2	3,234.2	3,083.1	6,317.2	5,061.1	0.0	23,104.5	603,949.1	
合計	196,712.0	124,611.2	83,546.9	32,358.9	102.3	48.1	437,379.4	71.3	21.3	92.6	740,920.6	19,364.1	6,098.3	5,808.3	11,906.6	8,497.2	0.0	39,767.8	1,218,160.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	142,744.2	77,008.2	36,559.4	17,072.3	64.4	28.4	273,476.9	53.2	7.0	60.2	463,269.9	9,107.8	3,518.2	3,087.6	6,605.8	4,284.5	0.0	19,998.1	756,805.0	
KL	103,100.9	82,603.6	60,107.8	22,551.2	72.6	31.8	268,468.0	20.3	16.0	36.3	454,784.5	14,520.2	4,139.2	3,551.5	7,690.7	6,484.4	0.0	28,695.3	751,984.1	
合計	245,845.1	159,611.8	96,667.1	39,623.5	137.1	60.3	541,944.9	73.5	23.0	96.5	918,054.4	23,628.0	7,657.4	6,639.0	14,296.5	10,768.9	0.0	48,693.4	1,508,789.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	169,542.1	93,192.0	41,473.3	20,310.3	78.5	33.0	324,629.1	54.9	7.6	62.4	549,921.7	10,978.4	4,200.5	3,411.8	7,612.2	5,139.6	0.0	23,730.2	898,343.4	
KL	125,229.4	101,573.5	67,336.2	26,808.7	91.8	38.4	321,078.0	20.4	16.1	36.5	543,905.9	17,328.8	5,017.8	3,965.8	8,983.7	7,883.5	0.0	34,195.9	899,216.4	
合計	294,771.5	194,765.5	108,809.5	47,119.0	170.3	71.4	645,707.1	75.2	23.7	98.9	1,093,827.6	28,307.2	9,218.3	7,377.6	16,595.9	13,023.0	0.0	57,926.1	1,797,559.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	180,875.5	100,251.4	43,651.7	21,797.3	84.5	34.9	346,695.3	55.9	7.6	63.4	587,301.8	11,779.5	4,504.9	3,545.6	8,050.5	5,513.7	0.0	25,343.7	959,404.1	
KL	137,077.2	110,519.4	70,830.7	28,821.3	101.0	41.6	347,391.1	20.5	17.8	38.3	588,480.4	18,818.0	5,466.8	4,184.6	9,651.4	8,541.5	0.0	37,010.9	972,920.6	
合計	317,952.7	210,770.8	114,482.4	50,618.6	185.6	76.5	694,086.4	76.4	25.3	101.7	1,175,782.1	30,597.4	9,971.7	7,730.2	17,701.8	14,055.3	0.0	62,354.5	1,932,324.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	201,191.8	110,833.9	47,601.1	24,290.8	94.3	38.3	384,050.1	57.6	7.7	65.3	650,580.8	13,339.1	5,010.0	3,823.0	8,833.0	6,127.8	0.0	28,300.0	1,062,996.1	
KL	156,654.7	123,657.6	75,940.5	31,891.1	114.9	46.5	388,305.3	20.9	19.2	40.1	657,789.0	21,350.7	6,172.9	4,526.1	10,699.0	9,429.9	0.0	41,479.6	1,087,614.0	
合計	357,846.5	234,491.5	123,541.6	56,181.8	209.2	84.8	772,355.4	78.5	26.9	105.4	1,308,369.7	34,689.8	11,182.9	8,349.1	19,532.1	15,557.7	0.0	69,779.6	2,150,610.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	4,361.3	1,149.7	3,006.1	597.2	1.1	0.5	9,115.9	11.5	3.3	14.8	15,442.3	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	25,566.6	
合計	4,361.3	1,149.7	3,006.1	597.2	1.1	0.5	9,115.9	11.5	3.3	14.8	15,442.3	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	25,566.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	14,065.1	7,634.3	10,020.0	2,381.2	6.8	3.1	34,110.5	14.6	4.4	19.0	57,783.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.5	95,549.0	
合計	14,065.1	7,634.3	10,020.0	2,381.2	6.8	3.1	34,110.5	14.6	4.4	19.0	57,783.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.5	95,549.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	102,636.1	54,294.4	29,390.7	12,547.1	43.2	21.2	198,932.7	53.4	6.7	60.1	336,992.3	6,296.5	2,306.4	2,353.6	4,660.0	2,710.7	0.0	13,667.2	549,652.3	
KL	66,987.0	52,113.0	46,472.6	15,075.8	44.1	21.4	180,713.9	21.8	12.2	34.0	306,129.0	9,244.9	2,419.0	2,573.5	4,992.5	3,817.2	0.0	18,054.6	504,931.5	
合計	169,623.1	106,407.4	75,863.3	27,622.9	87.3	42.6	379,646.6	75.2	18.9	94.1	643,121.3	15,541.4	4,725.4	4,927.1	9,652.5	6,527.9	0.0	31,721.8	1,054,583.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	126,176.2	67,403.2	34,752.5	15,552.3	54.4	25.6	243,964.2	56.2	7.4	63.6	413,275.2	7,637.9	2,864.1	2,725.2	5,589.3	3,436.1	0.0	16,663.3	673,966.3	
KL	90,207.0	69,669.2	57,149.2	20,042.5	58.1	27.4	237,153.4	22.2	16.0	38.2	401,737.5	11,726.2	3,234.2	3,083.1	6,317.3	5,061.1	0.0	23,104.6	662,033.7	
合計	216,383.2	137,072.4	91,901.7	35,594.8	112.5	53.0	481,117.6	78.4	23.4	101.8	815,012.7	19,364.1	6,098.3	5,808.3	11,906.6	8,497.2	0.0	39,767.9	1,336,000.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	157,018.6	84,709.0	40,215.3	18,779.5	70.9	31.3	300,824.6	58.5	7.7	66.2	509,596.9	9,107.8	3,518.2	3,087.6	6,605.8	4,284.5	0.0	19,998.1	830,485.8	
KL	113,411.0	90,864.0	66,118.5	24,806.4	79.9	35.0	295,314.8	22.3	17.6	39.9	500,262.9	14,520.2	4,139.2	3,551.5	7,690.7	6,484.4	0.0	28,695.3	824,312.9	
合計	270,429.6	175,573.0	106,333.8	43,585.9	150.8	66.3	596,139.4	80.8	25.3	106.1	1,009,859.8	23,628.0	7,657.4	6,639.1	14,296.5	10,768.9	0.0	48,693.4	1,654,798.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	186,496.3	102,511.2	45,620.6	22,341.3	86.3	36.3	357,092.0	60.3	8.3	68.6	604,913.9	10,978.4	4,200.5	3,411.8	7,612.3	5,139.6	0.0	23,730.3	985,804.8	
KL	137,752.4	111,730.8	74,069.9	29,489.5	101.0	42.2	353,185.8	22.4	17.7	40.1	598,296.5	17,328.8	5,017.8	3,965.8	8,983.6	7,883.5	0.0	34,195.9	985,718.3	
合計	324,248.7	214,242.0	119,690.5	51,830.8	187.3	78.5	710,277.8	82.7	26.0	108.7	1,203,210.4	28,307.2	9,218.3	7,377.6	16,595.9	13,023.1	0.0	57,926.2	1,971,523.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	198,963.0	110,276.6	48,016.8	23,977.0	93.0	38.4	381,364.8	61.5	8.3	69.8	646,031.9	11,779.5	4,504.9	3,545.6	8,050.5	5,513.7	0.0	25,343.7	1,052,810.2	
KL	150,784.9	121,571.3	77,913.8	31,703.4	111.1	45.7	382,130.2	22.6	19.6	42.2	647,328.4	18,818.0	5,466.8	4,184.6	9,651.4	8,541.5	0.0	37,010.9	1,066,511.7	
合計	349,747.9	231,847.9	125,930.6	55,680.4	204.1	84.1	763,495.0	84.1	27.9	112.0	1,293,360.3	30,597.5	9,971.7	7,730.2	17,701.9	14,055.2	0.0	62,354.6	2,119,321.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	221,311.0	121,917.3	52,361.2	26,719.8	103.7	42.1	422,455.1	63.3	8.5	71.8	715,638.8	13,339.1	5,010.0	3,823.0	8,833.0	6,127.8	0.0	28,299.9	1,166,465.6	
KL	172,320.2	136,023.4	83,534.6	35,080.2	126.3	51.2	427,135.9	23.0	21.1	44.1	723,567.9	21,350.7	6,172.9	4,526.1	10,699.0	9,429.9	0.0	41,479.6	1,192,227.5	
合計	393,631.2	257,940.7	135,895.8	61,800.0	230.0	93.3	849,591.0	86.3	29.6	115.9	1,439,206.7	34,689.8	11,182.9	8,349.1	19,532.0	15,557.7	0.0	69,779.5	2,358,693.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	3,568.4	940.6	2,459.5	488.6	0.9	0.4	7,458.4	9.4	2.7	12.1	12,634.6	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	21,098.7		
合計	3,568.4	940.6	2,459.5	488.6	0.9	0.4	7,458.4	9.4	2.7	12.1	12,634.6	629.5	85.6	145.5	231.1	133.0	0.0	993.6	21,098.7		

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	11,507.8	6,246.3	8,198.2	1,948.2	5.5	2.5	27,908.5	12.0	3.6	15.6	47,277.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.5	78,837.6		
合計	11,507.8	6,246.3	8,198.2	1,948.2	5.5	2.5	27,908.5	12.0	3.6	15.6	47,277.0	2,066.1	390.7	601.4	992.1	578.3	0.0	3,636.5	78,837.6		

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	83,975.0	44,422.7	24,046.9	10,265.8	35.4	17.4	162,763.2	43.7	5.5	49.2	275,721.0	6,296.5	2,306.4	2,353.6	4,660.0	2,710.7	0.0	13,667.2	452,200.6	
KL	54,807.5	42,637.9	38,023.0	12,334.7	36.0	17.5	147,856.6	17.9	10.0	27.9	250,469.2	9,244.9	2,419.0	2,573.5	4,992.5	3,817.2	0.0	18,054.6	416,408.3	
合計	138,782.5	87,060.6	62,069.9	22,600.5	71.4	34.9	310,619.8	61.6	15.5	77.1	526,190.2	15,541.4	4,725.4	4,927.1	9,652.5	6,527.9	0.0	31,721.8	868,608.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	103,235.1	55,148.0	28,433.8	12,724.6	44.5	20.9	199,606.9	46.0	6.1	52.1	338,134.2	7,637.9	2,864.1	2,725.2	5,589.3	3,436.1	0.0	16,663.3	554,456.5	
KL	73,805.7	57,002.0	46,758.4	16,398.4	47.6	22.4	194,034.5	18.2	13.1	31.3	328,694.3	11,726.2	3,234.2	3,083.1	6,317.3	5,061.1	0.0	23,104.6	545,864.7	
合計	177,040.8	112,150.0	75,192.2	29,123.0	92.1	43.3	393,641.4	64.2	19.2	83.4	666,828.5	19,364.1	6,098.3	5,808.3	11,906.6	8,497.2	0.0	39,767.9	1,100,321.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	128,469.7	69,307.4	32,903.5	15,365.1	58.0	25.6	246,129.3	47.8	6.3	54.1	416,942.9	9,107.8	3,518.2	3,087.6	6,605.8	4,284.5	0.0	19,998.1	683,124.4	
KL	92,790.8	74,343.2	54,097.0	20,296.1	65.4	28.7	241,621.2	18.3	14.4	32.7	409,306.0	14,520.2	4,139.2	3,551.5	7,690.7	6,484.4	0.0	28,695.3	679,655.2	
合計	221,260.5	143,650.6	87,000.5	35,661.2	123.4	54.3	487,750.5	66.1	20.7	86.8	826,248.9	23,628.0	7,657.4	6,639.1	14,296.5	10,768.9	0.0	48,693.4	1,362,779.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	152,587.9	83,872.8	37,325.9	18,279.3	70.6	29.7	292,166.2	49.4	6.8	56.2	494,929.5	10,978.4	4,200.5	3,411.8	7,612.3	5,139.6	0.0	23,730.3	810,882.2	
KL	112,706.5	91,416.1	60,602.6	24,127.8	82.6	34.6	288,970.2	18.4	14.5	32.9	489,515.3	17,328.8	5,017.8	3,965.8	8,983.6	7,883.5	0.0	34,195.9	812,714.3	
合計	265,294.4	175,288.9	97,928.5	42,407.1	153.2	64.3	581,136.4	67.8	21.3	89.1	984,444.8	28,307.2	9,218.3	7,377.6	16,595.9	13,023.1	0.0	57,926.2	1,623,596.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	162,787.9	90,226.3	39,286.5	19,617.6	76.1	31.4	312,025.8	50.3	6.8	57.1	528,571.6	11,779.5	4,504.9	3,545.6	8,050.5	5,513.7	0.0	25,343.7	865,998.2	
KL	123,369.5	99,467.4	63,747.6	25,939.1	90.9	37.4	312,651.9	18.5	16.0	34.5	529,632.3	18,818.0	5,466.8	4,184.6	9,651.4	8,541.5	0.0	37,010.9	879,329.6	
合計	286,157.4	189,693.7	103,034.1	45,556.7	167.0	68.8	624,677.7	68.8	22.8	91.6	1,058,203.9	30,597.5	9,971.7	7,730.2	17,701.9	14,055.2	0.0	62,354.6	1,745,327.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

H16対応河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	181,072.6	99,750.5	42,841.0	21,861.7	84.9	34.4	345,645.1	51.8	7.0	58.8	585,522.7	13,339.1	5,010.0	3,823.0	8,833.0	6,127.8	0.0	28,299.9	959,526.5	
KL	140,989.2	111,291.8	68,346.5	28,702.0	103.4	41.9	349,474.8	18.8	17.3	36.1	592,010.1	21,350.7	6,172.9	4,526.1	10,699.0	9,429.9	0.0	41,479.6	983,000.6	
合計	322,061.8	211,042.3	111,187.5	50,563.7	188.3	76.3	695,119.9	70.6	24.3	94.9	1,177,532.8	34,689.8	11,182.9	8,349.1	19,532.0	15,557.7	0.0	69,779.5	1,942,527.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	2,544.7	501.7	1,766.0	344.0	0.5	0.2	5,157.1	8.8	2.7	11.5	8,736.2	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.2	14,558.0	0.0	
合計	2,544.7	501.7	1,766.0	344.0	0.5	0.2	5,157.1	8.8	2.7	11.5	8,736.2	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.2	14,558.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	11,857.9	6,440.8	8,533.3	2,005.6	5.6	2.6	28,845.8	13.1	4.0	17.1	48,864.7	1,889.6	357.2	550.9	908.0	527.1	0.0	3,324.7	81,052.3	0.0	
合計	11,857.9	6,440.8	8,533.3	2,005.6	5.6	2.6	28,845.8	13.1	4.0	17.1	48,864.7	1,889.6	357.2	550.9	908.0	527.1	0.0	3,324.7	81,052.3	0.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	36,895.0	16,321.4	9,351.8	3,288.0	17.1	7.7	65,881.0	38.3	2.4	40.7	111,602.4	2,467.1	793.7	1,162.1	1,955.7	847.8	0.0	5,270.6	182,794.7	0.0
KL	16,663.5	9,881.3	13,816.5	3,511.9	9.7	4.4	43,887.3	13.7	4.3	18.1	74,345.1	3,148.7	547.3	832.0	1,379.2	918.7	0.0	5,446.6	123,697.1	0.0
合計	53,558.5	26,202.7	23,168.2	6,799.9	26.8	12.2	109,768.3	52.1	6.7	58.8	185,947.5	5,615.8	1,340.9	1,994.0	3,335.0	1,766.4	0.0	10,717.2	306,491.7	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	89,905.1	47,498.6	25,602.8	10,806.0	38.1	18.8	173,869.4	48.0	6.1	54.1	294,534.8	6,022.7	2,211.6	2,279.7	4,491.3	2,592.3	0.0	13,106.3	481,564.7	
KL	53,867.5	41,964.7	38,662.2	12,262.0	35.1	17.2	146,808.7	19.4	9.1	28.5	248,693.8	8,430.4	2,143.5	2,371.4	4,514.9	3,407.1	0.0	16,352.4	411,883.3	
合計	143,772.6	89,463.3	64,265.0	23,068.0	73.2	36.0	320,678.1	67.4	15.2	82.6	543,228.6	14,453.1	4,355.1	4,651.2	9,006.2	5,999.4	0.0	29,458.7	893,448.0	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	112,629.0	60,243.8	31,155.1	13,868.1	48.5	22.9	217,967.4	51.0	6.6	57.6	369,236.9	7,502.7	2,819.4	2,697.9	5,517.3	3,366.7	0.0	16,386.7	603,648.7	
KL	73,157.3	56,382.9	48,078.2	16,215.8	47.3	22.7	193,904.1	20.2	13.1	33.2	328,473.4	10,652.3	2,882.7	2,886.3	5,769.1	4,518.7	0.0	20,940.1	543,350.8	
合計	185,786.3	116,626.7	79,233.3	30,083.9	95.8	45.6	411,871.5	71.2	19.7	90.9	697,710.3	18,155.1	5,702.1	5,584.3	11,286.4	7,885.3	0.0	37,326.8	1,146,999.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	123,935.3	66,587.2	33,360.2	15,185.9	54.2	25.0	239,147.6	51.6	7.0	58.6	405,116.1	8,139.8	3,093.8	2,855.4	5,949.2	3,728.9	0.0	17,817.9	662,140.4	
KL	82,654.3	63,869.6	52,294.0	18,387.7	53.4	25.1	217,283.9	20.2	14.5	34.7	368,078.8	11,820.7	3,258.6	3,099.1	6,357.8	5,107.2	0.0	23,285.6	608,683.1	
合計	206,589.5	130,456.7	85,654.1	33,573.6	107.6	50.1	456,431.6	71.8	21.6	93.4	773,195.0	19,960.4	6,352.5	5,954.5	12,307.0	8,836.1	0.0	41,103.5	1,270,823.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	144,962.9	78,458.4	36,896.0	17,301.1	65.8	28.8	277,713.0	53.3	7.1	60.4	470,445.9	9,241.3	3,575.5	3,112.3	6,687.8	4,358.4	0.0	20,287.5	768,506.8	
KL	98,327.7	78,419.5	58,452.4	21,662.3	68.3	30.3	256,960.5	20.3	15.9	36.2	435,290.8	13,930.9	3,948.4	3,452.7	7,401.1	6,190.2	0.0	27,522.2	719,809.7	
合計	243,290.6	156,877.9	95,348.3	38,963.4	134.1	59.1	534,673.5	73.6	23.0	96.6	905,736.7	23,172.2	7,523.9	6,565.0	14,088.8	10,548.6	0.0	47,809.6	1,488,316.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	2,799.1	551.9	1,942.6	378.4	0.6	0.3	5,672.9	9.7	3.0	12.7	9,609.8	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.3	15,948.7	
合計	2,799.1	551.9	1,942.6	378.4	0.6	0.3	5,672.9	9.7	3.0	12.7	9,609.8	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.3	15,948.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
KL	13,043.6	7,084.8	9,386.7	2,206.2	6.2	2.8	31,730.3	14.4	4.4	18.8	53,751.2	1,889.6	357.2	550.9	908.1	527.1	0.0	3,324.8	88,825.1	
合計	13,043.6	7,084.8	9,386.7	2,206.2	6.2	2.8	31,730.3	14.4	4.4	18.8	53,751.2	1,889.6	357.2	550.9	908.1	527.1	0.0	3,324.8	88,825.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	40,584.5	17,953.6	10,286.9	3,616.8	18.8	8.5	72,469.1	42.2	2.6	44.8	122,762.7	2,467.1	793.7	1,162.1	1,955.8	847.8	0.0	5,270.7	200,547.3	
KL	18,329.9	10,869.5	15,198.1	3,863.1	10.7	4.9	48,276.2	15.1	4.8	19.9	81,779.6	3,148.7	547.3	832.0	1,379.3	918.7	0.0	5,446.7	135,522.4	
合計	58,914.4	28,823.1	25,485.0	7,479.9	29.5	13.4	120,745.3	57.3	7.4	64.7	204,542.3	5,615.8	1,341.0	1,994.1	3,335.1	1,766.5	0.0	10,717.4	336,069.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	98,895.6	52,248.4	28,163.1	11,886.6	42.0	20.7	191,256.4	52.8	6.7	59.5	323,988.3	6,022.7	2,211.6	2,279.7	4,491.3	2,592.3	0.0	13,106.3	528,410.5	
KL	59,254.2	46,161.2	42,528.4	13,488.2	38.6	18.9	161,489.5	21.4	10.0	31.4	273,563.1	8,430.4	2,143.5	2,371.4	4,514.9	3,407.1	0.0	16,352.4	451,436.4	
合計	158,149.8	98,409.6	70,691.5	25,374.8	80.6	39.6	352,745.9	74.2	16.7	90.9	597,551.4	14,453.1	4,355.1	4,651.1	9,006.2	5,999.4	0.0	29,458.7	979,846.9	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	123,891.9	66,268.2	34,270.6	15,254.9	53.4	25.2	239,764.2	56.1	7.3	63.4	406,160.6	7,502.7	2,819.4	2,697.9	5,517.3	3,366.7	0.0	16,386.7	662,374.9	
KL	80,473.0	62,021.2	52,886.0	17,837.4	52.0	24.9	213,294.5	22.2	14.4	36.6	361,320.7	10,652.3	2,882.7	2,886.3	5,769.0	4,518.7	0.0	20,940.0	595,591.8	
合計	204,364.9	128,289.4	87,156.6	33,092.3	105.4	50.1	453,058.7	78.3	21.7	100.0	767,481.3	18,155.0	5,702.1	5,584.2	11,286.3	7,885.4	0.0	37,326.7	1,257,966.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	136,328.8	73,245.9	36,696.2	16,704.5	59.6	27.5	263,062.5	56.8	7.7	64.5	445,627.8	8,139.8	3,093.8	2,855.4	5,949.2	3,728.9	0.0	17,817.9	726,572.7	
KL	90,919.7	70,256.5	57,523.4	20,226.5	58.7	27.6	239,012.4	22.2	16.0	38.2	404,886.7	11,820.7	3,258.6	3,099.1	6,357.7	5,107.2	0.0	23,285.6	667,222.9	
合計	227,248.5	143,502.4	94,219.6	36,931.0	118.3	55.1	502,074.9	79.0	23.7	102.7	850,514.5	19,960.5	6,352.4	5,954.5	12,306.9	8,836.1	0.0	41,103.5	1,393,795.6	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	159,459.2	86,304.2	40,585.6	19,031.3	72.4	31.7	305,484.4	58.6	7.8	66.4	517,490.5	9,241.3	3,575.5	3,112.3	6,687.8	4,358.4	0.0	20,287.5	843,328.8	
KL	108,160.5	86,261.5	64,297.6	23,828.5	75.1	33.3	282,656.5	22.3	17.5	39.8	478,819.9	13,930.9	3,948.4	3,452.7	7,401.1	6,190.2	0.0	27,522.2	789,038.4	
合計	267,619.7	172,565.7	104,883.2	42,859.8	147.5	65.0	588,140.9	80.9	25.3	106.2	996,310.4	23,172.2	7,523.9	6,565.0	14,088.9	10,548.6	0.0	47,809.7	1,632,367.2	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/2

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/5

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/10

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	2,290.2	451.5	1,589.4	309.6	0.5	0.2	4,641.4	7.9	2.4	10.3	7,862.5	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.3	13,167.5	
合計	2,290.2	451.5	1,589.4	309.6	0.5	0.2	4,641.4	7.9	2.4	10.3	7,862.5	450.0	44.2	75.9	120.1	83.2	0.0	653.3	13,167.5	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/20

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KL	10,672.1	5,796.7	7,680.0	1,805.1	5.1	2.3	25,961.3	11.8	3.6	15.4	43,978.3	1,889.6	357.2	550.9	908.1	527.1	0.0	3,324.8	73,279.8	
合計	10,672.1	5,796.7	7,680.0	1,805.1	5.1	2.3	25,961.3	11.8	3.6	15.4	43,978.3	1,889.6	357.2	550.9	908.1	527.1	0.0	3,324.8	73,279.8	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/30

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	33,205.5	14,689.3	8,416.6	2,959.2	15.4	7.0	59,293.0	34.5	2.1	36.6	100,442.2	2,467.1	793.7	1,162.1	1,955.8	847.8	0.0	5,270.7	165,042.5	
KL	14,997.2	8,893.2	12,434.8	3,160.7	8.7	4.0	39,498.6	12.4	3.9	16.3	66,910.6	3,148.7	547.3	832.0	1,379.3	918.7	0.0	5,446.7	111,872.2	
合計	48,202.7	23,582.5	20,851.4	6,119.9	24.1	11.0	98,791.6	46.9	6.0	52.9	167,352.8	5,615.8	1,341.0	1,994.1	3,335.1	1,766.5	0.0	10,717.4	276,914.7	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/50

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	80,914.6	42,748.7	23,042.5	9,725.4	34.3	16.9	156,482.4	43.2	5.5	48.7	265,081.4	6,022.7	2,211.6	2,279.7	4,491.3	2,592.3	0.0	13,106.3	434,718.8	
KL	48,480.7	37,768.2	34,796.0	11,035.8	31.6	15.5	132,127.8	17.5	8.2	25.7	223,824.4	8,430.4	2,143.5	2,371.4	4,514.9	3,407.1	0.0	16,352.4	372,330.3	
合計	129,395.3	80,516.9	57,838.5	20,761.2	65.9	32.4	288,610.2	60.7	13.7	74.4	488,905.8	14,453.1	4,355.1	4,651.1	9,006.2	5,999.4	0.0	29,458.7	807,049.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/80

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	101,366.1	54,219.4	28,039.6	12,481.3	43.7	20.6	196,170.7	45.9	6.0	51.9	332,313.2	7,502.7	2,819.4	2,697.9	5,517.3	3,366.7	0.0	16,386.7	544,922.5	
KL	65,841.6	50,744.6	43,270.4	14,594.2	42.5	20.4	174,513.7	18.1	11.8	29.9	295,626.0	10,652.3	2,882.7	2,886.3	5,769.0	4,518.7	0.0	20,940.0	491,109.6	
合計	167,207.7	104,964.0	71,310.0	27,075.5	86.2	41.0	370,684.4	64.0	17.8	81.8	627,939.2	18,155.0	5,702.1	5,584.2	11,286.3	7,885.4	0.0	37,326.7	1,036,032.1	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/100

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	111,541.7	59,928.4	30,024.2	13,667.3	48.8	22.5	215,232.9	46.5	6.3	52.8	364,604.5	8,139.8	3,093.8	2,855.4	5,949.2	3,728.9	0.0	17,817.9	597,708.1	
KL	74,388.8	57,482.6	47,064.6	16,548.9	48.0	22.6	195,555.5	18.2	13.1	31.3	331,270.9	11,820.7	3,258.6	3,099.1	6,357.7	5,107.2	0.0	23,285.6	550,143.3	
合計	185,930.5	117,411.0	77,088.8	30,216.2	96.8	45.1	410,788.4	64.7	19.4	84.1	695,875.4	19,960.5	6,352.4	5,954.5	12,306.9	8,836.1	0.0	41,103.5	1,147,851.4	

水系名：淀川

河川名：桂川

流量規模：1/150

整備計画河道

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対 価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
KR	130,466.6	70,612.6	33,206.4	15,571.0	59.2	26.0	249,941.8	48.0	6.4	54.4	423,401.3	9,241.3	3,575.5	3,112.3	6,687.8	4,358.4	0.0	20,287.5	693,685.0	
KL	88,495.0	70,577.6	52,607.1	19,496.1	61.5	27.3	231,264.6	18.3	14.3	32.6	391,761.7	13,930.9	3,948.4	3,452.7	7,401.1	6,190.2	0.0	27,522.2	650,581.1	
合計	218,961.6	141,190.2	85,813.5	35,067.1	120.7	53.3	481,206.4	66.3	20.7	87.0	815,163.0	23,172.2	7,523.9	6,565.0	14,088.9	10,548.6	0.0	47,809.7	1,344,266.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手 (H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	292.4	3.0	14.1	6.7	0.0	0.0	316.2	4.7	2.3	7.0	535.6	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	866.3		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	35.6	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	57.3	1.5	0.0	1.5	96.8	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	161.6		
合計	328.0	14.3	22.3	8.7	0.1	0.1	373.5	6.2	2.3	8.5	632.4	9.4	0.8	1.2	2.0	2.1	0.0	13.5	1,027.9		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手 (H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	822.4	46.3	199.6	99.3	0.0	0.0	1,167.6	6.7	2.9	9.6	1,977.9	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	3,261.2		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	55.5	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	81.0	2.1	0.0	2.1	137.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	229.3		
合計	877.9	58.6	210.1	101.8	0.1	0.1	1,248.6	8.8	2.9	11.7	2,115.0	88.9	5.6	9.2	14.8	11.5	0.0	115.2	3,490.5		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手 (H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,373.3	116.9	356.5	177.7	0.1	0.0	2,024.5	8.4	3.1	11.5	3,429.6	146.8	9.6	15.7	25.3	17.5	0.0	189.6	5,655.2		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.1	0.0	0.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2		
守田町ブロック	693.6	28.1	25.7	8.3	0.4	0.2	756.3	7.3	0.0	7.3	1,281.2	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,058.3		
服部町ブロック	78.6	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	104.1	2.6	0.0	2.6	176.3	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	292.1		
合計	2,150.0	157.3	392.7	188.5	0.6	0.3	2,889.4	18.4	3.1	21.5	4,894.7	157.1	12.0	19.3	31.3	23.8	0.0	212.2	8,017.8		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手 (H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	2,096.7	240.8	480.0	251.8	0.2	0.1	3,069.6	10.0	3.1	13.1	5,199.9	175.1	14.7	20.8	35.5	25.9	0.0	236.5	8,519.1		
朝屋ブロック	447.9	43.5	4.6	1.9	0.3	0.1	498.3	3.3	0.0	3.3	844.1	1.6	2.0	3.0	5.0	1.4	0.0	8.0	1,353.7		
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	918.1	297.2	903.1	477.3	0.2	0.1	2,596.0	1.7	0.0	1.7	4,397.5	294.6	20.5	30.6	51.1	27.4	0.0	373.1	7,368.3		
守田町ブロック	1,064.9	68.2	39.5	13.1	0.6	0.3	1,186.6	8.6	0.0	8.6	2,010.0	7.3	3.7	5.3	9.0	6.7	0.0	23.0	3,228.2		
服部町ブロック	154.8	28.4	23.9	6.3	0.2	0.1	213.7	4.0	0.0	4.0	362.0	10.7	1.6	2.2	3.8	5.1	0.0	19.6	599.3		
合計	4,682.4	678.1	1,451.1	750.4	1.5	0.7	7,564.2	27.6	3.1	30.7	12,813.5	489.3	42.5	61.9	104.4	66.5	0.0	660.2	21,068.6		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,527.9	315.4	544.2	289.8	0.2	0.1	3,677.6	10.9	3.1	14.0	6,229.8	190.4	18.2	23.7	41.9	31.1	0.0	263.4	10,184.8	
朝屋ブロック	1,063.3	46.8	13.3	7.3	0.2	0.1	1,131.0	5.4	0.0	5.4	1,915.9	3.2	2.1	2.9	5.0	2.8	0.0	11.0	3,063.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	6,121.0	2,792.9	5,528.8	3,469.3	1.8	0.8	17,914.6	6.6	2.5	9.1	30,347.4	1,413.3	136.7	145.4	282.1	190.4	0.0	1,885.8	50,156.9	
守田町ブロック	1,300.9	103.0	54.5	20.0	0.7	0.3	1,479.4	9.2	0.0	9.2	2,506.2	9.9	6.0	8.1	14.1	10.3	0.0	34.3	4,029.1	
服部町ブロック	217.3	36.6	32.9	9.1	0.3	0.1	296.3	4.7	0.0	4.7	502.0	14.4	2.2	2.8	5.0	7.0	0.0	26.4	829.4	
合計	11,230.4	3,294.7	6,173.7	3,795.5	3.2	1.4	24,498.9	36.8	5.6	42.4	41,501.3	1,631.2	165.2	182.9	348.1	241.6	0.0	2,220.9	68,263.5	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,358.3	526.4	837.7	449.2	0.4	0.2	5,172.2	11.8	3.1	14.9	8,761.7	252.0	26.7	32.4	59.1	46.8	0.0	357.9	14,306.7	
朝屋ブロック	1,407.3	90.8	21.1	13.6	0.5	0.2	1,533.5	8.8	0.0	8.8	2,597.6	5.5	4.2	4.7	8.9	5.8	0.0	20.2	4,160.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	11,327.3	5,254.0	7,623.1	4,936.8	4.7	2.1	29,148.0	8.9	4.6	13.5	49,376.8	2,007.6	252.8	250.4	503.2	356.5	0.0	2,867.3	81,405.6	
守田町ブロック	1,836.3	176.8	61.4	22.2	0.8	0.4	2,097.9	9.8	0.0	9.8	3,553.8	12.0	9.9	12.5	22.4	12.4	0.0	46.8	5,708.3	
服部町ブロック	335.3	58.1	50.5	13.3	0.4	0.2	457.8	6.4	0.0	6.4	775.7	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,277.0	
合計	18,264.5	6,106.1	8,593.8	5,435.1	6.8	3.1	38,409.4	45.7	7.7	53.4	65,065.6	2,297.4	296.7	304.0	600.7	431.2	0.0	3,329.3	106,857.7	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,920.9	836.1	1,241.1	701.3	0.7	0.3	7,700.4	12.4	3.1	15.5	13,044.7	329.8	39.2	41.6	80.8	79.0	0.0	489.6	21,250.2	
朝屋ブロック	1,912.3	249.1	40.9	22.6	1.3	0.7	2,226.9	11.9	0.2	12.1	3,772.3	10.8	11.1	12.1	23.2	11.9	0.0	45.9	6,057.2	
大内ブロック	111.7	4.1	5.0	1.4	0.1	0.0	122.3	5.7	0.4	6.1	207.3	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	338.7	
小田町ブロック	18,394.0	7,690.6	8,596.0	5,615.4	8.1	3.4	40,307.5	9.6	4.6	14.2	68,281.1	2,337.7	367.1	317.2	684.3	513.5	0.0	3,535.5	112,138.3	
守田町ブロック	2,617.2	314.9	89.0	34.8	1.6	0.7	3,058.2	10.7	0.0	10.7	5,180.6	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	8,324.8	
服部町ブロック	494.2	106.7	83.5	23.9	0.7	0.3	709.3	7.4	0.0	7.4	1,201.5	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	1,975.9	
合計	28,450.3	9,201.5	10,055.5	6,399.4	12.5	5.4	54,124.6	57.7	8.3	66.0	91,687.5	2,729.5	439.5	394.1	833.6	643.9	0.0	4,207.0	150,085.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,798.1	1,048.7	1,517.5	874.5	0.9	0.3	9,240.0	12.9	3.1	16.0	15,652.6	382.4	47.9	48.0	95.9	98.6	0.0	576.9	25,485.5	
朝屋ブロック	2,100.8	328.6	52.2	29.7	1.8	0.9	2,514.0	13.1	0.5	13.6	4,258.6	13.8	14.3	14.3	28.6	16.0	0.0	58.4	6,844.6	
大内ブロック	126.3	8.2	8.6	2.5	0.1	0.1	145.8	6.9	0.7	7.6	246.8	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	404.6	
小田町ブロック	22,411.9	9,116.0	9,070.7	6,025.6	10.2	4.1	46,638.5	9.8	4.6	14.4	79,005.6	2,557.5	428.7	348.7	777.4	593.7	0.0	3,928.6	129,587.1	
守田町ブロック	2,876.9	360.2	100.1	37.6	1.7	0.7	3,377.2	10.9	0.0	10.9	5,721.0	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	9,195.0	
服部町ブロック	553.9	115.9	91.4	26.4	0.7	0.4	788.7	8.1	0.0	8.1	1,336.0	33.0	5.6	6.0	11.6	18.8	0.0	63.4	2,196.2	
合計	33,867.9	10,977.6	10,840.5	6,996.3	15.4	6.5	62,704.2	61.7	8.9	70.6	106,220.6	3,010.9	516.7	437.5	954.2	752.5	0.0	4,717.6	173,713.0	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	321.7	3.3	15.5	7.4	0.0	0.0	347.9	5.2	2.5	7.7	589.2	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	952.3	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	39.1	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	62.9	1.6	0.0	1.6	106.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	177.0	
合計	19.0	360.8	15.7	24.5	9.6	0.1	0.1	410.8	6.8	2.5	9.3	695.7	9.4	0.8	1.2	2.0	2.1	0.0	13.5	1,129.3	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	151.0	904.7	50.9	219.5	109.2	0.0	0.0	1,284.3	7.4	3.1	10.5	2,175.7	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	3,576.6	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	61.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	89.1	2.3	0.0	2.3	150.9	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	251.4	
合計	171.0	965.7	64.4	231.1	112.0	0.1	0.1	1,373.4	9.7	3.1	12.8	2,326.6	88.9	5.6	9.2	14.8	11.5	0.0	115.2	3,828.0	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	273.0	1,510.6	128.6	392.1	195.5	0.1	0.0	2,226.9	9.2	3.4	12.6	3,772.6	146.8	9.6	15.7	25.3	17.5	0.0	189.6	6,201.7	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.1	0.0	0.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	
守田町ブロック	43.0	763.0	30.9	28.3	9.1	0.4	0.2	831.9	8.1	0.0	8.1	1,409.3	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,262.8	
服部町ブロック	20.0	86.5	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	114.6	2.9	0.0	2.9	193.9	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	320.5	
合計	336.0	2,365.0	173.0	432.0	207.4	0.6	0.3	3,178.3	20.3	3.4	23.7	5,384.1	157.1	12.0	19.3	31.3	23.8	0.0	212.2	8,798.3	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	304.0	2,306.3	264.9	528.0	277.0	0.2	0.1	3,376.5	11.0	3.4	14.4	5,719.8	175.1	14.7	20.8	35.5	25.9	0.0	236.5	9,347.2	
朝屋ブロック	59.0	492.7	47.9	5.0	2.1	0.3	0.1	548.1	3.6	0.0	3.6	928.5	1.6	2.0	3.0	5.0	1.4	0.0	8.0	1,488.2	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	485.0	1,009.9	326.9	993.4	525.0	0.2	0.1	2,855.5	1.8	0.0	1.8	4,837.3	294.6	20.5	30.6	51.1	27.4	0.0	373.1	8,067.7	
守田町ブロック	66.0	1,171.4	75.0	43.4	14.4	0.6	0.3	1,305.1	9.5	0.0	9.5	2,211.0	7.3	3.7	5.3	9.0	6.7	0.0	23.0	3,548.6	
服部町ブロック	35.0	170.2	31.2	26.3	7.0	0.3	0.1	235.1	4.4	0.0	4.4	398.2	10.7	1.6	2.2	3.8	5.1	0.0	19.6	657.3	
合計	949.0	5,150.5	745.9	1,596.1	825.5	1.6	0.7	8,320.3	30.3	3.4	33.7	14,094.8	489.3	42.5	61.9	104.4	66.5	0.0	660.2	23,109.0	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	263.2	2.7	12.7	6.0	0.0	0.0	284.6	4.2	2.0	6.2	482.1	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	780.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	32.0	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	51.4	1.3	0.0	1.3	87.1	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	145.8	
合計	19.0	295.2	12.8	20.1	7.8	0.1	0.0	336.0	5.5	2.0	7.5	569.2	9.4	0.8	1.2	2.0	2.1	0.0	13.5	926.2	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	151.0	740.2	41.7	179.6	89.3	0.0	0.0	1,050.8	6.0	2.6	8.6	1,780.1	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	2,945.6	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	49.9	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	72.8	1.9	0.0	1.9	123.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	207.2	
合計	171.0	790.1	52.7	189.1	91.6	0.1	0.0	1,123.6	7.9	2.6	10.5	1,903.5	88.9	5.6	9.2	14.8	11.5	0.0	115.2	3,152.8	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	273.0	1,236.0	105.2	320.8	160.0	0.1	0.0	1,822.1	7.5	2.8	10.3	3,086.7	146.8	9.6	15.7	25.3	17.5	0.0	189.6	5,108.7	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.1	0.0	0.1	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	
守田町ブロック	43.0	624.3	25.3	23.2	7.5	0.3	0.2	680.8	6.6	0.0	6.6	1,153.1	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	1,854.0	
服部町ブロック	20.0	70.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	93.6	2.3	0.0	2.3	158.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	263.7	
合計	336.0	1,935.0	141.5	353.5	169.8	0.5	0.2	2,600.5	16.5	2.8	19.3	4,405.3	157.1	12.0	19.3	31.3	23.8	0.0	212.2	7,237.3	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	304.0	1,887.0	216.7	432.0	226.6	0.1	0.1	2,762.5	9.0	2.8	11.8	4,679.9	175.1	14.7	20.8	35.5	25.9	0.0	236.5	7,690.7	
朝屋ブロック	59.0	403.1	39.2	4.1	1.7	0.3	0.1	448.5	3.0	0.0	3.0	759.7	1.6	2.0	3.0	5.0	1.4	0.0	8.0	1,219.2	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	485.0	826.3	267.5	812.8	429.6	0.1	0.1	2,336.4	1.5	0.0	1.5	3,957.8	294.6	20.5	30.6	51.1	27.4	0.0	373.1	6,668.8	
守田町ブロック	66.0	958.4	61.4	35.5	11.8	0.5	0.3	1,067.9	7.8	0.0	7.8	1,809.0	7.3	3.7	5.3	9.0	6.7	0.0	23.0	2,907.7	
服部町ブロック	35.0	139.3	25.5	21.5	5.7	0.2	0.1	192.3	3.6	0.0	3.6	325.8	10.7	1.6	2.2	3.8	5.1	0.0	19.6	541.3	
合計	949.0	4,214.1	610.3	1,305.9	675.4	1.2	0.7	6,807.6	24.9	2.8	27.7	11,532.2	489.3	42.5	61.9	104.4	66.5	0.0	660.2	19,027.7	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	73.2	1.2	10.5	5.1	0.0	0.0	90.0	2.3	1.4	3.7	152.5	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	252.8		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	45.7	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	67.4	1.6	0.0	1.6	113.9	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	188.9		
合計	118.9	12.5	18.7	7.1	0.1	0.1	157.4	3.9	1.4	5.3	266.4	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	441.7		

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	285.4	6.0	28.1	13.4	0.0	0.0	332.9	4.9	2.1	7.0	564.0	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	919.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	56.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	81.8	2.1	0.0	2.1	138.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	231.6		
合計	341.7	18.3	38.6	15.9	0.1	0.1	414.7	7.0	2.1	9.1	702.6	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,150.7		

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,443.2	114.6	317.8	158.7	0.1	0.0	2,034.4	8.4	3.1	11.5	3,446.4	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,660.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	18.1	1.0	2.5	0.2	0.0	0.0	21.8	0.2	0.0	0.2	37.0	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	60.7		
守田町ブロック	794.8	28.1	25.7	8.3	0.4	0.2	857.5	7.5	0.0	7.5	1,452.6	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,331.1		
服部町ブロック	78.2	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	103.7	2.6	0.0	2.6	175.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	291.1		
合計	2,334.3	156.0	356.5	169.7	0.6	0.3	3,017.4	18.7	3.1	21.8	5,111.7	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	8,343.0		

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,427.5	278.4	478.3	249.5	0.2	0.1	3,434.0	10.3	3.1	13.4	5,817.2	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	9,507.8	
朝屋ブロック	26.8	5.9	5.9	3.9	0.0	0.0	42.5	0.5	0.0	0.5	72.1	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	117.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	985.2	344.6	996.0	524.2	0.2	0.1	2,850.3	1.8	0.0	1.8	4,828.3	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	8,076.6	
守田町ブロック	1,186.6	79.7	42.8	14.6	0.6	0.3	1,324.6	8.8	0.0	8.8	2,243.8	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,603.4	
服部町ブロック	123.2	17.1	14.4	3.5	0.1	0.1	158.4	3.5	0.0	3.5	268.2	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	441.9	
合計	4,749.3	725.7	1,537.4	795.7	1.1	0.6	7,809.8	24.9	3.1	28.0	13,229.6	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	21,747.5	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,238.9	245.2	433.1	227.9	0.2	0.1	3,145.4	10.2	3.1	13.3	5,328.1	165.1	15.4	20.7	36.1	25.6	0.0	226.8	8,713.6	
朝屋ブロック	1,053.3	52.0	10.8	5.9	0.3	0.1	1,122.4	5.8	0.0	5.8	1,901.3	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	3,040.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	5,850.8	2,704.9	5,422.5	3,389.7	1.7	0.7	17,370.3	6.2	2.4	8.6	29,425.4	1,379.9	131.9	141.8	273.7	182.8	0.0	1,836.4	48,640.7	
守田町ブロック	1,503.0	127.6	56.8	20.8	0.8	0.4	1,709.4	9.6	0.0	9.6	2,895.6	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,651.6	
服部町ブロック	196.1	29.3	27.3	7.2	0.2	0.1	260.2	4.5	0.0	4.5	440.7	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	728.0	
合計	10,842.1	3,159.0	5,950.5	3,651.5	3.2	1.4	23,607.7	36.3	5.5	41.8	39,991.1	1,570.8	158.3	177.2	335.5	227.4	0.0	2,133.7	65,774.3	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,213.3	476.6	727.6	387.5	0.4	0.2	4,805.6	11.7	3.1	14.8	8,140.7	231.3	24.7	30.2	54.9	42.7	0.0	328.9	13,290.0	
朝屋ブロック	1,531.8	106.5	16.8	8.8	0.7	0.3	1,664.9	8.6	0.0	8.6	2,820.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,515.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	10,946.0	5,023.1	7,545.0	4,887.4	4.4	2.0	28,407.9	8.8	4.5	13.3	48,123.0	1,990.3	245.1	247.0	492.1	345.8	0.0	2,828.2	79,372.4	
守田町ブロック	2,273.9	244.5	73.4	26.3	1.1	0.5	2,619.7	10.4	0.0	10.4	4,437.8	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	7,128.4	
服部町ブロック	358.1	65.4	54.8	14.4	0.5	0.2	493.4	6.6	0.0	6.6	835.8	21.4	3.3	4.2	7.5	10.4	0.0	39.3	1,375.1	
合計	18,323.1	5,916.1	8,417.6	5,324.4	7.1	3.2	37,991.5	46.1	7.6	53.7	64,357.7	2,262.9	292.4	303.5	595.9	419.6	0.0	3,278.4	105,681.3	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,467.6	917.9	1,320.9	755.5	0.8	0.3	8,463.0	12.6	3.1	15.7	14,336.5	347.6	42.7	44.1	86.8	87.1	0.0	521.5	23,336.7	
朝屋ブロック	1,998.9	306.2	50.0	25.5	1.7	0.8	2,383.1	13.1	0.0	13.1	4,037.0	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	6,487.0	
大内ブロック	147.6	8.5	9.2	2.7	0.1	0.1	168.2	8.1	0.9	9.0	284.8	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	466.9	
小田町ブロック	17,567.8	7,394.7	8,533.5	5,554.9	7.6	3.3	39,061.8	9.6	4.6	14.2	66,170.8	2,294.6	355.3	313.2	668.5	498.2	0.0	3,461.3	108,708.1	
守田町ブロック	2,869.1	360.2	100.1	37.6	1.7	0.7	3,369.4	10.9	0.0	10.9	5,707.7	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	9,173.9	
服部町ブロック	522.5	106.7	83.5	23.9	0.7	0.3	737.6	7.6	0.0	7.6	1,249.5	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	2,052.4	
合計	28,573.5	9,094.2	10,097.2	6,400.1	12.6	5.5	54,183.1	61.9	8.6	70.5	91,786.3	2,709.2	436.9	397.0	833.9	642.0	0.0	4,185.1	150,225.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,739.9	1,020.2	1,449.8	835.8	0.9	0.3	9,046.9	12.8	3.1	15.9	15,325.4	371.8	46.8	47.1	93.9	96.0	0.0	561.7	24,949.9	
朝屋ブロック	2,267.1	403.7	62.2	34.8	2.2	1.0	2,771.0	14.2	0.5	14.7	4,694.1	16.9	17.5	16.3	33.8	19.6	0.0	70.3	7,550.1	
大内ブロック	183.2	14.5	13.3	3.9	0.2	0.1	215.2	9.2	0.9	10.1	364.6	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	596.5	
小田町ブロック	21,894.9	9,026.7	9,015.6	5,980.4	10.1	4.1	45,931.8	9.8	4.6	14.4	77,808.5	2,521.9	424.2	347.2	771.4	588.5	0.0	3,881.8	127,636.5	
守田町ブロック	3,312.6	506.2	123.6	45.3	2.1	0.9	3,990.7	11.3	0.0	11.3	6,760.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	10,872.2	
服部町ブロック	609.3	130.8	98.7	29.8	0.8	0.4	869.8	8.3	0.0	8.3	1,473.5	37.2	6.4	6.4	12.8	21.9	0.0	71.9	2,423.5	
合計	34,007.0	11,102.1	10,763.2	6,930.0	16.3	6.8	62,825.4	65.6	9.1	74.7	106,426.2	2,978.5	523.2	441.7	964.9	759.0	0.0	4,702.4	174,028.7	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	80.5	1.3	11.6	5.6	0.0	0.0	99.0	2.5	1.6	4.1	167.7	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	277.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	50.2	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	74.0	1.8	0.0	1.8	125.2	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	207.0	
合計	19.0	130.7	13.7	20.6	7.8	0.1	0.1	173.0	4.3	1.6	5.9	292.9	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	484.4	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	17.0	314.0	6.6	30.9	14.8	0.0	0.0	366.3	5.4	2.3	7.7	620.4	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	1,009.6	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	62.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	90.1	2.3	0.0	2.3	152.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	253.9	
合計	37.0	376.0	20.1	42.5	17.6	0.1	0.1	456.4	7.7	2.3	10.0	772.8	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,263.5	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	251.0	1,587.5	126.1	349.6	174.5	0.1	0.0	2,237.8	9.3	3.4	12.7	3,791.1	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	6,209.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8.0	19.9	1.1	2.8	0.2	0.0	0.0	24.0	0.2	0.0	0.2	40.7	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	66.6	
守田町ブロック	43.0	874.3	30.9	28.3	9.1	0.4	0.2	943.2	8.3	0.0	8.3	1,597.8	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,562.8	
服部町ブロック	20.0	86.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	114.1	2.8	0.0	2.8	193.2	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	319.2	
合計	322.0	2,567.7	171.6	392.3	186.6	0.6	0.3	3,319.1	20.6	3.4	24.0	5,622.8	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	9,158.0	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	317.0	2,670.3	306.2	526.1	274.5	0.2	0.1	3,777.4	11.3	3.4	14.7	6,399.0	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	10,434.3	
朝屋ブロック	2.0	29.5	6.5	6.5	4.3	0.0	0.0	46.8	0.5	0.0	0.5	79.3	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	129.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	494.0	1,083.7	379.1	1,095.6	576.6	0.2	0.1	3,135.3	2.0	0.0	2.0	5,311.1	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	8,844.6	
守田町ブロック	77.0	1,305.2	87.7	47.1	16.0	0.7	0.3	1,457.0	9.7	0.0	9.7	2,468.2	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,961.1	
服部町ブロック	25.0	135.5	18.8	15.8	3.8	0.1	0.1	174.1	3.8	0.0	3.8	295.1	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	484.8	
合計	915.0	5,224.2	798.3	1,691.1	875.2	1.2	0.6	8,590.6	27.3	3.4	30.7	14,552.7	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	23,854.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	65.9	1.1	9.5	4.6	0.0	0.0	81.1	2.1	1.3	3.4	137.2	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	228.3		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	41.1	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	60.5	1.5	0.0	1.5	102.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	170.5		
合計	107.0	11.2	16.9	6.4	0.1	0.0	141.6	3.6	1.3	4.9	239.7	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	398.8		

様式-3 被害額 (現況河道(H29)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	256.9	5.4	25.3	12.1	0.0	0.0	299.7	4.4	1.9	6.3	507.6	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	828.8		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	50.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	73.6	1.9	0.0	1.9	124.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	209.3		
合計	307.6	16.4	34.8	14.4	0.1	0.0	373.3	6.3	1.9	8.2	632.3	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,038.1		

様式-3 被害額 (現況河道(H29)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,298.9	103.2	286.1	142.8	0.1	0.0	1,831.1	7.6	2.8	10.4	3,101.8	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,111.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	16.3	0.9	2.3	0.2	0.0	0.0	19.7	0.1	0.0	0.1	33.3	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	54.8		
守田町ブロック	715.3	25.3	23.2	7.5	0.3	0.2	771.8	6.8	0.0	6.8	1,307.3	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,099.4		
服部町ブロック	70.4	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	93.3	2.3	0.0	2.3	158.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	262.8		
合計	2,100.9	140.4	321.1	152.8	0.5	0.2	2,715.9	16.8	2.8	19.6	4,600.5	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	7,528.1		

様式-3 被害額 (現況河道(H29)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	2,184.8	250.6	430.5	224.6	0.2	0.1	3,090.8	9.3	2.8	12.1	5,235.5	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	8,581.6		
朝屋ブロック	24.1	5.3	5.4	3.5	0.0	0.0	38.3	0.4	0.0	0.4	64.9	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	106.3		
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	886.7	310.2	896.4	471.8	0.2	0.1	2,565.4	1.6	0.0	1.6	4,345.5	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	7,308.7		
守田町ブロック	1,067.9	71.8	38.5	13.1	0.6	0.3	1,192.2	8.0	0.0	8.0	2,019.5	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,245.9		
服部町ブロック	110.9	15.4	12.9	3.1	0.1	0.1	142.5	3.1	0.0	3.1	241.4	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	398.8		
合計	4,274.4	653.3	1,383.7	716.1	1.1	0.6	7,029.2	22.4	2.8	25.2	11,906.8	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	19,641.3		

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,015.0	220.7	389.7	205.1	0.1	0.1	2,830.7	9.1	2.8	11.9	4,795.3	165.1	15.4	20.7	36.1	25.6	0.0	226.8	7,864.7	
朝屋ブロック	948.0	46.8	9.7	5.3	0.2	0.1	1,010.1	5.2	0.0	5.2	1,711.2	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	2,737.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	5,265.7	2,434.5	4,880.2	3,050.7	1.5	0.7	15,633.3	5.6	2.2	7.8	26,482.8	1,379.9	131.9	141.8	273.7	182.8	0.0	1,836.4	43,960.3	
守田町ブロック	1,352.7	114.9	51.1	18.7	0.7	0.3	1,538.4	8.6	0.0	8.6	2,606.0	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,190.0	
服部町ブロック	176.5	26.4	24.6	6.4	0.2	0.1	234.2	4.0	0.0	4.0	396.7	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	657.5	
合計	9,757.9	2,843.3	5,355.3	3,286.2	2.7	1.3	21,246.7	32.5	5.0	37.5	35,992.0	1,570.8	158.3	177.2	335.5	227.4	0.0	2,133.7	59,409.9	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,892.0	429.0	654.9	348.7	0.3	0.1	4,325.0	10.5	2.8	13.3	7,326.6	231.3	24.7	30.2	54.9	42.7	0.0	328.9	11,993.8	
朝屋ブロック	1,378.6	95.9	15.1	8.0	0.6	0.3	1,498.5	7.7	0.0	7.7	2,538.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,066.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	9,851.4	4,520.8	6,790.5	4,398.7	3.9	1.8	25,567.1	7.9	4.1	12.0	43,310.7	1,990.3	245.1	247.0	492.1	345.8	0.0	2,828.2	71,718.0	
守田町ブロック	2,046.5	220.1	66.1	23.7	1.0	0.5	2,357.9	9.4	0.0	9.4	3,994.0	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	6,421.8	
服部町ブロック	322.3	58.8	49.3	13.0	0.5	0.2	444.1	5.9	0.0	5.9	752.2	21.4	3.3	4.2	7.5	10.4	0.0	39.3	1,241.5	
合計	16,490.8	5,324.6	7,575.9	4,792.1	6.3	2.9	34,192.6	41.4	6.9	48.3	57,921.9	2,262.9	292.4	303.5	595.9	419.6	0.0	3,278.4	95,441.2	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,920.9	826.1	1,188.8	680.0	0.7	0.3	7,616.8	11.3	2.8	14.1	12,902.8	347.6	42.7	44.1	86.8	87.1	0.0	521.5	21,055.2	
朝屋ブロック	1,799.0	275.5	45.0	22.9	1.5	0.7	2,144.6	11.8	0.0	11.8	3,633.3	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	5,843.5	
大内ブロック	132.9	7.6	8.2	2.4	0.1	0.0	151.2	7.3	0.8	8.1	256.3	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	420.5	
小田町ブロック	15,811.0	6,655.3	7,680.1	4,999.4	6.9	3.0	35,155.7	8.6	4.2	12.8	59,553.7	2,294.6	355.3	313.2	668.5	498.2	0.0	3,461.3	98,183.5	
守田町ブロック	2,582.2	324.2	90.1	33.8	1.5	0.7	3,032.5	9.8	0.0	9.8	5,136.9	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	8,265.1	
服部町ブロック	470.2	96.1	75.2	21.5	0.6	0.3	663.9	6.9	0.0	6.9	1,124.6	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	1,853.1	
合計	25,716.2	8,184.8	9,087.4	5,760.0	11.3	5.0	48,764.7	55.7	7.8	63.5	82,607.6	2,709.2	436.9	397.0	833.9	642.0	0.0	4,185.1	135,620.9	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,165.9	918.1	1,304.8	752.2	0.8	0.3	8,142.1	11.5	2.8	14.3	13,792.8	371.8	46.8	47.1	93.9	96.0	0.0	561.7	22,510.9	
朝屋ブロック	2,040.3	363.3	56.0	31.3	2.0	0.9	2,493.8	12.8	0.4	13.2	4,224.7	16.9	17.5	16.3	33.8	19.6	0.0	70.3	6,802.0	
大内ブロック	164.9	13.0	12.0	3.5	0.2	0.1	193.7	8.3	0.8	9.1	328.1	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	537.5	
小田町ブロック	19,705.4	8,124.0	8,114.0	5,382.4	9.1	3.7	41,338.6	8.8	4.2	13.0	70,027.6	2,521.9	424.2	347.2	771.4	588.5	0.0	3,881.8	115,261.0	
守田町ブロック	2,981.3	455.6	111.2	40.7	1.9	0.8	3,591.5	10.2	0.0	10.2	6,084.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	9,795.9	
服部町ブロック	548.4	117.7	88.8	26.8	0.8	0.3	782.8	7.5	0.0	7.5	1,326.1	37.2	6.4	6.4	12.8	21.9	0.0	71.9	2,188.3	
合計	30,606.2	9,991.7	9,686.8	6,236.9	14.8	6.1	56,542.5	59.1	8.2	67.3	95,783.4	2,978.5	523.2	441.7	964.9	759.0	0.0	4,702.4	157,095.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	70.7	1.2	10.5	5.1	0.0	0.0	87.5	2.3	1.4	3.7	148.2	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	246.0		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	51.4	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	73.1	1.9	0.0	1.9	123.6	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	204.6		
合計	122.1	12.5	18.7	7.1	0.1	0.1	160.6	4.2	1.4	5.6	271.8	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	450.6		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	265.8	6.0	28.1	13.4	0.0	0.0	313.3	4.8	1.9	6.7	530.7	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	865.9		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	56.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	81.8	2.1	0.0	2.1	138.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	231.6		
合計	322.1	18.3	38.6	15.9	0.1	0.1	395.1	6.9	1.9	8.8	669.3	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,097.5		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,406.2	114.6	317.8	158.7	0.1	0.0	1,997.4	8.4	3.1	11.5	3,383.7	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,560.4		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	18.1	1.0	2.5	0.2	0.0	0.0	21.8	0.2	0.0	0.2	37.0	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	60.7		
守田町ブロック	794.8	28.1	25.7	8.3	0.4	0.2	857.5	7.5	0.0	7.5	1,452.6	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,331.1		
服部町ブロック	75.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	100.8	2.5	0.0	2.5	170.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	283.1		
合計	2,294.4	156.0	356.5	169.7	0.6	0.3	2,977.5	18.6	3.1	21.7	5,044.0	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	8,235.3		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	2,321.9	267.8	465.6	243.1	0.2	0.1	3,298.7	10.2	3.1	13.3	5,588.0	173.8	16.3	22.0	38.3	27.1	0.0	239.2	9,139.2		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	606.7	157.3	493.9	227.8	0.1	0.0	1,485.8	1.6	0.0	1.6	2,516.9	184.2	12.3	20.4	32.7	18.0	0.0	234.9	4,239.2		
守田町ブロック	1,186.6	79.7	42.8	14.6	0.6	0.3	1,324.6	8.8	0.0	8.8	2,243.8	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,603.4		
服部町ブロック	106.6	16.6	13.2	3.2	0.1	0.1	139.8	3.1	0.0	3.1	236.7	5.8	0.8	1.2	2.0	2.6	0.0	10.4	390.0		
合計	4,221.8	521.4	1,015.5	488.7	1.0	0.5	6,248.9	23.7	3.1	26.8	10,585.4	371.7	33.8	50.0	83.8	55.2	0.0	510.7	17,371.8		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,112.3	239.5	426.0	224.7	0.2	0.1	3,002.8	10.0	3.1	13.1	5,086.7	163.0	15.2	20.4	35.6	25.3	0.0	223.9	8,326.5	
朝屋ブロック	1,049.8	52.0	10.8	5.9	0.3	0.1	1,118.9	5.7	0.0	5.7	1,895.4	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	3,030.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	3,814.9	1,793.0	4,096.9	2,482.9	1.0	0.4	12,189.1	3.9	0.6	4.5	20,648.4	1,024.7	88.9	100.8	189.7	116.0	0.0	1,330.4	34,172.4	
守田町ブロック	1,503.0	127.6	56.8	20.8	0.8	0.4	1,709.4	9.6	0.0	9.6	2,895.6	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,651.6	
服部町ブロック	178.4	29.3	27.3	7.2	0.2	0.1	242.5	4.2	0.0	4.2	410.8	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	680.1	
合計	8,658.4	2,241.4	4,617.8	2,741.5	2.5	1.1	18,262.7	33.4	3.7	37.1	30,936.9	1,213.5	115.1	135.9	251.0	160.3	0.0	1,624.8	50,861.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,107.2	442.8	673.5	361.4	0.3	0.1	4,585.3	11.4	3.1	14.5	7,767.6	219.8	23.3	28.4	51.7	40.2	0.0	311.7	12,679.1	
朝屋ブロック	1,531.8	106.5	16.8	8.8	0.7	0.3	1,664.9	8.6	0.0	8.6	2,820.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,515.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	9,632.0	4,300.1	7,198.5	4,695.0	3.4	1.5	25,830.5	8.2	4.0	12.2	43,757.0	1,886.3	214.7	221.7	436.4	299.0	0.0	2,621.7	72,221.4	
守田町ブロック	2,266.7	244.5	73.4	26.3	1.1	0.5	2,612.5	10.4	0.0	10.4	4,425.8	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	7,109.2	
服部町ブロック	320.4	58.1	50.5	13.3	0.4	0.2	442.9	6.2	0.0	6.2	750.4	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,236.6	
合計	16,858.1	5,152.0	8,012.7	5,104.8	5.9	2.6	35,136.1	44.8	7.1	51.9	59,521.2	2,146.3	260.4	276.2	536.6	369.6	0.0	3,052.5	97,761.7	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,336.0	885.8	1,253.2	712.4	0.8	0.3	8,188.5	12.5	3.1	15.6	13,871.2	334.0	41.1	43.1	84.2	83.9	0.0	502.1	22,577.4	
朝屋ブロック	1,999.8	306.2	50.0	25.5	1.7	0.8	2,384.0	13.2	0.0	13.2	4,038.5	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	6,489.5	
大内ブロック	147.6	8.5	9.2	2.7	0.1	0.1	168.2	8.1	0.9	9.0	284.8	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	466.9	
小田町ブロック	15,700.9	6,842.2	8,338.2	5,401.8	6.8	3.0	36,292.9	9.5	4.6	14.1	61,480.0	2,219.1	331.1	300.2	631.3	464.7	0.0	3,315.1	101,102.1	
守田町ブロック	2,869.1	360.2	100.1	37.6	1.7	0.7	3,369.4	10.9	0.0	10.9	5,707.7	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	9,173.9	
服部町ブロック	487.2	106.7	83.5	23.9	0.7	0.3	702.3	7.4	0.0	7.4	1,189.8	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	1,957.2	
合計	26,540.6	8,509.6	9,834.2	6,203.9	11.8	5.2	51,105.3	61.6	8.6	70.2	86,572.0	2,620.1	411.1	383.0	794.1	605.3	0.0	4,019.5	141,767.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,597.5	942.8	1,334.7	765.2	0.9	0.3	8,641.4	12.8	3.1	15.9	14,638.4	350.9	43.6	44.9	88.5	89.6	0.0	529.0	23,824.7	
朝屋ブロック	2,273.7	411.7	63.2	35.5	2.2	1.0	2,787.3	14.2	0.5	14.7	4,721.9	17.2	18.0	16.5	34.5	20.1	0.0	71.8	7,595.7	
大内ブロック	183.2	14.5	13.3	3.9	0.2	0.1	215.2	9.2	0.9	10.1	364.6	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	596.5	
小田町ブロック	19,697.5	8,193.5	8,768.1	5,732.8	8.9	3.7	42,404.5	9.8	4.6	14.4	71,833.4	2,399.0	390.0	332.7	722.7	543.2	0.0	3,664.9	117,917.2	
守田町ブロック	3,312.6	506.2	123.6	45.3	2.1	0.9	3,990.7	11.3	0.0	11.3	6,760.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	10,872.2	
服部町ブロック	541.5	107.2	84.7	24.1	0.7	0.3	758.5	7.9	0.0	7.9	1,285.1	31.2	5.2	5.7	10.9	17.2	0.0	59.3	2,110.8	
合計	31,606.0	10,175.9	10,387.6	6,606.8	15.0	6.3	58,797.6	65.2	9.1	74.3	99,603.5	2,829.0	485.1	424.5	909.6	703.1	0.0	4,441.7	162,917.1	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	77.7	1.3	11.6	5.6	0.0	0.0	96.2	2.5	1.6	4.1	163.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	269.9		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	56.6	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	80.4	2.1	0.0	2.1	136.0	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	224.5		
合計	134.3	13.7	20.6	7.8	0.1	0.1	176.6	4.6	1.6	6.2	299.0	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	494.4		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	292.4	6.6	30.9	14.8	0.0	0.0	344.7	5.3	2.1	7.4	583.8	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	951.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	62.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	90.1	2.3	0.0	2.3	152.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	253.9		
合計	354.4	20.1	42.5	17.6	0.1	0.1	434.8	7.6	2.1	9.7	736.2	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,205.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,546.8	126.1	349.6	174.5	0.1	0.0	2,197.1	9.2	3.4	12.6	3,722.1	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	6,099.6		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	19.9	1.1	2.8	0.2	0.0	0.0	24.0	0.2	0.0	0.2	40.7	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	66.6		
守田町ブロック	874.3	30.9	28.3	9.1	0.4	0.2	943.2	8.3	0.0	8.3	1,597.8	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,562.8		
服部町ブロック	82.8	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	110.9	2.7	0.0	2.7	187.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	310.4		
合計	2,523.8	171.6	392.3	186.6	0.6	0.3	3,275.2	20.4	3.4	23.8	5,548.3	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	9,039.4		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	2,554.1	294.6	512.1	267.4	0.2	0.1	3,628.5	11.2	3.4	14.6	6,146.8	173.8	16.3	22.0	38.3	27.1	0.0	239.2	10,029.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	667.3	173.0	543.3	250.5	0.1	0.0	1,634.2	1.8	0.0	1.8	2,768.6	184.2	12.3	20.4	32.7	18.0	0.0	234.9	4,639.5		
守田町ブロック	1,305.2	87.7	47.1	16.0	0.7	0.3	1,457.0	9.7	0.0	9.7	2,468.2	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,961.1		
服部町ブロック	117.2	18.2	14.5	3.5	0.1	0.1	153.6	3.4	0.0	3.4	260.4	5.8	0.8	1.2	2.0	2.6	0.0	10.4	427.8		
合計	4,643.8	573.5	1,117.0	537.4	1.1	0.5	6,873.3	26.1	3.4	29.5	11,644.0	371.7	33.8	50.0	83.8	55.2	0.0	510.7	19,057.5		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,323.5	263.5	468.6	247.2	0.2	0.1	3,303.1	11.0	3.4	14.4	5,595.4	163.0	15.2	20.4	35.6	25.3	0.0	223.9	9,136.8	
朝屋ブロック	1,154.8	57.2	11.9	6.5	0.3	0.2	1,230.9	6.2	0.0	6.2	2,085.0	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	3,333.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	4,196.4	1,972.3	4,506.6	2,731.1	1.1	0.5	13,408.0	4.3	0.7	5.0	22,713.2	1,024.7	88.9	100.8	189.7	116.0	0.0	1,330.4	37,456.6	
守田町ブロック	1,653.3	140.4	62.4	22.9	0.8	0.4	1,880.2	10.5	0.0	10.5	3,185.2	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	5,112.9	
服部町ブロック	196.2	32.2	30.0	7.9	0.3	0.1	266.7	4.6	0.0	4.6	451.8	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	745.7	
合計	9,524.2	2,465.6	5,079.5	3,015.6	2.7	1.3	20,088.9	36.6	4.1	40.7	34,030.6	1,213.5	115.1	135.9	251.0	160.3	0.0	1,624.8	55,785.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,418.0	487.0	740.8	397.5	0.4	0.2	5,043.9	12.5	3.4	15.9	8,544.3	219.8	23.3	28.4	51.7	40.2	0.0	311.7	13,915.8	
朝屋ブロック	1,685.0	117.2	18.5	9.7	0.7	0.3	1,831.4	9.4	0.0	9.4	3,102.5	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,964.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	10,595.2	4,730.1	7,918.3	5,164.6	3.8	1.7	28,413.7	9.0	4.4	13.4	48,132.7	1,886.3	214.7	221.7	436.4	299.0	0.0	2,621.7	79,181.5	
守田町ブロック	2,493.4	269.0	80.7	29.0	1.2	0.6	2,873.9	11.4	0.0	11.4	4,868.3	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	7,814.1	
服部町ブロック	352.4	63.9	55.6	14.7	0.5	0.2	487.3	6.8	0.0	6.8	825.5	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,356.7	
合計	18,544.0	5,667.2	8,813.9	5,615.5	6.6	3.0	38,650.2	49.1	7.8	56.9	65,473.3	2,146.3	260.4	276.2	536.6	369.6	0.0	3,052.5	107,232.9	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,869.5	974.4	1,378.5	783.6	0.9	0.4	9,007.3	13.8	3.4	17.2	15,258.3	334.0	41.1	43.1	84.2	83.9	0.0	502.1	24,784.9	
朝屋ブロック	2,199.7	336.8	55.0	28.0	1.9	0.9	2,622.3	14.5	0.0	14.5	4,442.3	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	7,132.9	
大内ブロック	162.4	9.3	10.1	2.9	0.1	0.1	184.9	8.9	1.0	9.9	313.2	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	512.9	
小田町ブロック	17,270.9	7,526.4	9,172.0	5,942.0	7.4	3.3	39,922.0	10.5	5.1	15.6	67,628.0	2,219.1	331.1	300.2	631.3	464.7	0.0	3,315.1	110,880.7	
守田町ブロック	3,156.0	396.3	110.1	41.3	1.9	0.8	3,706.4	12.0	0.0	12.0	6,278.5	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	10,082.8	
服部町ブロック	536.0	117.4	91.9	26.2	0.8	0.4	772.7	8.1	0.0	8.1	1,308.8	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	2,147.3	
合計	29,194.5	9,360.6	10,817.6	6,824.0	13.0	5.9	56,215.6	67.8	9.5	77.3	95,229.1	2,620.1	411.1	383.0	794.1	605.3	0.0	4,019.5	155,541.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	6,157.3	1,037.1	1,468.1	841.7	0.9	0.4	9,505.5	14.0	3.4	17.4	16,102.2	350.9	43.6	44.9	88.5	89.6	0.0	529.0	26,154.1	
朝屋ブロック	2,501.1	452.9	69.5	39.0	2.4	1.1	3,066.0	15.7	0.5	16.2	5,194.1	17.2	18.0	16.5	34.5	20.1	0.0	71.8	8,348.1	
大内ブロック	201.5	15.9	14.6	4.3	0.2	0.1	236.6	10.1	1.0	11.1	401.1	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	655.4	
小田町ブロック	21,667.3	9,012.9	9,644.9	6,306.1	9.8	4.1	46,645.1	10.8	5.1	15.9	79,016.8	2,399.0	390.0	332.7	722.7	543.2	0.0	3,664.9	129,342.7	
守田町ブロック	3,643.9	556.9	135.9	49.8	2.3	0.9	4,389.7	12.4	0.0	12.4	7,436.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	11,948.3	
服部町ブロック	595.7	118.0	93.2	26.5	0.8	0.4	834.6	8.7	0.0	8.7	1,413.6	31.2	5.2	5.7	10.9	17.2	0.0	59.3	2,316.2	
合計	34,766.8	11,193.7	11,426.2	7,267.4	16.4	7.0	64,677.5	71.7	10.0	81.7	109,563.9	2,829.0	485.1	424.5	909.6	703.1	0.0	4,441.7	178,764.8	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	63.6	1.1	9.5	4.6	0.0	0.0	78.8	2.1	1.3	3.4	133.4	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	222.2		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	46.3	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	65.7	1.7	0.0	1.7	111.3	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	184.7		
合計	109.9	11.2	16.9	6.4	0.1	0.0	144.5	3.8	1.3	5.1	244.7	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	406.9		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	239.2	5.4	25.3	12.1	0.0	0.0	282.0	4.3	1.8	6.1	477.7	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	781.0		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	50.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	73.6	1.9	0.0	1.9	124.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	209.3		
合計	289.9	16.4	34.8	14.4	0.1	0.0	355.6	6.2	1.8	8.0	602.4	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	990.3		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	1,265.6	103.2	286.1	142.8	0.1	0.0	1,797.8	7.5	2.8	10.3	3,045.4	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,021.3		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	16.3	0.9	2.3	0.2	0.0	0.0	19.7	0.1	0.0	0.1	33.3	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	54.8		
守田町ブロック	715.3	25.3	23.2	7.5	0.3	0.2	771.8	6.8	0.0	6.8	1,307.3	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,099.4		
服部町ブロック	67.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	90.6	2.2	0.0	2.2	153.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	255.5		
合計	2,064.9	140.4	321.1	152.8	0.5	0.2	2,679.9	16.6	2.8	19.4	4,539.6	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	7,431.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：木津川、柘植川、服部川 流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	2,089.7	241.0	419.0	218.8	0.2	0.1	2,968.8	9.2	2.8	12.0	5,029.2	173.8	16.3	22.0	38.3	27.1	0.0	239.2	8,249.2		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	546.0	141.6	444.6	205.0	0.1	0.0	1,337.3	1.4	0.0	1.4	2,265.2	184.2	12.3	20.4	32.7	18.0	0.0	234.9	3,838.8		
守田町ブロック	1,067.9	71.8	38.5	13.1	0.6	0.3	1,192.2	8.0	0.0	8.0	2,019.5	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,245.9		
服部町ブロック	95.9	14.9	11.9	2.9	0.1	0.1	125.8	2.8	0.0	2.8	213.0	5.8	0.8	1.2	2.0	2.6	0.0	10.4	352.0		
合計	3,799.5	469.3	914.0	439.8	1.0	0.5	5,624.1	21.4	2.8	24.2	9,526.9	371.7	33.8	50.0	83.8	55.2	0.0	510.7	15,685.9		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,901.0	215.6	383.4	202.2	0.1	0.1	2,702.4	9.0	2.8	11.8	4,578.0	163.0	15.2	20.4	35.6	25.3	0.0	223.9	7,516.1	
朝屋ブロック	944.9	46.8	9.7	5.3	0.2	0.1	1,007.0	5.1	0.0	5.1	1,705.9	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	2,728.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	3,433.4	1,613.7	3,687.2	2,234.6	0.9	0.4	10,970.2	3.5	0.6	4.1	18,583.6	1,024.7	88.9	100.8	189.7	116.0	0.0	1,330.4	30,888.3	
守田町ブロック	1,352.7	114.9	51.1	18.7	0.7	0.3	1,538.4	8.6	0.0	8.6	2,606.0	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,190.0	
服部町ブロック	160.5	26.4	24.6	6.4	0.2	0.1	218.2	3.7	0.0	3.7	369.7	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	614.2	
合計	7,792.5	2,017.4	4,156.0	2,467.2	2.1	1.0	16,436.2	29.9	3.4	33.3	27,843.2	1,213.5	115.1	135.9	251.0	160.3	0.0	1,624.8	45,937.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,796.5	398.5	606.1	325.3	0.3	0.1	4,126.8	10.2	2.8	13.0	6,990.8	219.8	23.3	28.4	51.7	40.2	0.0	311.7	11,442.3	
朝屋ブロック	1,378.6	95.9	15.1	8.0	0.6	0.3	1,498.5	7.7	0.0	7.7	2,538.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,066.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8,668.8	3,870.1	6,478.6	4,225.5	3.1	1.4	23,247.5	7.4	3.6	11.0	39,381.3	1,886.3	214.7	221.7	436.4	299.0	0.0	2,621.7	65,261.5	
守田町ブロック	2,040.1	220.1	66.1	23.7	1.0	0.5	2,351.5	9.4	0.0	9.4	3,983.2	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	6,404.6	
服部町ブロック	288.3	52.3	45.5	12.0	0.4	0.2	398.7	5.6	0.0	5.6	675.4	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,116.8	
合計	15,172.3	4,636.9	7,211.4	4,594.5	5.4	2.5	31,623.0	40.3	6.4	46.7	53,569.1	2,146.3	260.4	276.2	536.6	369.6	0.0	3,052.5	88,291.3	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,802.4	797.2	1,127.8	641.1	0.7	0.3	7,369.5	11.3	2.8	14.1	12,484.0	334.0	41.1	43.1	84.2	83.9	0.0	502.1	20,369.7	
朝屋ブロック	1,799.8	275.5	45.0	22.9	1.5	0.7	2,145.4	11.9	0.0	11.9	3,634.6	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	5,845.7	
大内ブロック	132.9	7.6	8.2	2.4	0.1	0.0	151.2	7.3	0.8	8.1	256.3	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	420.5	
小田町ブロック	14,130.8	6,157.9	7,504.4	4,861.6	6.1	2.7	32,663.5	8.6	4.2	12.8	55,332.0	2,219.1	331.1	300.2	631.3	464.7	0.0	3,315.1	91,323.4	
守田町ブロック	2,582.2	324.2	90.1	33.8	1.5	0.7	3,032.5	9.8	0.0	9.8	5,136.9	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	8,265.1	
服部町ブロック	438.5	96.1	75.2	21.5	0.6	0.3	632.2	6.6	0.0	6.6	1,070.9	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	1,767.4	
合計	23,886.6	7,658.5	8,850.7	5,583.3	10.5	4.7	45,994.3	55.5	7.8	63.3	77,914.7	2,620.1	411.1	383.0	794.1	605.3	0.0	4,019.5	127,991.8	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,037.8	848.5	1,201.2	688.6	0.8	0.3	7,777.2	11.5	2.8	14.3	13,174.5	350.9	43.6	44.9	88.5	89.6	0.0	529.0	21,495.0	
朝屋ブロック	2,046.4	370.6	56.9	31.9	2.0	0.9	2,508.7	12.8	0.4	13.2	4,249.7	17.2	18.0	16.5	34.5	20.1	0.0	71.8	6,843.4	
大内ブロック	164.9	13.0	12.0	3.5	0.2	0.1	193.7	8.3	0.8	9.1	328.1	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	537.5	
小田町ブロック	17,727.8	7,374.2	7,891.3	5,159.5	8.0	3.4	38,164.2	8.8	4.2	13.0	64,650.1	2,399.0	390.0	332.7	722.7	543.2	0.0	3,664.9	106,492.2	
守田町ブロック	2,981.3	455.6	111.2	40.7	1.9	0.8	3,591.5	10.2	0.0	10.2	6,084.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	9,795.9	
服部町ブロック	487.4	96.5	76.2	21.7	0.6	0.3	682.7	7.2	0.0	7.2	1,156.6	31.2	5.2	5.7	10.9	17.2	0.0	59.3	1,905.8	
合計	28,445.6	9,158.4	9,348.8	5,945.9	13.5	5.8	52,918.0	58.8	8.2	67.0	89,643.1	2,829.0	485.1	424.5	909.6	703.1	0.0	4,441.7	147,069.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成 (H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	71.7	1.2	10.5	5.1	0.0	0.0	88.5	2.6	1.4	4.0	150.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	249.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	39.8	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	61.5	1.5	0.0	1.5	103.9	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	172.9		
合計	111.5	12.5	18.7	7.1	0.1	0.1	150.0	4.1	1.4	5.5	253.9	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	422.0		

様式-3 被害額 (整備計画完成 (H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	270.2	8.6	34.0	16.6	0.0	0.0	329.4	4.8	1.9	6.7	558.0	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	910.4		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	49.7	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	75.2	1.8	0.0	1.8	127.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	213.5		
合計	319.9	20.9	44.5	19.1	0.1	0.1	404.6	6.6	1.9	8.5	685.4	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,123.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成 (H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	450.6	10.1	42.5	20.7	0.0	0.0	523.9	5.8	2.4	8.2	887.4	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,441.6		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	64.6	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	90.1	2.2	0.0	2.2	152.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	254.0		
合計	515.2	22.4	53.0	23.2	0.1	0.1	614.0	8.0	2.4	10.4	1,040.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,695.6		

様式-3 被害額 (整備計画完成 (H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	719.9	15.8	52.4	25.1	0.0	0.0	813.2	6.6	2.4	9.0	1,377.7	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,228.7		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	87.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	112.8	2.8	0.0	2.8	191.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	315.8		
合計	807.2	28.1	62.9	27.6	0.1	0.1	926.0	9.4	2.4	11.8	1,568.8	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,544.5		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	842.3	31.1	73.7	38.4	0.0	0.0	985.5	6.9	2.4	9.3	1,669.5	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,700.2	
朝屋ブロック	1,016.2	24.9	6.0	2.8	0.2	0.1	1,050.2	4.9	0.0	4.9	1,779.0	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	2,840.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	141.6	21.9	19.6	5.3	0.1	0.1	188.6	3.8	0.0	3.8	319.6	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	528.3	
合計	2,000.1	77.9	99.3	46.5	0.3	0.2	2,224.3	15.6	2.4	18.0	3,768.1	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	6,069.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,458.3	284.3	431.5	232.6	0.2	0.1	3,407.0	10.3	3.1	13.4	5,771.5	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	9,414.6	
朝屋ブロック	1,312.6	80.0	13.8	7.7	0.4	0.2	1,414.7	7.8	0.0	7.8	2,396.5	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	3,834.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8,387.4	3,765.0	6,849.8	4,470.9	2.6	1.2	23,476.9	7.5	3.6	11.1	39,770.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	65,679.6	
守田町ブロック	1,798.7	163.8	60.2	21.5	0.8	0.4	2,045.4	9.8	0.0	9.8	3,465.0	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,563.6	
服部町ブロック	301.3	58.1	50.5	13.3	0.4	0.2	423.8	6.0	0.0	6.0	718.2	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,185.1	
合計	14,258.3	4,351.2	7,405.8	4,746.0	4.4	2.1	30,767.8	41.4	6.7	48.1	52,121.2	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	85,677.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,878.3	655.9	902.9	490.3	0.6	0.2	5,928.2	12.1	3.1	15.2	10,042.4	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	16,380.1	
朝屋ブロック	1,820.6	244.0	34.8	17.2	1.4	0.7	2,118.7	11.5	0.0	11.5	3,588.9	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	5,761.7	
大内ブロック	117.2	4.1	5.0	1.4	0.1	0.0	127.8	6.0	0.4	6.4	216.6	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	353.8	
小田町ブロック	14,464.0	6,449.9	8,228.3	5,326.7	6.1	2.8	34,477.8	9.3	4.6	13.9	58,405.4	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	96,115.2	
守田町ブロック	2,635.6	314.9	89.0	34.8	1.6	0.7	3,076.6	10.7	0.0	10.7	5,211.6	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	8,374.2	
服部町ブロック	479.4	106.2	82.3	23.6	0.7	0.3	692.5	7.2	0.0	7.2	1,173.3	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	1,929.2	
合計	23,395.1	7,775.0	9,342.3	5,894.0	10.5	4.7	46,421.6	56.8	8.1	64.9	78,638.2	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	128,914.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,213.4	822.2	1,102.8	622.2	0.8	0.3	7,761.7	12.5	3.1	15.6	13,148.4	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	21,393.0	
朝屋ブロック	2,159.1	355.4	54.1	30.8	1.9	0.9	2,602.2	13.4	0.5	13.9	4,408.4	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	7,086.0	
大内ブロック	134.8	8.2	8.6	2.5	0.1	0.1	154.3	7.2	0.9	8.1	261.2	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	428.0	
小田町ブロック	18,920.7	7,897.1	8,712.7	5,705.1	8.4	3.5	41,247.5	9.7	4.6	14.3	69,873.4	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	114,741.8	
守田町ブロック	2,984.1	389.6	105.5	39.8	1.8	0.8	3,521.6	11.0	0.0	11.0	5,965.5	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	9,590.7	
服部町ブロック	584.7	126.5	94.6	28.2	0.8	0.4	835.2	8.1	0.0	8.1	1,414.9	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,327.4	
合計	29,996.8	9,599.0	10,078.3	6,428.6	13.8	6.0	56,122.5	61.9	9.1	71.0	95,071.8	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	155,566.9	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	78.9	1.3	11.6	5.6	0.0	0.0	97.4	2.9	1.6	4.5	165.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	273.5	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	43.8	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	67.6	1.7	0.0	1.7	114.3	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	189.6	
合計	122.7	13.7	20.6	7.8	0.1	0.1	165.0	4.6	1.6	6.2	279.3	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	463.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	297.3	9.4	37.4	18.2	0.0	0.0	362.3	5.3	2.1	7.4	613.8	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	999.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	54.7	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	82.8	2.0	0.0	2.0	140.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	234.0	
合計	352.0	22.9	49.0	21.0	0.1	0.1	445.1	7.3	2.1	9.4	753.9	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,233.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	495.6	11.1	46.8	22.7	0.0	0.0	576.2	6.4	2.6	9.0	976.1	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,583.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	71.1	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	99.2	2.4	0.0	2.4	167.9	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	278.6	
合計	566.7	24.6	58.4	25.5	0.1	0.1	675.4	8.8	2.6	11.4	1,144.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,862.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	791.9	17.4	57.7	27.6	0.0	0.0	894.6	7.3	2.7	10.0	1,515.4	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,448.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	96.1	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	124.2	3.0	0.0	3.0	210.2	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	346.5	
合計	888.0	30.9	69.3	30.4	0.1	0.1	1,018.8	10.3	2.7	13.0	1,725.6	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,795.3	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	926.5	34.3	81.1	42.2	0.0	0.0	1,084.1	7.6	2.7	10.3	1,836.4	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,966.7	
朝屋ブロック	1,117.9	27.4	6.6	3.1	0.2	0.1	1,155.3	5.3	0.0	5.3	1,957.0	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	3,124.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	155.7	24.1	21.5	5.9	0.2	0.1	207.5	4.2	0.0	4.2	351.5	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	579.5	
合計	2,200.1	85.8	109.2	51.2	0.4	0.2	2,446.9	17.1	2.7	19.8	4,144.9	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	6,670.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,704.1	312.8	474.7	255.8	0.2	0.1	3,747.7	11.3	3.4	14.7	6,348.6	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	10,333.7	
朝屋ブロック	1,443.9	88.0	15.2	8.4	0.5	0.2	1,556.2	8.6	0.0	8.6	2,636.1	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	4,216.5	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	9,226.1	4,141.5	7,534.8	4,918.0	2.9	1.3	25,824.6	8.2	4.0	12.2	43,747.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	72,005.4	
守田町ブロック	1,978.6	180.2	66.2	23.6	0.9	0.5	2,250.0	10.8	0.0	10.8	3,811.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	6,115.7	
服部町ブロック	331.5	63.9	55.6	14.7	0.5	0.2	466.4	6.6	0.0	6.6	790.0	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,300.1	
合計	15,684.2	4,786.4	8,146.5	5,220.5	5.0	2.3	33,844.9	45.5	7.4	52.9	57,333.2	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	93,971.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,266.2	721.5	993.2	539.3	0.6	0.3	6,521.1	13.3	3.4	16.7	11,046.6	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	17,978.7	
朝屋ブロック	2,002.7	268.4	38.2	18.9	1.5	0.8	2,330.5	12.7	0.0	12.7	3,947.8	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	6,333.6	
大内ブロック	128.9	4.6	5.5	1.6	0.1	0.0	140.7	6.6	0.5	7.1	238.2	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	389.0	
小田町ブロック	15,910.4	7,094.9	9,051.2	5,859.4	6.7	3.1	37,925.7	10.2	5.1	15.3	64,245.9	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	105,405.0	
守田町ブロック	2,899.1	346.4	97.9	38.3	1.8	0.7	3,384.2	11.7	0.0	11.7	5,732.8	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	9,204.0	
服部町ブロック	527.4	116.9	90.6	25.9	0.8	0.4	762.0	8.0	0.0	8.0	1,290.6	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	2,116.8	
合計	25,734.7	8,552.7	10,276.6	6,483.4	11.5	5.3	51,064.2	62.5	9.0	71.5	86,501.9	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	141,427.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,734.8	904.4	1,213.1	684.4	0.9	0.4	8,538.0	13.8	3.4	17.2	14,463.2	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	23,485.7	
朝屋ブロック	2,375.0	391.0	59.6	33.9	2.1	1.0	2,862.6	14.7	0.5	15.2	4,849.2	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	7,788.5	
大内ブロック	148.3	9.0	9.5	2.7	0.1	0.1	169.7	8.0	1.0	9.0	287.4	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	470.5	
小田町ブロック	20,812.8	8,686.8	9,584.0	6,275.6	9.2	3.9	45,372.3	10.6	5.1	15.7	76,860.7	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	125,855.3	
守田町ブロック	3,282.5	428.5	116.0	43.8	2.0	0.8	3,873.6	12.1	0.0	12.1	6,562.1	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	10,540.4	
服部町ブロック	643.1	139.1	104.1	31.0	0.9	0.4	918.6	8.9	0.0	8.9	1,556.3	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,553.0	
合計	32,996.5	10,558.8	11,086.3	7,071.4	15.2	6.6	61,734.8	68.1	10.0	78.1	104,578.9	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	170,693.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	64.6	1.1	9.5	4.6	0.0	0.0	79.8	2.4	1.3	3.7	135.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	225.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	35.8	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	55.2	1.4	0.0	1.4	93.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	156.1		
合計	100.4	11.2	16.9	6.4	0.1	0.0	135.0	3.8	1.3	5.1	228.5	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	381.2		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	243.2	7.7	30.6	14.9	0.0	0.0	296.4	4.3	1.8	6.1	502.2	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	821.0		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	44.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	67.6	1.6	0.0	1.6	114.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	192.9		
合計	287.9	18.7	40.1	17.2	0.1	0.0	364.0	5.9	1.8	7.7	616.8	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,013.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	405.5	9.1	38.3	18.6	0.0	0.0	471.5	5.3	2.1	7.4	798.6	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,299.6		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	58.2	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	81.1	1.9	0.0	1.9	137.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	229.5		
合計	463.7	20.1	47.8	20.9	0.1	0.0	552.6	7.2	2.1	9.3	936.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,529.1		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	647.9	14.2	47.2	22.6	0.0	0.0	731.9	6.0	2.2	8.2	1,239.9	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,008.8		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	78.6	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	101.5	2.5	0.0	2.5	172.0	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	285.1		
合計	726.5	25.2	56.7	24.9	0.1	0.0	833.4	8.5	2.2	10.7	1,411.9	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,293.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	758.1	28.0	66.3	34.5	0.0	0.0	886.9	6.2	2.2	8.4	1,502.5	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,433.7	
朝屋ブロック	914.6	22.4	5.4	2.5	0.2	0.1	945.2	4.4	0.0	4.4	1,601.1	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	2,557.5	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	127.4	19.7	17.6	4.8	0.1	0.1	169.7	3.4	0.0	3.4	287.6	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	477.0	
合計	1,800.1	70.1	89.3	41.8	0.3	0.2	2,001.8	14.0	2.2	16.2	3,391.2	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	5,468.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,212.4	255.9	388.4	209.3	0.2	0.1	3,066.3	9.3	2.8	12.1	5,194.3	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	8,495.4	
朝屋ブロック	1,181.4	72.0	12.4	6.9	0.4	0.2	1,273.3	7.0	0.0	7.0	2,156.8	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	3,452.7	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	7,548.7	3,388.5	6,164.8	4,023.8	2.4	1.1	21,129.3	6.7	3.3	10.0	35,793.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	59,353.9	
守田町ブロック	1,618.8	147.4	54.2	19.3	0.8	0.4	1,840.9	8.8	0.0	8.8	3,118.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,011.6	
服部町ブロック	271.2	52.3	45.5	12.0	0.4	0.2	381.6	5.4	0.0	5.4	646.3	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,070.4	
合計	12,832.5	3,916.1	6,665.3	4,271.3	4.2	2.0	27,691.4	37.2	6.1	43.3	46,908.9	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	77,384.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,490.5	590.3	812.6	441.3	0.5	0.2	5,335.4	10.9	2.8	13.7	9,038.2	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	14,781.6	
朝屋ブロック	1,638.5	219.6	31.3	15.5	1.2	0.6	1,906.7	10.4	0.0	10.4	3,230.0	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	5,189.7	
大内ブロック	105.4	3.7	4.5	1.3	0.1	0.0	115.0	5.4	0.4	5.8	194.9	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	318.7	
小田町ブロック	13,017.6	5,804.9	7,405.5	4,794.0	5.5	2.5	31,030.0	8.4	4.2	12.6	52,564.9	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	86,825.6	
守田町ブロック	2,372.0	283.4	80.1	31.3	1.5	0.6	2,768.9	9.6	0.0	9.6	4,690.5	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	7,544.3	
服部町ブロック	431.5	95.6	74.1	21.2	0.6	0.3	623.3	6.5	0.0	6.5	1,055.9	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	1,741.9	
合計	21,055.5	6,997.5	8,408.1	5,304.6	9.4	4.2	41,779.3	51.2	7.4	58.6	70,774.4	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	116,401.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,692.1	740.0	992.5	560.0	0.7	0.3	6,985.6	11.3	2.8	14.1	11,833.6	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	19,300.6	
朝屋ブロック	1,943.2	319.9	48.7	27.8	1.7	0.8	2,342.1	12.0	0.4	12.4	3,967.5	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	6,383.5	
大内ブロック	121.3	7.3	7.7	2.2	0.1	0.0	138.6	6.5	0.8	7.3	235.1	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	385.4	
小田町ブロック	17,028.7	7,107.4	7,841.4	5,134.6	7.5	3.2	37,122.8	8.7	4.2	12.9	62,886.0	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	103,628.3	
守田町ブロック	2,685.7	350.6	94.9	35.9	1.6	0.7	3,169.4	9.9	0.0	9.9	5,369.0	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	8,640.9	
服部町ブロック	526.2	113.8	85.2	25.4	0.7	0.3	751.6	7.3	0.0	7.3	1,273.4	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,101.5	
合計	26,997.2	8,639.0	9,070.4	5,785.9	12.3	5.3	50,510.1	55.7	8.2	63.9	85,564.6	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	140,440.2	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1		
合計	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.1	0.0	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	0.1	0.0	0.1	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	75.0			
合計	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	1.5	0.0	1.5	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	76.4				

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価							代替活動	小計	
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動								
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	47.2	15.1	5.3	1.7	0.1	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0	117.6	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	6.0	193.0		
島ヶ原ブロック⑤	46.9	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	52.7	0.2	0.0	0.2	89.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	143.1		
合計	94.1	20.6	5.6	1.7	0.1	0.0	122.1	1.8	0.0	1.8	206.9	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	6.9	337.7			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価							代替活動	小計	
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動								
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	85.3	36.7	11.1	3.8	0.2	0.1	137.2	0.0	0.0	0.0	232.4	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	380.9		
島ヶ原ブロック⑤	78.6	12.3	0.6	0.1	0.0	0.0	91.6	0.2	0.0	0.2	155.2	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	248.3		
合計	163.9	49.0	11.7	3.9	0.2	0.1	228.8	2.0	0.0	2.0	387.6	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	12.6	631.0			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価							代替活動	小計	
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動								
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	153.0	71.0	20.4	8.3	0.3	0.1	253.1	0.0	0.0	0.0	428.9	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	701.6		
島ヶ原ブロック⑤	118.4	19.6	1.5	0.4	0.0	0.0	139.9	0.3	0.0	0.3	237.1	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	380.4		
合計	271.4	90.6	21.9	8.7	0.3	0.1	393.0	2.3	0.0	2.3	666.0	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	22.7	1,084.0			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20)) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価							代替活動	小計	
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動								
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	157.7	71.7	21.1	8.5	0.3	0.1	259.4	0.0	0.0	0.0	439.3	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	719.2		
島ヶ原ブロック⑤	158.8	28.2	4.6	1.4	0.1	0.0	193.1	0.3	0.0	0.3	327.3	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	527.2		
合計	316.5	99.9	25.7	9.9	0.4	0.1	452.5	2.4	0.0	2.4	766.6	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	27.0	1,248.5			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	
合計	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.3	0.0	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	0.1	0.0	0.1	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	82.5	
合計	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	1.7	0.0	1.7	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	84.1		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	51.9	16.6	5.8	1.9	0.1	0.0	76.3	0.0	0.0	0.0	129.4	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	6.0	211.7		
島ヶ原ブロック⑤	51.5	6.0	0.3	0.0	0.0	0.0	57.8	0.2	0.0	0.2	98.2	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	157.1		
合計	103.4	22.6	6.1	1.9	0.1	0.0	134.1	2.0	0.0	2.0	227.6	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	0.0	6.9	370.6			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	93.8	40.4	12.2	4.2	0.2	0.1	150.9	0.0	0.0	0.0	255.7	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	417.9			
島ヶ原ブロック⑤	86.4	13.5	0.6	0.1	0.0	0.0	100.6	0.2	0.0	0.2	170.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	272.8			
合計	180.2	53.9	12.8	4.3	0.2	0.1	251.5	2.2	0.0	2.2	426.4	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	0.0	12.6	692.7			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	168.3	78.1	22.5	9.1	0.3	0.2	278.5	0.0	0.0	0.0	471.7	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	769.8			
島ヶ原ブロック⑤	130.2	21.6	1.6	0.4	0.1	0.0	153.9	0.3	0.0	0.3	260.8	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	418.1			
合計	298.5	99.7	24.1	9.5	0.4	0.2	432.4	2.5	0.0	2.5	732.5	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	0.0	22.7	1,190.1			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	173.4	78.9	23.2	9.3	0.3	0.2	285.3	0.0	0.0	0.0	483.2	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	789.0			
島ヶ原ブロック⑤	174.7	31.0	5.1	1.6	0.1	0.0	212.5	0.3	0.0	0.3	360.1	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	579.4			
合計	348.1	109.9	28.3	10.9	0.4	0.2	497.8	2.6	0.0	2.6	843.3	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	0.0	27.0	1,370.7			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0		
合計	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	1.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	0.1	0.0	0.1	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	67.6		
合計	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	1.4	0.0	1.4	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	68.9			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20) : 資産-10%)

水系名 : 淀川水系河川名 : 木津川

流量規模 : 1/30確率規模洪水

(単位 : 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	42.5	13.6	4.7	1.6	0.1	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	105.9	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	6.0	174.4		
島ヶ原ブロック⑤	42.2	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	47.4	0.1	0.0	0.1	80.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	128.7			
合計	84.7	18.5	5.0	1.6	0.1	0.0	109.9	1.6	0.0	1.6	186.2	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	0.0	6.9	304.6			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20) : 資産-10%)

水系名 : 淀川水系河川名 : 木津川

流量規模 : 1/50確率規模洪水

(単位 : 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	76.8	33.0	10.0	3.4	0.2	0.1	123.5	0.0	0.0	0.0	209.2	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	344.0			
島ヶ原ブロック⑤	70.7	11.1	0.5	0.1	0.0	0.0	82.4	0.2	0.0	0.2	139.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	223.6			
合計	147.5	44.1	10.5	3.5	0.2	0.1	205.9	1.8	0.0	1.8	348.9	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	0.0	12.6	569.2			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20) : 資産-10%)

水系名 : 淀川水系河川名 : 木津川

流量規模 : 1/80確率規模洪水

(単位 : 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	137.7	63.9	18.4	7.5	0.2	0.1	227.8	0.0	0.0	0.0	386.0	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	633.4			
島ヶ原ブロック⑤	106.6	17.7	1.3	0.3	0.0	0.0	125.9	0.2	0.0	0.2	213.4	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	342.6			
合計	244.3	81.6	19.7	7.8	0.2	0.1	353.7	2.0	0.0	2.0	599.4	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	0.0	22.7	977.8			

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20) : 資産-10%)

水系名 : 淀川水系河川名 : 木津川

流量規模 : 1/100確率規模洪水

(単位 : 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	141.9	64.5	18.9	7.6	0.2	0.1	233.2	0.0	0.0	0.0	395.4	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	649.1			
島ヶ原ブロック⑤	143.0	25.4	4.1	1.3	0.1	0.0	173.9	0.3	0.0	0.3	294.6	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	475.3			
合計	284.9	89.9	23.0	8.9	0.3	0.1	407.1	2.2	0.0	2.2	690.0	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	0.0	27.0	1,126.3			

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1		
合計	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.1	0.0	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2		

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	0.1	0.0	0.1	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	75.0		
合計	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	1.5	0.0	1.5	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	76.4			

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	47.2	15.1	5.3	1.7	0.1	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0	117.6	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	6.0	193.0		
島ヶ原ブロック⑤	46.9	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	52.7	0.2	0.0	0.2	89.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	143.1		
合計	94.1	20.6	5.6	1.7	0.1	0.0	122.1	1.8	0.0	1.8	206.9	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	0.0	6.9	337.7			

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	85.3	36.7	11.1	3.8	0.2	0.1	137.2	0.0	0.0	0.0	232.4	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	380.9			
島ヶ原ブロック⑤	78.6	12.3	0.6	0.1	0.0	0.0	91.6	0.2	0.0	0.2	155.2	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	248.3			
合計	163.9	49.0	11.7	3.9	0.2	0.1	228.8	2.0	0.0	2.0	387.6	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	0.0	12.6	631.0			

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	153.0	71.0	20.4	8.3	0.3	0.1	253.1	0.0	0.0	0.0	428.9	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	701.6		
島ヶ原ブロック⑤	118.4	19.6	1.5	0.4	0.0	0.0	139.9	0.3	0.0	0.3	237.1	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	380.4		
合計	271.4	90.6	21.9	8.7	0.3	0.1	393.0	2.3	0.0	2.3	666.0	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	0.0	22.7	1,084.0		

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	157.7	71.7	21.1	8.5	0.3	0.1	259.4	0.0	0.0	0.0	439.3	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	719.2		
島ヶ原ブロック⑤	158.8	28.2	4.6	1.4	0.1	0.0	193.1	0.3	0.0	0.3	327.3	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	527.2		
合計	316.5	99.9	25.7	9.9	0.4	0.1	452.5	2.4	0.0	2.4	766.6	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	0.0	27.0	1,248.5		

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2		
合計	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.3	0.0	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5		

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	0.1	0.0	0.1	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	82.5			
合計	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	1.7	0.0	1.7	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	84.1				

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	51.9	16.6	5.8	1.9	0.1	0.0	76.3	0.0	0.0	0.0	129.4	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	6.0	211.7		
島ヶ原ブロック⑤	51.5	6.0	0.3	0.0	0.0	0.0	57.8	0.2	0.0	0.2	98.2	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	157.1		
合計	103.4	22.6	6.1	1.9	0.1	0.0	134.1	2.0	0.0	2.0	227.6	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	6.9	370.6			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	93.8	40.4	12.2	4.2	0.2	0.1	150.9	0.0	0.0	0.0	255.7	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	417.9		
島ヶ原ブロック⑤	86.4	13.5	0.6	0.1	0.0	0.0	100.6	0.2	0.0	0.2	170.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	272.8		
合計	180.2	53.9	12.8	4.3	0.2	0.1	251.5	2.2	0.0	2.2	426.4	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	12.6	692.7			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	168.3	78.1	22.5	9.1	0.3	0.2	278.5	0.0	0.0	0.0	471.7	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	769.8		
島ヶ原ブロック⑤	130.2	21.6	1.6	0.4	0.1	0.0	153.9	0.3	0.0	0.3	260.8	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	418.1		
合計	298.5	99.7	24.1	9.5	0.4	0.2	432.4	2.5	0.0	2.5	732.5	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	22.7	1,190.1			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	173.4	78.9	23.2	9.3	0.3	0.2	285.3	0.0	0.0	0.0	483.2	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	789.0		
島ヶ原ブロック⑤	174.7	31.0	5.1	1.6	0.1	0.0	212.5	0.3	0.0	0.3	360.1	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	579.4		
合計	348.1	109.9	28.3	10.9	0.4	0.2	497.8	2.6	0.0	2.6	843.3	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	27.0	1,370.7			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
合計	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	1.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	0.1	0.0	0.1	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	67.6		
合計	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	1.4	0.0	1.4	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	68.9			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	42.5	13.6	4.7	1.6	0.1	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	105.9	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	6.0	174.4		
島ヶ原ブロック⑤	42.2	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	47.4	0.1	0.0	0.1	80.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	128.7		
合計	84.7	18.5	5.0	1.6	0.1	0.0	109.9	1.6	0.0	1.6	186.2	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	6.9	304.6			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	76.8	33.0	10.0	3.4	0.2	0.1	123.5	0.0	0.0	0.0	209.2	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	11.3	344.0			
島ヶ原ブロック⑤	70.7	11.1	0.5	0.1	0.0	0.0	82.4	0.2	0.0	0.2	139.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	1.3	223.6			
合計	147.5	44.1	10.5	3.5	0.2	0.1	205.9	1.8	0.0	1.8	348.9	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	12.6	569.2			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	137.7	63.9	18.4	7.5	0.2	0.1	227.8	0.0	0.0	0.0	386.0	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	19.6	633.4			
島ヶ原ブロック⑤	106.6	17.7	1.3	0.3	0.0	0.0	125.9	0.2	0.0	0.2	213.4	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	3.1	342.6			
合計	244.3	81.6	19.7	7.8	0.2	0.1	353.7	2.0	0.0	2.0	599.4	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	22.7	977.8			

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	141.9	64.5	18.9	7.6	0.2	0.1	233.2	0.0	0.0	0.0	395.4	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	20.5	649.1			
島ヶ原ブロック⑤	143.0	25.4	4.1	1.3	0.1	0.0	173.9	0.3	0.0	0.3	294.6	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	6.5	475.3			
合計	284.9	89.9	23.0	8.9	0.3	0.1	407.1	2.2	0.0	2.2	690.0	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	27.0	1,126.3			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1		
合計	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.1	0.0	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	0.1	0.0	0.1	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	75.0	
合計	26.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.6	1.5	0.0	1.5	46.8	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	76.4	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	47.2	15.1	5.3	1.7	0.1	0.0	69.4	0.0	0.0	0.0	117.6	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	6.0	193.0		
島ヶ原ブロック⑤	46.9	5.5	0.3	0.0	0.0	0.0	52.7	0.2	0.0	0.2	89.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	143.1			
合計	94.1	20.6	5.6	1.7	0.1	0.0	122.1	1.8	0.0	1.8	206.9	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	0.0	6.9	337.7			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	85.3	36.7	11.1	3.8	0.2	0.1	137.2	0.0	0.0	0.0	232.4	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	380.9			
島ヶ原ブロック⑤	78.6	12.3	0.6	0.1	0.0	0.0	91.6	0.2	0.0	0.2	155.2	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	248.3			
合計	163.9	49.0	11.7	3.9	0.2	0.1	228.8	2.0	0.0	2.0	387.6	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	0.0	12.6	631.0			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	153.0	71.0	20.4	8.3	0.3	0.1	253.1	0.0	0.0	0.0	428.9	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	701.6			
島ヶ原ブロック⑤	118.4	19.6	1.5	0.4	0.0	0.0	139.9	0.3	0.0	0.3	237.1	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	380.4			
合計	271.4	90.6	21.9	8.7	0.3	0.1	393.0	2.3	0.0	2.3	666.0	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	0.0	22.7	1,084.0			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	157.7	71.7	21.1	8.5	0.3	0.1	259.4	0.0	0.0	0.0	439.3	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	719.2			
島ヶ原ブロック⑤	158.8	28.2	4.6	1.4	0.1	0.0	193.1	0.3	0.0	0.3	327.3	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	527.2			
合計	316.5	99.9	25.7	9.9	0.4	0.1	452.5	2.4	0.0	2.4	766.6	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	0.0	27.0	1,248.5			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	4.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	12.2
合計	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.3	0.0	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	0.1	0.0	0.1	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	82.5	82.5	
合計	29.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	30.4	1.7	0.0	1.7	51.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	84.1	84.1	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	51.9	16.6	5.8	1.9	0.1	0.0	76.3	0.0	0.0	0.0	129.4	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	6.0	211.7		
島ヶ原ブロック⑤	51.5	6.0	0.3	0.0	0.0	0.0	57.8	0.2	0.0	0.2	98.2	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	157.1		
合計	103.4	22.6	6.1	1.9	0.1	0.0	134.1	2.0	0.0	2.0	227.6	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	6.9	370.6			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	93.8	40.4	12.2	4.2	0.2	0.1	150.9	0.0	0.0	0.0	255.7	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	417.9		
島ヶ原ブロック⑤	86.4	13.5	0.6	0.1	0.0	0.0	100.6	0.2	0.0	0.2	170.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	272.8		
合計	180.2	53.9	12.8	4.3	0.2	0.1	251.5	2.2	0.0	2.2	426.4	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	12.6	692.7			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	168.3	78.1	22.5	9.1	0.3	0.2	278.5	0.0	0.0	0.0	471.7	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	769.8		
島ヶ原ブロック⑤	130.2	21.6	1.6	0.4	0.1	0.0	153.9	0.3	0.0	0.3	260.8	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	418.1		
合計	298.5	99.7	24.1	9.5	0.4	0.2	432.4	2.5	0.0	2.5	732.5	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	22.7	1,190.1			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	173.4	78.9	23.2	9.3	0.3	0.2	285.3	0.0	0.0	0.0	483.2	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	789.0		
島ヶ原ブロック⑤	174.7	31.0	5.1	1.6	0.1	0.0	212.5	0.3	0.0	0.3	360.1	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	579.4		
合計	348.1	109.9	28.3	10.9	0.4	0.2	497.8	2.6	0.0	2.6	843.3	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	27.0	1,370.7			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0		
合計	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	1.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	0.1	0.0	0.1	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.5	67.6			
合計	24.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8	1.4	0.0	1.4	42.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	68.9				

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	42.5	13.6	4.7	1.6	0.1	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	105.9	2.1	0.8	1.3	2.1	1.8	0.0	0.0	6.0	174.4		
島ヶ原ブロック⑤	42.2	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	47.4	0.1	0.0	0.1	80.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.9	128.7		
合計	84.7	18.5	5.0	1.6	0.1	0.0	109.9	1.6	0.0	1.6	186.2	2.2	1.1	1.7	2.8	1.9	0.0	6.9	304.6			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	76.8	33.0	10.0	3.4	0.2	0.1	123.5	0.0	0.0	0.0	209.2	3.6	1.6	2.4	4.0	3.7	0.0	0.0	11.3	344.0		
島ヶ原ブロック⑤	70.7	11.1	0.5	0.1	0.0	0.0	82.4	0.2	0.0	0.2	139.7	0.1	0.4	0.6	1.0	0.2	0.0	0.0	1.3	223.6		
合計	147.5	44.1	10.5	3.5	0.2	0.1	205.9	1.8	0.0	1.8	348.9	3.7	2.0	3.0	5.0	3.9	0.0	12.6	569.2			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	137.7	63.9	18.4	7.5	0.2	0.1	227.8	0.0	0.0	0.0	386.0	5.6	3.0	3.4	6.4	7.6	0.0	0.0	19.6	633.4		
島ヶ原ブロック⑤	106.6	17.7	1.3	0.3	0.0	0.0	125.9	0.2	0.0	0.2	213.4	0.5	1.0	0.9	1.9	0.7	0.0	0.0	3.1	342.6		
合計	244.3	81.6	19.7	7.8	0.2	0.1	353.7	2.0	0.0	2.0	599.4	6.1	4.0	4.3	8.3	8.3	0.0	22.7	977.8			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	141.9	64.5	18.9	7.6	0.2	0.1	233.2	0.0	0.0	0.0	395.4	6.0	3.1	3.6	6.7	7.8	0.0	0.0	20.5	649.1		
島ヶ原ブロック⑤	143.0	25.4	4.1	1.3	0.1	0.0	173.9	0.3	0.0	0.3	294.6	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	475.3		
合計	284.9	89.9	23.0	8.9	0.3	0.1	407.1	2.2	0.0	2.2	690.0	7.7	4.5	5.2	9.7	9.6	0.0	27.0	1,126.3			

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	
合計	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.1	0.0	1.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所 その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.1	0.0	0.1	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.5	
合計	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	1.5	0.0	1.5	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所応急 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.2	0.0	0.2	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	
合計	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	1.8	0.0	1.8	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.3	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所応急 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	0.2	0.0	0.2	87.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	
合計	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.8	2.0	0.0	2.0	87.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所応急 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	0.3	0.0	0.3	107.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	171.6	
合計	63.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	2.3	0.0	2.3	107.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計	事業所応急 対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	23.3	3.3	3.1	1.1	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	52.2	1.9	0.6	1.0	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	4.8	87.8	
島ヶ原ブロック⑤	158.8	28.2	4.6	1.4	0.1	0.0	193.1	0.3	0.0	0.3	327.3	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	0.0	6.5	527.2	
合計	182.1	31.5	7.7	2.5	0.1	0.0	223.9	2.4	0.0	2.4	379.5	3.6	2.0	2.6	4.6	3.1	0.0	0.0	0.0	11.3	617.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	
合計	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	1.3	0.0	1.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.1	0.0	0.1	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.9	
合計	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	1.7	0.0	1.7	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.2	0.0	0.2	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.2	
合計	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	2.0	0.0	2.0	52.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.2	0.0	0.2	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.7	
合計	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	2.2	0.0	2.2	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.7	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	0.3	0.0	0.3	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.6	
合計	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	2.5	0.0	2.5	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	190.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	25.7	3.6	3.5	1.2	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	57.4	1.9	0.6	1.0	1.6	1.3	0.0	0.0	4.8	96.2		
島ヶ原ブロック⑤	174.7	31.0	5.1	1.6	0.1	0.0	212.5	0.3	0.0	0.3	360.1	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	6.5	579.4		
合計	200.4	34.6	8.6	2.8	0.1	0.0	246.5	2.6	0.0	2.6	417.5	3.6	2.0	2.6	4.6	3.1	0.0	0.0	11.3	677.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
合計	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	1.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	0.1	0.0	0.1	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	
合計	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	1.4	0.0	1.4	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5		
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.1	0.0	0.1	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	
合計	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	1.6	0.0	1.6	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	0.2	0.0	0.2	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.7	
合計	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	1.8	0.0	1.8	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.3	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック⑤	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.2	0.0	0.2	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.3	
合計	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	2.0	0.0	2.0	96.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
島ヶ原ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	
島ヶ原ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
島ヶ原ブロック④	21.0	2.9	2.8	1.0	0.0	0.0	27.7	0.0	0.0	0.0	47.0	1.9	0.6	1.0	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	4.8	79.5	
島ヶ原ブロック⑤	143.0	25.4	4.1	1.3	0.1	0.0	173.9	0.3	0.0	0.3	294.6	1.7	1.4	1.6	3.0	1.8	0.0	0.0	0.0	6.5	475.3	
合計	164.0	28.3	6.9	2.3	0.1	0.0	201.6	2.2	0.0	2.2	341.6	3.6	2.0	2.6	4.6	3.1	0.0	0.0	0.0	11.3	556.7	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.2	0.0	0.2	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	236.9	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	39.2	29.5	16.9	1.9	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	148.4	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	242.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	120.1	36.2	16.9	1.9	0.1	0.0	175.2	0.2	0.0	0.2	296.9	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	479.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	46.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	47.6	0.6	0.0	0.6	80.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	129.6	
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.3	0.0	0.3	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	237.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	51.0	36.0	21.5	2.6	0.0	0.0	111.1	0.0	0.0	0.0	188.3	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	307.4	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	178.3	43.5	21.8	2.7	0.1	0.0	246.4	0.9	0.0	0.9	417.6	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	674.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	116.3	5.9	1.6	0.7	0.0	0.0	124.5	0.8	0.0	0.8	211.1	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	340.2	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.6	0.0	0.6	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	304.8	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	71.0	50.8	23.9	3.3	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0	252.6	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	412.0	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	292.8	63.9	25.5	4.0	0.1	0.0	386.3	1.4	0.0	1.4	654.6	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,057.0	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	10.9	5.8	7.2	0.7	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	41.7	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	69.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	287.4	42.8	8.1	3.8	0.1	0.1	342.3	1.1	0.0	1.1	579.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	938.0	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	94.3	66.4	27.7	4.1	0.1	0.0	192.6	0.0	0.0	0.0	326.3	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	532.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	498.1	122.2	43.0	8.6	0.3	0.1	672.3	2.0	0.0	2.0	1,138.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,844.8	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	52.3	67.2	69.9	7.7	0.1	0.1	197.3	0.0	0.0	0.0	334.3	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	553.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	306.1	43.7	8.1	3.8	0.1	0.1	361.9	1.2	0.0	1.2	613.0	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	991.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	572.0	186.8	106.1	15.8	0.4	0.2	881.3	2.1	0.0	2.1	1,492.7	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,428.1	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20))水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	123.1	133.7	116.3	14.7	0.2	0.1	388.1	0.0	0.0	0.0	657.6	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,085.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	404.5	78.3	10.6	5.5	0.2	0.1	499.2	1.3	0.0	1.3	845.6	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,365.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	1.0	0.0	1.0	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	741.2	287.9	155.0	24.5	0.6	0.2	1,209.4	2.3	0.0	2.3	2,048.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,333.7	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	43.1	32.5	18.6	2.1	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	163.2	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	265.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	132.1	39.9	18.6	2.1	0.1	0.0	192.8	0.3	0.0	0.3	326.5	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	526.4	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	51.1	0.9	0.4	0.2	0.0	0.0	52.6	0.7	0.0	0.7	88.9	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	142.8	
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	56.1	39.6	23.6	2.9	0.0	0.0	122.2	0.0	0.0	0.0	207.1	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	337.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	196.2	47.9	24.0	3.1	0.1	0.0	271.3	1.0	0.0	1.0	459.3	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	740.7	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	128.0	6.5	1.8	0.8	0.0	0.0	137.1	0.9	0.0	0.9	232.2	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	374.0	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	0.7	0.0	0.7	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	78.1	55.9	26.3	3.6	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	277.8	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	452.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	322.1	70.3	28.1	4.4	0.1	0.0	425.0	1.6	0.0	1.6	720.0	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,161.3	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	12.0	6.4	7.9	0.7	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	45.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	75.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	316.1	47.0	8.9	4.2	0.1	0.1	376.4	1.2	0.0	1.2	637.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	1,030.2	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	103.7	73.1	30.4	4.5	0.1	0.0	211.8	0.0	0.0	0.0	358.9	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	584.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	547.8	134.4	47.2	9.4	0.3	0.1	739.2	2.2	0.0	2.2	1,252.4	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	2,025.7	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	57.5	73.9	76.9	8.5	0.1	0.1	217.0	0.0	0.0	0.0	367.7	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	606.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	336.7	48.1	8.9	4.2	0.1	0.1	398.1	1.3	0.0	1.3	674.3	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	1,088.7	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	629.2	205.4	116.7	17.4	0.4	0.2	969.3	2.3	0.0	2.3	1,641.9	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,665.5	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	135.4	147.1	128.0	16.2	0.2	0.1	427.0	0.0	0.0	0.0	723.3	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,189.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	445.0	86.1	11.6	6.0	0.2	0.1	549.0	1.5	0.0	1.5	930.1	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,499.6	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.2	0.0	1.2	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.7	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	815.4	316.6	170.5	26.9	0.6	0.2	1,330.2	2.7	0.0	2.7	2,253.3	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,659.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	35.3	26.6	15.2	1.7	0.0	0.0	78.8	0.0	0.0	0.0	133.5	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	218.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	108.1	32.6	15.2	1.7	0.1	0.0	157.7	0.2	0.0	0.2	267.1	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	431.8	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	41.8	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	42.9	0.5	0.0	0.5	72.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	116.7	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	45.9	32.4	19.3	2.3	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0	169.4	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	277.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	160.5	39.1	19.6	2.4	0.1	0.0	221.7	0.7	0.0	0.7	375.7	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	607.2	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	104.7	5.3	1.5	0.6	0.0	0.0	112.1	0.7	0.0	0.7	190.0	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	306.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.5	0.0	0.5	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	63.9	45.7	21.5	3.0	0.0	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0	227.3	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	371.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	263.5	57.4	23.0	3.6	0.1	0.0	347.6	1.2	0.0	1.2	589.1	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	952.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	9.8	5.2	6.5	0.6	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	37.5	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	62.5	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	258.7	38.5	7.3	3.4	0.1	0.0	308.0	1.0	0.0	1.0	521.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	845.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.8	0.0	0.8	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	84.9	59.8	24.9	3.7	0.1	0.0	173.4	0.0	0.0	0.0	293.6	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	480.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	448.3	109.9	38.7	7.7	0.3	0.0	604.9	1.8	0.0	1.8	1,024.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,663.2	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	47.1	60.5	62.9	7.0	0.1	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0	300.9	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	500.6	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	275.5	39.4	7.3	3.4	0.1	0.1	325.8	1.0	0.0	1.0	551.7	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	893.5	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	514.8	168.1	95.5	14.3	0.4	0.1	793.2	1.9	0.0	1.9	1,343.4	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,190.5	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産-10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	110.8	120.4	104.7	13.2	0.2	0.1	349.4	0.0	0.0	0.0	591.8	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	980.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	364.1	70.4	9.5	4.9	0.2	0.1	449.2	1.2	0.0	1.2	761.0	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,230.4	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	667.1	259.0	139.5	22.0	0.6	0.2	1,088.4	2.1	0.0	2.1	1,843.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,007.5	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価 代替活動							小計
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動						
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価 代替活動							小計
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動						
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価 代替活動							小計
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動						
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.2	0.0	0.2	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	236.9	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	39.2	29.5	16.9	1.9	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	148.4	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	242.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	120.1	36.2	16.9	1.9	0.1	0.0	175.2	0.2	0.0	0.2	296.9	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	479.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価 代替活動							小計
			償却	在庫	償却	在庫							労働対価	代替活動						
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	46.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	47.6	0.6	0.0	0.6	80.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	129.6	
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.3	0.0	0.3	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	237.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	51.0	36.0	21.5	2.6	0.0	0.0	111.1	0.0	0.0	0.0	188.3	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	307.4	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	178.3	43.5	21.8	2.7	0.1	0.0	246.4	0.9	0.0	0.9	417.6	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	674.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	116.3	5.9	1.6	0.7	0.0	0.0	124.5	0.8	0.0	0.8	211.1	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	340.2	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.6	0.0	0.6	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	304.8	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	71.0	50.8	23.9	3.3	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0	252.6	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	412.0	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	292.8	63.9	25.5	4.0	0.1	0.0	386.3	1.4	0.0	1.4	654.6	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,057.0	

様式-3 被害額 (現況河道(H29)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	10.9	5.8	7.2	0.7	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	41.7	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	69.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	287.4	42.8	8.1	3.8	0.1	0.1	342.3	1.1	0.0	1.1	579.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	938.0	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	94.3	66.4	27.7	4.1	0.1	0.0	192.6	0.0	0.0	0.0	326.3	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	532.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	498.1	122.2	43.0	8.6	0.3	0.1	672.3	2.0	0.0	2.0	1,138.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,844.8	

様式-3 被害額 (現況河道(H29)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	52.3	67.2	69.9	7.7	0.1	0.1	197.3	0.0	0.0	0.0	334.3	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	553.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	306.1	43.7	8.1	3.8	0.1	0.1	361.9	1.2	0.0	1.2	613.0	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	991.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	572.0	186.8	106.1	15.8	0.4	0.2	881.3	2.1	0.0	2.1	1,492.7	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,428.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	123.1	133.7	116.3	14.7	0.2	0.1	388.1	0.0	0.0	0.0	657.6	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,085.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	404.5	78.3	10.6	5.5	0.2	0.1	499.2	1.3	0.0	1.3	845.6	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,365.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	1.0	0.0	1.0	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	741.2	287.9	155.0	24.5	0.6	0.2	1,209.4	2.3	0.0	2.3	2,048.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,333.7	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	43.1	32.5	18.6	2.1	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	163.2	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	265.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	132.1	39.9	18.6	2.1	0.1	0.0	192.8	0.3	0.0	0.3	326.5	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	526.4	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	51.1	0.9	0.4	0.2	0.0	0.0	52.6	0.7	0.0	0.7	88.9	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	142.8	
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	56.1	39.6	23.6	2.9	0.0	0.0	122.2	0.0	0.0	0.0	207.1	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	337.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	196.2	47.9	24.0	3.1	0.1	0.0	271.3	1.0	0.0	1.0	459.3	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	740.7	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	128.0	6.5	1.8	0.8	0.0	0.0	137.1	0.9	0.0	0.9	232.2	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	374.0	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	0.7	0.0	0.7	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	78.1	55.9	26.3	3.6	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	277.8	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	452.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	322.1	70.3	28.1	4.4	0.1	0.0	425.0	1.6	0.0	1.6	720.0	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,161.3	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	12.0	6.4	7.9	0.7	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	45.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	75.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	316.1	47.0	8.9	4.2	0.1	0.1	376.4	1.2	0.0	1.2	637.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	1,030.2	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	103.7	73.1	30.4	4.5	0.1	0.0	211.8	0.0	0.0	0.0	358.9	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	584.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	547.8	134.4	47.2	9.4	0.3	0.1	739.2	2.2	0.0	2.2	1,252.4	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	2,025.7	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	57.5	73.9	76.9	8.5	0.1	0.1	217.0	0.0	0.0	0.0	367.7	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	606.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	336.7	48.1	8.9	4.2	0.1	0.1	398.1	1.3	0.0	1.3	674.3	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	1,088.7	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	629.2	205.4	116.7	17.4	0.4	0.2	969.3	2.3	0.0	2.3	1,641.9	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,665.5	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	135.4	147.1	128.0	16.2	0.2	0.1	427.0	0.0	0.0	0.0	723.3	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,189.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	445.0	86.1	11.6	6.0	0.2	0.1	549.0	1.5	0.0	1.5	930.1	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,499.6	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.2	0.0	1.2	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.7	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	815.4	316.6	170.5	26.9	0.6	0.2	1,330.2	2.7	0.0	2.7	2,253.3	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,659.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	35.3	26.6	15.2	1.7	0.0	0.0	78.8	0.0	0.0	0.0	133.5	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	218.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	108.1	32.6	15.2	1.7	0.1	0.0	157.7	0.2	0.0	0.2	267.1	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	431.8	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	41.8	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	42.9	0.5	0.0	0.5	72.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	116.7	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	45.9	32.4	19.3	2.3	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0	169.4	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	277.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	160.5	39.1	19.6	2.4	0.1	0.0	221.7	0.7	0.0	0.7	375.7	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	607.2	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	104.7	5.3	1.5	0.6	0.0	0.0	112.1	0.7	0.0	0.7	190.0	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	306.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.5	0.0	0.5	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	63.9	45.7	21.5	3.0	0.0	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0	227.3	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	371.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	263.5	57.4	23.0	3.6	0.1	0.0	347.6	1.2	0.0	1.2	589.1	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	952.6	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	9.8	5.2	6.5	0.6	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	37.5	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	62.5	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	258.7	38.5	7.3	3.4	0.1	0.0	308.0	1.0	0.0	1.0	521.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	845.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.8	0.0	0.8	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	84.9	59.8	24.9	3.7	0.1	0.0	173.4	0.0	0.0	0.0	293.6	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	480.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	448.3	109.9	38.7	7.7	0.3	0.0	604.9	1.8	0.0	1.8	1,024.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,663.2	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	47.1	60.5	62.9	7.0	0.1	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0	300.9	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	500.6	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	275.5	39.4	7.3	3.4	0.1	0.1	325.8	1.0	0.0	1.0	551.7	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	893.5	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	514.8	168.1	95.5	14.3	0.4	0.1	793.2	1.9	0.0	1.9	1,343.4	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,190.5	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	110.8	120.4	104.7	13.2	0.2	0.1	349.4	0.0	0.0	0.0	591.8	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	980.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	364.1	70.4	9.5	4.9	0.2	0.1	449.2	1.2	0.0	1.2	761.0	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,230.4	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	667.1	259.0	139.5	22.0	0.6	0.2	1,088.4	2.1	0.0	2.1	1,843.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,007.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.2	0.0	0.2	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	236.9	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	39.2	29.5	16.9	1.9	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	148.4	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	242.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	120.1	36.2	16.9	1.9	0.1	0.0	175.2	0.2	0.0	0.2	296.9	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	479.1	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	46.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	47.6	0.6	0.0	0.6	80.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	129.6	
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.3	0.0	0.3	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	237.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	51.0	36.0	21.5	2.6	0.0	0.0	111.1	0.0	0.0	0.0	188.3	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	307.4	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	178.3	43.5	21.8	2.7	0.1	0.0	246.4	0.9	0.0	0.9	417.6	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	674.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止損失	清掃労働対価						代替活動	小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	116.3	5.9	1.6	0.7	0.0	0.0	124.5	0.8	0.0	0.8	211.1	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8		
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.6	0.0	0.6	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	71.0	50.8	23.9	3.3	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0	252.6	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	292.8	63.9	25.5	4.0	0.1	0.0	386.3	1.4	0.0	1.4	654.6	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止損失	清掃労働対価						代替活動	小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	10.9	5.8	7.2	0.7	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	41.7	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	287.4	42.8	8.1	3.8	0.1	0.1	342.3	1.1	0.0	1.1	579.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9		
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	94.3	66.4	27.7	4.1	0.1	0.0	192.6	0.0	0.0	0.0	326.3	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	498.1	122.2	43.0	8.6	0.3	0.1	672.3	2.0	0.0	2.0	1,138.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止損失	清掃労働対価						代替活動	小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	52.3	67.2	69.9	7.7	0.1	0.1	197.3	0.0	0.0	0.0	334.3	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	306.1	43.7	8.1	3.8	0.1	0.1	361.9	1.2	0.0	1.2	613.0	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0		
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	572.0	186.8	106.1	15.8	0.4	0.2	881.3	2.1	0.0	2.1	1,492.7	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止損失	清掃労働対価						代替活動	小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	123.1	133.7	116.3	14.7	0.2	0.1	388.1	0.0	0.0	0.0	657.6	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	404.5	78.3	10.6	5.5	0.2	0.1	499.2	1.3	0.0	1.3	845.6	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0		
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	1.0	0.0	1.0	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	741.2	287.9	155.0	24.5	0.6	0.2	1,209.4	2.3	0.0	2.3	2,048.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	43.1	32.5	18.6	2.1	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	163.2	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	265.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	132.1	39.9	18.6	2.1	0.1	0.0	192.8	0.3	0.0	0.3	326.5	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	526.4	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	51.1	0.9	0.4	0.2	0.0	0.0	52.6	0.7	0.0	0.7	88.9	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	142.8	
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	56.1	39.6	23.6	2.9	0.0	0.0	122.2	0.0	0.0	0.0	207.1	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	337.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	196.2	47.9	24.0	3.1	0.1	0.0	271.3	1.0	0.0	1.0	459.3	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	740.7	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	128.0	6.5	1.8	0.8	0.0	0.0	137.1	0.9	0.0	0.9	232.2	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	374.0	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	0.7	0.0	0.7	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	78.1	55.9	26.3	3.6	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	277.8	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	452.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	322.1	70.3	28.1	4.4	0.1	0.0	425.0	1.6	0.0	1.6	720.0	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,161.3	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	12.0	6.4	7.9	0.7	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	45.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	75.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	316.1	47.0	8.9	4.2	0.1	0.1	376.4	1.2	0.0	1.2	637.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	1,030.2	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	103.7	73.1	30.4	4.5	0.1	0.0	211.8	0.0	0.0	0.0	358.9	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	584.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	547.8	134.4	47.2	9.4	0.3	0.1	739.2	2.2	0.0	2.2	1,252.4	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	2,025.7	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	57.5	73.9	76.9	8.5	0.1	0.1	217.0	0.0	0.0	0.0	367.7	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	606.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	336.7	48.1	8.9	4.2	0.1	0.1	398.1	1.3	0.0	1.3	674.3	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	1,088.7	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	629.2	205.4	116.7	17.4	0.4	0.2	969.3	2.3	0.0	2.3	1,641.9	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,665.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%)

水系名: 淀川水系河川名: 木津川

流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	135.4	147.1	128.0	16.2	0.2	0.1	427.0	0.0	0.0	0.0	723.3	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,189.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	445.0	86.1	11.6	6.0	0.2	0.1	549.0	1.5	0.0	1.5	930.1	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,499.6	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.2	0.0	1.2	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.7	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	815.4	316.6	170.5	26.9	0.6	0.2	1,330.2	2.7	0.0	2.7	2,253.3	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,659.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	35.3	26.6	15.2	1.7	0.0	0.0	78.8	0.0	0.0	0.0	133.5	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	218.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	108.1	32.6	15.2	1.7	0.1	0.0	157.7	0.2	0.0	0.2	267.1	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	431.8	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	41.8	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	42.9	0.5	0.0	0.5	72.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	116.7	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	45.9	32.4	19.3	2.3	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0	169.4	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	277.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	160.5	39.1	19.6	2.4	0.1	0.0	221.7	0.7	0.0	0.7	375.7	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	607.2	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	104.7	5.3	1.5	0.6	0.0	0.0	112.1	0.7	0.0	0.7	190.0	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8		
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.5	0.0	0.5	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	63.9	45.7	21.5	3.0	0.0	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0	227.3	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	263.5	57.4	23.0	3.6	0.1	0.0	347.6	1.2	0.0	1.2	589.1	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	9.8	5.2	6.5	0.6	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	37.5	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	258.7	38.5	7.3	3.4	0.1	0.0	308.0	1.0	0.0	1.0	521.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9		
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.8	0.0	0.8	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	84.9	59.8	24.9	3.7	0.1	0.0	173.4	0.0	0.0	0.0	293.6	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	448.3	109.9	38.7	7.7	0.3	0.0	604.9	1.8	0.0	1.8	1,024.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	47.1	60.5	62.9	7.0	0.1	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0	300.9	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	275.5	39.4	7.3	3.4	0.1	0.1	325.8	1.0	0.0	1.0	551.7	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0		
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	514.8	168.1	95.5	14.3	0.4	0.1	793.2	1.9	0.0	1.9	1,343.4	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 木津川

流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	110.8	120.4	104.7	13.2	0.2	0.1	349.4	0.0	0.0	0.0	591.8	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5		
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック④	364.1	70.4	9.5	4.9	0.2	0.1	449.2	1.2	0.0	1.2	761.0	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0		
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5		
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4		
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	667.1	259.0	139.5	22.0	0.6	0.2	1,088.4	2.1	0.0	2.1	1,843.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.7	1.5	2.7	0.2	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.8	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	31.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	23.3	16.7	9.3	0.9	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	85.1	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	139.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.2	0.0	0.2	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	236.9	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	39.2	29.5	16.9	1.9	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	148.4	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	242.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	120.1	36.2	16.9	1.9	0.1	0.0	175.2	0.2	0.0	0.2	296.9	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	479.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	46.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	47.6	0.6	0.0	0.6	80.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	129.6	
有市ブロック⑤	80.9	6.7	0.0	0.0	0.1	0.0	87.7	0.3	0.0	0.3	148.5	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	237.0	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	51.0	36.0	21.5	2.6	0.0	0.0	111.1	0.0	0.0	0.0	188.3	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	307.4	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	178.3	43.5	21.8	2.7	0.1	0.0	246.4	0.9	0.0	0.9	417.6	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	674.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	116.3	5.9	1.6	0.7	0.0	0.0	124.5	0.8	0.0	0.8	211.1	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	340.2	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.6	0.0	0.6	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	304.8	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	71.0	50.8	23.9	3.3	0.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0	252.6	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	412.0	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	292.8	63.9	25.5	4.0	0.1	0.0	386.3	1.4	0.0	1.4	654.6	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,057.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	10.9	5.8	7.2	0.7	0.0	0.0	24.6	0.0	0.0	0.0	41.7	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	69.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	287.4	42.8	8.1	3.8	0.1	0.1	342.3	1.1	0.0	1.1	579.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	938.0	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	94.3	66.4	27.7	4.1	0.1	0.0	192.6	0.0	0.0	0.0	326.3	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	532.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	498.1	122.2	43.0	8.6	0.3	0.1	672.3	2.0	0.0	2.0	1,138.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,844.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	52.3	67.2	69.9	7.7	0.1	0.1	197.3	0.0	0.0	0.0	334.3	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	553.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	306.1	43.7	8.1	3.8	0.1	0.1	361.9	1.2	0.0	1.2	613.0	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	991.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	0.9	0.0	0.9	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.1	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	572.0	186.8	106.1	15.8	0.4	0.2	881.3	2.1	0.0	2.1	1,492.7	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,428.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49)) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物		小計	営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	123.1	133.7	116.3	14.7	0.2	0.1	388.1	0.0	0.0	0.0	657.6	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,085.2	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	404.5	78.3	10.6	5.5	0.2	0.1	499.2	1.3	0.0	1.3	845.6	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,365.1	
有市ブロック⑤	105.5	7.2	0.0	0.0	0.1	0.0	112.8	1.0	0.0	1.0	190.9	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	305.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	108.1	68.7	28.1	4.3	0.1	0.0	209.3	0.0	0.0	0.0	354.5	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	578.2	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	741.2	287.9	155.0	24.5	0.6	0.2	1,209.4	2.3	0.0	2.3	2,048.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,333.7	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	7.3	1.6	3.0	0.3	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0	20.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	34.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	25.6	18.3	10.3	1.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	93.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	152.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	43.1	32.5	18.6	2.1	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0	163.2	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	265.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	132.1	39.9	18.6	2.1	0.1	0.0	192.8	0.3	0.0	0.3	326.5	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	526.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	51.1	0.9	0.4	0.2	0.0	0.0	52.6	0.7	0.0	0.7	88.9	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	142.8	
有市ブロック⑤	89.0	7.4	0.0	0.0	0.1	0.0	96.5	0.3	0.0	0.3	163.3	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	260.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	56.1	39.6	23.6	2.9	0.0	0.0	122.2	0.0	0.0	0.0	207.1	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	337.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	196.2	47.9	24.0	3.1	0.1	0.0	271.3	1.0	0.0	1.0	459.3	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	740.7	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	128.0	6.5	1.8	0.8	0.0	0.0	137.1	0.9	0.0	0.9	232.2	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	374.0	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	0.7	0.0	0.7	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	78.1	55.9	26.3	3.6	0.0	0.0	163.9	0.0	0.0	0.0	277.8	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	452.1	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	322.1	70.3	28.1	4.4	0.1	0.0	425.0	1.6	0.0	1.6	720.0	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	1,161.3	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	12.0	6.4	7.9	0.7	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0	0.0	45.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	75.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	316.1	47.0	8.9	4.2	0.1	0.1	376.4	1.2	0.0	1.2	637.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	1,030.2	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	103.7	73.1	30.4	4.5	0.1	0.0	211.8	0.0	0.0	0.0	358.9	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	584.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	547.8	134.4	47.2	9.4	0.3	0.1	739.2	2.2	0.0	2.2	1,252.4	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	2,025.7	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	57.5	73.9	76.9	8.5	0.1	0.1	217.0	0.0	0.0	0.0	367.7	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	606.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	336.7	48.1	8.9	4.2	0.1	0.1	398.1	1.3	0.0	1.3	674.3	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	1,088.7	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.0	0.0	1.0	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	629.2	205.4	116.7	17.4	0.4	0.2	969.3	2.3	0.0	2.3	1,641.9	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,665.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	135.4	147.1	128.0	16.2	0.2	0.1	427.0	0.0	0.0	0.0	723.3	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	1,189.8	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	445.0	86.1	11.6	6.0	0.2	0.1	549.0	1.5	0.0	1.5	930.1	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,499.6	
有市ブロック⑤	116.0	7.9	0.0	0.0	0.1	0.0	124.0	1.2	0.0	1.2	210.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	335.7	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	119.0	75.5	30.9	4.7	0.1	0.0	230.2	0.0	0.0	0.0	389.9	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	634.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	815.4	316.6	170.5	26.9	0.6	0.2	1,330.2	2.7	0.0	2.7	2,253.3	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,659.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	28.5	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	6.0	1.3	2.4	0.2	0.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	16.9	0.6	0.3	0.5	0.8	0.3	0.0	1.7	28.5	28.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	125.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	21.0	15.0	8.4	0.8	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	76.6	1.1	0.7	1.0	1.7	1.0	0.0	3.8	125.6	125.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	35.3	26.6	15.2	1.7	0.0	0.0	78.8	0.0	0.0	0.0	133.5	1.8	1.2	1.3	2.5	2.0	0.0	6.3	218.6	218.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	108.1	32.6	15.2	1.7	0.1	0.0	157.7	0.2	0.0	0.2	267.1	1.8	1.5	1.5	3.0	2.0	0.0	6.8	431.8	431.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック④	41.8	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	42.9	0.5	0.0	0.5	72.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	116.7	116.7	
有市ブロック⑤	72.8	6.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.9	0.2	0.0	0.2	133.6	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	213.2	213.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
有市ブロック⑦	45.9	32.4	19.3	2.3	0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0	169.4	2.2	1.6	1.5	3.1	2.7	0.0	8.0	277.3	277.3	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	160.5	39.1	19.6	2.4	0.1	0.0	221.7	0.7	0.0	0.7	375.7	2.4	2.0	1.9	3.9	2.8	0.0	9.1	607.2	607.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	104.7	5.3	1.5	0.6	0.0	0.0	112.1	0.7	0.0	0.7	190.0	1.0	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.8	306.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.5	0.0	0.5	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.2	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	63.9	45.7	21.5	3.0	0.0	0.0	134.1	0.0	0.0	0.0	227.3	2.9	2.2	1.6	3.8	3.7	0.0	10.4	371.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	263.5	57.4	23.0	3.6	0.1	0.0	347.6	1.2	0.0	1.2	589.1	3.9	3.3	3.1	6.4	4.4	0.0	14.7	952.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	9.8	5.2	6.5	0.6	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	37.5	1.4	0.4	0.6	1.0	0.5	0.0	2.9	62.5	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	258.7	38.5	7.3	3.4	0.1	0.0	308.0	1.0	0.0	1.0	521.7	3.5	3.1	4.7	7.8	3.6	0.0	14.9	845.6	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.8	0.0	0.8	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.5	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	84.9	59.8	24.9	3.7	0.1	0.0	173.4	0.0	0.0	0.0	293.6	3.9	2.8	2.0	4.8	4.9	0.0	13.6	480.6	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	448.3	109.9	38.7	7.7	0.3	0.0	604.9	1.8	0.0	1.8	1,024.6	8.8	6.6	7.5	14.1	9.0	0.0	31.9	1,663.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	47.1	60.5	62.9	7.0	0.1	0.0	177.6	0.0	0.0	0.0	300.9	9.7	3.3	4.1	7.4	5.0	0.0	22.1	500.6	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	275.5	39.4	7.3	3.4	0.1	0.1	325.8	1.0	0.0	1.0	551.7	3.5	3.2	4.7	7.9	3.6	0.0	15.0	893.5	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	514.8	168.1	95.5	14.3	0.4	0.1	793.2	1.9	0.0	1.9	1,343.4	17.7	9.8	11.0	20.8	13.5	0.0	52.0	2,190.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川 流量規模: 1/150確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
有市ブロック①	110.8	120.4	104.7	13.2	0.2	0.1	349.4	0.0	0.0	0.0	591.8	17.0	6.2	6.3	12.5	10.0	0.0	39.5	980.7	
有市ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック④	364.1	70.4	9.5	4.9	0.2	0.1	449.2	1.2	0.0	1.2	761.0	4.3	4.2	5.4	9.6	5.1	0.0	19.0	1,230.4	
有市ブロック⑤	94.9	6.4	0.0	0.0	0.1	0.0	101.4	0.9	0.0	0.9	171.8	0.0	0.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	274.6	
有市ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
有市ブロック⑦	97.3	61.8	25.3	3.9	0.1	0.0	188.4	0.0	0.0	0.0	319.0	4.5	3.0	2.0	5.0	4.9	0.0	14.4	521.8	
有市ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	667.1	259.0	139.5	22.0	0.6	0.2	1,088.4	2.1	0.0	2.1	1,843.6	25.8	13.7	13.9	27.6	20.0	0.0	73.4	3,007.5	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20))

水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	24.3	5.2	1.1	0.5	0.1	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	52.8	0.7	0.3	0.6	0.9	0.3	0.0	1.9	85.9		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
萬生ブロック①	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	
萬生ブロック②	38.9	25.2	5.9	3.8	0.3	0.1	74.2	0.8	0.0	0.8	125.8	1.5	1.2	1.4	2.6	1.9	0.0	6.0	206.8		
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	61.4	142.5	7.1	1.8	0.1	0.0	212.9	0.2	6.2	6.4	360.7	1.7	6.0	6.3	12.3	3.6	0.0	17.6	597.6		
大屋戸ブロック	321.7	605.7	59.3	18.3	0.6	0.2	1,005.8	2.4	4.5	6.9	1,703.8	17.5	27.4	26.4	53.8	22.9	0.0	94.2	2,810.7		
名張市街地ブロック	4,768.9	1,537.1	644.0	181.9	2.1	1.0	7,135.0	9.7	2.6	12.3	12,086.7	284.8	105.9	147.0	252.9	171.7	0.0	709.4	19,943.4		
結馬ブロック	931.7	608.0	408.9	153.0	1.6	0.8	2,104.0	14.1	14.3	28.4	3,564.2	109.5	27.4	26.1	53.5	83.4	0.0	246.4	5,943.0		
小屋出ブロック	53.4	18.9	18.2	7.9	0.1	0.0	98.5	0.3	0.0	0.3	166.8	7.5	1.5	2.3	3.8	3.3	0.0	14.6	280.2		
赤目町ブロック	1,371.5	674.9	495.4	146.6	1.6	0.8	2,690.8	8.4	0.8	9.2	4,558.2	163.9	38.0	53.8	91.8	80.7	0.0	336.4	7,594.6		
安部田ブロック	252.5	27.3	6.1	1.7	0.1	0.0	287.7	9.6	0.0	9.6	487.2	2.2	2.4	4.3	6.7	2.4	0.0	11.3	795.8		
下比奈知ブロック	27.8	7.8	32.0	4.1	0.0	0.0	71.7	0.1	0.8	0.9	121.4	13.7	1.5	2.6	4.1	3.2	0.0	21.0	215.0		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	253.0	91.8	6.2	3.7	0.5	0.2	355.4	0.0	0.0	0.0	602.1	1.8	4.2	5.2	9.4	3.5	0.0	14.7	972.2		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	
宇陀川上流ブロック⑨	236.9	34.3	12.3	3.7	0.1	0.0	287.3	0.0	0.0	0.0	486.7	3.7	1.4	1.9	3.3	5.1	0.0	12.1	786.1		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	8,343.5	3,778.7	1,696.5	527.0	7.2	3.1	14,356.0	46.5	33.7	80.2	24,318.9	608.5	217.2	277.9	495.1	382.0	0.0	1,485.6	40,240.7		

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20))

水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	43.8	14.7	2.2	1.0	0.2	0.1	62.0	0.0	0.0	0.0	104.9	0.9	0.6	0.9	1.5	0.7	0.0	3.1	170.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
萬生ブロック①	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.1	0.0	0.1	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	
萬生ブロック②	104.8	65.7	14.9	9.6	0.8	0.4	196.2	1.1	0.0	1.1	332.5	4.1	3.3	3.9	7.2	5.1	0.0	16.4	546.2		
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	82.1	173.6	9.0	2.5	0.1	0.1	267.4	0.2	6.2	6.4	452.9	2.1	7.9	7.2	15.1	4.9	0.0	22.1	748.8		
大屋戸ブロック	386.2	726.0	74.9	22.8	0.7	0.3	1,210.9	2.4	4.8	7.2	2,051.3	22.6	32.9	31.9	64.8	27.7	0.0	115.1	3,384.5		
名張市街地ブロック	5,594.2	1,927.5	765.3	219.5	3.0	1.4	8,510.9	11.0	2.6	13.6	14,417.5	319.2	123.1	167.0	290.1	200.3	0.0	809.6	23,751.6		
結馬ブロック	1,143.8	692.7	475.3	184.2	1.8	0.9	2,498.7	15.0	16.9	31.9	4,232.9	126.8	32.1	28.6	60.7	99.5	0.0	287.0	7,050.5		
小屋出ブロック	90.3	48.3	27.8	11.5	0.3	0.1	178.3	0.5	0.0	0.5	302.2	10.1	2.4	3.5	5.9	5.5	0.0	21.5	502.5		
赤目町ブロック	1,604.2	749.2	546.7	164.1	1.8	0.8	3,066.8	9.3	1.6	10.9	5,195.0	180.2	42.1	59.0	101.1	89.6	0.0	370.9	8,643.6		
安部田ブロック	297.2	42.0	8.1	2.2	0.1	0.0	349.6	11.0	0.0	11.0	592.2	2.7	3.1	5.2	8.3	3.1	0.0	14.1	966.9		
下比奈知ブロック	36.0	22.0	46.3	6.1	0.0	0.0	110.4	0.1	0.8	0.9	187.1	15.6	1.9	3.1	5.0	4.3	0.0	24.9	323.3		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	484.9	145.4	9.8	6.3	0.8	0.4	647.6	0.0	0.0	0.0	1,097.1	2.9	7.0	7.6	14.6	5.9	0.0	23.4	1,768.1		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	
宇陀川上流ブロック⑨	507.4	78.4	26.9	9.6	0.2	0.1	622.6	0.0	0.0	0.0	1,054.6	7.8	3.5	3.4	6.9	13.2	0.0	27.9	1,705.1		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	10,377.5	4,685.5	2,007.2	639.4	9.8	4.6	17,724.0	52.3	38.0	90.3	30,024.6	695.0	259.9	321.3	581.2	459.8	0.0	1,736.0	49,574.9		

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20))

水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	73.6	26.0	4.1	2.1	0.2	0.1	106.1	0.1	0.0	0.1	179.9	1.5	1.1	1.2	2.3	1.4	0.0	5.2	291.3		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
篤生ブロック①	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	0.4	0.0	0.4	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	
篤生ブロック②	258.5	170.7	32.8	23.0	2.2	1.0	488.2	1.3	1.2	2.5	826.9	8.7	7.6	7.8	15.4	12.4	0.0	36.5	1,354.1		
篤生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	117.5	247.7	10.4	3.3	0.2	0.1	379.2	0.2	6.2	6.4	642.1	2.9	10.8	8.6	19.4	6.9	0.0	29.2	1,056.9		
大屋戸ブロック	617.7	1,038.0	143.3	42.9	1.2	0.6	1,843.7	2.5	4.9	7.4	3,123.3	42.0	48.5	50.5	99.0	45.1	0.0	186.1	5,160.5		
名張市街地ブロック	7,530.8	2,982.9	1,100.4	319.8	5.7	2.6	11,942.2	14.3	3.1	17.4	20,230.0	391.2	161.9	209.1	371.0	271.0	0.0	1,033.2	33,222.8		
結馬ブロック	1,541.0	947.6	555.6	234.0	2.8	1.2	3,282.2	16.4	18.3	34.7	5,560.0	164.1	41.4	32.4	73.8	132.3	0.0	370.2	9,247.1		
小屋出ブロック	430.6	227.7	98.6	49.6	1.1	0.5	808.1	1.3	3.8	5.1	1,369.0	28.9	10.3	10.2	20.5	25.6	0.0	75.0	2,257.2		
赤目町ブロック	3,052.5	1,427.4	841.0	274.2	3.8	1.7	5,600.6	11.5	6.8	18.3	9,487.5	257.6	71.8	94.1	165.9	148.5	0.0	572.0	15,678.4		
安部田ブロック	640.4	206.3	50.0	25.6	0.8	0.3	923.4	16.5	0.0	16.5	1,564.2	14.8	9.6	12.4	22.0	14.1	0.0	50.9	2,555.0		
下比奈知ブロック	55.9	37.3	69.2	10.2	0.0	0.0	172.6	0.1	0.9	1.0	292.4	20.4	2.8	4.0	6.8	6.8	0.0	34.0	500.0		
宇陀川上流ブロック①	11.8	0.7	1.5	0.6	0.0	0.0	14.6	0.3	0.0	0.3	24.9	0.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	1.5	41.3		
宇陀川上流ブロック②	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	1,051.3	471.4	33.5	23.6	2.6	1.1	1,583.5	0.2	0.0	0.2	2,682.5	11.2	20.5	15.9	36.4	21.7	0.0	69.3	4,335.5		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
宇陀川上流ブロック⑨	1,229.4	195.5	48.7	21.9	0.5	0.2	1,496.2	0.0	0.0	0.0	2,534.7	20.3	8.6	5.7	14.3	31.5	0.0	66.1	4,097.0		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
合計	16,623.3	7,979.2	2,989.1	1,030.8	21.1	9.4	28,652.9	67.2	50.3	117.5	48,538.2	964.5	395.0	452.1	847.1	717.6	0.0	2,529.2	79,837.8		

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20))

水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	133.3	44.8	5.8	3.7	0.4	0.2	188.2	0.2	2.7	2.9	318.7	2.4	1.9	1.4	3.3	2.6	0.0	8.3	518.1		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
篤生ブロック①	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.8	0.0	0.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	
篤生ブロック②	405.3	284.5	53.3	38.3	3.6	1.6	786.6	1.7	1.6	3.3	1,332.5	13.7	12.4	11.6	24.0	19.5	0.0	57.2	2,179.6		
篤生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	168.9	330.2	11.6	4.1	0.2	0.1	515.1	0.2	6.2	6.4	872.6	4.1	14.4	9.5	23.9	8.8	0.0	36.8	1,430.9		
大屋戸ブロック	889.6	1,507.2	216.3	70.2	1.8	0.8	2,685.9	2.6	5.2	7.8	4,549.8	59.7	68.8	64.6	133.4	69.8	0.0	262.9	7,506.4		
名張市街地ブロック	10,958.7	5,199.0	2,061.5	614.8	9.1	4.3	18,847.4	15.1	3.1	18.2	31,927.6	586.3	250.7	291.9	542.6	483.8	0.0	1,612.7	52,405.9		
結馬ブロック	1,880.6	1,192.6	634.3	286.7	3.7	1.4	3,999.3	16.6	19.6	36.2	6,774.9	206.7	51.2	35.8	87.0	163.6	0.0	457.3	11,267.7		
小屋出ブロック	473.3	247.8	104.9	53.7	1.2	0.5	881.4	1.3	3.8	5.1	1,493.1	30.6	11.1	10.6	21.7	27.9	0.0	80.2	2,459.8		
赤目町ブロック	4,798.8	2,495.2	1,567.6	499.5	5.4	2.5	9,369.0	14.7	7.1	21.8	15,871.2	445.8	125.2	148.5	273.7	285.8	0.0	1,005.3	26,267.3		
安部田ブロック	713.8	222.5	52.0	26.2	0.8	0.3	1,015.6	16.8	0.0	16.8	1,720.3	15.1	10.2	13.1	23.3	14.8	0.0	53.2	2,805.9		
下比奈知ブロック	141.4	152.7	190.2	31.7	0.1	0.0	516.1	0.1	1.1	1.2	874.3	41.4	7.6	7.6	15.2	20.0	0.0	76.6	1,468.2		
宇陀川上流ブロック①	11.8	2.9	2.6	1.0	0.0	0.0	18.3	0.3	0.0	0.3	31.1	1.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.0	2.0	51.7		
宇陀川上流ブロック②	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	1,267.9	538.7	37.1	27.3	3.0	1.2	1,875.2	0.2	0.0	0.2	3,176.5	13.6	23.3	17.0	40.3	25.5	0.0	79.4	5,131.3		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	
宇陀川上流ブロック⑨	1,381.1	210.3	53.6	23.9	0.6	0.2	1,669.7	0.0	0.0	0.0	2,828.5	22.6	9.4	6.4	15.8	33.6	0.0	72.0	4,570.2		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
合計	23,251.7	12,428.4	4,990.8	1,681.1	29.9	13.1	42,395.0	72.7	55.5	128.2	71,817.2	1,443.1	586.4	618.3	1,204.7	1,156.1	0.0	3,803.9	118,144.3		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	32.7	31.2	2.1	0.4	0.0	0.0	66.4	0.3	6.4	6.7	112.5	0.7	1.7	3.0	4.7	0.9	0.0	6.3	191.9	
大屋戸ブロック	152.2	334.3	24.9	7.0	0.3	0.1	518.8	2.3	3.4	5.7	878.7	6.7	14.3	14.7	29.0	10.0	0.0	45.7	1,448.9	
名張市街地ブロック	3,219.3	1,032.2	402.2	119.5	1.3	0.6	4,775.1	6.7	2.5	9.2	8,089.1	169.6	66.3	95.0	161.3	99.7	0.0	430.6	13,304.0	
結馬ブロック	570.8	276.9	202.6	63.6	0.9	0.4	1,115.2	13.2	12.0	25.2	1,889.1	57.8	11.7	16.3	28.0	32.5	0.0	118.3	3,147.8	
小屋出ブロック	2.1	0.4	0.8	0.3	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	6.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	10.6	
赤目町ブロック	1,025.8	445.0	388.8	112.3	1.1	0.5	1,973.5	7.1	0.5	7.6	3,343.1	128.7	26.5	39.7	66.2	57.9	0.0	252.8	5,577.0	
安部田ブロック	154.7	9.7	2.1	0.6	0.0	0.0	167.1	8.4	0.0	8.4	283.0	0.7	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.5	462.0	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	118.8	27.0	2.9	1.6	0.1	0.1	150.5	0.1	0.0	0.1	254.9	1.1	2.0	3.0	5.0	1.5	0.0	7.6	413.1	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	105.3	11.2	4.9	1.3	0.0	0.0	122.7	0.0	0.0	0.0	208.0	1.8	0.6	0.9	1.5	1.8	0.0	5.1	335.8	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	5,381.7	2,167.9	1,031.3	306.6	3.7	1.7	8,892.9	38.6	24.8	63.4	15,064.7	367.5	124.0	174.0	298.0	205.1	0.0	870.6	24,891.6	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	19.9	5.0	0.8	0.4	0.1	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	44.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.0	1.2	71.7	
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック①	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	
薦生ブロック②	14.8	9.5	2.3	1.5	0.1	0.1	28.3	0.0	0.0	0.0	47.8	0.5	0.4	0.4	0.8	0.7	0.0	2.0	78.1	
薦生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	55.1	88.5	4.3	0.9	0.1	0.0	148.9	0.3	6.7	7.0	252.3	1.1	3.2	4.7	7.9	1.7	0.0	10.7	418.9	
大屋戸ブロック	252.3	536.4	37.1	10.9	0.5	0.2	837.4	2.6	4.7	7.3	1,418.4	10.0	20.8	19.5	40.3	15.2	0.0	65.5	2,328.6	
名張市街地ブロック	4,562.4	1,432.2	610.9	171.2	1.8	0.8	6,779.3	8.8	2.7	11.5	11,484.3	254.4	93.6	131.5	225.1	150.4	0.0	629.9	18,905.0	
結馬ブロック	839.1	495.6	342.5	118.1	1.4	0.7	1,797.4	14.9	15.1	30.0	3,044.9	83.7	19.5	22.0	41.5	57.1	0.0	182.3	5,054.6	
小屋出ブロック	6.0	2.8	2.0	0.8	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	19.7	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	1.2	32.5	
赤目町ブロック	1,346.0	640.3	480.6	141.7	1.6	0.7	2,610.9	8.4	0.9	9.3	4,422.9	146.2	34.3	48.9	83.2	71.4	0.0	300.8	7,343.9	
安部田ブロック	219.5	17.4	3.4	0.9	0.0	0.0	241.2	9.8	0.0	9.8	408.8	1.1	1.2	2.1	3.3	1.2	0.0	5.6	665.4	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	228.7	71.0	5.0	2.9	0.4	0.2	308.2	0.1	0.0	0.1	522.2	1.5	3.2	4.4	7.6	2.6	0.0	11.7	842.2	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
宇陀川上流ブロック⑨	205.6	27.1	10.2	3.1	0.1	0.0	246.1	0.0	0.0	0.0	416.8	3.0	1.1	1.5	2.6	3.9	0.0	9.5	672.4	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	7,749.8	3,325.8	1,499.1	452.4	6.1	2.7	13,035.9	45.8	34.7	80.5	22,083.1	502.5	177.6	235.6	413.2	304.7	0.0	1,220.4	36,419.9	

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	26.8	5.7	1.2	0.5	0.1	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	58.0	0.7	0.3	0.6	0.9	0.3	0.0	1.9	94.2		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
蕎生ブロック①	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	
蕎生ブロック②	42.8	27.7	6.5	4.2	0.3	0.2	81.7	0.9	0.0	0.9	138.4	1.5	1.2	1.4	2.6	1.9	0.0	6.0	227.0		
蕎生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	67.5	156.7	7.8	2.0	0.1	0.1	234.2	0.3	6.8	7.1	396.7	1.7	6.0	6.3	12.3	3.6	0.0	17.6	655.6		
大屋戸ブロック	353.9	666.3	65.2	20.1	0.6	0.3	1,106.4	2.6	4.9	7.5	1,874.2	17.5	27.4	26.4	53.8	22.9	0.0	94.2	3,082.3		
名張市街地ブロック	5,245.8	1,690.8	708.4	200.1	2.4	1.1	7,848.6	10.6	2.9	13.5	13,295.4	284.8	105.9	147.0	252.9	171.7	0.0	709.4	21,866.9		
結馬ブロック	1,024.8	668.8	449.8	168.3	1.8	0.9	2,314.4	15.5	15.7	31.2	3,920.6	109.5	27.4	26.1	53.5	83.4	0.0	246.4	6,512.6		
小屋出ブロック	58.7	20.8	20.0	8.7	0.1	0.0	108.3	0.4	0.0	0.4	183.5	7.5	1.5	2.3	3.8	3.3	0.0	14.6	306.8		
赤目町ブロック	1,508.6	742.4	544.9	161.3	1.8	0.8	2,959.8	9.3	0.9	10.2	5,014.0	163.9	38.0	53.8	91.8	80.7	0.0	336.4	8,320.4		
安部田ブロック	277.7	30.0	6.7	1.8	0.1	0.0	316.3	10.6	0.0	10.6	535.9	2.2	2.4	4.3	6.7	2.4	0.0	11.3	874.1		
下比奈知ブロック	30.5	8.6	35.2	4.5	0.0	0.0	78.8	0.1	0.9	1.0	133.6	13.7	1.5	2.6	4.1	3.2	0.0	21.0	234.4		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	278.3	100.9	6.8	4.1	0.6	0.3	391.0	0.1	0.0	0.1	662.3	1.8	4.2	5.2	9.4	3.5	0.0	14.7	1,068.1		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	
宇陀川上流ブロック⑨	260.6	37.8	13.5	4.1	0.1	0.1	316.2	0.0	0.0	0.0	535.4	3.7	1.4	1.9	3.3	5.1	0.0	12.1	863.7		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	9,177.6	4,156.5	1,866.0	579.7	8.0	3.8	15,791.6	51.4	37.0	88.4	26,750.8	608.5	217.2	277.9	495.1	382.0	0.0	1,485.6	44,116.4		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	48.2	16.2	2.5	1.1	0.2	0.1	68.3	0.0	0.0	0.0	115.4	0.9	0.6	0.9	1.5	0.7	0.0	3.1	186.8		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
蕎生ブロック①	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
蕎生ブロック②	115.3	72.3	16.4	10.6	0.9	0.4	215.9	1.2	0.0	1.2	365.7	4.1	3.3	3.9	7.2	5.1	0.0	16.4	599.2		
蕎生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	90.3	190.9	9.9	2.8	0.1	0.1	294.1	0.3	6.8	7.1	498.2	2.1	7.9	7.2	15.1	4.9	0.0	22.1	821.5		
大屋戸ブロック	424.9	798.6	82.4	25.1	0.8	0.3	1,332.1	2.6	5.3	7.9	2,256.5	22.6	32.9	31.9	64.8	27.7	0.0	115.1	3,711.6		
名張市街地ブロック	6,153.6	2,120.2	841.9	241.5	3.3	1.5	9,362.0	12.1	2.9	15.0	15,859.2	319.2	123.1	167.0	290.1	200.3	0.0	809.6	26,045.8		
結馬ブロック	1,258.1	762.0	522.8	202.6	2.0	1.0	2,748.5	16.5	18.5	35.0	4,656.1	126.8	32.1	28.6	60.7	99.5	0.0	287.0	7,726.6		
小屋出ブロック	99.4	53.2	30.6	12.7	0.3	0.1	196.3	0.5	0.0	0.5	332.5	10.1	2.4	3.5	5.9	5.5	0.0	21.5	550.8		
赤目町ブロック	1,764.6	824.1	601.3	180.5	2.0	0.9	3,373.4	10.3	1.8	12.1	5,714.5	180.2	42.1	59.0	101.1	89.6	0.0	370.9	9,470.9		
安部田ブロック	326.9	46.2	8.9	2.5	0.1	0.0	384.6	12.1	0.0	12.1	651.4	2.7	3.1	5.2	8.3	3.1	0.0	14.1	1,062.2		
下比奈知ブロック	39.6	24.3	50.9	6.7	0.0	0.0	121.5	0.1	0.9	1.0	205.8	15.6	1.9	3.1	5.0	4.3	0.0	24.9	353.2		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	533.4	159.9	10.8	6.9	0.9	0.4	712.3	0.1	0.0	0.1	1,206.9	2.9	7.0	7.6	14.6	5.9	0.0	23.4	1,942.7		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
宇陀川上流ブロック⑨	558.1	86.2	29.6	10.6	0.2	0.1	684.8	0.0	0.0	0.0	1,160.1	7.8	3.5	3.4	6.9	13.2	0.0	27.9	1,872.8		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
合計	11,415.3	5,154.1	2,208.0	703.6	10.8	4.9	19,496.7	57.7	41.8	99.5	33,027.2	695.0	259.9	321.3	581.2	459.8	0.0	1,736.0	54,359.4		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	81.0	28.6	4.5	2.4	0.2	0.1	116.8	0.1	0.0	0.1	197.9	1.5	1.1	1.2	2.3	1.4	0.0	5.2	320.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.5	0.0	0.5	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	
鳶生ブロック②	284.3	187.8	36.0	25.3	2.4	1.0	536.8	1.4	1.3	2.7	909.6	8.7	7.6	7.8	15.4	12.4	0.0	36.5	1,485.6		
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	129.2	272.5	11.4	3.6	0.2	0.1	417.0	0.3	6.8	7.1	706.3	2.9	10.8	8.6	19.4	6.9	0.0	29.2	1,159.6		
大屋戸ブロック	679.4	1,141.8	157.6	47.2	1.4	0.6	2,028.0	2.8	5.4	8.2	3,435.7	42.0	48.5	50.5	99.0	45.1	0.0	186.1	5,658.0		
名張市街地ブロック	8,283.9	3,281.2	1,210.5	351.7	6.3	2.8	13,136.4	15.7	3.4	19.1	22,253.0	391.2	161.9	209.1	371.0	271.0	0.0	1,033.2	36,441.7		
結馬ブロック	1,695.1	1,042.4	611.1	257.4	3.1	1.3	3,610.4	18.1	20.2	38.3	6,116.0	164.1	41.4	32.4	73.8	132.3	0.0	370.2	10,134.9		
小屋出ブロック	473.7	250.5	108.4	54.6	1.2	0.5	888.9	1.5	4.2	5.7	1,505.9	28.9	10.3	10.2	20.5	25.6	0.0	75.0	2,475.5		
赤目町ブロック	3,357.8	1,570.2	925.1	301.6	4.2	1.9	6,160.8	12.7	7.5	20.2	10,436.2	257.6	71.8	94.1	165.9	148.5	0.0	572.0	17,189.2		
安部田ブロック	704.4	226.9	55.0	28.2	0.8	0.3	1,015.6	18.1	0.0	18.1	1,720.6	14.8	9.6	12.4	22.0	14.1	0.0	50.9	2,805.2		
下比奈知ブロック	61.5	41.0	76.1	11.2	0.0	0.0	189.8	0.1	1.0	1.1	321.6	20.4	2.8	4.0	6.8	6.8	0.0	34.0	546.5		
宇陀川上流ブロック①	13.0	0.8	1.7	0.7	0.0	0.0	16.2	0.4	0.0	0.4	27.4	0.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	1.5	45.5		
宇陀川上流ブロック②	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	1,156.5	518.6	36.8	26.0	2.9	1.2	1,742.0	0.2	0.0	0.2	2,950.7	11.2	20.5	15.9	36.4	21.7	0.0	69.3	4,762.2		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
宇陀川上流ブロック⑨	1,352.3	215.0	53.6	24.1	0.6	0.2	1,645.8	0.0	0.0	0.0	2,788.1	20.3	8.6	5.7	14.3	31.5	0.0	66.1	4,500.0		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
合計	18,285.6	8,777.3	3,287.8	1,134.0	23.3	10.0	31,518.0	74.2	55.4	129.6	53,391.9	964.5	395.0	452.1	847.1	717.6	0.0	2,529.2	87,568.7		

様式-3 被害額 (整備計画事業着手(H20):資産+10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	146.7	49.3	6.3	4.1	0.4	0.2	207.0	0.2	2.9	3.1	350.6	2.4	1.9	1.4	3.3	2.6	0.0	8.3	569.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2	0.8	0.0	0.8	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.7	
鳶生ブロック②	445.8	312.9	58.7	42.1	3.9	1.8	865.2	1.9	1.7	3.6	1,465.7	13.7	12.4	11.6	24.0	19.5	0.0	57.2	2,391.7		
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	185.8	363.2	12.7	4.6	0.2	0.1	566.6	0.3	6.8	7.1	959.9	4.1	14.4	9.5	23.9	8.8	0.0	36.8	1,570.4		
大屋戸ブロック	978.5	1,657.9	237.9	77.2	2.0	0.9	2,954.4	2.8	5.8	8.6	5,004.8	59.7	68.8	64.6	133.4	69.8	0.0	262.9	8,230.7		
名張市街地ブロック	12,054.6	5,718.9	2,267.7	676.2	10.1	4.8	20,732.3	16.7	3.4	20.1	35,120.3	586.3	250.7	291.9	542.6	483.8	0.0	1,612.7	57,485.4		
結馬ブロック	2,068.7	1,311.8	697.7	315.4	4.1	1.6	4,399.3	18.3	21.6	39.9	7,452.4	206.7	51.2	35.8	87.0	163.6	0.0	457.3	12,348.9		
小屋出ブロック	520.7	272.6	115.4	59.0	1.3	0.6	969.6	1.5	4.2	5.7	1,642.4	30.6	11.1	10.6	21.7	27.9	0.0	80.2	2,697.9		
赤目町ブロック	5,278.6	2,744.8	1,724.4	549.4	6.0	2.7	10,305.9	16.2	7.9	24.1	17,458.3	445.8	125.2	148.5	273.7	285.8	0.0	1,005.3	28,793.6		
安部田ブロック	785.2	244.7	57.2	28.8	0.9	0.4	1,117.2	18.5	0.0	18.5	1,892.4	15.1	10.2	13.1	23.3	14.8	0.0	53.2	3,081.3		
下比奈知ブロック	155.5	167.9	209.2	34.9	0.1	0.0	567.6	0.1	1.2	1.3	961.7	41.4	7.6	7.6	15.2	20.0	0.0	76.6	1,607.2		
宇陀川上流ブロック①	13.0	3.2	2.8	1.1	0.0	0.0	20.1	0.4	0.0	0.4	34.2	1.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.0	2.0	56.7		
宇陀川上流ブロック②	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	1,394.7	592.6	40.9	30.0	3.3	1.3	2,062.8	0.2	0.0	0.2	3,494.1	13.6	23.3	17.0	40.3	25.5	0.0	79.4	5,636.5		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
宇陀川上流ブロック⑨	1,519.2	231.4	59.0	26.2	0.6	0.2	1,836.6	0.0	0.0	0.0	3,111.3	22.6	9.4	6.4	15.8	33.6	0.0	72.0	5,019.9		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
合計	25,577.0	13,671.2	5,489.9	1,849.0	32.9	14.6	46,634.6	80.3	61.1	141.4	78,998.9	1,443.1	586.4	618.3	1,204.7	1,156.1	0.0	3,803.9	129,578.8		

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.7	1.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
大屋戸ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
名張市街地ブロック	284.2	59.7	15.1	4.1	0.1	0.0	363.2	1.6	0.8	2.4	615.2	6.2	6.6	11.6	18.2	5.7	0.0	30.1	1,010.9	
結馬ブロック	25.2	0.4	1.4	0.4	0.0	0.0	27.4	0.8	2.1	2.9	46.3	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	1.2	77.8	
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤目町ブロック	5.9	6.2	0.8	0.3	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	22.5	0.2	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	1.2	36.9	
安部田ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	318.4	66.3	17.3	4.8	0.1	0.0	406.9	2.4	4.6	7.0	689.2	7.2	7.0	12.2	19.2	6.1	0.0	32.5	1,135.6	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
薦生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.2	3.9	4.1	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6
大屋戸ブロック	36.1	87.9	4.3	1.0	0.1	0.0	129.4	1.0	0.0	1.0	219.2	1.3	3.9	5.6	9.5	2.1	0.0	12.9	362.5	
名張市街地ブロック	1,461.9	490.3	91.5	27.5	0.7	0.3	2,072.2	4.2	1.8	6.0	3,510.4	30.2	29.1	38.8	67.9	30.7	0.0	128.8	5,717.4	
結馬ブロック	230.4	52.4	60.2	17.2	0.2	0.1	360.5	7.9	5.9	13.8	610.5	29.1	4.6	7.8	12.4	11.7	0.0	53.2	1,038.0	
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤目町ブロック	424.0	184.1	173.9	45.7	0.5	0.2	828.4	2.6	0.2	2.8	1,403.3	73.4	14.0	22.4	36.4	32.3	0.0	142.1	2,376.6	
安部田ブロック	69.8	2.4	1.0	0.3	0.0	0.0	73.5	5.2	0.0	5.2	124.3	0.5	0.5	0.8	1.3	0.4	0.0	2.2	205.2	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	8.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	14.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	23.9	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	2,244.5	817.6	331.0	91.8	1.5	0.6	3,487.0	21.3	11.8	33.1	5,906.6	134.6	52.2	75.6	127.8	77.3	0.0	339.7	9,766.4	

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	21.9	4.7	1.0	0.4	0.1	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	47.5	0.7	0.3	0.6	0.9	0.3	0.0	1.9	77.5		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
萬生ブロック①	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	0.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	
萬生ブロック②	35.0	22.7	5.3	3.4	0.3	0.1	66.8	0.7	0.0	0.7	113.2	1.5	1.2	1.4	2.6	1.9	0.0	6.0	186.7		
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	55.2	128.2	6.4	1.7	0.1	0.0	191.6	0.2	5.6	5.8	324.6	1.7	6.0	6.3	12.3	3.6	0.0	17.6	539.6		
大屋戸ブロック	289.5	545.1	53.4	16.4	0.5	0.2	905.1	2.1	4.0	6.1	1,533.4	17.5	27.4	26.4	53.8	22.9	0.0	94.2	2,538.8		
名張市街地ブロック	4,292.0	1,383.4	579.6	163.7	1.9	0.9	6,421.5	8.7	2.4	11.1	10,878.0	284.8	105.9	147.0	252.9	171.7	0.0	709.4	18,020.0		
結馬ブロック	838.5	547.2	368.0	137.7	1.5	0.7	1,893.6	12.7	12.8	25.5	3,207.8	109.5	27.4	26.1	53.5	83.4	0.0	246.4	5,373.3		
小屋出ブロック	48.0	17.0	16.4	7.1	0.1	0.0	88.6	0.3	0.0	0.3	150.1	7.5	1.5	2.3	3.8	3.3	0.0	14.6	253.6		
赤目町ブロック	1,234.3	607.4	445.8	132.0	1.5	0.7	2,421.7	7.6	0.7	8.3	4,102.4	163.9	38.0	53.8	91.8	80.7	0.0	336.4	6,868.8		
安部田ブロック	227.2	24.6	5.5	1.5	0.1	0.0	258.9	8.6	0.0	8.6	438.5	2.2	2.4	4.3	6.7	2.4	0.0	11.3	717.3		
下比奈知ブロック	25.0	7.0	28.8	3.7	0.0	0.0	64.5	0.1	0.7	0.8	109.3	13.7	1.5	2.6	4.1	3.2	0.0	21.0	195.6		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	227.7	82.6	5.6	3.3	0.5	0.2	319.9	0.0	0.0	0.0	541.9	1.8	4.2	5.2	9.4	3.5	0.0	14.7	876.5		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	
宇陀川上流ブロック⑨	213.2	30.9	11.1	3.3	0.1	0.0	258.6	0.0	0.0	0.0	438.1	3.7	1.4	1.9	3.3	5.1	0.0	12.1	708.8		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	7,508.8	3,400.8	1,526.9	474.2	6.7	2.8	12,920.2	41.9	30.2	72.1	21,887.1	608.5	217.2	277.9	495.1	382.0	0.0	1,485.6	36,365.0		

様式-3 被害額

(整備計画事業着手(H20):資産-10%) 水系名: 淀川水系

河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用				事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	39.4	13.2	2.0	0.9	0.1	0.1	55.7	0.0	0.0	0.0	94.4	0.9	0.6	0.9	1.5	0.7	0.0	3.1	153.2		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
萬生ブロック①	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.1	0.0	0.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	
萬生ブロック②	94.4	59.2	13.4	8.6	0.7	0.3	176.6	1.0	0.0	1.0	299.2	4.1	3.3	3.9	7.2	5.1	0.0	16.4	493.2		
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	73.9	156.2	8.1	2.3	0.1	0.0	240.6	0.2	5.6	5.8	407.6	2.1	7.9	7.2	15.1	4.9	0.0	22.1	676.1		
大屋戸ブロック	347.6	653.4	67.4	20.5	0.6	0.3	1,089.8	2.2	4.3	6.5	1,846.2	22.6	32.9	31.9	64.8	27.7	0.0	115.1	3,057.6		
名張市街地ブロック	5,034.7	1,734.7	688.8	197.6	2.7	1.2	7,659.7	9.9	2.4	12.3	12,975.7	319.2	123.1	167.0	290.1	200.3	0.0	809.6	21,457.3		
結馬ブロック	1,029.4	623.4	427.7	165.8	1.7	0.8	2,248.8	13.5	15.2	28.7	3,809.6	126.8	32.1	28.6	60.7	99.5	0.0	287.0	6,374.1		
小屋出ブロック	81.3	43.5	25.1	10.4	0.2	0.1	160.6	0.4	0.0	0.4	272.0	10.1	2.4	3.5	5.9	5.5	0.0	21.5	454.5		
赤目町ブロック	1,443.8	674.2	492.0	147.7	1.6	0.8	2,760.1	8.4	1.5	9.9	4,675.5	180.2	42.1	59.0	101.1	89.6	0.0	370.9	7,816.4		
安部田ブロック	267.5	37.8	7.3	2.0	0.1	0.0	314.7	9.9	0.0	9.9	533.0	2.7	3.1	5.2	8.3	3.1	0.0	14.1	871.7		
下比奈知ブロック	32.4	19.8	41.6	5.4	0.0	0.0	99.2	0.1	0.7	0.8	168.4	15.6	1.9	3.1	5.0	4.3	0.0	24.9	293.3		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	436.4	130.9	8.9	5.7	0.8	0.3	583.0	0.0	0.0	0.0	987.4	2.9	7.0	7.6	14.6	5.9	0.0	23.4	1,593.8		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	
宇陀川上流ブロック⑨	456.6	70.6	24.2	8.6	0.2	0.1	560.3	0.0	0.0	0.0	949.1	7.8	3.5	3.4	6.9	13.2	0.0	27.9	1,537.3		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	9,339.8	4,216.9	1,806.5	575.5	8.8	4.0	15,951.5	47.1	34.3	81.4	27,022.1	695.0	259.9	321.3	581.2	459.8	0.0	1,736.0	44,791.0		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/2確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.0	2.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
大屋戸ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
名張市街地ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結馬ブロック	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.2	1.1	1.3	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤目町ブロック	7.2	7.6	1.0	0.4	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0	0.0	27.5	0.2	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	1.2	44.9	
安部田ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15.3	7.6	1.0	0.4	0.0	0.0	24.3	0.2	3.1	3.3	41.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	1.2	69.9	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.2	5.0	5.2	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6
大屋戸ブロック	48.6	124.6	6.4	1.6	0.1	0.0	181.3	1.3	0.0	1.3	307.0	1.5	4.9	6.0	10.9	2.8	0.0	15.2	504.8	
名張市街地ブロック	569.0	140.8	32.0	8.9	0.2	0.1	751.0	2.7	1.0	3.7	1,272.0	10.8	9.6	15.7	25.3	9.1	0.0	45.2	2,071.9	
結馬ブロック	118.7	3.2	9.0	2.4	0.0	0.0	133.3	8.7	6.4	15.1	225.7	4.0	0.5	0.9	1.4	1.1	0.0	6.5	380.6	
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
赤目町ブロック	373.7	133.1	117.9	29.0	0.2	0.1	654.0	2.5	0.2	2.7	1,108.0	50.2	10.4	17.3	27.7	23.0	0.0	100.9	1,865.6	
安部田ブロック	84.8	2.9	1.2	0.3	0.0	0.0	89.2	6.3	0.0	6.3	151.2	0.5	0.5	0.8	1.3	0.4	0.0	2.2	248.9	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	9.8	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0	18.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	29.1	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	1,222.6	405.2	166.6	42.3	0.5	0.2	1,837.4	22.0	12.6	34.6	3,112.3	67.1	26.0	40.9	66.9	36.5	0.0	170.5	5,154.8	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	26.8	5.7	1.2	0.5	0.1	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	58.0	0.7	0.3	0.6	0.9	0.3	0.0	1.9	94.2	
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	
鳶生ブロック②	42.8	27.7	6.5	4.2	0.3	0.2	81.7	0.8	0.0	0.8	138.4	1.5	1.2	1.4	2.6	1.9	0.0	6.0	226.9	
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	67.5	156.7	7.8	2.0	0.1	0.1	234.2	0.3	6.8	7.1	396.7	1.7	6.0	6.3	12.3	3.6	0.0	17.6	655.6	
大屋戸ブロック	353.9	666.3	65.2	20.1	0.6	0.3	1,106.4	2.6	4.9	7.5	1,874.2	17.5	27.4	26.4	53.8	22.9	0.0	94.2	3,082.3	
名張市街地ブロック	3,008.9	1,088.8	252.5	76.1	1.5	0.7	4,428.5	9.7	2.6	12.3	7,502.1	77.0	55.5	70.8	126.3	64.7	0.0	268.0	12,210.9	
結馬ブロック	501.8	159.0	133.2	39.9	0.5	0.2	834.6	13.5	13.7	27.2	1,413.7	44.5	7.9	12.4	20.3	21.0	0.0	85.8	2,361.3	
小屋出ブロック	58.7	20.8	20.0	8.7	0.1	0.0	108.3	0.4	0.0	0.4	183.5	7.5	1.5	2.3	3.8	3.3	0.0	14.6	306.8	
赤目町ブロック	1,239.5	573.6	400.3	113.8	1.3	0.6	2,329.1	8.6	0.9	9.5	3,945.2	135.8	32.3	47.8	80.1	63.8	0.0	279.7	6,563.5	
安部田ブロック	277.7	30.0	6.7	1.8	0.1	0.0	316.3	10.5	0.0	10.5	535.9	2.2	2.4	4.3	6.7	2.4	0.0	11.3	874.0	
下比奈知ブロック	30.5	8.6	35.2	4.5	0.0	0.0	78.8	0.1	0.9	1.0	133.6	13.7	1.5	2.6	4.1	3.2	0.0	21.0	234.4	
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	278.3	100.9	6.8	4.1	0.6	0.3	391.0	0.1	0.0	0.1	662.3	1.8	4.2	5.2	9.4	3.5	0.0	14.7	1,068.1	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	
宇陀川上流ブロック⑨	260.6	37.8	13.5	4.1	0.1	0.1	316.2	0.0	0.0	0.0	535.4	3.7	1.4	1.9	3.3	5.1	0.0	12.1	863.7	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
合計	6,148.6	2,875.9	948.9	279.8	5.3	2.5	10,261.0	47.6	34.7	82.3	17,381.8	307.6	141.6	182.0	323.6	195.7	0.0	826.9	28,552.0	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	48.2	16.2	2.5	1.1	0.2	0.1	68.3	0.0	0.0	0.0	115.4	0.9	0.6	0.9	1.5	0.7	0.0	3.1	186.8	
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	
鳶生ブロック②	110.3	71.2	15.6	10.2	0.9	0.4	208.6	1.2	0.0	1.2	353.3	3.8	3.1	3.6	6.7	4.9	0.0	15.4	578.5	
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	90.3	190.9	9.9	2.8	0.1	0.1	294.1	0.3	6.8	7.1	498.2	2.1	7.9	7.2	15.1	4.9	0.0	22.1	821.5	
大屋戸ブロック	424.9	798.6	82.4	25.1	0.8	0.3	1,332.1	2.6	5.3	7.9	2,256.5	22.6	32.9	31.9	64.8	27.7	0.0	115.1	3,711.6	
名張市街地ブロック	3,770.0	1,379.4	331.7	101.8	2.0	0.9	5,585.8	11.2	2.7	13.9	9,462.3	105.6	69.6	85.5	155.1	85.1	0.0	345.8	15,407.8	
結馬ブロック	676.5	293.6	215.7	67.1	1.0	0.5	1,254.4	14.9	16.0	30.9	2,124.8	61.0	12.2	17.1	29.3	33.9	0.0	124.2	3,534.3	
小屋出ブロック	99.4	53.2	30.6	12.7	0.3	0.1	196.3	0.5	0.0	0.5	332.5	10.1	2.4	3.5	5.9	5.5	0.0	21.5	550.8	
赤目町ブロック	1,427.3	647.9	445.8	130.1	1.5	0.7	2,653.3	9.3	1.8	11.1	4,494.4	148.9	35.6	52.0	87.6	70.8	0.0	307.3	7,466.1	
安部田ブロック	326.9	46.2	8.9	2.5	0.1	0.0	384.6	12.1	0.0	12.1	651.4	2.7	3.1	5.2	8.3	3.1	0.0	14.1	1,062.2	
下比奈知ブロック	39.6	24.3	50.9	6.7	0.0	0.0	121.5	0.1	0.9	1.0	205.8	15.6	1.9	3.1	5.0	4.3	0.0	24.9	353.2	
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	533.4	159.9	10.8	6.9	0.9	0.4	712.3	0.1	0.0	0.1	1,206.9	2.9	7.0	7.6	14.6	5.9	0.0	23.4	1,942.7	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
宇陀川上流ブロック⑨	558.1	86.2	29.6	10.6	0.2	0.1	684.8	0.0	0.0	0.0	1,160.1	7.8	3.5	3.4	6.9	13.2	0.0	27.9	1,872.8	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
合計	8,107.8	3,767.6	1,234.4	377.6	8.0	3.6	13,499.0	54.2	39.1	93.3	22,866.5	384.0	179.8	221.0	400.8	260.0	0.0	1,044.8	37,503.6	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	81.0	28.6	4.5	2.4	0.2	0.1	116.8	0.1	0.0	0.1	197.9	1.5	1.1	1.2	2.3	1.4	0.0	5.2	320.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.5	0.0	0.5	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	
鳶生ブロック②	235.9	157.5	32.7	21.9	2.0	0.9	450.9	1.5	0.9	2.4	763.7	7.7	6.6	7.2	13.8	10.5	0.0	32.0	1,249.0		
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	129.2	272.5	11.4	3.6	0.2	0.1	417.0	0.3	6.8	7.1	706.3	2.9	10.8	8.6	19.4	6.9	0.0	29.2	1,159.6		
大屋戸ブロック	716.5	1,208.3	167.5	49.9	1.5	0.7	2,144.4	2.8	5.4	8.2	3,632.6	43.6	50.3	52.6	102.9	47.1	0.0	193.6	5,978.8		
名張市街地ブロック	5,469.9	2,182.7	616.7	191.8	3.6	1.7	8,466.4	15.4	2.9	18.3	14,342.0	183.4	105.7	125.7	231.4	145.5	0.0	560.3	23,387.0		
結馬ブロック	1,103.5	605.2	427.1	152.9	1.7	0.9	2,291.3	17.7	19.0	36.7	3,881.5	101.9	24.9	25.7	50.6	74.1	0.0	226.6	6,436.1		
小屋出ブロック	473.7	250.5	108.4	54.6	1.2	0.5	888.9	1.5	4.2	5.7	1,505.9	28.9	10.3	10.2	20.5	25.6	0.0	75.0	2,475.5		
赤目町ブロック	2,534.0	1,170.9	649.9	197.6	3.0	1.3	4,556.7	11.8	7.3	19.1	7,719.3	198.7	56.8	81.3	138.1	103.2	0.0	440.0	12,735.1		
安部田ブロック	704.4	226.9	55.0	28.2	0.8	0.3	1,015.6	18.1	0.0	18.1	1,720.6	14.8	9.6	12.4	22.0	14.1	0.0	50.9	2,805.2		
下比奈知ブロック	61.5	41.0	76.1	11.2	0.0	0.0	189.8	0.1	1.0	1.1	321.6	20.4	2.8	4.0	6.8	6.8	0.0	34.0	546.5		
宇陀川上流ブロック①	13.0	0.8	1.7	0.7	0.0	0.0	16.2	0.4	0.0	0.4	27.4	0.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	1.5	45.5		
宇陀川上流ブロック②	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック④	1,156.5	518.6	36.8	26.0	2.9	1.2	1,742.0	0.2	0.0	0.2	2,950.7	11.2	20.5	15.9	36.4	21.7	0.0	69.3	4,762.2		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8		
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6		
宇陀川上流ブロック⑨	1,352.3	215.0	53.6	24.1	0.6	0.2	1,645.8	0.0	0.0	0.0	2,788.1	20.3	8.6	5.7	14.3	31.5	0.0	66.1	4,500.0		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		
合計	14,044.9	6,878.5	2,241.4	764.9	17.7	7.9	23,955.3	72.7	53.1	125.8	40,580.5	636.2	308.1	350.7	658.8	488.7	0.0	1,783.7	66,445.3		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	146.7	49.3	6.3	4.1	0.4	0.2	207.0	0.2	2.9	3.1	350.6	2.4	1.9	1.4	3.3	2.6	0.0	8.3	569.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.9	0.8	0.0	0.8	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.7		
鳶生ブロック②	458.4	317.2	58.5	42.5	4.0	1.8	882.4	1.9	1.7	3.6	1,495.0	13.9	12.5	11.6	24.1	19.9	0.0	57.9	2,438.9		
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	185.8	363.2	12.7	4.6	0.2	0.1	566.6	0.3	6.8	7.1	959.9	4.1	14.4	9.5	23.9	8.8	0.0	36.8	1,570.4		
大屋戸ブロック	1,016.9	1,740.6	257.5	84.3	2.1	0.9	3,102.3	2.8	5.8	8.6	5,255.5	63.0	72.3	67.1	139.4	74.8	0.0	277.2	8,643.6		
名張市街地ブロック	8,781.1	3,768.4	1,485.6	431.4	7.0	3.2	14,476.7	16.1	3.3	19.4	24,523.6	444.0	180.8	230.6	411.4	318.1	0.0	1,173.5	40,193.2		
結馬ブロック	1,383.5	779.6	536.9	206.6	2.1	1.0	2,909.7	18.0	19.7	37.7	4,929.2	129.8	32.7	29.5	62.2	101.0	0.0	293.0	8,169.6		
小屋出ブロック	520.7	272.6	115.4	59.0	1.3	0.6	969.6	1.5	4.2	5.7	1,642.4	30.6	11.1	10.6	21.7	27.9	0.0	80.2	2,697.9		
赤目町ブロック	4,138.3	2,173.1	1,344.6	395.0	4.5	2.1	8,057.6	14.0	7.9	21.9	13,649.5	357.9	101.4	131.0	232.4	217.0	0.0	807.3	22,536.3		
安部田ブロック	779.5	244.7	57.2	28.8	0.9	0.4	1,111.5	18.5	0.0	18.5	1,882.8	15.1	10.2	13.1	23.3	14.8	0.0	53.2	3,066.0		
下比奈知ブロック	155.5	167.9	209.2	34.9	0.1	0.0	567.6	0.1	1.2	1.3	961.7	41.4	7.6	7.6	15.2	20.0	0.0	76.6	1,607.2		
宇陀川上流ブロック①	13.0	3.2	2.8	1.1	0.0	0.0	20.1	0.4	0.0	0.4	34.2	1.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.0	2.0	56.7		
宇陀川上流ブロック②	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック④	1,394.7	592.6	40.9	30.0	3.3	1.3	2,062.8	0.2	0.0	0.2	3,494.1	13.6	23.3	17.0	40.3	25.5	0.0	79.4	5,636.5		
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8		
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4		
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6		
宇陀川上流ブロック⑨	1,519.2	231.4	59.0	26.2	0.6	0.2	1,836.6	0.0	0.0	0.0	3,111.3	22.6	9.4	6.4	15.8	33.6	0.0	72.0	5,019.9		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		
合計	20,527.0	10,703.8	4,186.6	1,348.5	26.5	11.8	36,804.2	77.2	59.1	136.3	62,346.9	1,139.5	477.8	535.7	1,013.5	864.4	0.0	3,017.4	102,304.8		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/2確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.7	1.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
大屋戸ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
名張市街地ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
結馬ブロック	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.1	0.9	1.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
赤目町ブロック	5.9	6.2	0.8	0.3	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	22.5	0.2	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	1.2	36.9		
安部田ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	12.5	6.2	0.8	0.3	0.0	0.0	19.8	0.1	2.6	2.7	33.6	0.2	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	1.2	57.3		

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/5確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鳶生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
夏秋ブロック	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.2	4.1	4.3	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9		
大屋戸ブロック	39.8	101.9	5.2	1.3	0.1	0.0	148.3	1.1	0.0	1.1	251.2	1.5	4.9	6.0	10.9	2.8	0.0	15.2	415.8			
名張市街地ブロック	465.5	115.2	26.1	7.3	0.1	0.1	614.3	2.2	0.8	3.0	1,040.7	10.8	9.6	15.7	25.3	9.1	0.0	45.2	1,703.2			
結馬ブロック	97.1	2.6	7.4	2.0	0.0	0.0	109.1	7.1	5.3	12.4	184.7	4.0	0.5	0.9	1.4	1.1	0.0	6.5	312.7			
小屋出ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
赤目町ブロック	305.8	108.9	96.5	23.8	0.2	0.1	535.3	2.0	0.2	2.2	906.5	50.2	10.4	17.3	27.7	23.0	0.0	100.9	1,544.9			
安部田ブロック	69.4	2.4	1.0	0.3	0.0	0.0	73.1	5.2	0.0	5.2	123.7	0.5	0.5	0.8	1.3	0.4	0.0	2.2	204.2			
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック④	8.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	14.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.5	23.9			
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2			
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑨	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	1,000.3	331.5	136.3	34.8	0.4	0.2	1,503.5	18.0	10.4	28.4	2,546.4	67.1	26.0	40.9	66.9	36.5	0.0	170.5	4,248.8			

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/10確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
萬生ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
萬生ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	26.7	25.5	1.7	0.4	0.0	0.0	54.3	0.2	5.3	5.5	92.0	0.7	1.7	3.0	4.7	0.9	0.0	6.3	158.1	
大屋戸ブロック	130.1	319.7	21.4	6.1	0.2	0.1	477.6	1.9	2.9	4.8	809.1	7.1	16.0	15.4	31.4	11.2	0.0	49.7	1,341.2	
名張市街地ブロック	1,082.0	335.9	64.4	19.2	0.5	0.2	1,502.2	3.4	1.7	5.1	2,544.7	22.8	21.1	29.4	50.5	21.9	0.0	95.2	4,147.2	
結馬ブロック	199.6	10.6	17.9	4.9	0.0	0.0	233.0	8.6	7.7	16.3	394.8	9.2	1.3	2.3	3.6	3.2	0.0	16.0	660.1	
小屋出ブロック	1.7	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	8.8	
赤目町ブロック	668.9	267.1	223.8	60.5	0.5	0.2	1,221.0	5.3	0.4	5.7	2,068.5	108.0	21.6	34.3	55.9	45.4	0.0	209.3	3,504.5	
安部田ブロック	126.6	7.9	1.7	0.5	0.0	0.0	136.7	6.8	0.0	6.8	231.6	0.7	0.8	1.3	2.1	0.7	0.0	3.5	378.6	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	97.2	22.1	2.4	1.3	0.1	0.0	123.1	0.0	0.0	0.0	208.5	1.1	2.0	3.0	5.0	1.5	0.0	7.6	339.2	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑨	86.1	9.2	4.0	1.1	0.0	0.0	100.4	0.0	0.0	0.0	170.2	1.8	0.6	0.9	1.5	1.8	0.0	5.1	275.7	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	2,418.9	998.3	338.0	94.3	1.3	0.5	3,851.3	26.6	18.0	44.6	6,524.5	151.8	65.2	89.7	154.9	86.7	0.0	393.4	10,813.8	

様式-3 被害額 (当面整備完了(H34):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 名張川、宇陀川、青蓮寺川 流量規模: 1/20確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃 労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
広瀬ブロック①	16.3	4.1	0.7	0.3	0.1	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	36.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.0	1.2	58.9	
広瀬ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
萬生ブロック①	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
萬生ブロック②	5.3	2.4	0.7	0.4	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	15.0	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.0	1.0	24.8	
萬生ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
夏秋ブロック	47.4	100.2	4.6	1.0	0.1	0.0	153.3	0.2	5.4	5.6	259.9	1.3	4.0	5.4	9.4	2.2	0.0	12.9	431.7	
大屋戸ブロック	219.5	447.4	33.0	10.1	0.4	0.2	710.6	2.1	4.0	6.1	1,203.6	10.7	21.5	19.8	41.3	16.3	0.0	68.3	1,988.6	
名張市街地ブロック	2,015.2	697.0	150.2	45.1	1.0	0.5	2,909.0	5.5	1.9	7.4	4,927.8	55.2	45.1	59.6	104.7	49.7	0.0	209.6	8,053.8	
結馬ブロック	328.0	57.9	63.0	17.9	0.2	0.1	467.1	10.0	10.5	20.5	791.2	29.5	4.6	7.9	12.5	11.9	0.0	53.9	1,332.7	
小屋出ブロック	4.9	2.3	1.6	0.6	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	16.1	0.6	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	1.2	26.7	
赤目町ブロック	897.9	389.5	279.3	78.2	0.8	0.4	1,646.1	6.3	0.7	7.0	2,788.5	122.9	28.7	44.3	73.0	55.4	0.0	251.3	4,692.9	
安部田ブロック	178.8	14.2	2.8	0.8	0.0	0.0	196.6	8.0	0.0	8.0	333.0	1.1	1.2	2.1	3.3	1.2	0.0	5.6	543.2	
下比奈知ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック④	187.2	58.1	4.1	2.3	0.4	0.2	252.3	0.0	0.0	0.0	427.2	1.5	3.2	4.4	7.6	2.6	0.0	11.7	691.2	
宇陀川上流ブロック⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
宇陀川上流ブロック⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
宇陀川上流ブロック⑦	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
宇陀川上流ブロック⑧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
宇陀川上流ブロック⑨	168.2	22.2	8.3	2.5	0.1	0.0	201.3	0.0	0.0	0.0	341.0	3.0	1.1	1.5	2.6	3.9	0.0	9.5	551.8	
宇陀川上流ブロック⑩	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	4,069.0	1,795.3	548.3	159.2	3.1	1.4	6,576.3	32.6	26.3	58.9	11,140.1	226.5	109.9	145.9	255.8	143.9	0.0	626.2	18,401.5	

様式－4

様式－4

年平均被害軽減期待額

水系名：淀川

河川名：宇治川

対象河道：H29末河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	338.9	0.0	1.1	1.1	
1/60	0.01667	58447.9	57770.1	677.8	578.8	0.0	1.4	2.5	
1/70	0.01429	60425.7	59945.9	479.9	618.2	0.0	1.1	3.6	
1/80	0.01250	61584.1	60827.7	756.5	838.7	0.0	2.1	5.7	
1/100	0.01000	65039.8	64118.9	920.9	665.9	0.0	1.5	7.2	
1/130	0.00769	67556.6	67145.7	410.8	268.3	0.0	0.3	7.5	
1/150	0.00667	68195.2	68069.5	125.7					

様式－4

年平均被害軽減期待額

水系名：淀川

河川名：宇治川

対象河道：整備計画河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	671.5	0.0	2.2	2.2	
1/60	0.01667	57770.1	56427.1	1343.0	890.9	0.0	2.1	4.4	
1/70	0.01429	59945.9	59507.2	438.7	410.3	0.0	0.7	5.1	
1/80	0.01250	60827.7	60445.7	381.9	220.3	0.0	0.6	5.6	
1/100	0.01000	64118.9	64060.2	58.7	141.3	0.0	0.3	6.0	
1/130	0.00769	67145.7	66921.8	223.9	185.7	0.0	0.2	6.2	
1/150	0.00667	68069.5	67922.1	147.5					

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10%）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：H29末河道 (単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	371.7	0.0	1.2	1.2	
1/60	0.01667	64081.6	63338.2	743.4	634.4	0.0	1.5	2.7	
1/70	0.01429	66250.8	65725.4	525.4	677.5	0.0	1.2	4.0	
1/80	0.01250	67521.1	66691.4	829.7	920.4	0.0	2.3	6.3	
1/100	0.01000	71310.3	70299.2	1011.1	731.1	0.0	1.7	7.9	
1/130	0.00769	74072.5	73621.4	451.1	294.5	0.0	0.3	8.2	
1/150	0.00667	74773.6	74635.6	138.0					

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産＋10%）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：整備計画河道 (単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	734.9	0.0	2.4	2.4	
1/60	0.01667	63338.2	61868.4	1469.8	975.4	0.0	2.3	4.8	
1/70	0.01429	65725.4	65244.4	481.0	449.8	0.0	0.8	5.6	
1/80	0.01250	66691.4	66272.9	418.5	241.5	0.0	0.6	6.2	
1/100	0.01000	70299.2	70234.7	64.5	154.9	0.0	0.4	6.5	
1/130	0.00769	73621.4	73376.0	245.4	203.8	0.0	0.2	6.7	
1/150	0.00667	74635.6	74473.4	162.2					

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10%）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：H29末河道 (単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	306.2	0.0	1.0	1.0	
1/60	0.01667	52814.5	52202.2	612.3	523.3	0.0	1.2	2.3	
1/70	0.01429	54600.7	54166.4	434.3	558.8	0.0	1.0	3.3	
1/80	0.01250	55647.2	54963.8	683.4	756.9	0.0	1.9	5.2	
1/100	0.01000	58769.2	57938.7	830.5	600.6	0.0	1.4	6.5	
1/130	0.00769	61040.5	60669.8	370.7	241.9	0.0	0.2	6.8	
1/150	0.00667	61617.0	61503.8	113.2					

様式－４ 年平均被害軽減期待額（資産－10%）

水系名：淀川 河川名：宇治川 対象河道：整備計画河道 (単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/50	0.02000	0.0	0.0	0.0	608.1	0.0	2.0	2.0	
1/60	0.01667	52202.2	50985.9	1216.3	806.3	0.0	1.9	3.9	
1/70	0.01429	54166.4	53770.0	396.4	370.8	0.0	0.7	4.6	
1/80	0.01250	54963.8	54618.7	345.1	199.0	0.0	0.5	5.1	
1/100	0.01000	57938.7	57885.9	52.8	127.6	0.0	0.3	5.4	
1/130	0.00769	60669.8	60467.5	202.3	167.8	0.0	0.2	5.6	
1/150	0.00667	61503.8	61370.6	133.2					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：H29年河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	11,859.9	0.3	3,558.0	3,558.0	
1/5	0.20000	99,592.8	75,873.0	23,719.8	98,013.1	0.1	9,801.3	13,359.3	
1/10	0.10000	1,005,092.2	832,785.9	172,306.4	146,283.1	0.1	7,314.2	20,673.4	
1/20	0.05000	1,437,396.6	1,317,136.6	120,259.9	163,078.8	0.0	2,718.0	23,391.4	
1/30	0.03333	1,747,242.9	1,541,345.3	205,897.6	227,980.2	0.0	3,039.7	26,431.2	
1/50	0.02000	2,110,866.1	1,860,803.2	250,062.9	254,495.5	0.0	1,908.7	28,339.9	
1/80	0.01250	2,395,472.2	2,136,544.2	258,928.1	258,087.3	0.0	645.2	28,985.1	
1/100	0.01000	2,538,655.9	2,281,409.3	257,246.6	309,489.6	0.0	1,031.6	30,016.7	
1/150	0.00667	2,872,103.5	2,510,370.9	361,732.6					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：緊特河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	13,515.5	0.3	4,054.6	4,054.6	
1/5	0.20000	75,873.0	48,842.0	27,030.9	247,132.0	0.1	24,713.2	28,767.8	
1/10	0.10000	832,785.9	365,552.7	467,233.1	331,940.6	0.1	16,597.0	45,364.9	
1/20	0.05000	1,317,136.6	1,120,488.7	196,648.0	177,216.8	0.0	2,953.6	48,318.5	
1/30	0.03333	1,541,345.3	1,383,559.6	157,785.6	151,431.0	0.0	2,019.1	50,337.6	
1/50	0.02000	1,860,803.2	1,715,726.9	145,076.4	119,359.7	0.0	895.2	51,232.8	
1/80	0.01250	2,136,544.2	2,042,901.0	93,643.1	86,873.2	0.0	217.2	51,449.9	
1/100	0.01000	2,281,409.3	2,201,306.1	80,103.2	80,029.5	0.0	266.8	51,716.7	
1/150	0.00667	2,510,370.9	2,430,415.0	79,955.9					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：H16年対応河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	12,754.7	0.3	3,826.4	3,826.4	
1/5	0.20000	48,842.0	23,332.7	25,509.3	151,934.5	0.1	15,193.4	19,019.8	
1/10	0.10000	365,552.7	87,193.2	278,359.6	218,625.9	0.1	10,931.3	29,951.1	
1/20	0.05000	1,120,488.7	961,596.3	158,892.3	162,145.8	0.0	2,702.4	32,653.6	
1/30	0.03333	1,383,559.6	1,218,160.4	165,399.2	186,168.5	0.0	2,482.2	35,135.8	
1/50	0.02000	1,715,726.9	1,508,789.1	206,937.8	226,139.5	0.0	1,696.0	36,831.9	
1/80	0.01250	2,042,901.0	1,797,559.7	245,341.3	257,161.3	0.0	642.9	37,474.8	
1/100	0.01000	2,201,306.1	1,932,324.8	268,981.4	274,393.1	0.0	914.6	38,389.4	
1/150	0.00667	2,430,415.0	2,150,610.1	279,804.9					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：整備計画河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	11,666.3	0.3	3,499.9	3,499.9	
1/5	0.20000	23,332.7	0.0	23,332.7	47,983.9	0.1	4,798.4	8,298.3	
1/10	0.10000	87,193.2	14,558.0	72,635.1	476,589.6	0.1	23,829.5	32,127.8	
1/20	0.05000	961,596.3	81,052.3	880,544.0	896,106.4	0.0	14,935.1	47,062.9	
1/30	0.03333	1,218,160.4	306,491.7	911,668.7	763,504.9	0.0	10,180.1	57,242.9	
1/50	0.02000	1,508,789.1	893,448.0	615,341.0	632,950.7	0.0	4,747.1	61,990.1	
1/80	0.01250	1,797,559.7	1,146,999.5	650,560.3	656,030.8	0.0	1,640.1	63,630.2	
1/100	0.01000	1,932,324.8	1,270,823.5	661,501.3	661,897.5	0.0	2,206.3	65,836.5	
1/150	0.00667	2,150,610.1	1,488,316.5	662,293.7					

様式－4

年平均被害軽減期待額（資産＋10%）

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：H29年河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	13,008.6	0.3	3,902.6	3,902.6	
1/5	0.20000	109,153.5	83,136.4	26,017.1	107,518.9	0.1	10,751.9	14,654.5	
1/10	0.10000	1,102,307.5	913,286.8	189,020.7	160,474.1	0.1	8,023.7	22,678.2	
1/20	0.05000	1,576,480.9	1,444,553.5	131,927.4	178,856.6	0.0	2,980.9	25,659.1	
1/30	0.03333	1,916,264.6	1,690,478.8	225,785.8	250,004.5	0.0	3,333.4	28,992.5	
1/50	0.02000	2,315,009.3	2,040,786.1	274,223.2	279,088.3	0.0	2,093.2	31,085.7	
1/80	0.01250	2,627,100.0	2,343,146.7	283,953.3	283,044.0	0.0	707.6	31,793.3	
1/100	0.01000	2,784,126.5	2,501,991.8	282,134.7	339,397.3	0.0	1,131.3	32,924.6	
1/150	0.00667	3,149,740.3	2,753,080.4	396,659.9					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：緊特河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	14,803.3	0.3	4,441.0	4,441.0	
1/5	0.20000	83,136.4	53,529.9	29,606.5	271,026.7	0.1	27,102.7	31,543.6	
1/10	0.10000	913,286.8	400,840.0	512,446.8	364,071.6	0.1	18,203.6	49,747.2	
1/20	0.05000	1,444,553.5	1,228,857.2	215,696.3	194,390.8	0.0	3,239.8	52,987.1	
1/30	0.03333	1,690,478.8	1,517,393.6	173,085.2	166,090.9	0.0	2,214.5	55,201.6	
1/50	0.02000	2,040,786.1	1,881,689.5	159,096.6	130,894.2	0.0	981.7	56,183.3	
1/80	0.01250	2,343,146.7	2,240,455.0	102,691.7	95,259.9	0.0	238.1	56,421.5	
1/100	0.01000	2,501,991.8	2,414,163.7	87,828.1	87,750.3	0.0	292.5	56,714.0	
1/150	0.00667	2,753,080.4	2,665,408.0	87,672.4					

様式－4

年平均被害軽減期待額（資産＋10%）

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：H16年対応河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	13,981.7	0.3	4,194.5	4,194.5	
1/5	0.20000	53,529.9	25,566.6	27,963.3	166,627.2	0.1	16,662.7	20,857.2	
1/10	0.10000	400,840.0	95,549.0	305,291.0	239,782.2	0.1	11,989.1	32,846.3	
1/20	0.05000	1,228,857.2	1,054,583.8	174,273.4	177,833.5	0.0	2,963.9	35,810.2	
1/30	0.03333	1,517,393.6	1,336,000.0	181,393.6	204,142.2	0.0	2,721.9	38,532.1	
1/50	0.02000	1,881,689.5	1,654,798.7	226,890.8	247,911.4	0.0	1,859.3	40,391.4	
1/80	0.01250	2,240,455.0	1,971,523.1	268,931.9	281,886.9	0.0	704.7	41,096.2	
1/100	0.01000	2,414,163.7	2,119,321.9	294,841.8	300,778.4	0.0	1,002.6	42,098.8	
1/150	0.00667	2,665,408.0	2,358,693.1	306,714.9					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：整備計画河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	12,783.3	0.3	3,835.0	3,835.0	
1/5	0.20000	25,566.6	0.0	25,566.6	52,583.5	0.1	5,258.3	9,093.3	
1/10	0.10000	95,549.0	15,948.7	79,600.3	522,679.5	0.1	26,134.0	35,227.3	
1/20	0.05000	1,054,583.8	88,825.1	965,758.7	982,844.5	0.0	16,380.7	51,608.1	
1/30	0.03333	1,336,000.0	336,069.7	999,930.3	837,441.1	0.0	11,165.9	62,773.9	
1/50	0.02000	1,654,798.7	979,846.9	674,951.8	694,254.1	0.0	5,206.9	67,980.8	
1/80	0.01250	1,971,523.1	1,257,966.7	713,556.4	719,541.4	0.0	1,798.9	69,779.7	
1/100	0.01000	2,119,321.9	1,393,795.6	725,526.3	725,926.1	0.0	2,419.8	72,199.4	
1/150	0.00667	2,358,693.1	1,632,367.2	726,325.9					

様式－4 年平均被害軽減期待額（資産－10%）

水系名：淀川		河川名：桂川			対象河道：H29年河道		(単位：百万円)		
流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	10,711.6	0.3	3,213.5	3,213.5	
1/5	0.20000	90,032.5	68,609.3	21,423.2	88,507.6	0.1	8,850.8	12,064.2	
1/10	0.10000	907,877.2	752,285.2	155,592.0	132,092.4	0.1	6,604.6	18,668.9	
1/20	0.05000	1,298,312.4	1,189,719.7	108,592.7	147,301.1	0.0	2,455.0	21,123.9	
1/30	0.03333	1,578,221.2	1,392,211.8	186,009.4	205,956.3	0.0	2,746.1	23,870.0	
1/50	0.02000	1,906,723.3	1,680,820.1	225,903.2	229,903.0	0.0	1,724.3	25,594.2	
1/80	0.01250	2,163,844.3	1,929,941.6	233,902.7	233,130.8	0.0	582.8	26,177.1	
1/100	0.01000	2,293,185.5	2,060,826.6	232,358.9	279,582.4	0.0	931.9	27,109.0	
1/150	0.00667	2,594,467.1	2,267,661.2	326,805.9					

水系名：淀川		河川名：桂川			対象河道：緊特河道		(単位：百万円)		
流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	12,227.8	0.3	3,668.3	3,668.3	
1/5	0.20000	68,609.3	44,153.7	24,455.6	223,237.7	0.1	22,323.8	25,992.1	
1/10	0.10000	752,285.2	330,265.4	422,019.8	299,809.8	0.1	14,990.5	40,982.6	
1/20	0.05000	1,189,719.7	1,012,120.0	177,599.7	160,042.9	0.0	2,667.4	43,650.0	
1/30	0.03333	1,392,211.8	1,249,725.7	142,486.1	136,771.1	0.0	1,823.6	45,473.6	
1/50	0.02000	1,680,820.1	1,549,764.0	131,056.1	107,825.4	0.0	808.7	46,282.3	
1/80	0.01250	1,929,941.6	1,845,347.0	84,594.6	78,486.3	0.0	196.2	46,478.5	
1/100	0.01000	2,060,826.6	1,988,448.6	72,378.0	72,308.5	0.0	241.0	46,719.5	
1/150	0.00667	2,267,661.2	2,195,422.2	72,239.0					

様式－4

年平均被害軽減期待額（資産－10%）

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：H16年対応河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	11,527.5	0.3	3,458.3	3,458.3	
1/5	0.20000	44,153.7	21,098.7	23,055.0	137,241.4	0.1	13,724.1	17,182.4	
1/10	0.10000	330,265.4	78,837.6	251,427.8	197,469.5	0.1	9,873.5	27,055.9	
1/20	0.05000	1,012,120.0	868,608.9	143,511.1	146,457.8	0.0	2,441.0	29,496.8	
1/30	0.03333	1,249,725.7	1,100,321.2	149,404.5	168,194.5	0.0	2,242.6	31,739.4	
1/50	0.02000	1,549,764.0	1,362,779.6	186,984.4	204,367.5	0.0	1,532.8	33,272.2	
1/80	0.01250	1,845,347.0	1,623,596.5	221,750.5	232,435.7	0.0	581.1	33,853.3	
1/100	0.01000	1,988,448.6	1,745,327.8	243,120.8	248,008.0	0.0	826.7	34,680.0	
1/150	0.00667	2,195,422.2	1,942,527.1	252,895.1					

水系名：淀川

河川名：桂川

対象河道：整備計画河道

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/2	0.50000	0.0	0.0	0.0	10,549.4	0.3	3,164.8	3,164.8	
1/5	0.20000	21,098.7	0.0	21,098.7	43,384.4	0.1	4,338.4	7,503.2	
1/10	0.10000	78,837.6	13,167.5	65,670.1	430,499.6	0.1	21,525.0	29,028.2	
1/20	0.05000	868,608.9	73,279.8	795,329.1	809,367.8	0.0	13,489.5	42,517.7	
1/30	0.03333	1,100,321.2	276,914.7	823,406.5	689,568.5	0.0	9,194.2	51,711.9	
1/50	0.02000	1,362,779.6	807,049.1	555,730.5	571,647.5	0.0	4,287.4	55,999.3	
1/80	0.01250	1,623,596.5	1,036,032.1	587,564.4	592,520.4	0.0	1,481.3	57,480.6	
1/100	0.01000	1,745,327.8	1,147,851.4	597,476.4	597,868.7	0.0	1,992.9	59,473.5	
1/150	0.00667	1,942,527.1	1,344,266.1	598,261.0					

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H20(整備計画事業着手時点)~H29(現時点)
河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	2,286.0	528.1	1,757.9	879.0	0.167	146.8	146.8	
1/5	0.200	14,335.8	8,669.3	5,666.5	3,712.2	0.300	1,113.7	1,260.5	
1/10	0.100	30,876.6	23,338.6	7,538.0	6,602.3	0.100	660.2	1,920.7	
1/20	0.050	54,843.4	48,067.1	6,776.3	7,157.2	0.050	357.9	2,278.6	
1/30	0.033	109,515.9	99,618.2	9,897.7	8,337.0	0.017	141.7	2,420.3	
1/50	0.020	158,120.6	148,870.3	9,250.3	9,574.0	0.013	124.5	2,544.8	
1/80	0.013	232,851.7	222,732.1	10,119.6	9,685.0	0.007	67.8	2,612.6	
1/100	0.010	295,533.9	280,704.5	14,829.4	12,474.5	0.003	37.4	2,650.0	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H29(現時点)~H34(当面整備完了時点)
河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	528.1	514.2	13.9	7.0	0.167	1.2	1.2	
1/5	0.200	8,669.3	5,830.9	2,838.4	1,426.2	0.300	427.9	429.1	
1/10	0.100	23,338.6	20,358.2	2,980.4	2,909.4	0.100	290.9	720.0	
1/20	0.050	48,067.1	38,303.7	9,763.4	6,371.9	0.050	318.6	1,038.6	
1/30	0.033	99,618.2	77,904.5	21,713.7	15,738.6	0.017	267.6	1,306.2	
1/50	0.020	148,870.3	133,637.9	15,232.4	18,473.1	0.013	240.2	1,546.4	
1/80	0.013	222,732.1	205,262.3	17,469.8	16,351.1	0.007	114.5	1,660.9	
1/100	0.010	280,704.5	259,872.7	20,831.8	19,150.8	0.003	57.5	1,718.4	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H34(当面整備完了時点)~H49(整備計画完了時点)
河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	514.2	422.0	92.2	46.1	0.167	7.7	7.7	
1/5	0.200	5,830.9	1,783.7	4,047.2	2,069.7	0.300	620.9	628.6	
1/10	0.100	20,358.2	3,650.0	16,708.2	10,377.7	0.100	1,037.8	1,666.4	
1/20	0.050	38,303.7	10,834.5	27,469.2	22,088.7	0.050	1,104.4	2,770.8	
1/30	0.033	77,904.5	19,507.6	58,396.9	42,933.1	0.017	729.9	3,500.7	
1/50	0.020	133,637.9	107,708.7	25,929.2	42,163.1	0.013	548.1	4,048.8	
1/80	0.013	205,262.3	172,209.6	33,052.7	29,491.0	0.007	206.4	4,255.2	
1/100	0.010	259,872.7	215,412.7	44,460.0	38,756.4	0.003	116.3	4,371.5	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H20(整備計画事業着手時点)~H29(現時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額)+10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	2,510.1	579.4	1,930.7	965.4	0.167	161.2	161.2	
1/5	0.200	15,724.0	9,507.2	6,216.8	4,073.8	0.300	1,222.1	1,383.3	
1/10	0.100	33,856.0	25,603.9	8,252.1	7,234.5	0.100	723.5	2,106.8	
1/20	0.050	60,139.4	52,717.3	7,422.1	7,837.1	0.050	391.9	2,498.7	
1/30	0.033	120,095.1	109,251.3	10,843.8	9,133.0	0.017	155.3	2,654.0	
1/50	0.020	173,423.7	163,287.0	10,136.7	10,490.3	0.013	136.4	2,790.4	
1/80	0.013	255,458.3	244,359.5	11,098.8	10,617.8	0.007	74.3	2,864.7	
1/100	0.010	324,227.5	307,964.8	16,262.7	13,680.8	0.003	41.0	2,905.7	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H29(現時点)~H34(当面整備完了時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額)+10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	579.4	564.3	15.1	7.6	0.167	1.3	1.3	
1/5	0.200	9,507.2	6,394.5	3,112.7	1,563.9	0.300	469.2	470.5	
1/10	0.100	25,603.9	22,335.3	3,268.6	3,190.7	0.100	319.1	789.6	
1/20	0.050	52,717.3	42,020.3	10,697.0	6,982.8	0.050	349.1	1,138.7	
1/30	0.033	109,251.3	85,448.3	23,803.0	17,250.0	0.017	293.3	1,432.0	
1/50	0.020	163,287.0	146,590.5	16,696.5	20,249.8	0.013	263.2	1,695.2	
1/80	0.013	244,359.5	225,202.6	19,156.9	17,926.7	0.007	125.5	1,820.7	
1/100	0.010	307,964.8	285,105.8	22,859.0	21,008.0	0.003	63.0	1,883.7	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H34(当面整備完了時点)~H49(整備計画完了時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額)+10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	564.3	463.1	101.2	50.6	0.167	8.5	8.5	
1/5	0.200	6,394.5	1,958.9	4,435.6	2,268.4	0.300	680.5	689.0	
1/10	0.100	22,335.3	4,008.6	18,326.7	11,381.2	0.100	1,138.1	1,827.1	
1/20	0.050	42,020.3	11,892.5	30,127.8	24,227.3	0.050	1,211.4	3,038.5	
1/30	0.033	85,448.3	21,416.4	64,031.9	47,079.9	0.017	800.4	3,838.9	
1/50	0.020	146,590.5	118,144.6	28,445.9	46,238.9	0.013	601.1	4,440.0	
1/80	0.013	225,202.6	188,938.4	36,264.2	32,355.1	0.007	226.5	4,666.5	
1/100	0.010	285,105.8	236,338.7	48,767.1	42,515.7	0.003	127.5	4,794.0	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H20(整備計画事業着手時点)~H29(現時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額) - 10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	2,061.8	476.6	1,585.2	792.6	0.167	132.4	132.4	
1/5	0.200	12,947.7	7,830.6	5,117.1	3,351.2	0.300	1,005.4	1,137.8	
1/10	0.100	27,897.9	21,073.2	6,824.7	5,970.9	0.100	597.1	1,734.9	
1/20	0.050	49,548.3	43,418.1	6,130.2	6,477.5	0.050	323.9	2,058.8	
1/30	0.033	98,936.0	89,984.1	8,951.9	7,541.1	0.017	128.2	2,187.0	
1/50	0.020	142,817.8	134,454.9	8,362.9	8,657.4	0.013	112.5	2,299.5	
1/80	0.013	210,246.3	201,104.1	9,142.2	8,752.6	0.007	61.3	2,360.8	
1/100	0.010	266,840.0	253,444.2	13,395.8	11,269.0	0.003	33.8	2,394.6	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H29(現時点)~H34(当面整備完了時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額) - 10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	476.6	464.2	12.4	6.2	0.167	1.0	1.0	
1/5	0.200	7,830.6	5,267.6	2,563.0	1,287.7	0.300	386.3	387.3	
1/10	0.100	21,073.2	18,381.4	2,691.8	2,627.4	0.100	262.7	650.0	
1/20	0.050	43,418.1	34,588.1	8,830.0	5,760.9	0.050	288.0	938.0	
1/30	0.033	89,984.1	70,360.1	19,624.0	14,227.0	0.017	241.9	1,179.9	
1/50	0.020	134,454.9	120,687.0	13,767.9	16,696.0	0.013	217.0	1,396.9	
1/80	0.013	201,104.1	185,321.1	15,783.0	14,775.5	0.007	103.4	1,500.3	
1/100	0.010	253,444.2	234,639.7	18,804.5	17,293.8	0.003	51.9	1,552.2	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名:淀川 対象河道:H34(当面整備完了時点)~H49(整備計画完了時点)
 河川名:木津川、柘植川、服部川、名張川、宇陀川、青蓮寺川 (一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額) - 10%

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	464.2	381.2	83.0	41.5	0.167	6.9	6.9	
1/5	0.200	5,267.6	1,608.4	3,659.2	1,871.1	0.300	561.3	568.2	
1/10	0.100	18,381.4	3,291.3	15,090.1	9,374.7	0.100	937.5	1,505.7	
1/20	0.050	34,588.1	9,776.7	24,811.4	19,950.8	0.050	997.5	2,503.2	
1/30	0.033	70,360.1	17,598.7	52,761.4	38,786.4	0.017	659.4	3,162.6	
1/50	0.020	120,687.0	97,273.9	23,413.1	38,087.3	0.013	495.1	3,657.7	
1/80	0.013	185,321.1	155,480.1	29,841.0	26,627.1	0.007	186.4	3,844.1	
1/100	0.010	234,639.7	194,486.8	40,152.9	34,997.0	0.003	105.0	3,949.1	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-現況河道 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	433.8	422.5	11.3	5.7	0.100	0.6	0.6	
1/20	0.05000	1,011.2	841.9	169.3	90.3	0.050	4.5	5.1	
1/30	0.03333	1,666.6	1,524.0	142.6	156.0	0.017	2.7	7.8	
1/50	0.02000	4,313.0	3,993.1	319.9	231.3	0.013	3.0	10.8	
1/80	0.01250	26,828.8	6,965.0	19,863.8	10,091.9	0.008	80.7	91.5	
1/100	0.01000	35,707.9	34,942.7	765.2	10,314.5	0.003	30.9	122.4	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道(完了年次31年) 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	433.8	422.0	11.8	5.9	0.100	0.6	0.6	
1/20	0.05000	1,011.2	835.4	175.8	93.8	0.050	4.7	5.3	
1/30	0.03333	1,666.6	1,517.3	149.3	162.6	0.017	2.8	8.1	
1/50	0.02000	4,313.0	3,992.8	320.2	234.8	0.013	3.1	11.2	
1/80	0.01250	26,828.8	6,951.7	19,877.1	10,098.7	0.008	80.8	92.0	
1/100	0.01000	35,707.9	34,872.9	835.0	10,356.1	0.003	31.1	123.1	

様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次35年） 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	433.8	278.0	155.8	77.9	0.100	7.8	7.8	
1/20	0.05000	1,011.2	600.7	410.5	283.2	0.050	14.2	22.0	
1/30	0.03333	1,666.6	1,118.2	548.4	479.5	0.017	8.2	30.2	
1/50	0.02000	4,313.0	2,333.3	1,979.7	1,264.1	0.013	16.4	46.6	
1/80	0.01250	26,828.8	4,872.6	21,956.2	11,968.0	0.008	95.7	142.3	
1/100	0.01000	35,707.9	6,391.3	29,316.6	25,636.4	0.003	76.9	219.2	

様式－４（全体事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策+洗堰改築（完了年次41年） 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	433.8	275.8	158.0	79.0	0.100	7.9	7.9	
1/20	0.05000	1,011.2	591.9	419.3	288.7	0.050	14.4	22.3	
1/30	0.03333	1,666.6	1,099.0	567.6	493.5	0.017	8.4	30.7	
1/50	0.02000	4,313.0	2,285.8	2,027.2	1,297.4	0.013	16.9	47.6	
1/80	0.01250	26,828.8	4,854.1	21,974.7	12,001.0	0.008	96.0	143.6	
1/100	0.01000	35,707.9	6,374.1	29,333.8	25,654.3	0.003	77.0	220.6	

様式－４（残事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次31年） 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	422.5	422.0	0.5	0.3	0.100	0.0	0.0	
1/20	0.05000	841.9	835.4	6.5	3.5	0.050	0.2	0.2	
1/30	0.03333	1,524.0	1,517.3	6.7	6.6	0.017	0.1	0.3	
1/50	0.02000	3,993.1	3,992.8	0.3	3.5	0.013	0.0	0.3	
1/80	0.01250	6,965.0	6,951.7	13.3	6.8	0.008	0.1	0.4	
1/100	0.01000	34,942.7	34,872.9	69.8	41.6	0.003	0.1	0.5	

様式－４（残事業） 年平均被害軽減期待額 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川 対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次35年） 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	422.5	278.0	144.5	72.3	0.100	7.2	7.2	
1/20	0.05000	841.9	600.7	241.2	192.9	0.050	9.6	16.8	
1/30	0.03333	1,524.0	1,118.2	405.8	323.5	0.017	5.5	22.3	
1/50	0.02000	3,993.1	2,333.3	1,659.8	1,032.8	0.013	13.4	35.7	
1/80	0.01250	6,965.0	4,872.6	2,092.4	1,876.1	0.008	15.0	50.7	
1/100	0.01000	34,942.7	6,391.3	28,551.4	15,321.9	0.003	46.0	96.7	

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	422.5	275.8	146.7	73.4	0.100	7.3	7.3	
1/20	0.05000	841.9	591.9	250.0	198.4	0.050	9.9	17.2	
1/30	0.03333	1,524.0	1,099.0	425.0	337.5	0.017	5.7	22.9	
1/50	0.02000	3,993.1	2,285.8	1,707.3	1,066.2	0.013	13.9	36.8	
1/80	0.01250	6,965.0	4,854.1	2,110.9	1,909.1	0.008	15.3	52.1	
1/100	0.01000	34,942.7	6,374.1	28,568.6	15,339.8	0.003	46.0	98.1	

様式-4 (全体事業)

年平均被害軽減期待額 (資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川

対象河道: 事業着手時河道-現況河道

単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	476.0	463.8	12.2	6.1	0.100	0.6	0.6	
1/20	0.05000	1,108.2	923.0	185.2	98.7	0.050	4.9	5.5	
1/30	0.03333	1,824.6	1,668.0	156.6	170.9	0.017	2.9	8.4	
1/50	0.02000	4,716.9	4,366.7	350.2	253.4	0.013	3.3	11.7	
1/80	0.01250	29,374.3	7,614.0	21,760.3	11,055.3	0.008	88.4	100.1	
1/100	0.01000	39,111.1	38,273.7	837.4	11,298.9	0.003	33.9	134.0	

様式-4 (全体事業)

年平均被害軽減期待額 (資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川

対象河道: 事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道(完了年次31年)

単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	476.0	463.3	12.7	6.4	0.100	0.6	0.6	
1/20	0.05000	1,108.2	916.0	192.2	102.5	0.050	5.1	5.7	
1/30	0.03333	1,824.6	1,660.7	163.9	178.1	0.017	3.0	8.7	
1/50	0.02000	4,716.9	4,366.4	350.5	257.2	0.013	3.3	12.0	
1/80	0.01250	29,374.3	7,599.3	21,775.0	11,062.8	0.008	88.5	100.5	
1/100	0.01000	39,111.1	38,197.7	913.4	11,344.2	0.003	34.0	134.5	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 (資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道 (完了年次35年) 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	476.0	305.0	171.0	85.5	0.100	8.6	8.6	
1/20	0.05000	1,108.2	659.4	448.8	309.9	0.050	15.5	24.1	
1/30	0.03333	1,824.6	1,225.1	599.5	524.2	0.017	8.9	33.0	
1/50	0.02000	4,716.9	2,553.6	2,163.3	1,381.4	0.013	18.0	51.0	
1/80	0.01250	29,374.3	5,327.5	24,046.8	13,105.1	0.008	104.8	155.8	
1/100	0.01000	39,111.1	6,985.2	32,125.9	28,086.4	0.003	84.3	240.1	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 (資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策+洗堰改築 (完了年次41年) 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	476.0	302.5	173.5	86.8	0.100	8.7	8.7	
1/20	0.05000	1,108.2	649.8	458.4	316.0	0.050	15.8	24.5	
1/30	0.03333	1,824.6	1,204.3	620.3	539.4	0.017	9.2	33.7	
1/50	0.02000	4,716.9	2,502.2	2,214.7	1,417.5	0.013	18.4	52.1	
1/80	0.01250	29,374.3	5,307.1	24,067.2	13,141.0	0.008	105.1	157.2	
1/100	0.01000	39,111.1	6,966.2	32,144.9	28,106.1	0.003	84.3	241.5	

様式－４（残事業）

年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川

対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次31年）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	463.8	463.3	0.5	0.3	0.100	0.0	0.0	
1/20	0.05000	923.0	916.0	7.0	3.8	0.050	0.2	0.2	
1/30	0.03333	1,668.0	1,660.7	7.3	7.2	0.017	0.1	0.3	
1/50	0.02000	4,366.7	4,366.4	0.3	3.8	0.013	0.0	0.3	
1/80	0.01250	7,614.0	7,599.3	14.7	7.5	0.008	0.1	0.4	
1/100	0.01000	38,273.7	38,197.7	76.0	45.4	0.003	0.1	0.5	

様式－４（残事業）

年平均被害軽減期待額（資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：瀬田川

対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次35年）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	463.8	305.0	158.8	79.4	0.100	7.9	7.9	
1/20	0.05000	923.0	659.4	263.6	211.2	0.050	10.6	18.5	
1/30	0.03333	1,668.0	1,225.1	442.9	353.3	0.017	6.0	24.5	
1/50	0.02000	4,366.7	2,553.6	1,813.1	1,128.0	0.013	14.7	39.2	
1/80	0.01250	7,614.0	5,327.5	2,286.5	2,049.8	0.008	16.4	55.6	
1/100	0.01000	38,273.7	6,985.2	31,288.5	16,787.5	0.003	50.4	106.0	

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	463.8	302.5	161.3	80.7	0.100	8.1	8.1	
1/20	0.05000	923.0	649.8	273.2	217.3	0.050	10.9	19.0	
1/30	0.03333	1,668.0	1,204.3	463.7	368.5	0.017	6.3	25.3	
1/50	0.02000	4,366.7	2,502.2	1,864.5	1,164.1	0.013	15.1	40.4	
1/80	0.01250	7,614.0	5,307.1	2,306.9	2,085.7	0.008	16.7	57.1	
1/100	0.01000	38,273.7	6,966.2	31,307.5	16,807.2	0.003	50.4	107.5	

様式-4 (全体事業)

年平均被害軽減期待額 (資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川

対象河道: 事業着手時河道-現況河道

単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	391.8	381.4	10.4	5.2	0.100	0.5	0.5	
1/20	0.05000	914.8	761.0	153.8	82.1	0.050	4.1	4.6	
1/30	0.03333	1,509.0	1,380.3	128.7	141.3	0.017	2.4	7.0	
1/50	0.02000	3,910.1	3,620.4	289.7	209.2	0.013	2.7	9.7	
1/80	0.01250	24,284.8	6,317.1	17,967.7	9,128.7	0.008	73.0	82.7	
1/100	0.01000	32,306.8	31,613.3	693.5	9,330.6	0.003	28.0	110.7	

様式-4 (全体事業)

年平均被害軽減期待額 (資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川

対象河道: 事業着手時河道-洗堰下流区間掘削河道(完了年次31年)

単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	391.8	380.9	10.9	5.5	0.100	0.6	0.6	
1/20	0.05000	914.8	755.0	159.8	85.4	0.050	4.3	4.9	
1/30	0.03333	1,509.0	1,374.2	134.8	147.3	0.017	2.5	7.4	
1/50	0.02000	3,910.1	3,620.1	290.0	212.4	0.013	2.8	10.2	
1/80	0.01250	24,284.8	6,305.2	17,979.6	9,134.8	0.008	73.1	83.3	
1/100	0.01000	32,306.8	31,549.8	757.0	9,368.3	0.003	28.1	111.4	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 (資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策河道 (完了年次35年) 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	391.8	251.2	140.6	70.3	0.100	7.0	7.0	
1/20	0.05000	914.8	542.3	372.5	256.6	0.050	12.8	19.8	
1/30	0.03333	1,509.0	1,011.6	497.4	435.0	0.017	7.4	27.2	
1/50	0.02000	3,910.1	2,113.7	1,796.4	1,146.9	0.013	14.9	42.1	
1/80	0.01250	24,284.8	4,418.7	19,866.1	10,831.3	0.008	86.7	128.8	
1/100	0.01000	32,306.8	5,798.5	26,508.3	23,187.2	0.003	69.6	198.4	

様式-4 (全体事業) 年平均被害軽減期待額 (資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 瀬田川 対象河道: 事業着手時河道-下流掘削+鹿跳対策+洗堰改築 (完了年次41年) 単位: 百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	391.8	249.2	142.6	71.3	0.100	7.1	7.1	
1/20	0.05000	914.8	534.5	380.3	261.5	0.050	13.1	20.2	
1/30	0.03333	1,509.0	993.9	515.1	447.7	0.017	7.6	27.8	
1/50	0.02000	3,910.1	2,070.4	1,839.7	1,177.4	0.013	15.3	43.1	
1/80	0.01250	24,284.8	4,401.9	19,882.9	10,861.3	0.008	86.9	130.0	
1/100	0.01000	32,306.8	5,783.0	26,523.8	23,203.4	0.003	69.6	199.6	

様式－4（残事業）

年平均被害軽減期待額（資産－10%）水系名：淀川水系

河川名：瀬田川

対象河道：現況河道-洗堰下流区間掘削河道（完了年次31年）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	381.4	380.9	0.5	0.3	0.100	0.0	0.0	
1/20	0.05000	761.0	755.0	6.0	3.3	0.050	0.2	0.2	
1/30	0.03333	1,380.3	1,374.2	6.1	6.1	0.017	0.1	0.3	
1/50	0.02000	3,620.4	3,620.1	0.3	3.2	0.013	0.0	0.3	
1/80	0.01250	6,317.1	6,305.2	11.9	6.1	0.008	0.0	0.3	
1/100	0.01000	31,613.3	31,549.8	63.5	37.7	0.003	0.1	0.4	

様式－4（残事業）

年平均被害軽減期待額（資産－10%）水系名：淀川水系 河川名：瀬田川

対象河道：現況河道-下流掘削+鹿跳対策河道（完了年次35年）

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	381.4	251.2	130.2	65.1	0.100	6.5	6.5	
1/20	0.05000	761.0	542.3	218.7	174.5	0.050	8.7	15.2	
1/30	0.03333	1,380.3	1,011.6	368.7	293.7	0.017	5.0	20.2	
1/50	0.02000	3,620.4	2,113.7	1,506.7	937.7	0.013	12.2	32.4	
1/80	0.01250	6,317.1	4,418.7	1,898.4	1,702.6	0.008	13.6	46.0	
1/100	0.01000	31,613.3	5,798.5	25,814.8	13,856.6	0.003	41.6	87.6	

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	381.4	249.2	132.2	66.1	0.100	6.6	6.6	
1/20	0.05000	761.0	534.5	226.5	179.4	0.050	9.0	15.6	
1/30	0.03333	1,380.3	993.9	386.4	306.5	0.017	5.2	20.8	
1/50	0.02000	3,620.4	2,070.4	1,550.0	968.2	0.013	12.6	33.4	
1/80	0.01250	6,317.1	4,401.9	1,915.2	1,732.6	0.008	13.9	47.3	
1/100	0.01000	31,613.3	5,783.0	25,830.3	13,872.8	0.003	41.6	88.9	

様式 - 5

様式 - 6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川水系直轄河川改修事業(淀川水系5河川) (全体事業費)
------------	-------------------------------

評価年度	H29	再評価
-------------	-----	------------

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	本工事費		式	1	204,208		
			式	1	158,606		
		築堤	m	10,843	10,989		
		護岸	m	2,676	7,043		
		河道掘削	千m ³	355,574	44,040		
		堰	箇所	3	2,562		
		樋門・樋管	箇所	14	7,819		
		堤防強化	m	69,000	28,530		
		緊急河川敷道路	m	5,600	3,045		
		高規格堤防	m	1,094	5,533		
		旧堤撤去	千m ³	2,868	3,453		
		越流堤	箇所	4	1,702		
		排水門	箇所	3	2,626		
		耐震対策	式	1	25,781		
		情報通信設備	式	1	132		
		危機管理型ハード対策	式	1	1,836		
		その他	式	1	13,514		
			附帯工事費		式	1	45,602
		橋梁	箇所	8	44,674		
		堰	箇所	1	759		
	付替道路	m	0	0			
	その他	式	1	169			
用地費及補償費			式	1	12,951		
	用地費		式	1	9,531		
	補償費		式	1	3,420		
間接経費			式	1	52,106		
工事諸費			式	1	42,652		
事業費 計			式	1	311,917		
維持管理費			式	1	181,310	30年間(H20~H49)	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川水系直轄河川改修事業(淀川)	(残事業費)
-----	------------------	--------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考		
工事費	本工事費		式	1	139,502			
			式	1	98,392			
		築堤	m	7,180	2,561			
		護岸	m	1,008	2,831			
		河道掘削	千m ³	4,252	35,144			
		堰	箇所	2	2,030			
		樋門・樋管	箇所	10	4,358			
		堤防強化	m	47,770	9,653			
		緊急河川敷道路	m	3,220	2,420			
		高規格堤防	m	174	652			
		旧堤撤去	千m ³	468	2,511			
		越流堤	箇所	0	0			
		排水門	箇所	0	0			
		耐震対策	式	1	21,270			
		情報通信設備	式	0	0			
		危機管理ハード対策	式	1	1,589			
		その他	式	1	13,373			
			附帯工事費		式	1	41,110	
			橋梁	箇所	2	40,232		
		堰	箇所	2	759			
	付替道路	m	180	100				
	その他	式	1	19				
用地費及補償費			式	1	5,083			
	用地費		式	1	2,442			
	補償費		式	1	2,641			
間接経費			式	1	34,020			
工事諸費			式	1	30,727			
事業費 計			式	1	209,332			

維持管理費	式	1	140,765	20年間(H30~H49)
-------	---	---	---------	---------------


淀川水系直轄河川改修事業

木津川上流直轄河川改修事業(上野遊水地)

様式 - 1

様式ー1 ブロック分割図（木津川）

【上野地区】

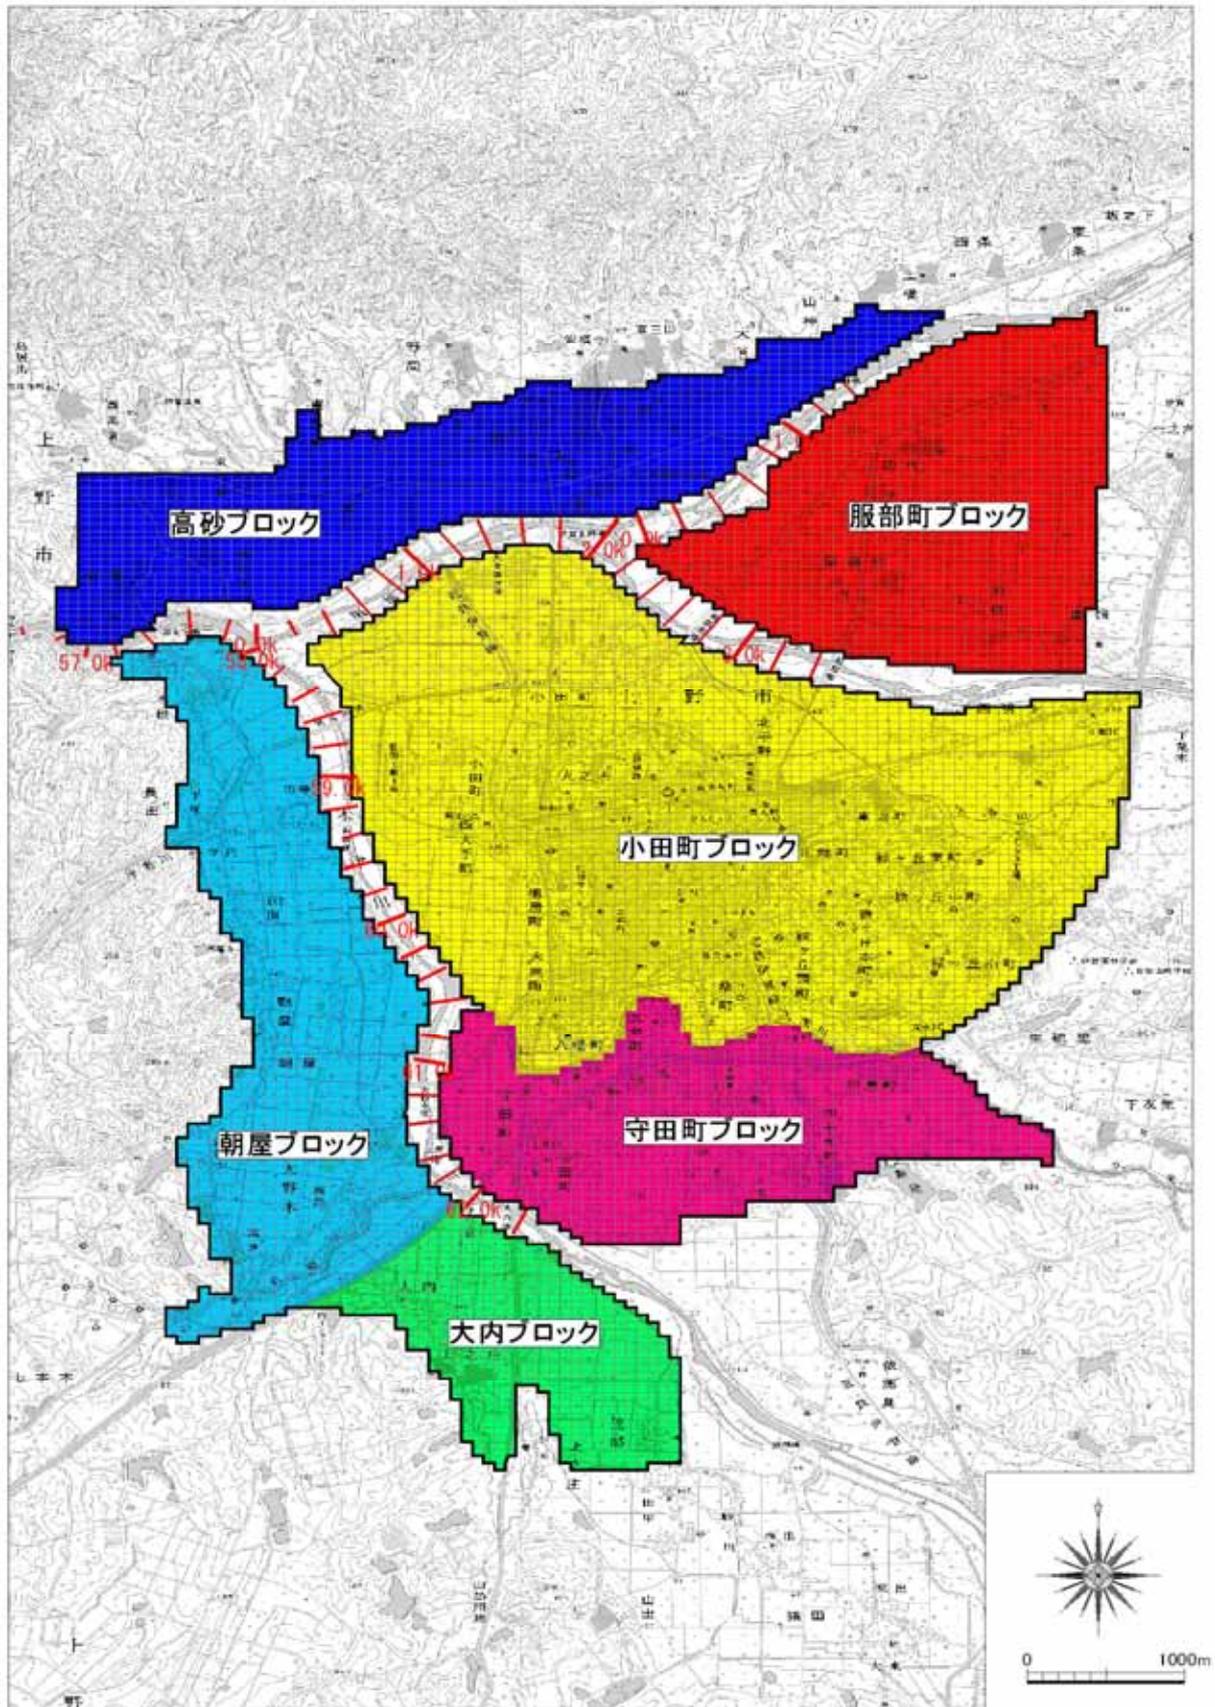

様式 - 2

様式-2

資産データ

水系名:淀川水系

河川名:木津川・拓植川・服部川

国勢調査年:平成22年

事業所統計調査年:平成26年

ブロック名	ブロック面積 (km ²)	一般資産等基礎数量										一般資産額								備考					
		人口 (人)	一般世帯数 (世帯)	1~2階世帯 (世帯)	3~5階世帯 (世帯)	6~10階世帯 (世帯)	11~14階世帯 (世帯)	15階以上世帯 (世帯)	事業所従業員 (人)	農漁家 (世帯)	延床面積 (m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産			小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	一般資産額等合計 (百万円)
																償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)						
高砂ブロック	2.804	2,964	1,145	1,081	26	38	0	0	1,523	27	306,253	1.1034	0.0554	57,326	14,891	5,905	4,857	42	13	83,032	91	16	107	83,139	
朝屋ブロック	3.275	1,784	530	525	5	0	0	0	712	46	141,641	2.2455	0.0422	26,522	6,895	2,002	1,427	73	23	36,942	185	12	198	37,140	
大内ブロック	1.743	569	212	174	33	5	0	0	259	22	64,105	1.1807	0.0974	11,989	2,758	1,226	821	34	11	16,839	97	28	125	16,965	
小田町ブロック	8.168	25,184	10,639	9,157	1,298	183	0	0	17,766	137	3,209,799	1.0534	0.1030	600,128	138,365	53,170	27,589	217	69	819,538	87	30	116	819,654	
守田町ブロック	3.014	3,110	1,274	1,017	219	37	0	0	2,346	30	234,561	0.9626	0.0211	43,918	16,570	13,937	2,087	48	15	76,575	79	6	86	76,661	
服部町ブロック	3.639	1,384	499	444	55	0	0	0	987	24	147,895	2.6626	0.1158	27,678	6,486	2,545	1,175	38	12	37,934	220	33	253	38,187	
小田遊水池	0.624	42	18	15	2	0	0	0	45	0	66,049	0.4065	0.0528	12,361	230	167	142	0	0	12,901	34	15	49	12,950	
木興遊水池	0.706	69	33	16	17	0	0	0	6	1	38,693	0.5702	0.0290	7,263	432	18	12	1	0	7,727	47	8	55	7,782	
長田遊水池	0.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,919	0.4962	0.0581	1,484	0	0	0	0	0	1,484	41	17	58	1,542	
新居遊水池	0.602	4	2	2	0	0	0	0	4	0	44,980	0.5796	0.0079	8,430	23	15	13	0	0	8,482	48	2	50	8,532	
合計	22.643	34,995	14,299	12,398	1,636	263	0	0	23,593	286	4,104,254	9.2081	0.4349	767,561	185,965	78,785	37,956	452	143	1,070,860	759	125	885	1,071,746	

様式 - 3

様式-3 被害額 (事業着手時 (S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	292.4	3.0	14.1	6.7	0.0	0.0	316.2	4.7	2.3	7.0	535.6	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	866.3	
朝屋ブロック	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.5	0.0	0.5	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	12.1	1.4	6.4	3.1	0.0	0.0	23.0	0.1	0.0	0.1	39.0	3.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	4.3	66.4	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	35.6	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	57.3	1.5	0.0	1.5	96.8	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	161.6	
合計	352.2	15.7	28.7	11.8	0.1	0.1	408.6	6.8	2.3	9.1	691.9	12.7	1.1	1.7	2.8	2.3	0.0	17.8	1,127.4	

様式-3 被害額 (事業着手時 (S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	822.4	46.3	199.6	99.3	0.0	0.0	1,167.6	6.7	2.9	9.6	1,977.9	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	3,261.2	
朝屋ブロック	414.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	414.9	4.3	0.0	4.3	702.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,122.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	2,762.5	1,106.2	742.5	362.4	1.8	0.8	4,976.2	5.9	4.3	10.2	8,429.5	233.1	54.1	72.2	126.3	57.2	0.0	416.6	13,832.5	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	55.5	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	81.0	2.1	0.0	2.1	137.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	229.3	
合計	4,055.3	1,164.8	952.6	464.2	1.9	0.9	6,639.7	19.0	7.2	26.2	11,247.3	322.0	59.7	81.4	141.1	68.7	0.0	531.8	18,445.0	

様式-3 被害額 (事業着手時 (S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,287.7	102.4	343.9	171.5	0.1	0.0	1,905.6	8.1	3.1	11.2	3,228.1	143.6	8.9	14.9	23.8	16.6	0.0	184.0	5,328.9	
朝屋ブロック	733.7	9.9	8.5	2.8	0.1	0.0	755.0	5.4	0.4	5.8	1,279.2	4.3	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	7.9	2,047.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	6,519.5	2,762.0	2,253.0	1,223.7	3.6	1.7	12,763.5	8.4	4.6	13.0	21,621.4	625.5	131.3	140.8	272.1	150.7	0.0	1,048.3	35,446.2	
守田町ブロック	726.7	28.1	25.7	8.3	0.4	0.2	789.4	7.4	0.0	7.4	1,337.2	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,147.5	
服部町ブロック	78.2	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	103.7	2.6	0.0	2.6	175.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	291.1	
合計	9,345.8	2,914.7	2,641.6	1,408.8	4.3	2.0	16,317.2	31.9	8.1	40.0	27,641.6	783.7	143.3	160.5	303.8	175.3	0.0	1,262.8	45,261.6	

様式-3 被害額 (事業着手時 (S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,789.2	182.6	423.7	214.2	0.1	0.1	2,609.9	9.2	3.1	12.3	4,421.1	164.5	12.0	18.6	30.6	21.5	0.0	216.6	7,259.9	
朝屋ブロック	1,425.1	73.0	33.0	11.4	0.6	0.3	1,543.4	10.2	0.8	11.0	2,614.4	13.6	4.0	6.6	10.6	6.6	0.0	30.8	4,199.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	12,585.9	5,083.8	4,821.9	2,854.7	6.2	2.6	25,355.1	9.4	4.6	14.0	42,951.5	1,330.3	242.2	230.8	473.0	300.0	0.0	2,103.3	70,423.9	
守田町ブロック	1,168.5	76.2	39.9	13.2	0.6	0.3	1,298.7	8.8	0.0	8.8	2,199.9	7.3	3.9	5.8	9.7	6.8	0.0	23.8	3,531.2	
服部町ブロック	134.0	22.4	20.7	5.6	0.1	0.1	182.9	3.7	0.0	3.7	310.1	9.9	1.5	1.9	3.4	4.6	0.0	17.9	514.6	
合計	17,102.7	5,438.0	5,339.2	3,099.1	7.6	3.4	30,990.0	41.3	8.5	49.8	52,497.0	1,525.6	263.6	263.7	527.3	339.5	0.0	2,392.4	85,929.2	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,061.8	228.7	479.1	248.2	0.2	0.1	3,018.1	10.1	3.1	13.2	5,112.6	174.6	14.1	20.6	34.7	25.0	0.0	234.3	8,378.2	
朝屋ブロック	1,185.2	115.0	57.4	21.6	1.0	0.5	1,380.7	8.0	0.8	8.8	2,338.9	18.9	5.2	7.3	12.5	11.3	0.0	42.7	3,771.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	17,098.1	7,171.5	6,544.8	4,007.1	8.7	3.5	34,833.7	9.5	4.6	14.1	59,008.2	1,780.6	329.4	283.9	613.3	428.8	0.0	2,822.7	96,678.7	
守田町ブロック	1,498.0	126.1	55.7	20.5	0.7	0.4	1,701.4	9.5	0.0	9.5	2,882.2	10.2	6.9	8.9	15.8	10.7	0.0	36.7	4,629.8	
服部町ブロック	180.4	29.3	27.3	7.2	0.2	0.1	244.5	4.2	0.0	4.2	414.2	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	685.5	
合計	22,023.5	7,670.6	7,164.3	4,304.6	10.8	4.6	41,178.4	41.3	8.5	49.8	69,756.1	1,997.0	357.4	323.2	680.6	481.4	0.0	3,159.0	114,143.3	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,474.3	316.6	566.0	300.2	0.2	0.1	3,657.4	10.9	3.1	14.0	6,195.6	193.8	18.0	23.8	41.8	31.3	0.0	266.9	10,133.9	
朝屋ブロック	1,411.8	204.4	90.1	35.3	1.5	0.8	1,743.9	11.7	0.8	12.5	2,954.1	27.8	8.8	10.8	19.6	18.5	0.0	65.9	4,776.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	22,306.8	9,041.0	8,623.7	5,617.3	10.3	4.1	45,603.2	9.7	4.6	14.3	77,252.0	2,401.5	422.6	340.5	763.1	574.6	0.0	3,739.2	126,608.7	
守田町ブロック	1,798.7	163.8	60.2	21.5	0.8	0.4	2,045.4	9.8	0.0	9.8	3,465.0	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,563.6	
服部町ブロック	260.8	43.0	37.3	10.1	0.4	0.2	351.8	5.4	0.0	5.4	595.8	16.2	2.5	3.2	5.7	7.8	0.0	29.7	982.7	
合計	28,252.4	9,768.8	9,377.3	5,984.4	13.2	5.6	53,401.7	47.5	8.5	56.0	90,462.5	2,650.9	460.5	389.8	850.3	643.9	0.0	4,145.1	148,065.3	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,937.9	413.3	704.4	374.8	0.3	0.1	4,430.8	11.4	3.1	14.5	7,505.9	223.0	22.1	28.2	50.3	38.5	0.0	311.8	12,263.0	
朝屋ブロック	2,216.4	448.6	140.2	61.5	3.0	1.5	2,871.2	14.4	0.8	15.2	4,863.7	43.3	20.0	20.6	40.6	34.8	0.0	118.7	7,868.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	26,289.9	10,324.2	9,559.5	6,322.3	11.6	4.6	52,512.1	9.8	4.6	14.4	88,955.4	2,792.5	489.6	375.5	865.1	688.5	0.0	4,346.1	145,828.0	
守田町ブロック	2,246.2	243.6	70.9	26.1	1.1	0.5	2,588.4	10.4	0.0	10.4	4,384.8	14.1	14.0	15.1	29.1	15.7	0.0	58.9	7,042.5	
服部町ブロック	329.6	58.1	50.5	13.3	0.4	0.2	452.1	6.3	0.0	6.3	766.0	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,261.5	
合計	34,020.0	11,487.8	10,525.5	6,798.0	16.4	6.9	62,854.6	52.3	8.5	60.8	106,475.8	3,093.2	548.8	443.4	992.2	787.2	0.0	4,872.6	174,263.8	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,176.4	499.2	795.6	424.2	0.4	0.2	4,896.0	12.0	3.1	15.1	8,293.6	240.5	25.4	31.2	56.6	44.9	0.0	342.0	13,546.7	
朝屋ブロック	2,380.7	514.1	154.5	68.6	3.4	1.7	3,123.0	15.2	0.8	16.0	5,290.3	48.2	22.6	22.2	44.8	39.5	0.0	132.5	8,561.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	28,270.5	11,059.0	10,072.4	6,682.8	12.2	4.8	56,101.7	9.8	4.6	14.4	95,036.3	3,021.0	525.8	395.4	921.2	755.2	0.0	4,697.4	155,849.8	
守田町ブロック	2,555.0	306.6	83.3	34.3	1.6	0.7	2,981.5	10.6	0.0	10.6	5,050.6	19.1	16.4	16.9	33.3	21.3	0.0	73.7	8,116.4	
服部町ブロック	388.9	69.7	57.4	15.1	0.5	0.3	531.9	6.7	0.0	6.7	901.0	22.0	3.4	4.4	7.8	10.9	0.0	40.7	1,480.3	
合計	36,771.5	12,448.6	11,163.2	7,225.0	18.1	7.7	67,634.1	54.3	8.5	62.8	114,571.8	3,350.8	593.6	470.1	1,063.7	871.8	0.0	5,286.3	187,555.0	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	73.2	1.2	10.5	5.1	0.0	0.0	90.0	2.3	1.4	3.7	152.5	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	252.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	45.7	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	67.4	1.6	0.0	1.6	113.9	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	188.9	
合計	19.0	118.9	12.5	18.7	7.1	0.1	0.1	157.4	3.9	1.4	5.3	266.4	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	441.7	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	17.0	285.4	6.0	28.1	13.4	0.0	0.0	332.9	4.9	2.1	7.0	564.0	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	919.1	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	56.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	81.8	2.1	0.0	2.1	138.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	231.6	
合計	37.0	341.7	18.3	38.6	15.9	0.1	0.1	414.7	7.0	2.1	9.1	702.6	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,150.7	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	251.0	1,443.2	114.6	317.8	158.7	0.1	0.0	2,034.4	8.4	3.1	11.5	3,446.4	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,660.1	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8.0	18.1	1.0	2.5	0.2	0.0	0.0	21.8	0.2	0.0	0.2	37.0	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	60.7	
守田町ブロック	43.0	794.8	28.1	25.7	8.3	0.4	0.2	857.5	7.5	0.0	7.5	1,452.6	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,331.1	
服部町ブロック	20.0	78.2	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	103.7	2.6	0.0	2.6	175.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	291.1	
合計	322.0	2,334.3	156.0	356.5	169.7	0.6	0.3	3,017.4	18.7	3.1	21.8	5,111.7	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	8,343.0	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	317.0	2,427.5	278.4	478.3	249.5	0.2	0.1	3,434.0	10.3	3.1	13.4	5,817.2	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	9,507.8	
朝屋ブロック	2.0	26.8	5.9	5.9	3.9	0.0	0.0	42.5	0.5	0.0	0.5	72.1	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	117.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	494.0	985.2	344.6	996.0	524.2	0.2	0.1	2,850.3	1.8	0.0	1.8	4,828.3	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	8,076.6	
守田町ブロック	77.0	1,186.6	79.7	42.8	14.6	0.6	0.3	1,324.6	8.8	0.0	8.8	2,243.8	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,603.4	
服部町ブロック	25.0	123.2	17.1	14.4	3.5	0.1	0.1	158.4	3.5	0.0	3.5	268.2	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	441.9	
合計	915.0	4,749.3	725.7	1,537.4	795.7	1.1	0.6	7,809.8	24.9	3.1	28.0	13,229.6	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	21,747.5	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	305.0	2,238.9	245.2	433.1	227.9	0.2	0.1	3,145.4	10.2	3.1	13.3	5,328.1	165.1	15.4	20.7	36.1	25.6	0.0	226.8	8,713.6	
朝屋ブロック	61.0	1,053.3	52.0	10.8	5.9	0.3	0.1	1,122.4	5.8	0.0	5.8	1,901.3	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	3,040.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	1,463.0	5,850.8	2,704.9	5,422.5	3,389.7	1.7	0.7	17,370.3	6.2	2.4	8.6	29,425.4	1,379.9	131.9	141.8	273.7	182.8	0.0	1,836.4	48,640.7	
守田町ブロック	97.0	1,503.0	127.6	56.8	20.8	0.8	0.4	1,709.4	9.6	0.0	9.6	2,895.6	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,651.6	
服部町ブロック	43.0	196.1	29.3	27.3	7.2	0.2	0.1	260.2	4.5	0.0	4.5	440.7	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	728.0	
合計	1,969.0	10,842.1	3,159.0	5,950.5	3,651.5	3.2	1.4	23,607.7	36.3	5.5	41.8	39,991.1	1,570.8	158.3	177.2	335.5	227.4	0.0	2,133.7	65,774.3	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	350.0	3,213.3	476.6	727.6	387.5	0.4	0.2	4,805.6	11.7	3.1	14.8	8,140.7	231.3	24.7	30.2	54.9	42.7	0.0	328.9	13,290.0	
朝屋ブロック	120.0	1,531.8	106.5	16.8	8.8	0.7	0.3	1,664.9	8.6	0.0	8.6	2,820.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,515.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	2,547.0	10,946.0	5,023.1	7,545.0	4,887.4	4.4	2.0	28,407.9	8.8	4.5	13.3	48,123.0	1,990.3	245.1	247.0	492.1	345.8	0.0	2,828.2	79,372.4	
守田町ブロック	133.0	2,273.9	244.5	73.4	26.3	1.1	0.5	2,619.7	10.4	0.0	10.4	4,437.8	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	7,128.4	
服部町ブロック	56.0	358.1	65.4	54.8	14.4	0.5	0.2	493.4	6.6	0.0	6.6	835.8	21.4	3.3	4.2	7.5	10.4	0.0	39.3	1,375.1	
合計	3,206.0	18,323.1	5,916.1	8,417.6	5,324.4	7.1	3.2	37,991.5	46.1	7.6	53.7	64,357.7	2,262.9	292.4	303.5	595.9	419.6	0.0	3,278.4	105,681.3	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	403.0	5,467.6	917.9	1,320.9	755.5	0.8	0.3	8,463.0	12.6	3.1	15.7	14,336.5	347.6	42.7	44.1	86.8	87.1	0.0	521.5	23,336.7	
朝屋ブロック	173.0	1,998.9	306.2	50.0	25.5	1.7	0.8	2,383.1	13.1	0.0	13.1	4,037.0	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	6,487.0	
大内ブロック	18.0	147.6	8.5	9.2	2.7	0.1	0.1	168.2	8.1	0.9	9.0	284.8	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	466.9	
小田町ブロック	2,802.0	17,567.8	7,394.7	8,533.5	5,554.9	7.6	3.3	39,061.8	9.6	4.6	14.2	66,170.8	2,294.6	355.3	313.2	668.5	498.2	0.0	3,461.3	108,708.1	
守田町ブロック	153.0	2,869.1	360.2	100.1	37.6	1.7	0.7	3,369.4	10.9	0.0	10.9	5,707.7	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	9,173.9	
服部町ブロック	61.0	522.5	106.7	83.5	23.9	0.7	0.3	737.6	7.6	0.0	7.6	1,249.5	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	2,052.4	
合計	3,610.0	28,573.5	9,094.2	10,097.2	6,400.1	12.6	5.5	54,183.1	61.9	8.6	70.5	91,786.3	2,709.2	436.9	397.0	833.9	642.0	0.0	4,185.1	150,225.0	

様式-3 被害額

(現況河道(H29))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	415.0	5,739.9	1,020.2	1,449.8	835.8	0.9	0.3	9,046.9	12.8	3.1	15.9	15,325.4	371.8	46.8	47.1	93.9	96.0	0.0	561.7	24,949.9	
朝屋ブロック	201.0	2,267.1	403.7	62.2	34.8	2.2	1.0	2,771.0	14.2	0.5	14.7	4,694.1	16.9	17.5	16.3	33.8	19.6	0.0	70.3	7,550.1	
大内ブロック	21.0	183.2	14.5	13.3	3.9	0.2	0.1	215.2	9.2	0.9	10.1	364.6	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	596.5	
小田町ブロック	2,928.0	21,894.9	9,026.7	9,015.6	5,980.4	10.1	4.1	45,931.8	9.8	4.6	14.4	77,808.5	2,521.9	424.2	347.2	771.4	588.5	0.0	3,881.8	127,636.5	
守田町ブロック	164.0	3,312.6	506.2	123.6	45.3	2.1	0.9	3,990.7	11.3	0.0	11.3	6,760.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	10,872.2	
服部町ブロック	71.0	609.3	130.8	98.7	29.8	0.8	0.4	869.8	8.3	0.0	8.3	1,473.5	37.2	6.4	6.4	12.8	21.9	0.0	71.9	2,423.5	
合計	3,800.0	34,007.0	11,102.1	10,763.2	6,930.0	16.3	6.8	62,825.4	65.6	9.1	74.7	106,426.2	2,978.5	523.2	441.7	964.9	759.0	0.0	4,702.4	174,028.7	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	71.7	1.2	10.5	5.1	0.0	0.0	88.5	2.6	1.4	4.0	150.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	249.1	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	39.8	11.3	8.2	2.0	0.1	0.1	61.5	1.5	0.0	1.5	103.9	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	172.9	
合計	111.5	12.5	18.7	7.1	0.1	0.1	150.0	4.1	1.4	5.5	253.9	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	422.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	270.2	8.6	34.0	16.6	0.0	0.0	329.4	4.8	1.9	6.7	558.0	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	910.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	49.7	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	75.2	1.8	0.0	1.8	127.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	213.5	
合計	319.9	20.9	44.5	19.1	0.1	0.1	404.6	6.6	1.9	8.5	685.4	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,123.9	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	450.6	10.1	42.5	20.7	0.0	0.0	523.9	5.8	2.4	8.2	887.4	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,441.6	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	64.6	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	90.1	2.2	0.0	2.2	152.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	254.0	
合計	515.2	22.4	53.0	23.2	0.1	0.1	614.0	8.0	2.4	10.4	1,040.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,695.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	719.9	15.8	52.4	25.1	0.0	0.0	813.2	6.6	2.4	9.0	1,377.7	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,228.7	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	87.3	12.3	10.5	2.5	0.1	0.1	112.8	2.8	0.0	2.8	191.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	315.8	
合計	807.2	28.1	62.9	27.6	0.1	0.1	926.0	9.4	2.4	11.8	1,568.8	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,544.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	842.3	31.1	73.7	38.4	0.0	0.0	985.5	6.9	2.4	9.3	1,669.5	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,700.2	
朝屋ブロック	1,016.2	24.9	6.0	2.8	0.2	0.1	1,050.2	4.9	0.0	4.9	1,779.0	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	2,840.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	141.6	21.9	19.6	5.3	0.1	0.1	188.6	3.8	0.0	3.8	319.6	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	528.3	
合計	2,000.1	77.9	99.3	46.5	0.3	0.2	2,224.3	15.6	2.4	18.0	3,768.1	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	6,069.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,458.3	284.3	431.5	232.6	0.2	0.1	3,407.0	10.3	3.1	13.4	5,771.5	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	9,414.6	
朝屋ブロック	1,312.6	80.0	13.8	7.7	0.4	0.2	1,414.7	7.8	0.0	7.8	2,396.5	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	3,834.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8,387.4	3,765.0	6,849.8	4,470.9	2.6	1.2	23,476.9	7.5	3.6	11.1	39,770.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	65,679.6	
守田町ブロック	1,798.7	163.8	60.2	21.5	0.8	0.4	2,045.4	9.8	0.0	9.8	3,465.0	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,563.6	
服部町ブロック	301.3	58.1	50.5	13.3	0.4	0.2	423.8	6.0	0.0	6.0	718.2	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,185.1	
合計	14,258.3	4,351.2	7,405.8	4,746.0	4.4	2.1	30,767.8	41.4	6.7	48.1	52,121.2	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	85,677.5	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,878.3	655.9	902.9	490.3	0.6	0.2	5,928.2	12.1	3.1	15.2	10,042.4	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	16,380.1	
朝屋ブロック	1,820.6	244.0	34.8	17.2	1.4	0.7	2,118.7	11.5	0.0	11.5	3,588.9	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	5,761.7	
大内ブロック	117.2	4.1	5.0	1.4	0.1	0.0	127.8	6.0	0.4	6.4	216.6	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	353.8	
小田町ブロック	14,464.0	6,449.9	8,228.3	5,326.7	6.1	2.8	34,477.8	9.3	4.6	13.9	58,405.4	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	96,115.2	
守田町ブロック	2,635.6	314.9	89.0	34.8	1.6	0.7	3,076.6	10.7	0.0	10.7	5,211.6	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	8,374.2	
服部町ブロック	479.4	106.2	82.3	23.6	0.7	0.3	692.5	7.2	0.0	7.2	1,173.3	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	1,929.2	
合計	23,395.1	7,775.0	9,342.3	5,894.0	10.5	4.7	46,421.6	56.8	8.1	64.9	78,638.2	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	128,914.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49))

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,213.4	822.2	1,102.8	622.2	0.8	0.3	7,761.7	12.5	3.1	15.6	13,148.4	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	21,393.0	
朝屋ブロック	2,159.1	355.4	54.1	30.8	1.9	0.9	2,602.2	13.4	0.5	13.9	4,408.4	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	7,086.0	
大内ブロック	134.8	8.2	8.6	2.5	0.1	0.1	154.3	7.2	0.9	8.1	261.2	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	428.0	
小田町ブロック	18,920.7	7,897.2	8,712.7	5,705.1	8.4	3.5	41,247.5	9.7	4.6	14.3	69,873.4	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	114,741.8	
守田町ブロック	2,984.1	389.6	105.5	39.8	1.8	0.8	3,521.6	11.0	0.0	11.0	5,965.5	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	9,590.7	
服部町ブロック	584.7	126.5	94.6	28.2	0.8	0.4	835.2	8.1	0.0	8.1	1,414.9	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,327.4	
合計	29,996.8	9,599.0	10,078.3	6,428.6	13.8	6.0	56,122.5	61.9	9.1	71.0	95,071.8	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	155,566.9	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	321.7	3.3	15.5	7.4	0.0	0.0	347.9	5.2	2.5	7.7	589.2	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	952.3	
朝屋ブロック	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.5	0.0	0.5	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	13.3	1.6	7.0	3.5	0.0	0.0	25.4	0.2	0.0	0.2	42.9	3.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	4.3	72.8	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	39.1	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	62.9	1.6	0.0	1.6	106.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	177.0	
合計	387.4	17.3	31.5	13.1	0.1	0.1	449.5	7.5	2.5	10.0	761.1	12.7	1.1	1.7	2.8	2.3	0.0	17.8	1,238.4	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	904.7	50.9	219.5	109.2	0.0	0.0	1,284.3	7.4	3.1	10.5	2,175.7	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	3,576.6	
朝屋ブロック	456.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	456.4	4.7	0.0	4.7	773.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,234.2	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	3,038.7	1,216.8	816.7	398.7	2.0	0.9	5,473.8	6.5	4.7	11.2	9,272.5	233.1	54.1	72.2	126.3	57.2	0.0	416.6	15,174.1	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	61.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	89.1	2.3	0.0	2.3	150.9	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	251.4	
合計	4,460.8	1,281.2	1,047.8	510.7	2.1	1.0	7,303.6	20.9	7.8	28.7	12,372.2	322.0	59.7	81.4	141.1	68.7	0.0	531.8	20,236.3	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,416.5	112.6	378.3	188.6	0.1	0.0	2,096.1	8.9	3.4	12.3	3,551.0	143.6	8.9	14.9	23.8	16.6	0.0	184.0	5,843.4	
朝屋ブロック	807.1	10.9	9.4	3.1	0.1	0.0	830.6	6.0	0.5	6.5	1,407.1	4.3	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	7.9	2,252.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	7,171.4	3,038.2	2,478.3	1,346.1	4.0	1.8	14,039.8	9.2	5.1	14.3	23,783.5	625.5	131.3	140.8	272.1	150.7	0.0	1,048.3	38,885.9	
守田町ブロック	799.3	30.9	28.3	9.1	0.4	0.2	868.2	8.1	0.0	8.1	1,470.9	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,360.7	
服部町ブロック	86.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	114.1	2.8	0.0	2.8	193.2	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	319.2	
合計	10,280.3	3,206.1	2,905.9	1,549.7	4.7	2.1	17,948.8	35.0	9.0	44.0	30,405.7	783.7	143.3	160.5	303.8	175.3	0.0	1,262.8	49,661.3	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,968.1	200.9	466.0	235.6	0.1	0.1	2,870.8	10.1	3.4	13.5	4,863.2	164.5	12.0	18.6	30.6	21.5	0.0	216.6	7,964.1	
朝屋ブロック	1,567.6	80.3	36.3	12.5	0.7	0.3	1,697.7	11.2	0.9	12.1	2,875.8	13.6	4.0	6.6	10.6	6.6	0.0	30.8	4,616.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	13,844.5	5,592.2	5,304.1	3,140.2	6.8	2.9	27,890.7	10.4	5.1	15.5	47,246.7	1,330.3	242.2	230.8	473.0	300.0	0.0	2,103.3	77,256.2	
守田町ブロック	1,285.3	83.8	43.8	14.5	0.7	0.3	1,428.4	9.7	0.0	9.7	2,419.9	7.3	3.9	5.8	9.7	6.8	0.0	23.8	3,881.8	
服部町ブロック	147.4	24.7	22.8	6.2	0.2	0.1	201.4	4.1	0.0	4.1	341.1	9.9	1.5	1.9	3.4	4.6	0.0	17.9	564.5	
合計	18,812.9	5,981.9	5,873.0	3,409.0	8.5	3.7	34,089.0	45.5	9.4	54.9	57,746.7	1,525.6	263.6	263.7	527.3	339.5	0.0	2,392.4	94,283.0	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44): 資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,268.0	251.5	527.1	273.0	0.2	0.1	3,319.9	11.1	3.4	14.5	5,623.8	174.6	14.1	20.6	34.7	25.0	0.0	234.3	9,192.5	
朝屋ブロック	1,303.7	126.5	63.1	23.8	1.2	0.5	1,518.8	8.8	0.9	9.7	2,572.8	18.9	5.2	7.3	12.5	11.3	0.0	42.7	4,144.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	18,808.0	7,888.6	7,199.3	4,407.8	9.6	3.8	38,317.1	10.5	5.1	15.6	64,909.0	1,780.6	329.4	283.9	613.3	428.8	0.0	2,822.7	106,064.4	
守田町ブロック	1,647.8	138.7	61.3	22.6	0.8	0.4	1,871.6	10.4	0.0	10.4	3,170.4	10.2	6.9	8.9	15.8	10.7	0.0	36.7	5,089.1	
服部町ブロック	198.4	32.2	30.0	7.9	0.3	0.1	268.9	4.6	0.0	4.6	455.6	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	751.7	
合計	24,225.9	8,437.5	7,880.8	4,735.1	12.1	4.9	45,296.3	45.4	9.4	54.8	76,731.6	1,997.0	357.4	323.2	680.6	481.4	0.0	3,159.0	125,241.7	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44): 資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,721.7	348.3	622.6	330.2	0.2	0.1	4,023.1	12.0	3.4	15.4	6,815.1	193.8	18.0	23.8	41.8	31.3	0.0	266.9	11,120.5	
朝屋ブロック	1,553.0	224.8	99.1	38.8	1.7	0.8	1,918.2	12.8	0.9	13.7	3,249.5	27.8	8.8	10.8	19.6	18.5	0.0	65.9	5,247.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	24,537.5	9,945.1	9,486.0	6,179.1	11.4	4.5	50,163.6	10.7	5.1	15.8	84,977.2	2,401.5	422.6	340.5	763.1	574.6	0.0	3,739.2	138,895.8	
守田町ブロック	1,978.6	180.2	66.2	23.6	0.9	0.5	2,250.0	10.8	0.0	10.8	3,811.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	6,115.7	
服部町ブロック	286.8	47.3	41.0	11.1	0.4	0.2	386.8	6.0	0.0	6.0	655.4	16.2	2.5	3.2	5.7	7.8	0.0	29.7	1,077.9	
合計	31,077.6	10,745.7	10,314.9	6,582.8	14.6	6.1	58,741.7	52.3	9.4	61.7	99,508.7	2,650.9	460.5	389.8	850.3	643.9	0.0	4,145.1	162,457.2	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44): 資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,231.7	454.7	774.8	412.2	0.4	0.2	4,874.0	12.5	3.4	15.9	8,256.5	223.0	22.1	28.2	50.3	38.5	0.0	311.8	13,458.2	
朝屋ブロック	2,438.0	493.5	154.2	67.6	3.3	1.6	3,158.2	15.8	0.9	16.7	5,350.0	43.3	20.0	20.6	40.6	34.8	0.0	118.7	8,643.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	28,918.9	11,356.7	10,515.4	6,954.5	12.7	5.0	57,763.2	10.8	5.1	15.9	97,850.9	2,792.5	489.6	375.5	865.1	688.5	0.0	4,346.1	159,976.1	
守田町ブロック	2,470.9	267.9	78.0	28.7	1.2	0.6	2,847.3	11.4	0.0	11.4	4,823.2	14.1	14.0	15.1	29.1	15.7	0.0	58.9	7,740.8	
服部町ブロック	362.5	63.9	55.6	14.7	0.5	0.2	497.4	6.9	0.0	6.9	842.6	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,384.0	
合計	37,422.0	12,636.7	11,578.0	7,477.7	18.1	7.6	69,140.1	57.4	9.4	66.8	117,123.2	3,093.2	548.8	443.4	992.2	787.2	0.0	4,872.6	191,202.7	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44): 資産+10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						小計	農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,494.0	549.1	875.1	466.6	0.5	0.2	5,385.5	13.2	3.4	16.6	9,122.9	240.5	25.4	31.2	56.6	44.9	0.0	342.0	14,867.0	
朝屋ブロック	2,618.7	565.5	169.9	75.5	3.8	1.8	3,435.2	16.7	0.9	17.6	5,819.3	48.2	22.6	22.2	44.8	39.5	0.0	132.5	9,404.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	31,097.5	12,164.9	11,079.6	7,351.1	13.5	5.3	61,711.9	10.8	5.1	15.9	104,540.0	3,021.0	525.8	395.4	921.2	755.2	0.0	4,697.4	170,965.2	
守田町ブロック	2,810.5	337.3	91.7	37.7	1.8	0.7	3,279.7	11.7	0.0	11.7	5,555.7	19.1	16.4	16.9	33.3	21.3	0.0	73.7	8,920.8	
服部町ブロック	427.8	76.7	63.1	16.6	0.6	0.3	585.1	7.4	0.0	7.4	991.1	22.0	3.4	4.4	7.8	10.9	0.0	40.7	1,624.3	
合計	40,448.5	13,693.5	12,279.4	7,947.5	20.2	8.3	74,397.4	59.8	9.4	69.2	126,029.0	3,350.8	593.6	470.1	1,063.7	871.8	0.0	5,286.3	205,781.9	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系

河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	80.5	1.3	11.6	5.6	0.0	0.0	99.0	2.5	1.6	4.1	167.7	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	277.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	50.2	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	74.0	1.8	0.0	1.8	125.2	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	207.0	
合計	19.0	130.7	13.7	20.6	7.8	0.1	0.1	173.0	4.3	1.6	5.9	292.9	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	484.4	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系

河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	17.0	314.0	6.6	30.9	14.8	0.0	0.0	366.3	5.4	2.3	7.7	620.4	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	1,009.6	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	62.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	90.1	2.3	0.0	2.3	152.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	253.9	
合計	37.0	376.0	20.1	42.5	17.6	0.1	0.1	456.4	7.7	2.3	10.0	772.8	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,263.5	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系

河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	251.0	1,587.5	126.1	349.6	174.5	0.1	0.0	2,237.8	9.3	3.4	12.7	3,791.1	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	6,209.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8.0	19.9	1.1	2.8	0.2	0.0	0.0	24.0	0.2	0.0	0.2	40.7	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	66.6	
守田町ブロック	43.0	874.3	30.9	28.3	9.1	0.4	0.2	943.2	8.3	0.0	8.3	1,597.8	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,562.8	
服部町ブロック	20.0	86.0	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	114.1	2.8	0.0	2.8	193.2	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	319.2	
合計	322.0	2,567.7	171.6	392.3	186.6	0.6	0.3	3,319.1	20.6	3.4	24.0	5,622.8	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	9,158.0	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産+10%)

水系名：淀川水系

河川名：木津川、柘植川、服部川

流量規模：1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	317.0	2,670.3	306.2	526.1	274.5	0.2	0.1	3,777.4	11.3	3.4	14.7	6,399.0	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	10,434.3	
朝屋ブロック	2.0	29.5	6.5	6.5	4.3	0.0	0.0	46.8	0.5	0.0	0.5	79.3	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	129.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	494.0	1,083.7	379.1	1,095.6	576.6	0.2	0.1	3,135.3	2.0	0.0	2.0	5,311.1	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	8,844.6	
守田町ブロック	77.0	1,305.2	87.7	47.1	16.0	0.7	0.3	1,457.0	9.7	0.0	9.7	2,468.2	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,961.1	
服部町ブロック	25.0	135.5	18.8	15.8	3.8	0.1	0.1	174.1	3.8	0.0	3.8	295.1	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	484.8	
合計	915.0	5,224.2	798.3	1,691.1	875.2	1.2	0.6	8,590.6	27.3	3.4	30.7	14,552.7	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	23,854.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	305.0	2,462.8	269.7	476.4	250.7	0.2	0.1	3,459.9	11.2	3.4	14.6	5,860.9	165.1	15.4	20.7	36.1	25.6	0.0	226.8	9,562.2	
朝屋ブロック	61.0	1,158.7	57.2	11.9	6.5	0.3	0.2	1,234.8	6.3	0.0	6.3	2,091.4	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	3,343.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	1,463.0	6,435.8	2,975.4	5,964.7	3,728.7	1.9	0.8	19,107.3	6.9	2.7	9.6	32,367.9	1,379.9	131.9	141.8	273.7	182.8	0.0	1,836.4	53,321.2	
守田町ブロック	97.0	1,653.3	140.4	62.4	22.9	0.8	0.4	1,880.2	10.5	0.0	10.5	3,185.2	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	5,112.9	
服部町ブロック	43.0	215.7	32.2	30.0	7.9	0.3	0.1	286.2	4.9	0.0	4.9	484.8	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	798.5	
合計	1,969.0	11,926.3	3,474.9	6,545.4	4,016.7	3.5	1.6	25,968.4	39.8	6.1	45.9	43,990.2	1,570.8	158.3	177.2	335.5	227.4	0.0	2,133.7	72,138.2	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	350.0	3,534.7	524.3	800.4	426.2	0.4	0.2	5,286.2	12.9	3.4	16.3	8,954.7	231.3	24.7	30.2	54.9	42.7	0.0	328.9	14,586.1	
朝屋ブロック	120.0	1,685.0	117.2	18.5	9.7	0.7	0.3	1,831.4	9.4	0.0	9.4	3,102.5	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,964.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	2,547.0	12,040.6	5,525.5	8,299.5	5,376.2	4.8	2.2	31,248.8	9.7	5.0	14.7	52,935.3	1,990.3	245.1	247.0	492.1	345.8	0.0	2,828.2	87,027.0	
守田町ブロック	133.0	2,501.2	269.0	80.7	29.0	1.2	0.6	2,881.7	11.4	0.0	11.4	4,881.6	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	7,835.2	
服部町ブロック	56.0	393.9	71.9	60.2	15.8	0.6	0.3	542.7	7.2	0.0	7.2	919.4	21.4	3.3	4.2	7.5	10.4	0.0	39.3	1,508.6	
合計	3,206.0	20,155.4	6,507.9	9,259.3	5,856.9	7.7	3.6	41,790.8	50.6	8.4	59.0	70,793.5	2,262.9	292.4	303.5	595.9	419.6	0.0	3,278.4	115,921.7	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	403.0	6,014.4	1,009.7	1,453.0	831.1	0.9	0.4	9,309.5	13.8	3.4	17.2	15,770.1	347.6	42.7	44.1	86.8	87.1	0.0	521.5	25,618.3	
朝屋ブロック	173.0	2,198.8	336.8	55.0	28.0	1.9	0.9	2,621.4	14.4	0.0	14.4	4,440.7	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	7,130.3	
大内ブロック	18.0	162.4	9.3	10.1	2.9	0.1	0.1	184.9	8.9	1.0	9.9	313.2	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	512.9	
小田町ブロック	2,802.0	19,324.6	8,134.2	9,386.8	6,110.4	8.4	3.6	42,968.0	10.6	5.1	15.7	72,787.8	2,294.6	355.3	313.2	668.5	498.2	0.0	3,461.3	119,232.8	
守田町ブロック	153.0	3,156.0	396.3	110.1	41.3	1.9	0.8	3,706.4	12.0	0.0	12.0	6,278.5	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	10,082.8	
服部町ブロック	61.0	574.7	117.4	91.9	26.2	0.8	0.4	811.4	8.4	0.0	8.4	1,374.5	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	2,252.0	
合計	3,610.0	31,430.9	10,003.7	11,106.9	7,039.9	14.0	6.2	59,601.6	68.1	9.5	77.6	100,964.8	2,709.2	436.9	397.0	833.9	642.0	0.0	4,185.1	164,829.1	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	415.0	6,313.9	1,122.2	1,594.8	919.4	1.0	0.4	9,951.7	14.1	3.4	17.5	16,857.9	371.8	46.8	47.1	93.9	96.0	0.0	561.7	27,388.8	
朝屋ブロック	201.0	2,493.8	444.0	68.5	38.3	2.4	1.1	3,048.1	15.6	0.5	16.1	5,163.5	16.9	17.5	16.3	33.8	19.6	0.0	70.3	8,298.0	
大内ブロック	21.0	201.5	15.9	14.6	4.3	0.2	0.1	236.6	10.1	1.0	11.1	401.1	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	655.4	
小田町ブロック	2,928.0	24,084.4	9,929.3	9,917.1	6,578.5	11.1	4.5	50,524.9	10.8	5.1	15.9	85,589.3	2,521.9	424.2	347.2	771.4	588.5	0.0	3,881.8	140,011.9	
守田町ブロック	164.0	3,643.9	556.9	135.9	49.8	2.3	0.9	4,389.7	12.4	0.0	12.4	7,436.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	11,948.3	
服部町ブロック	71.0	670.3	143.9	108.5	32.8	0.9	0.4	956.8	9.1	0.0	9.1	1,620.8	37.2	6.4	6.4	12.8	21.9	0.0	71.9	2,658.6	
合計	3,800.0	37,407.8	12,212.2	11,839.4	7,623.1	17.9	7.4	69,107.8	72.1	10.0	82.1	117,068.7	2,978.5	523.2	441.7	964.9	759.0	0.0	4,702.4	190,961.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	78.9	1.3	11.6	5.6	0.0	0.0	97.4	2.9	1.6	4.5	165.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	273.5	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	43.8	12.4	9.0	2.2	0.1	0.1	67.6	1.7	0.0	1.7	114.3	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	189.6	
合計	122.7	13.7	20.6	7.8	0.1	0.1	165.0	4.6	1.6	6.2	279.3	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	463.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	297.3	9.4	37.4	18.2	0.0	0.0	362.3	5.3	2.1	7.4	613.8	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	999.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	54.7	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	82.8	2.0	0.0	2.0	140.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	234.0	
合計	352.0	22.9	49.0	21.0	0.1	0.1	445.1	7.3	2.1	9.4	753.9	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,233.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	495.6	11.1	46.8	22.7	0.0	0.0	576.2	6.4	2.6	9.0	976.1	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,583.4	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	71.1	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	99.2	2.4	0.0	2.4	167.9	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	278.6	
合計	566.7	24.6	58.4	25.5	0.1	0.1	675.4	8.8	2.6	11.4	1,144.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,862.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	791.9	17.4	57.7	27.6	0.0	0.0	894.6	7.3	2.7	10.0	1,515.4	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,448.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	96.1	13.5	11.6	2.8	0.1	0.1	124.2	3.0	0.0	3.0	210.2	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	346.5	
合計	888.0	30.9	69.3	30.4	0.1	0.1	1,018.8	10.3	2.7	13.0	1,725.6	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,795.3	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49) : 資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	926.5	34.3	81.1	42.2	0.0	0.0	1,084.1	7.6	2.7	10.3	1,836.4	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,966.7	
朝屋ブロック	1,117.9	27.4	6.6	3.1	0.2	0.1	1,155.3	5.3	0.0	5.3	1,957.0	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	3,124.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	155.7	24.1	21.5	5.9	0.2	0.1	207.5	4.2	0.0	4.2	351.5	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	579.5	
合計	2,200.1	85.8	109.2	51.2	0.4	0.2	2,446.9	17.1	2.7	19.8	4,144.9	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	6,670.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49) : 資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,704.1	312.8	474.7	255.8	0.2	0.1	3,747.7	11.3	3.4	14.7	6,348.6	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	10,333.7	
朝屋ブロック	1,443.9	88.0	15.2	8.4	0.5	0.2	1,556.2	8.6	0.0	8.6	2,636.1	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	4,216.5	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	9,226.1	4,141.5	7,534.8	4,918.0	2.9	1.3	25,824.6	8.2	4.0	12.2	43,747.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	72,005.4	
守田町ブロック	1,978.6	180.2	66.2	23.6	0.9	0.5	2,250.0	10.8	0.0	10.8	3,811.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	6,115.7	
服部町ブロック	331.5	63.9	55.6	14.7	0.5	0.2	466.4	6.6	0.0	6.6	790.0	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,300.1	
合計	15,684.2	4,786.4	8,146.5	5,220.5	5.0	2.3	33,844.9	45.5	7.4	52.9	57,333.2	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	93,971.4	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49) : 資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,266.2	721.5	993.2	539.3	0.6	0.3	6,521.1	13.3	3.4	16.7	11,046.6	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	17,978.7	
朝屋ブロック	2,002.7	268.4	38.2	18.9	1.5	0.8	2,330.5	12.7	0.0	12.7	3,947.8	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	6,333.6	
大内ブロック	128.9	4.6	5.5	1.6	0.1	0.0	140.7	6.6	0.5	7.1	238.2	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	389.0	
小田町ブロック	15,910.4	7,094.9	9,051.2	5,859.4	6.7	3.1	37,925.7	10.2	5.1	15.3	64,245.9	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	105,405.0	
守田町ブロック	2,899.1	346.4	97.9	38.3	1.8	0.7	3,384.2	11.7	0.0	11.7	5,732.8	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	9,204.0	
服部町ブロック	527.4	116.9	90.6	25.9	0.8	0.4	762.0	8.0	0.0	8.0	1,290.6	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	2,116.8	
合計	25,734.7	8,552.7	10,276.6	6,483.4	11.5	5.3	51,064.2	62.5	9.0	71.5	86,501.9	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	141,427.1	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49) : 資産+10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	5,734.8	904.4	1,213.1	684.4	0.9	0.4	8,538.0	13.8	3.4	17.2	14,463.2	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	23,485.7	
朝屋ブロック	2,375.0	391.0	59.6	33.9	2.1	1.0	2,862.6	14.7	0.5	15.2	4,849.2	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	7,788.5	
大内ブロック	148.3	9.0	9.5	2.7	0.1	0.1	169.7	8.0	1.0	9.0	287.4	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	470.5	
小田町ブロック	20,812.8	8,686.8	9,584.0	6,275.6	9.2	3.9	45,372.3	10.6	5.1	15.7	76,860.7	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	125,855.3	
守田町ブロック	3,282.5	428.5	116.0	43.8	2.0	0.8	3,873.6	12.1	0.0	12.1	6,562.1	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	10,540.4	
服部町ブロック	643.1	139.1	104.1	31.0	0.9	0.4	918.6	8.9	0.0	8.9	1,556.3	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,553.0	
合計	32,996.5	10,558.8	11,086.3	7,071.4	15.2	6.6	61,734.8	68.1	10.0	78.1	104,578.9	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	170,693.4	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	263.2	2.7	12.7	6.0	0.0	0.0	284.6	4.3	2.0	6.3	482.1	6.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.0	7.5	780.5	
朝屋ブロック	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	0.4	0.0	0.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	10.8	1.3	5.7	2.8	0.0	0.0	20.6	0.1	0.0	0.1	35.1	3.3	0.3	0.5	0.8	0.2	0.0	4.3	60.1	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	32.0	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	51.4	1.3	0.0	1.3	87.1	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	145.8	
合計	316.9	14.1	25.8	10.6	0.1	0.0	367.5	6.1	2.0	8.1	622.7	12.7	1.1	1.7	2.8	2.3	0.0	17.8	1,016.1	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	740.2	41.7	179.6	89.3	0.0	0.0	1,050.8	6.0	2.6	8.6	1,780.1	83.7	4.9	8.1	13.0	9.4	0.0	106.1	2,945.6	
朝屋ブロック	373.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	373.4	3.9	0.0	3.9	632.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,009.8	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	2,486.2	995.5	668.2	326.2	1.6	0.7	4,478.4	5.4	3.9	9.3	7,586.6	233.1	54.1	72.2	126.3	57.2	0.0	416.6	12,490.9	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	49.9	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	72.8	1.9	0.0	1.9	123.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	207.2	
合計	3,649.7	1,048.2	857.3	417.8	1.7	0.7	5,975.4	17.2	6.5	23.7	10,122.6	322.0	59.7	81.4	141.1	68.7	0.0	531.8	16,653.5	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,159.0	92.1	309.5	154.3	0.1	0.0	1,715.0	7.3	2.8	10.1	2,905.3	143.6	8.9	14.9	23.8	16.6	0.0	184.0	4,814.4	
朝屋ブロック	660.3	8.9	7.7	2.5	0.1	0.0	679.5	4.9	0.4	5.3	1,151.2	4.3	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	7.9	1,843.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	5,867.5	2,485.8	2,027.7	1,101.3	3.3	1.5	11,487.1	7.5	4.2	11.7	19,459.3	625.5	131.3	140.8	272.1	150.7	0.0	1,048.3	32,006.4	
守田町ブロック	654.0	25.3	23.2	7.5	0.3	0.2	710.5	6.6	0.0	6.6	1,203.5	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	1,934.1	
服部町ブロック	70.4	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	93.3	2.3	0.0	2.3	158.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	262.8	
合計	8,411.2	2,623.1	2,377.6	1,267.9	3.9	1.7	14,685.4	28.6	7.4	36.0	24,877.4	783.7	143.3	160.5	303.8	175.3	0.0	1,262.8	40,861.6	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44):資産-10%)

水系名: 淀川水系

河川名: 木津川、柘植川、服部川

流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,610.3	164.4	381.3	192.7	0.1	0.1	2,348.9	8.2	2.8	11.0	3,979.0	164.5	12.0	18.6	30.6	21.5	0.0	216.6	6,555.5	
朝屋ブロック	1,282.6	65.7	29.7	10.2	0.6	0.2	1,389.0	9.2	0.7	9.9	2,352.9	13.6	4.0	6.6	10.6	6.6	0.0	30.8	3,782.6	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	11,327.3	4,575.4	4,339.7	2,569.2	5.5	2.4	22,819.5	8.5	4.2	12.7	38,656.4	1,330.3	242.2	230.8	473.0	300.0	0.0	2,103.3	63,591.9	
守田町ブロック	1,051.6	68.5	35.9	11.9	0.5	0.3	1,168.7	7.9	0.0	7.9	1,979.9	7.3	3.9	5.8	9.7	6.8	0.0	23.8	3,180.3	
服部町ブロック	120.6	20.2	18.7	5.1	0.1	0.1	164.8	3.3	0.0	3.3	279.1	9.9	1.5	1.9	3.4	4.6	0.0	17.9	465.1	
合計	15,392.4	4,894.2	4,805.3	2,789.1	6.8	3.1	27,890.9	37.1	7.7	44.8	47,247.3	1,525.6	263.6	263.7	527.3	339.5	0.0	2,392.4	77,575.4	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44) : 資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	1,855.6	205.8	431.2	223.4	0.1	0.1	2,716.2	9.1	2.8	11.9	4,601.3	174.6	14.1	20.6	34.7	25.0	0.0	234.3	7,563.7	
朝屋ブロック	1,066.7	103.5	51.6	19.5	0.9	0.4	1,242.6	7.2	0.7	7.9	2,105.0	18.9	5.2	7.3	12.5	11.3	0.0	42.7	3,398.2	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	15,388.3	6,454.3	5,890.3	3,606.4	7.8	3.1	31,350.2	8.6	4.2	12.8	53,107.4	1,780.6	329.4	283.9	613.3	428.8	0.0	2,822.7	87,293.1	
守田町ブロック	1,348.2	113.5	50.1	18.5	0.6	0.3	1,531.2	8.5	0.0	8.5	2,594.0	10.2	6.9	8.9	15.8	10.7	0.0	36.7	4,170.4	
服部町ブロック	162.4	26.4	24.6	6.4	0.2	0.1	220.1	3.8	0.0	3.8	372.8	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	619.3	
合計	19,821.2	6,903.5	6,447.8	3,874.2	9.6	4.0	37,060.3	37.2	7.7	44.9	62,780.5	1,997.0	357.4	323.2	680.6	481.4	0.0	3,159.0	103,044.7	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44) : 資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,226.8	285.0	509.4	270.2	0.2	0.1	3,291.7	9.8	2.8	12.6	5,576.0	193.8	18.0	23.8	41.8	31.3	0.0	266.9	9,147.2	
朝屋ブロック	1,270.6	183.9	81.1	31.8	1.4	0.7	1,569.5	10.5	0.7	11.2	2,658.7	27.8	8.8	10.8	19.6	18.5	0.0	65.9	4,305.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	20,076.1	8,136.9	7,761.3	5,055.6	9.3	3.7	41,042.9	8.7	4.2	12.9	69,526.8	2,401.5	422.6	340.5	763.1	574.6	0.0	3,739.2	114,321.8	
守田町ブロック	1,618.8	147.4	54.2	19.3	0.8	0.4	1,840.9	8.8	0.0	8.8	3,118.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,011.6	
服部町ブロック	234.7	38.7	33.5	9.1	0.3	0.2	316.5	4.9	0.0	4.9	536.2	16.2	2.5	3.2	5.7	7.8	0.0	29.7	887.3	
合計	25,427.0	8,791.9	8,439.5	5,386.0	12.0	5.1	48,061.5	42.7	7.7	50.4	81,416.2	2,650.9	460.5	389.8	850.3	643.9	0.0	4,145.1	133,673.2	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44) : 資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,644.1	372.0	634.0	337.3	0.3	0.1	3,987.8	10.3	2.8	13.1	6,755.3	223.0	22.1	28.2	50.3	38.5	0.0	311.8	11,068.0	
朝屋ブロック	1,994.7	403.8	126.1	55.3	2.7	1.3	2,583.9	12.9	0.7	13.6	4,377.3	43.3	20.0	20.6	40.6	34.8	0.0	118.7	7,093.5	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	23,661.0	9,291.8	8,603.5	5,690.0	10.4	4.1	47,260.8	8.8	4.2	13.0	80,059.9	2,792.5	489.6	375.5	865.1	688.5	0.0	4,346.1	131,679.8	
守田町ブロック	2,021.6	219.2	63.8	23.5	1.0	0.5	2,329.6	9.3	0.0	9.3	3,946.3	14.1	14.0	15.1	29.1	15.7	0.0	58.9	6,344.1	
服部町ブロック	296.6	52.3	45.5	12.0	0.4	0.2	407.0	5.6	0.0	5.6	689.4	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,139.1	
合計	30,618.0	10,339.1	9,472.9	6,118.1	14.8	6.2	56,569.1	46.9	7.7	54.6	95,828.2	3,093.2	548.8	443.4	992.2	787.2	0.0	4,872.6	157,324.5	

様式-3 被害額 (事業着手時(S44) : 資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,858.7	449.3	716.0	381.7	0.4	0.2	4,406.3	10.8	2.8	13.6	7,464.2	240.5	25.4	31.2	56.6	44.9	0.0	342.0	12,226.1	
朝屋ブロック	2,142.6	462.7	139.0	61.8	3.1	1.5	2,810.7	13.7	0.7	14.4	4,761.3	48.2	22.6	22.2	44.8	39.5	0.0	132.5	7,718.9	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	25,443.4	9,953.1	9,065.2	6,014.5	11.0	4.4	50,491.6	8.9	4.2	13.1	85,532.7	3,021.0	525.8	395.4	921.2	755.2	0.0	4,697.4	140,734.8	
守田町ブロック	2,299.5	276.0	75.0	30.8	1.4	0.6	2,683.3	9.6	0.0	9.6	4,545.5	19.1	16.4	16.9	33.3	21.3	0.0	73.7	7,312.1	
服部町ブロック	350.0	62.7	51.7	13.6	0.5	0.2	478.7	6.1	0.0	6.1	810.9	22.0	3.4	4.4	7.8	10.9	0.0	40.7	1,336.4	
合計	33,094.2	11,203.8	10,046.9	6,502.4	16.4	6.9	60,870.6	49.1	7.7	56.8	103,114.6	3,350.8	593.6	470.1	1,063.7	871.8	0.0	5,286.3	169,328.3	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産-10%)

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/2確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	9.0	65.9	1.1	9.5	4.6	0.0	0.0	81.1	2.1	1.3	3.4	137.2	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	228.3	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	10.0	41.1	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	60.5	1.5	0.0	1.5	102.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	170.5	
合計	19.0	107.0	11.2	16.9	6.4	0.1	0.0	141.6	3.6	1.3	4.9	239.7	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	398.8	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産-10%)

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/5確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	17.0	256.9	5.4	25.3	12.1	0.0	0.0	299.7	4.4	1.9	6.3	507.6	12.3	0.6	1.1	1.7	1.2	0.0	15.2	828.8	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	20.0	50.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	73.6	1.9	0.0	1.9	124.7	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	209.3	
合計	37.0	307.6	16.4	34.8	14.4	0.1	0.0	373.3	6.3	1.9	8.2	632.3	17.5	1.3	2.2	3.5	3.3	0.0	24.3	1,038.1	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産-10%)

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/10確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	251.0	1,298.9	103.2	286.1	142.8	0.1	0.0	1,831.1	7.6	2.8	10.4	3,101.8	128.5	8.9	14.5	23.4	15.9	0.0	167.8	5,111.1	
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	8.0	16.3	0.9	2.3	0.2	0.0	0.0	19.7	0.1	0.0	0.1	33.3	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.0	1.7	54.8	
守田町ブロック	43.0	715.3	25.3	23.2	7.5	0.3	0.2	771.8	6.8	0.0	6.8	1,307.3	5.1	1.7	2.5	4.2	4.2	0.0	13.5	2,099.4	
服部町ブロック	20.0	70.4	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	93.3	2.3	0.0	2.3	158.1	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	262.8	
合計	322.0	2,100.9	140.4	321.1	152.8	0.5	0.2	2,715.9	16.8	2.8	19.6	4,600.5	139.7	11.5	18.4	29.9	22.5	0.0	192.1	7,528.1	

様式-3 被害額

(現況河道(H29)：資産-10%)

水系名： 淀川水系

河川名： 木津川、柘植川、服部川

流量規模： 1/20確率規模洪水

(単位：百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計
				償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	317.0	2,184.8	250.6	430.5	224.6	0.2	0.1	3,090.8	9.3	2.8	12.1	5,235.5	176.1	16.8	22.4	39.2	27.9	0.0	243.2	8,581.6	
朝屋ブロック	2.0	24.1	5.3	5.4	3.5	0.0	0.0	38.3	0.4	0.0	0.4	64.9	1.1	0.3	0.2	0.5	1.1	0.0	2.7	106.3	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	494.0	886.7	310.2	896.4	471.8	0.2	0.1	2,565.4	1.6	0.0	1.6	4,345.5	312.2	22.2	32.6	54.8	29.2	0.0	396.2	7,308.7	
守田町ブロック	77.0	1,067.9	71.8	38.5	13.1	0.6	0.3	1,192.2	8.0	0.0	8.0	2,019.5	7.9	4.4	6.4	10.8	7.5	0.0	26.2	3,245.9	
服部町ブロック	25.0	110.9	15.4	12.9	3.1	0.1	0.1	142.5	3.1	0.0	3.1	241.4	6.7	0.9	1.4	2.3	2.8	0.0	11.8	398.8	
合計	915.0	4,274.4	653.3	1,383.7	716.1	1.1	0.6	7,029.2	22.4	2.8	25.2	11,906.8	504.0	44.6	63.0	107.6	68.5	0.0	680.1	19,641.3	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	305.0	2,015.0	220.7	389.7	205.1	0.1	0.1	2,830.7	9.1	2.8	11.9	4,795.3	165.1	15.4	20.7	36.1	25.6	0.0	226.8	7,864.7	
朝屋ブロック	61.0	948.0	46.8	9.7	5.3	0.2	0.1	1,010.1	5.2	0.0	5.2	1,711.2	2.8	2.3	3.2	5.5	2.6	0.0	10.9	2,737.4	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	1,463.0	5,265.7	2,434.5	4,880.2	3,050.7	1.5	0.7	15,633.3	5.6	2.2	7.8	26,482.8	1,379.9	131.9	141.8	273.7	182.8	0.0	1,836.4	43,960.3	
守田町ブロック	97.0	1,352.7	114.9	51.1	18.7	0.7	0.3	1,538.4	8.6	0.0	8.6	2,606.0	10.3	6.9	9.0	15.9	10.8	0.0	37.0	4,190.0	
服部町ブロック	43.0	176.5	26.4	24.6	6.4	0.2	0.1	234.2	4.0	0.0	4.0	396.7	12.7	1.8	2.5	4.3	5.6	0.0	22.6	657.5	
合計	1,969.0	9,757.9	2,843.3	5,355.3	3,286.2	2.7	1.3	21,246.7	32.5	5.0	37.5	35,992.0	1,570.8	158.3	177.2	335.5	227.4	0.0	2,133.7	59,409.9	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	350.0	2,892.0	429.0	654.9	348.7	0.3	0.1	4,325.0	10.5	2.8	13.3	7,326.6	231.3	24.7	30.2	54.9	42.7	0.0	328.9	11,993.8	
朝屋ブロック	120.0	1,378.6	95.9	15.1	8.0	0.6	0.3	1,498.5	7.7	0.0	7.7	2,538.4	4.9	5.1	6.7	11.8	4.8	0.0	21.5	4,066.1	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	2,547.0	9,851.4	4,520.8	6,790.5	4,398.7	3.9	1.8	25,567.1	7.9	4.1	12.0	43,310.7	1,990.3	245.1	247.0	492.1	345.8	0.0	2,828.2	71,718.0	
守田町ブロック	133.0	2,046.5	220.1	66.1	23.7	1.0	0.5	2,357.9	9.4	0.0	9.4	3,994.0	15.0	14.2	15.4	29.6	15.9	0.0	60.5	6,421.8	
服部町ブロック	56.0	322.3	58.8	49.3	13.0	0.5	0.2	444.1	5.9	0.0	5.9	752.2	21.4	3.3	4.2	7.5	10.4	0.0	39.3	1,241.5	
合計	3,206.0	16,490.8	5,324.6	7,575.9	4,792.1	6.3	2.9	34,192.6	41.4	6.9	48.3	57,921.9	2,262.9	292.4	303.5	595.9	419.6	0.0	3,278.4	95,441.2	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	403.0	4,920.9	826.1	1,188.8	680.0	0.7	0.3	7,616.8	11.3	2.8	14.1	12,902.8	347.6	42.7	44.1	86.8	87.1	0.0	521.5	21,055.2	
朝屋ブロック	173.0	1,799.0	275.5	45.0	22.9	1.5	0.7	2,144.6	11.8	0.0	11.8	3,633.3	12.4	13.5	13.6	27.1	14.3	0.0	53.8	5,843.5	
大内ブロック	18.0	132.9	7.6	8.2	2.4	0.1	0.0	151.2	7.3	0.8	8.1	256.3	2.2	0.5	0.8	1.3	1.4	0.0	4.9	420.5	
小田町ブロック	2,802.0	15,811.0	6,655.3	7,680.1	4,999.4	6.9	3.0	35,155.7	8.6	4.2	12.8	59,553.7	2,294.6	355.3	313.2	668.5	498.2	0.0	3,461.3	98,183.5	
守田町ブロック	153.0	2,582.2	324.2	90.1	33.8	1.5	0.7	3,032.5	9.8	0.0	9.8	5,136.9	22.2	19.8	19.8	39.6	24.1	0.0	85.9	8,265.1	
服部町ブロック	61.0	470.2	96.1	75.2	21.5	0.6	0.3	663.9	6.9	0.0	6.9	1,124.6	30.2	5.1	5.5	10.6	16.9	0.0	57.7	1,853.1	
合計	3,610.0	25,716.2	8,184.8	9,087.4	5,760.0	11.3	5.0	48,764.7	55.7	7.8	63.5	82,607.6	2,709.2	436.9	397.0	833.9	642.0	0.0	4,185.1	135,620.9	

様式-3 被害額 (現況河道(H29):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水 (単位: 百万円)

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考	
		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃 労働対価			代替活動	小計							
		家屋	家庭用品	償却	在庫										償却						在庫
高砂ブロック	415.0	5,165.9	918.1	1,304.8	752.2	0.8	0.3	8,142.1	11.5	2.8	14.3	13,792.8	371.8	46.8	47.1	93.9	96.0	0.0	561.7	22,510.9	
朝屋ブロック	201.0	2,040.3	363.3	56.0	31.3	2.0	0.9	2,493.8	12.8	0.4	13.2	4,224.7	16.9	17.5	16.3	33.8	19.6	0.0	70.3	6,802.0	
大内ブロック	21.0	164.9	13.0	12.0	3.5	0.2	0.1	193.7	8.3	0.8	9.1	328.1	2.9	0.7	1.1	1.8	1.9	0.0	6.6	537.5	
小田町ブロック	2,928.0	19,705.4	8,124.0	8,114.0	5,382.4	9.1	3.7	41,338.6	8.8	4.2	13.0	70,027.6	2,521.9	424.2	347.2	771.4	588.5	0.0	3,881.8	115,261.0	
守田町ブロック	164.0	2,981.3	455.6	111.2	40.7	1.9	0.8	3,591.5	10.2	0.0	10.2	6,084.1	27.8	27.6	23.6	51.2	31.1	0.0	110.1	9,795.9	
服部町ブロック	71.0	548.4	117.7	88.8	26.8	0.8	0.3	782.8	7.5	0.0	7.5	1,326.1	37.2	6.4	6.4	12.8	21.9	0.0	71.9	2,188.3	
合計	3,800.0	30,606.2	9,991.7	9,686.8	6,236.9	14.8	6.1	56,542.5	59.1	8.2	67.3	95,783.4	2,978.5	523.2	441.7	964.9	759.0	0.0	4,702.4	157,095.6	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/2確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	64.6	1.1	9.5	4.6	0.0	0.0	79.8	2.4	1.3	3.7	135.0	5.5	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.6	225.1		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	35.8	10.1	7.4	1.8	0.1	0.0	55.2	1.4	0.0	1.4	93.5	3.3	0.5	0.7	1.2	1.5	0.0	6.0	156.1		
合計	100.4	11.2	16.9	6.4	0.1	0.0	135.0	3.8	1.3	5.1	228.5	8.8	0.7	1.1	1.8	2.0	0.0	12.6	381.2		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/5確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	243.2	7.7	30.6	14.9	0.0	0.0	296.4	4.3	1.8	6.1	502.2	13.1	0.7	1.1	1.8	1.4	0.0	16.3	821.0		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	44.7	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	67.6	1.6	0.0	1.6	114.6	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	192.9		
合計	287.9	18.7	40.1	17.2	0.1	0.0	364.0	5.9	1.8	7.7	616.8	18.3	1.4	2.2	3.6	3.5	0.0	25.4	1,013.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/10確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	405.5	9.1	38.3	18.6	0.0	0.0	471.5	5.3	2.1	7.4	798.6	17.6	1.0	1.6	2.6	1.9	0.0	22.1	1,299.6		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	58.2	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	81.1	1.9	0.0	1.9	137.4	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	229.5		
合計	463.7	20.1	47.8	20.9	0.1	0.0	552.6	7.2	2.1	9.3	936.0	22.8	1.7	2.7	4.4	4.0	0.0	31.2	1,529.1		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/20確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用	その他 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働対価	代替活動						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
高砂ブロック	647.9	14.2	47.2	22.6	0.0	0.0	731.9	6.0	2.2	8.2	1,239.9	21.3	1.7	3.0	4.7	2.8	0.0	28.8	2,008.8		
朝屋ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	78.6	11.0	9.5	2.3	0.1	0.0	101.5	2.5	0.0	2.5	172.0	5.2	0.7	1.1	1.8	2.1	0.0	9.1	285.1		
合計	726.5	25.2	56.7	24.9	0.1	0.0	833.4	8.5	2.2	10.7	1,411.9	26.5	2.4	4.1	6.5	4.9	0.0	37.9	2,293.9		

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/30確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	758.1	28.0	66.3	34.5	0.0	0.0	886.9	6.2	2.2	8.4	1,502.5	25.5	2.5	3.9	6.4	4.0	0.0	35.9	2,433.7	
朝屋ブロック	914.6	22.4	5.4	2.5	0.2	0.1	945.2	4.4	0.0	4.4	1,601.1	1.8	1.3	2.3	3.6	1.4	0.0	6.8	2,557.5	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
守田町ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
服部町ブロック	127.4	19.7	17.6	4.8	0.1	0.1	169.7	3.4	0.0	3.4	287.6	8.9	1.4	1.7	3.1	4.3	0.0	16.3	477.0	
合計	1,800.1	70.1	89.3	41.8	0.3	0.2	2,001.8	14.0	2.2	16.2	3,391.2	36.2	5.2	7.9	13.1	9.7	0.0	59.0	5,468.2	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/50確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	2,212.4	255.9	388.4	209.3	0.2	0.1	3,066.3	9.3	2.8	12.1	5,194.3	157.7	16.6	21.1	37.7	27.3	0.0	222.7	8,495.4	
朝屋ブロック	1,181.4	72.0	12.4	6.9	0.4	0.2	1,273.3	7.0	0.0	7.0	2,156.8	3.6	3.7	4.4	8.1	3.9	0.0	15.6	3,452.7	
大内ブロック	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小田町ブロック	7,548.7	3,388.5	6,164.8	4,023.8	2.4	1.1	21,129.3	6.7	3.3	10.0	35,793.0	1,772.0	189.9	195.3	385.2	264.4	0.0	2,421.6	59,353.9	
守田町ブロック	1,618.8	147.4	54.2	19.3	0.8	0.4	1,840.9	8.8	0.0	8.8	3,118.5	11.6	8.6	11.5	20.1	11.7	0.0	43.4	5,011.6	
服部町ブロック	271.2	52.3	45.5	12.0	0.4	0.2	381.6	5.4	0.0	5.4	646.3	20.3	3.1	4.0	7.1	9.7	0.0	37.1	1,070.4	
合計	12,832.5	3,916.1	6,665.3	4,271.3	4.2	2.0	27,691.4	37.2	6.1	43.3	46,908.9	1,965.2	221.9	236.3	458.2	317.0	0.0	2,740.4	77,384.0	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/80確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	3,490.5	590.3	812.6	441.3	0.5	0.2	5,335.4	10.9	2.8	13.7	9,038.2	268.4	31.7	35.8	67.5	58.4	0.0	394.3	14,781.6	
朝屋ブロック	1,638.5	219.6	31.3	15.5	1.2	0.6	1,906.7	10.4	0.0	10.4	3,230.0	9.3	10.9	12.1	23.0	10.3	0.0	42.6	5,189.7	
大内ブロック	105.4	3.7	4.5	1.3	0.1	0.0	115.0	5.4	0.4	5.8	194.9	1.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	3.0	318.7	
小田町ブロック	13,017.6	5,804.9	7,405.5	4,794.0	5.5	2.5	31,030.0	8.4	4.2	12.6	52,564.9	2,173.4	313.5	289.1	602.6	442.1	0.0	3,218.1	86,825.6	
守田町ブロック	2,372.0	283.4	80.1	31.3	1.5	0.6	2,768.9	9.6	0.0	9.6	4,690.5	19.6	16.7	17.2	33.9	21.8	0.0	75.3	7,544.3	
服部町ブロック	431.5	95.6	74.1	21.2	0.6	0.3	623.3	6.5	0.0	6.5	1,055.9	29.3	5.0	5.3	10.3	16.6	0.0	56.2	1,741.9	
合計	21,055.5	6,997.5	8,408.1	5,304.6	9.4	4.2	41,779.3	51.2	7.4	58.6	70,774.4	2,501.4	378.1	360.0	738.1	550.0	0.0	3,789.5	116,401.8	

様式-3 被害額 (整備計画完成(H49):資産-10%) 水系名: 淀川水系 河川名: 木津川、柘植川、服部川 流量規模: 1/100確率規模洪水

(単位: 百万円)

ブロック名	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所応急対策費用	その他間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
高砂ブロック	4,692.1	740.0	992.5	560.0	0.7	0.3	6,985.6	11.3	2.8	14.1	11,833.6	309.4	38.5	41.3	79.8	78.1	0.0	467.3	19,300.6	
朝屋ブロック	1,943.2	319.9	48.7	27.8	1.7	0.8	2,342.1	12.0	0.4	12.4	3,967.5	14.6	15.2	14.7	29.9	17.0	0.0	61.5	6,383.5	
大内ブロック	121.3	7.3	7.7	2.2	0.1	0.0	138.6	6.5	0.8	7.3	235.1	2.0	0.4	0.7	1.1	1.3	0.0	4.4	385.4	
小田町ブロック	17,028.7	7,107.4	7,841.4	5,134.6	7.5	3.2	37,122.8	8.7	4.2	12.9	62,886.0	2,378.3	376.8	323.9	700.7	527.6	0.0	3,606.6	103,628.3	
守田町ブロック	2,685.7	350.6	94.9	35.9	1.6	0.7	3,169.4	9.9	0.0	9.9	5,369.0	24.0	21.6	21.0	42.6	26.0	0.0	92.6	8,640.9	
服部町ブロック	526.2	113.8	85.2	25.4	0.7	0.3	751.6	7.3	0.0	7.3	1,273.4	36.0	6.1	6.3	12.4	20.8	0.0	69.2	2,101.5	
合計	26,997.2	8,639.0	9,070.4	5,785.9	12.3	5.3	50,510.1	55.7	8.2	63.9	85,564.6	2,764.3	458.6	407.9	866.5	670.8	0.0	4,301.6	140,440.2	

様式 - 4

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名: 淀川
河川名: 木津川、柘植川、服部川

対象河道: S44(上野遊水地事業着手時点)~H29(現時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	1,127.4	441.7	685.7	342.9	0.167	57.3	57.3	
1/5	0.200	18,445.0	1,150.7	17,294.3	8,990.0	0.300	2,697.0	2,754.3	
1/10	0.100	45,261.6	8,343.0	36,918.6	27,106.5	0.100	2,710.7	5,465.0	
1/20	0.050	85,929.2	21,747.5	64,181.7	50,550.2	0.050	2,527.5	7,992.5	
1/30	0.033	114,143.3	65,774.3	48,369.0	56,275.4	0.017	956.7	8,949.2	
1/50	0.020	148,065.3	105,681.3	42,384.0	45,376.5	0.013	589.9	9,539.1	
1/80	0.013	174,263.8	150,225.0	24,038.8	33,211.4	0.007	232.5	9,771.6	
1/100	0.010	187,555.0	174,028.7	13,526.3	18,782.6	0.003	56.3	9,827.9	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名: 淀川
河川名: 木津川、柘植川、服部川

対象河道: H29(現時点)~H49(整備計画完了時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	441.7	422.0	19.7	9.9	0.167	1.7	1.7	
1/5	0.200	1,150.7	1,123.9	26.8	23.3	0.300	7.0	8.7	
1/10	0.100	8,343.0	1,695.6	6,647.4	3,337.1	0.100	333.7	342.4	
1/20	0.050	21,747.5	2,544.5	19,203.0	12,925.2	0.050	646.3	988.7	
1/30	0.033	65,774.3	6,069.4	59,704.9	39,454.0	0.017	670.7	1,659.4	
1/50	0.020	105,681.3	85,677.5	20,003.8	39,854.4	0.013	518.1	2,177.5	
1/80	0.013	150,225.0	128,914.2	21,310.8	20,657.3	0.007	144.6	2,322.1	
1/100	0.010	174,028.7	155,566.9	18,461.8	19,886.3	0.003	59.7	2,381.8	

様式-4 年平均被害軽減期待額:資産+10% 水系名:淀川
河川名:木津川、柘植川、服部川

対象河道:S44(上野遊水地事業着手時点)~H29(現時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	1,238.4	484.4	754.0	377.0	0.167	63.0	63.0	
1/5	0.200	20,236.3	1,263.5	18,972.8	9,863.4	0.300	2,959.0	3,022.0	
1/10	0.100	49,661.3	9,158.0	40,503.3	29,738.1	0.100	2,973.8	5,995.8	
1/20	0.050	94,283.0	23,854.1	70,428.9	55,466.1	0.050	2,773.3	8,769.1	
1/30	0.033	125,241.7	72,138.2	53,103.5	61,766.2	0.017	1,050.0	9,819.1	
1/50	0.020	162,457.2	115,921.7	46,535.5	49,819.5	0.013	647.7	10,466.8	
1/80	0.013	191,202.7	164,829.1	26,373.6	36,454.6	0.007	255.2	10,722.0	
1/100	0.010	205,781.9	190,961.0	14,820.9	20,597.3	0.003	61.8	10,783.8	

様式-4 年平均被害軽減期待額:資産+10% 水系名:淀川
河川名:木津川、柘植川、服部川

対象河道:H29(現時点)~H49(整備計画完了時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
1/2	0.500	484.4	463.1	21.3	10.7	0.167	1.8	1.8	
1/5	0.200	1,263.5	1,233.8	29.7	25.5	0.300	7.7	9.5	
1/10	0.100	9,158.0	1,862.0	7,296.0	3,662.9	0.100	366.3	375.8	
1/20	0.050	23,854.1	2,795.3	21,058.8	14,177.4	0.050	708.9	1,084.7	
1/30	0.033	72,138.2	6,670.6	65,467.6	43,263.2	0.017	735.5	1,820.2	
1/50	0.020	115,921.7	93,971.4	21,950.3	43,709.0	0.013	568.2	2,388.4	
1/80	0.013	164,829.1	141,427.1	23,402.0	22,676.2	0.007	158.7	2,547.1	
1/100	0.010	190,961.0	170,693.4	20,267.6	21,834.8	0.003	65.5	2,612.6	

様式-4 年平均被害軽減期待額:資産-10% 水系名:淀川
河川名:木津川、柘植川、服部川

対象河道:S44(上野遊水地事業着手時点)~H29(現時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	1,016.1	398.8	617.3	308.7	0.167	51.6	51.6	
1/5	0.200	16,653.5	1,038.1	15,615.4	8,116.4	0.300	2,434.9	2,486.5	
1/10	0.100	40,861.6	7,528.1	33,333.5	24,474.5	0.100	2,447.5	4,934.0	
1/20	0.050	77,575.4	19,641.3	57,934.1	45,633.8	0.050	2,281.7	7,215.7	
1/30	0.033	103,044.7	59,409.9	43,634.8	50,784.5	0.017	863.3	8,079.0	
1/50	0.020	133,673.2	95,441.2	38,232.0	40,933.4	0.013	532.1	8,611.1	
1/80	0.013	157,324.5	135,620.9	21,703.6	29,967.8	0.007	209.8	8,820.9	
1/100	0.010	169,328.3	157,095.6	12,232.7	16,968.2	0.003	50.9	8,871.8	

様式-4 年平均被害軽減期待額:資産-10% 水系名:淀川
河川名:木津川、柘植川、服部川

対象河道:H29(現時点)~H49(整備計画完了時点)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④ (百万円)	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤ (百万円)	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/1.5	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/2	0.500	398.8	381.2	17.6	8.8	0.167	1.5	1.5	
1/5	0.200	1,038.1	1,013.9	24.2	20.9	0.300	6.3	7.8	
1/10	0.100	7,528.1	1,529.1	5,999.0	3,011.6	0.100	301.2	309.0	
1/20	0.050	19,641.3	2,293.9	17,347.4	11,673.2	0.050	583.7	892.7	
1/30	0.033	59,409.9	5,468.2	53,941.7	35,644.6	0.017	606.0	1,498.7	
1/50	0.020	95,441.2	77,384.0	18,057.2	35,999.5	0.013	468.0	1,966.7	
1/80	0.013	135,620.9	116,401.8	19,219.1	18,638.2	0.007	130.5	2,097.2	
1/100	0.010	157,095.6	140,440.2	16,655.4	17,937.3	0.003	53.8	2,151.0	

様式 - 5

様式－５ 費用対便益（残事業）

水系名：淀川

河川名：木津川,服部川,柘植川

年次	年度	t	割引率 0.040	便 益 (B)			建設費③						費用 対便益比 B/C	純 現在価値 B-C	備 考	
				便益①		残存価値②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
				便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
整備期間 (20年)	H29	0	1.000	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		評価基準年	
	H30	1	0.962	0.0	0.0			660.8	635.4	66.4	63.8	727.2	699.2			
	H31	2	0.925	175.0	161.8			597.2	552.1	112.3	103.8	709.5	655.9			
	H32	3	0.889	333.2	296.2			480.1	426.8	101.5	90.2	581.6	517.0			
	H33	4	0.855	460.4	393.6			480.1	410.4	81.6	69.7	561.7	480.1			
	H34	5	0.822	587.5	482.9			480.1	394.6	81.6	67.1	561.7	461.7			
	H35	6	0.790	714.7	564.8			517.3	408.8	81.6	64.5	598.9	473.3			
	H36	7	0.760	851.7	647.2			493.8	375.2	87.9	66.8	581.7	442.0			
	H37	8	0.731	982.5	717.9			460.0	336.1	83.9	61.3	543.9	397.4			
	H38	9	0.703	1,104.3	775.9			378.2	265.7	78.2	55.0	456.4	320.7			
	H39	10	0.676	1,204.5	813.7			370.6	250.4	64.3	43.4	434.9	293.8			
	H40	11	0.650	1,302.7	846.2			365.7	237.6	63.0	40.9	428.7	278.5			
	H41	12	0.625	1,399.5	874.1			358.2	223.7	62.2	38.9	420.4	262.6			
	H42	13	0.601	1,494.4	897.5			358.2	215.1	60.9	36.6	419.1	251.7			
	H43	14	0.577	1,589.3	917.8			470.7	271.8	60.9	35.2	531.6	307.0			
	H44	15	0.555	1,714.0	951.7			470.7	261.4	80.0	44.4	550.7	305.8			
	H45	16	0.534	1,838.6	981.6			459.1	245.1	80.0	42.7	539.1	287.8			
	H46	17	0.513	1,960.2	1,006.3			397.6	204.1	78.0	40.0	475.6	244.1			
	H47	18	0.494	2,065.5	1,019.6			397.6	196.3	67.6	33.4	465.2	229.7			
	H48	19	0.475	2,170.9	1,030.4			398.2	189.0	67.6	32.1	465.8	221.1			
H49	20	0.456	2,276.3	1,038.9			398.2	181.7	67.7	30.9	465.9	212.6				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H50	21	0.439	2,381.8	1,045.2					67.7	29.7	67.7	29.7			
	H51	22	0.422	2,381.8	1,005.0					75.9	32.0	75.9	32.0			
	H52	23	0.406	2,381.8	966.4					75.9	30.8	75.9	30.8			
	H53	24	0.390	2,381.8	929.2					75.9	29.6	75.9	29.6			
	H54	25	0.375	2,381.8	893.5					75.9	28.5	75.9	28.5			
	H55	26	0.361	2,381.8	859.1					75.9	27.4	75.9	27.4			
	H56	27	0.347	2,381.8	826.0					75.9	26.3	75.9	26.3			
	H57	28	0.333	2,381.8	794.3					75.9	25.3	75.9	25.3			
	H58	29	0.321	2,381.8	763.7					75.9	24.3	75.9	24.3			
	H59	30	0.308	2,381.8	734.4					75.9	23.4	75.9	23.4			
	H60	31	0.296	2,381.8	706.1					75.9	22.5	75.9	22.5			
	H61	32	0.285	2,381.8	679.0					75.9	21.6	75.9	21.6			
	H62	33	0.274	2,381.8	652.8					75.9	20.8	75.9	20.8			
	H63	34	0.264	2,381.8	627.7					75.9	20.0	75.9	20.0			
	H64	35	0.253	2,381.8	603.6					75.9	19.2	75.9	19.2			
	H65	36	0.244	2,381.8	580.4					75.9	18.5	75.9	18.5			
	H66	37	0.234	2,381.8	558.0					75.9	17.8	75.9	17.8			
	H67	38	0.225	2,381.8	536.6					75.9	17.1	75.9	17.1			
	H68	39	0.217	2,381.8	515.9					75.9	16.4	75.9	16.4			
	H69	40	0.208	2,381.8	496.1					75.9	15.8	75.9	15.8			
H70	41	0.200	2,381.8	477.0					75.9	15.2	75.9	15.2				
H71	42	0.193	2,381.8	458.7					75.9	14.6	75.9	14.6				
H72	43	0.185	2,381.8	441.0					75.9	14.1	75.9	14.1				
H73	44	0.178	2,381.8	424.1					75.9	13.5	75.9	13.5				
H74	45	0.171	2,381.8	407.8					75.9	13.0	75.9	13.0				
H75	46	0.165	2,381.8	392.1					75.9	12.5	75.9	12.5				
H76	47	0.158	2,381.8	377.0					75.9	12.0	75.9	12.0				
H77	48	0.152	2,381.8	362.5					75.9	11.6	75.9	11.6				
H78	49	0.146	2,381.8	348.6					75.9	11.1	75.9	11.1				
H79	50	0.141	2,381.8	335.1					75.9	10.7	75.9	10.7				
H80	51	0.135	2,381.8	322.3					75.9	10.3	75.9	10.3				
H81	52	0.130	2,381.8	309.9					75.9	9.9	75.9	9.9				
H82	53	0.125	2,381.8	297.9					75.9	9.5	75.9	9.5				
H83	54	0.120	2,381.8	286.5					75.9	9.1	75.9	9.1				
H84	55	0.116	2,381.8	275.5					75.9	8.8	75.9	8.8				
H85	56	0.111	2,381.8	264.9					75.9	8.4	75.9	8.4				
H86	57	0.107	2,381.8	254.7					75.9	8.1	75.9	8.1				
H87	58	0.103	2,381.8	244.9					75.9	7.8	75.9	7.8				
H88	59	0.099	2,381.8	235.5					75.9	7.5	75.9	7.5				
H89	60	0.095	2,381.8	226.4					75.9	7.2	75.9	7.2				
H90	61	0.091	2,381.8	217.7					75.9	6.9	75.9	6.9				
H91	62	0.088	2,381.8	209.3					75.9	6.7	75.9	6.7				
H92	63	0.085	2,381.8	201.3					75.9	6.4	75.9	6.4				
H93	64	0.081	2,381.8	193.5					75.9	6.2	75.9	6.2				
H94	65	0.078	2,381.8	186.1					75.9	5.9	75.9	5.9				
H95	66	0.075	2,381.8	178.9					75.9	5.7	75.9	5.7				
H96	67	0.072	2,381.8	172.1					75.9	5.5	75.9	5.5				
H97	68	0.069	2,381.8	165.4					75.9	5.3	75.9	5.3				
H98	69	0.067	2,381.8	159.1					75.9	5.1	75.9	5.1				
H99	70	0.064	2,381.8	153.0					75.9	4.9	75.9	4.9				
合 計				143,315.2	37,769.9	14.1	37,784.0	8,992.4	6,281.3	5,314.0	1,801.2	14,306.4	8,082.5	4.67	29,687.4	

様式一5 費用対便益（残事業・残工期+10%）

水系名：淀川

河川名：木津川,服部川,柘植川

年次	年度	t	割引率 0.040	便 益 (B)				建設費③				維持管理費④		計③+④		費用 便益比 B/C	純 現在価値 B-C	備考
				便益①		残存価値②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値					
				便益	現在価値													
整備期間 (22年)	H29	0	1.000	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	H30	1	0.962	0.0	0.0			600.7	577.6	66.4	63.8	667.1	641.4					
	H31	2	0.925	159.1	147.1			548.7	507.3	102.1	94.4	650.8	601.7					
	H32	3	0.889	304.4	270.6			457.8	407.0	93.3	82.9	551.1	489.9					
	H33	4	0.855	425.7	363.9			436.4	373.0	77.8	66.5	514.2	439.5					
	H34	5	0.822	541.3	444.9			436.5	358.8	74.2	61.0	510.7	419.8					
	H35	6	0.790	656.9	519.2			453.3	358.2	74.2	58.7	527.5	416.9					
	H36	7	0.760	777.0	590.5			461.8	350.9	77.1	58.6	538.9	409.5					
	H37	8	0.731	899.3	657.1			439.7	321.3	78.5	57.3	518.2	378.6					
	H38	9	0.703	1,015.7	713.6			403.3	283.4	74.7	52.5	478.0	335.9					
	H39	10	0.676	1,122.6	758.4			343.1	231.8	68.6	46.4	411.7	278.2					
	H40	11	0.650	1,213.4	788.2			336.9	218.8	58.3	37.9	395.2	256.7					
	H41	12	0.625	1,302.7	813.7			332.5	207.7	57.3	35.8	389.8	243.5					
	H42	13	0.601	1,390.7	835.2			326.3	196.0	56.5	33.9	382.8	229.9					
	H43	14	0.577	1,477.2	853.0			325.6	188.0	55.5	32.0	381.1	220.0					
	H44	15	0.555	1,563.4	868.1			397.2	220.6	55.4	30.8	452.6	251.4					
	H45	16	0.534	1,668.6	890.9			427.9	228.5	67.5	36.0	495.4	264.5					
	H46	17	0.513	1,782.0	914.8			422.7	217.0	72.7	37.3	495.4	254.3					
	H47	18	0.494	1,893.9	934.9			395.0	195.0	71.9	35.5	466.9	230.5					
	H48	19	0.475	1,998.5	948.6			361.4	171.5	67.2	31.9	428.6	203.4					
	H49	20	0.456	2,094.3	955.8			361.6	165.0	61.4	28.0	423.0	193.0					
	H50	21	0.439	2,190.0	961.0			362.0	158.9	61.5	27.0	423.5	185.9					
H51	22	0.422	2,285.9	964.5			362.0	152.7	61.5	25.9	423.5	178.6						
施設完成後の 評価期間 (50年)	H52	23	0.406	2,381.8	966.4					61.5	24.9	61.5	24.9					
	H53	24	0.390	2,381.8	929.2					69.4	27.1	69.4	27.1					
	H54	25	0.375	2,381.8	893.5					69.4	26.0	69.4	26.0					
	H55	26	0.361	2,381.8	859.1					69.4	25.0	69.4	25.0					
	H56	27	0.347	2,381.8	826.0					69.4	24.1	69.4	24.1					
	H57	28	0.333	2,381.8	794.3					69.4	23.1	69.4	23.1					
	H58	29	0.321	2,381.8	763.7					69.4	22.3	69.4	22.3					
	H59	30	0.308	2,381.8	734.4					69.4	21.4	69.4	21.4					
	H60	31	0.296	2,381.8	706.1					69.4	20.6	69.4	20.6					
	H61	32	0.285	2,381.8	679.0					69.4	19.8	69.4	19.8					
	H62	33	0.274	2,381.8	652.8					69.4	19.0	69.4	19.0					
	H63	34	0.264	2,381.8	627.7					69.4	18.3	69.4	18.3					
	H64	35	0.253	2,381.8	603.6					69.4	17.6	69.4	17.6					
	H65	36	0.244	2,381.8	580.4					69.4	16.9	69.4	16.9					
	H66	37	0.234	2,381.8	558.0					69.4	16.3	69.4	16.3					
	H67	38	0.225	2,381.8	536.6					69.4	15.6	69.4	15.6					
	H68	39	0.217	2,381.8	515.9					69.4	15.0	69.4	15.0					
	H69	40	0.208	2,381.8	496.1					69.4	14.5	69.4	14.5					
	H70	41	0.200	2,381.8	477.0					69.4	13.9	69.4	13.9					
	H71	42	0.193	2,381.8	458.7					69.4	13.4	69.4	13.4					
	H72	43	0.185	2,381.8	441.0					69.4	12.9	69.4	12.9					
	H73	44	0.178	2,381.8	424.1					69.4	12.4	69.4	12.4					
	H74	45	0.171	2,381.8	407.8					69.4	11.9	69.4	11.9					
	H75	46	0.165	2,381.8	392.1					69.4	11.4	69.4	11.4					
	H76	47	0.158	2,381.8	377.0					69.4	11.0	69.4	11.0					
	H77	48	0.152	2,381.8	362.5					69.4	10.6	69.4	10.6					
	H78	49	0.146	2,381.8	348.6					69.4	10.2	69.4	10.2					
	H79	50	0.141	2,381.8	335.1					69.4	9.8	69.4	9.8					
	H80	51	0.135	2,381.8	322.3					69.4	9.4	69.4	9.4					
	H81	52	0.130	2,381.8	309.9					69.4	9.0	69.4	9.0					
	H82	53	0.125	2,381.8	297.9					69.4	8.7	69.4	8.7					
	H83	54	0.120	2,381.8	286.5					69.4	8.3	69.4	8.3					
	H84	55	0.116	2,381.8	275.5					69.4	8.0	69.4	8.0					
	H85	56	0.111	2,381.8	264.9					69.4	7.7	69.4	7.7					
H86	57	0.107	2,381.8	254.7					69.4	7.4	69.4	7.4						
H87	58	0.103	2,381.8	244.9					69.4	7.1	69.4	7.1						
H88	59	0.099	2,381.8	235.5					69.4	6.9	69.4	6.9						
H89	60	0.095	2,381.8	226.4					69.4	6.6	69.4	6.6						
H90	61	0.091	2,381.8	217.7					69.4	6.3	69.4	6.3						
H91	62	0.088	2,381.8	209.3					69.4	6.1	69.4	6.1						
H92	63	0.085	2,381.8	201.3					69.4	5.9	69.4	5.9						
H93	64	0.081	2,381.8	193.5					69.4	5.6	69.4	5.6						
H94	65	0.078	2,381.8	186.1					69.4	5.4	69.4	5.4						
H95	66	0.075	2,381.8	178.9					69.4	5.2	69.4	5.2						
H96	67	0.072	2,381.8	172.1					69.4	5.0	69.4	5.0						
H97	68	0.069	2,381.8	165.4					69.4	4.8	69.4	4.8						
H98	69	0.067	2,381.8	159.1					69.4	4.6	69.4	4.6						
H99	70	0.064	2,381.8	153.0					69.4	4.5	69.4	4.5						
H100	71	0.062	2,381.8	147.1					69.4	4.3	69.4	4.3						
H101	72	0.059	2,381.8	141.4					69.4	4.1	69.4	4.1						
合 計				141,089.0	36,495.6	13.0	36,508.6	8,992.4	6,089.0	4,995.7	1,651.6	13,849.3	7,740.6	4.72	28768.0			

様式 - 6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	上野遊水地事業（全体事業費）
-----	----------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費	本工事費		式				
			式	1	31,435		
		築堤	m	18,223	4,603		
		周囲堤	m	10,620	2,734		
		護岸	千m ²	197	3,445		
		河床掘削	千m ³	1,092	3,751		
		越流堤	箇所	4	1,702		
		樋門・樋管	箇所	36	4,738		
		排水機場	箇所	1	2,227		
		排水門	箇所	4	2,797		
		その他	式	1	5,438	集中管理システム・霞堤対策、陸間等	
	附帯工事費			式	1	2,889	
		道路橋	箇所	11	1,994		
		鉄道橋	箇所				
		水路橋	箇所				
		堰	箇所				
		樋門・樋管	箇所	16	333		
		揚排水機場	箇所				
		付替道路	m				
		鉄道盛土保護	式				
	その他	式	1	562	水路		
用地費及補償費			式	1	15,314		
	用地費		式	1	5,207		
	地役権		式	1	5,873		
	補償費		式	1	4,234		
間接経費			式	1	14,257		
工事諸費			式	1	7,806		
事業費 計			式	1	71,700		

維持管理費			式		4,370	S44～H49(69年間)
-------	--	--	---	--	-------	---------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	上野遊水地事業 (残事業費)
-----	----------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式				
	本工事費			式	1	6,195	
		築堤	m	600	1,310		
		周囲堤	m	0	0		
		護岸	千m ²	90	863		
		河床掘削	千m ³	1,041	3,345		
		越流堤	箇所	0	0		
		樋門・樋管	箇所	2	63		
		排水機場	箇所	0	0		
		排水門	箇所	0	0		
		その他	式	0	615	霞堤締切、陸閘等	
	附帯工事費			式	1	0	
		道路橋	箇所	0	0		
		鉄道橋	箇所	0	0		
		水路橋	箇所	0	0		
		堰	箇所	0	0		
		樋門・樋管	箇所	0	0		
		揚排水機場	箇所	0	0		
		付替道路	m	0	0		
		鉄道盛土保護	式	0	0		
その他	式	0	0				
用地費及補償費			式	1	12		
	用地費	式	1	12			
	地役権	式	1	0			
	補償費	式	1	0			
間接経費			式	1	1,840		
工事諸費			式	1	1,540		
事業費 計			式	1	9,588		


維持管理費		式			1,649	H30～H49(20年間)
-------	--	---	--	--	-------	---------------

淀川水系直轄河川改修事業

淀川特定構造物改築事業(阪神なんば線淀川橋梁)

様式 - 1

様式－1 氾濫ブロック分割図

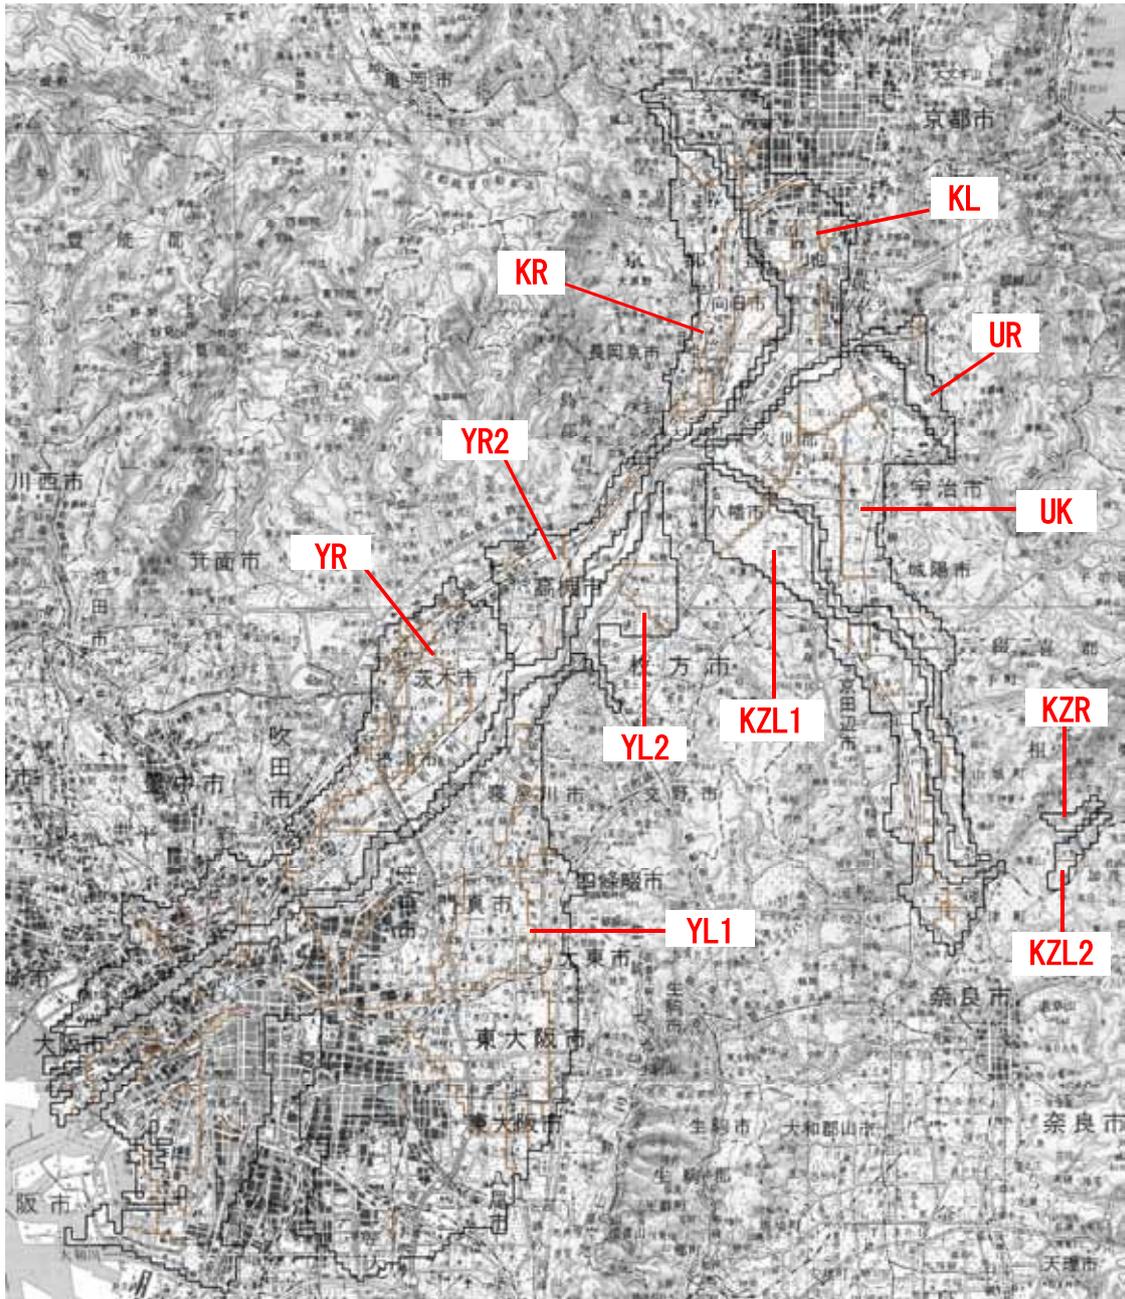

様式－2

様式-2

資産データ

水系名：淀川水系

河川名：淀川・宇治川・木津川・桂川

国勢調査年：平成22年

事業所統計調査年：平成26年

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額（百万円）						農作物被害額（百万円）			一般資産額等 合計	備考	
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類別に算出) (世帯)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
YL1-1	6,933	772,439	409,766	1,176,217	134	5,341	0	0	10,895,170	5,328,593	4,938,423	1,768,248	211	68	22,930,713	0	0	0	22,930,713	
YL1-2	17,035	2,088,921	919,557	955,167	1,442	11,582	222	12	23,627,977	11,957,916	3,446,013	1,781,666	2,275	730	40,816,577	180	69	249	40,816,826	
YL2	1,261	106,729	44,364	30,389	180	535	104	12	1,090,490	576,906	97,076	36,316	284	91	1,801,163	84	66	150	1,801,313	
YR1-1	2,869	379,693	195,524	237,917	135	2,554	0	0	5,209,654	2,542,599	825,715	416,656	213	68	8,994,905	0	0	0	8,994,905	
YR1-2	4,432	381,726	163,755	157,700	479	2,059	273	0	4,200,211	2,129,476	580,950	270,138	755	243	7,181,773	221	0	221	7,181,994	
YR2	1,888	143,891	60,781	63,954	224	689	185	10	1,406,134	790,391	267,080	87,875	353	113	2,551,946	150	54	204	2,552,150	
UKZ	5,273	197,480	77,629	91,648	1,101	1,047	1,688	337	2,110,523	1,009,490	318,287	178,241	1,738	558	3,618,837	1,429	1,415	2,844	3,621,681	
KL	3,817	297,839	136,569	191,684	706	1,569	99	12	3,161,475	1,775,938	759,797	370,322	1,113	358	6,069,003	84	49	133	6,069,136	
UR	673	46,336	18,705	14,992	95	194	7	15	391,262	243,245	48,547	22,868	149	48	706,119	6	61	67	706,186	
KR	3,066	223,432	89,811	83,628	612	1,079	300	7	2,174,362	1,167,907	289,528	157,104	965	310	3,790,176	254	31	285	3,790,461	
KZL1	3,738	88,416	35,735	40,001	766	489	1,576	144	984,649	464,698	142,281	62,485	1,208	388	1,655,709	1,334	607	1,941	1,657,650	
KZL2	251	4,207	1,497	1,255	47	14	109	2	27,463	19,468	3,649	1,523	74	24	52,201	93	9	102	52,303	
KZR	145	451	151	86	19	2	58	13	4,706	1,959	251	213	31	10	7,170	49	53	102	7,272	
合計	51,380	4,731,560	2,153,844	3,044,638	5,940	27,154	4,621	563	55,284,076	28,008,586	11,717,597	5,153,655	9,369	3,009	100,176,292	3,884	2,414	6,298	100,182,590	

様式－3

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/70

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用									
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計								
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/80

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計									
YR1-1	332,309.1	242,937.3	107,111.0	45,249.1	16.0	6.9	727,629.5	0.0	0.0	0.0	1,232,604.3	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	2,039,300.2	0.0				
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	332,309.1	242,937.3	107,111.0	45,249.1	16.0	6.9	727,629.5	0.0	0.0	0.0	1,232,604.3	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	2,039,300.2	0.0				

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/90

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計									
YR1-1	328,243.4	239,764.3	105,409.3	44,657.0	15.8	6.8	718,096.5	0.0	0.0	0.0	1,216,455.4	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	2,012,384.1	0.0				
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	328,243.4	239,764.3	105,409.3	44,657.0	15.8	6.8	718,096.5	0.0	0.0	0.0	1,216,455.4	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	2,012,384.1	0.0				

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/100

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計									
YR1-1	365,986.8	266,524.2	118,567.0	50,123.9	17.8	7.6	801,227.2	0.0	0.0	0.0	1,357,279.0	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,245,417.1	0.0				
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	365,986.8	266,524.2	118,567.0	50,123.9	17.8	7.6	801,227.2	0.0	0.0	0.0	1,357,279.0	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,245,417.1	0.0				

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等		小計					
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	379,719.0	276,479.2	123,149.0	52,036.0	18.5	7.9	831,409.6	0.0	0.0	0.0	1,408,407.9	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,329,912.2		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	379,719.0	276,479.2	123,149.0	52,036.0	18.5	7.9	831,409.6	0.0	0.0	0.0	1,408,407.9	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,329,912.2		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等		小計					
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	414,516.9	301,699.0	134,777.5	56,855.1	20.3	8.7	907,877.5	0.0	0.0	0.0	1,537,944.6	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.4	21,466.6	0.0	98,036.7	2,543,858.7		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	414,516.9	301,699.0	134,777.5	56,855.1	20.3	8.7	907,877.5	0.0	0.0	0.0	1,537,944.6	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.4	21,466.6	0.0	98,036.7	2,543,858.7		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備前

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等		小計					
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	429,475.4	313,357.8	139,271.4	59,023.2	21.3	9.0	941,158.1	0.0	0.0	0.0	1,594,321.9	43,873.2	17,337.5	17,951.3	35,288.8	22,279.6	0.0	101,441.6	2,636,921.6		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	443,185.3	310,172.5	520,454.4	114,478.3	8.3	3.1	1,388,301.8	0.0	0.0	0.0	2,351,783.4	145,962.5	18,063.1	18,553.2	36,616.4	50,077.7	0.0	232,656.6	3,972,741.9		
YL1-2	27,905.7	9,130.8	6,429.9	1,563.4	0.2	0.1	45,030.0	0.0	0.0	0.0	76,280.8	3,493.9	1,481.8	2,627.6	4,109.4	1,309.2	0.0	8,912.5	130,223.3		
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	900,566.3	632,661.0	666,155.7	175,064.9	29.8	12.2	2,374,489.9	0.0	0.0	0.0	4,022,386.1	193,329.6	36,882.5	39,132.1	76,014.6	73,666.6	0.0	343,010.8	6,739,886.8		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/70

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/80

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
YR1-1	365,540.0	267,231.0	117,822.1	49,774.0	17.6	7.6	800,392.3	0.0	0.0	0.0	1,355,864.7	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	2,235,323.4	0.0			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	365,540.0	267,231.0	117,822.1	49,774.0	17.6	7.6	800,392.3	0.0	0.0	0.0	1,355,864.7	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	2,235,323.4	0.0			

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/90

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
YR1-1	361,067.7	263,740.8	115,950.2	49,122.7	17.3	7.4	789,906.1	0.0	0.0	0.0	1,338,101.0	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	2,205,839.2	0.0			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	361,067.7	263,740.8	115,950.2	49,122.7	17.3	7.4	789,906.1	0.0	0.0	0.0	1,338,101.0	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	2,205,839.2	0.0			

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/100

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
YR1-1	402,585.5	293,176.6	130,423.7	55,136.3	19.6	8.4	881,350.1	0.0	0.0	0.0	1,493,006.9	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,461,267.9	0.0			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	402,585.5	293,176.6	130,423.7	55,136.3	19.6	8.4	881,350.1	0.0	0.0	0.0	1,493,006.9	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,461,267.9	0.0			

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額								農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫						代替活動等			小計							
YR1-1	417,690.9	304,127.2	135,463.9	57,239.6	20.3	8.7	914,550.6	0.0	0.0	0.0	1,549,248.7	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,553,894.0			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	417,690.9	304,127.2	135,463.9	57,239.6	20.3	8.7	914,550.6	0.0	0.0	0.0	1,549,248.7	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,553,894.0			

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額								農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫						代替活動等			小計							
YR1-1	455,968.6	331,868.9	148,255.2	62,540.6	22.4	9.5	998,665.2	0.0	0.0	0.0	1,691,739.0	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.3	21,466.6	0.0	98,036.6	2,788,440.8			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	455,968.6	331,868.9	148,255.2	62,540.6	22.4	9.5	998,665.2	0.0	0.0	0.0	1,691,739.0	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.3	21,466.6	0.0	98,036.6	2,788,440.8			

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備前：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額								農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価	家屋における応急対策費用										
			償却	在庫	償却	在庫						代替活動等			小計							
YR1-1	472,422.9	344,693.6	153,198.6	64,925.5	23.4	9.9	1,035,273.9	0.0	0.0	0.0	1,753,754.1	43,873.2	17,337.5	17,951.3	35,288.8	22,279.6	0.0	101,441.6	2,890,469.6			
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL1-1	487,503.8	341,189.7	572,499.8	125,926.1	9.2	3.4	1,527,132.0	0.0	0.0	0.0	2,586,961.8	145,962.5	18,063.1	18,553.2	36,616.3	50,077.7	0.0	232,656.5	4,346,750.3			
YL1-2	30,696.2	10,043.9	7,072.9	1,719.7	0.2	0.1	49,533.0	0.0	0.0	0.0	83,908.9	3,493.9	1,481.8	2,627.6	4,109.4	1,309.2	0.0	8,912.5	142,354.4			
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合計	990,622.9	695,927.2	732,771.3	192,571.3	32.8	13.4	2,611,938.9	0.0	0.0	0.0	4,424,624.8	193,329.6	36,882.4	39,132.1	76,014.5	73,666.5	0.0	343,010.6	7,379,574.3			

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70 なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計					
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80 なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計					
YR1-1	299,078.2	218,643.6	96,399.9	40,724.2	14.4	6.2	654,866.5	0.0	0.0	0.0	1,109,343.9	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	1,843,276.8	0.0
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	299,078.2	218,643.6	96,399.9	40,724.2	14.4	6.2	654,866.5	0.0	0.0	0.0	1,109,343.9	33,443.1	13,717.5	15,056.0	28,773.5	16,849.8	0.0	79,066.4	1,843,276.8	0.0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90 なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計					
YR1-1	295,419.0	215,787.9	94,868.4	40,191.3	14.2	6.1	646,286.9	0.0	0.0	0.0	1,094,809.9	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	1,818,928.9	0.0
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	295,419.0	215,787.9	94,868.4	40,191.3	14.2	6.1	646,286.9	0.0	0.0	0.0	1,094,809.9	32,822.9	13,549.0	14,870.0	28,419.0	16,590.2	0.0	77,832.1	1,818,928.9	0.0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100 なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用						
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計					
YR1-1	329,388.2	239,871.7	106,710.3	45,111.5	16.0	6.9	721,104.6	0.0	0.0	0.0	1,221,551.1	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,029,566.6	0.0
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	329,388.2	239,871.7	106,710.3	45,111.5	16.0	6.9	721,104.6	0.0	0.0	0.0	1,221,551.1	37,088.0	14,967.0	16,117.9	31,084.9	18,738.0	0.0	86,910.9	2,029,566.6	0.0

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	341,747.1	248,831.3	110,834.1	46,832.4	16.6	7.1	748,268.6	0.0	0.0	0.0	1,267,567.1	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,105,930.4		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	341,747.1	248,831.3	110,834.1	46,832.4	16.6	7.1	748,268.6	0.0	0.0	0.0	1,267,567.1	38,581.0	15,471.2	16,530.5	32,001.7	19,512.0	0.0	90,094.7	2,105,930.4		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	373,065.2	271,529.1	121,299.7	51,169.6	18.3	7.8	817,089.7	0.0	0.0	0.0	1,384,150.1	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.3	21,466.6	0.0	98,036.6	2,299,276.4		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	373,065.2	271,529.1	121,299.7	51,169.6	18.3	7.8	817,089.7	0.0	0.0	0.0	1,384,150.1	42,278.7	16,743.6	17,547.7	34,291.3	21,466.6	0.0	98,036.6	2,299,276.4		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備前：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	386,527.8	282,022.0	125,344.3	53,120.8	19.2	8.1	847,042.2	0.0	0.0	0.0	1,434,889.7	43,873.2	17,337.5	17,951.3	35,288.8	22,279.6	0.0	101,441.6	2,383,373.5		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	398,866.8	279,155.2	468,408.9	103,030.5	7.5	2.8	1,249,471.7	0.0	0.0	0.0	2,116,605.1	145,962.5	18,063.1	18,553.2	36,616.3	50,077.7	0.0	232,656.5	3,598,733.3		
YL1-2	25,115.1	8,217.7	5,786.9	1,407.1	0.2	0.1	40,527.1	0.0	0.0	0.0	68,652.7	3,493.9	1,481.8	2,627.6	4,109.4	1,309.2	0.0	8,912.5	118,092.3		
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	810,509.7	569,394.9	599,540.1	157,558.4	26.9	11.0	2,137,041.0	0.0	0.0	0.0	3,620,147.5	193,329.6	36,882.4	39,132.1	76,014.5	73,666.5	0.0	343,010.6	6,100,199.1		

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/70 なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等									
			償却	在庫	償却	在庫								小計									
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/80 なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等										
			償却	在庫	償却	在庫								小計										
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/90 なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等										
			償却	在庫	償却	在庫								小計										
YR1-1	295,873.9	215,701.9	94,345.7	39,996.0	14.0	6.0	645,937.4	0.0	0.0	0.0	1,094,218.0	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.4	1,810,291.8					
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	295,873.9	215,701.9	94,345.7	39,996.0	14.0	6.0	645,937.4	0.0	0.0	0.0	1,094,218.0	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.4	1,810,291.8					

水系名：淀川 河川名：淀川 流量規模：1/100 なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等										
			償却	在庫	償却	在庫								小計										
YR1-1	333,743.7	244,053.4	107,816.7	45,520.0	16.1	6.9	731,156.9	0.0	0.0	0.0	1,238,579.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	2,049,257.5					
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	333,743.7	244,053.4	107,816.7	45,520.0	16.1	6.9	731,156.9	0.0	0.0	0.0	1,238,579.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	2,049,257.5					

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	341,070.7	249,107.6	110,060.0	46,593.2	16.5	7.1	746,855.1	0.0	0.0	0.0	1,265,172.6	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	2,093,162.0		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	341,070.7	249,107.6	110,060.0	46,593.2	16.5	7.1	746,855.1	0.0	0.0	0.0	1,265,172.6	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	2,093,162.0		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	379,163.7	276,070.1	123,274.6	51,977.2	18.5	7.9	830,511.9	0.0	0.0	0.0	1,406,887.2	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.0	19,502.4	0.0	90,079.0	2,327,478.2		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	379,163.7	276,070.1	123,274.6	51,977.2	18.5	7.9	830,511.9	0.0	0.0	0.0	1,406,887.2	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.0	19,502.4	0.0	90,079.0	2,327,478.2		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備後

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	401,900.8	292,917.2	131,366.8	55,264.6	19.7	8.4	881,477.5	0.0	0.0	0.0	1,493,222.9	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,470,172.9		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	401,900.8	292,917.2	131,366.8	55,264.6	19.7	8.4	881,477.5	0.0	0.0	0.0	1,493,222.9	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,470,172.9		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/70

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/80

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/90

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	325,461.2	237,272.1	103,780.2	43,995.6	15.4	6.6	710,531.1	0.0	0.0	0.0	1,203,639.8	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.5	1,984,307.4		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	325,461.2	237,272.1	103,780.2	43,995.6	15.4	6.6	710,531.1	0.0	0.0	0.0	1,203,639.8	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.5	1,984,307.4		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/100

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	367,118.1	268,458.7	118,598.4	50,072.0	17.7	7.6	804,272.5	0.0	0.0	0.0	1,362,437.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	2,246,231.1		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	367,118.1	268,458.7	118,598.4	50,072.0	17.7	7.6	804,272.5	0.0	0.0	0.0	1,362,437.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	2,246,231.1		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設 等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対 価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	375,177.7	274,018.4	121,066.0	51,252.6	18.1	7.8	821,540.6	0.0	0.0	0.0	1,391,689.8	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	2,294,364.7		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	375,177.7	274,018.4	121,066.0	51,252.6	18.1	7.8	821,540.6	0.0	0.0	0.0	1,391,689.8	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	2,294,364.7		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設 等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対 価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	417,080.0	303,677.1	135,602.0	57,174.9	20.3	8.7	913,563.0	0.0	0.0	0.0	1,547,576.0	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.1	19,502.4	0.0	90,079.1	2,551,218.1		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	417,080.0	303,677.1	135,602.0	57,174.9	20.3	8.7	913,563.0	0.0	0.0	0.0	1,547,576.0	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.1	19,502.4	0.0	90,079.1	2,551,218.1		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備後：資産+10%

(単位：百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設 等被害額	営業停止損 失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	その他の間 接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対 価			代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫								小計							
YR1-1	442,090.8	322,208.9	144,503.5	60,791.1	21.7	9.3	969,625.3	0.0	0.0	0.0	1,642,545.1	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,707,643.0		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	442,090.8	322,208.9	144,503.5	60,791.1	21.7	9.3	969,625.3	0.0	0.0	0.0	1,642,545.1	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,707,643.0		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/70

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/80

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
YR1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/90

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
YR1-1	266,286.5	194,131.7	84,911.1	35,996.4	12.6	5.4	581,343.7	0.0	0.0	0.0	984,796.2	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.5	1,636,276.4		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	266,286.5	194,131.7	84,911.1	35,996.4	12.6	5.4	581,343.7	0.0	0.0	0.0	984,796.2	29,386.5	12,267.7	13,733.1	26,000.8	14,749.2	0.0	70,136.5	1,636,276.4		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/100

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働対価			代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
YR1-1	300,369.3	219,648.1	97,035.0	40,968.0	14.5	6.2	658,041.1	0.0	0.0	0.0	1,114,721.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	1,852,283.7		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	300,369.3	219,648.1	97,035.0	40,968.0	14.5	6.2	658,041.1	0.0	0.0	0.0	1,114,721.8	33,675.8	13,777.5	15,118.0	28,895.5	16,949.5	0.0	79,520.8	1,852,283.7		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/110

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	306,963.6	224,196.9	99,054.0	41,933.9	14.8	6.4	672,169.6	0.0	0.0	0.0	1,138,655.3	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	1,891,959.2		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	306,963.6	224,196.9	99,054.0	41,933.9	14.8	6.4	672,169.6	0.0	0.0	0.0	1,138,655.3	34,389.0	14,058.6	15,333.9	29,392.5	17,352.8	0.0	81,134.3	1,891,959.2		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/130

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	341,247.3	248,463.1	110,947.1	46,779.5	16.6	7.1	747,460.7	0.0	0.0	0.0	1,266,198.5	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.1	19,502.4	0.0	90,079.1	2,103,738.3		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	341,247.3	248,463.1	110,947.1	46,779.5	16.6	7.1	747,460.7	0.0	0.0	0.0	1,266,198.5	38,583.6	15,454.2	16,538.9	31,993.1	19,502.4	0.0	90,079.1	2,103,738.3		

水系名：淀川

河川名：淀川

流量規模：1/150

なんば線整備後：資産-10%

(単位：百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫								代替活動等	小計						
YR1-1	361,710.7	263,625.5	118,230.1	49,738.2	17.7	7.6	793,329.8	0.0	0.0	0.0	1,343,900.6	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,232,703.0		
YR1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL1-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YR2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YL2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	361,710.7	263,625.5	118,230.1	49,738.2	17.7	7.6	793,329.8	0.0	0.0	0.0	1,343,900.6	41,118.1	16,302.6	17,240.4	33,543.0	20,811.5	0.0	95,472.6	2,232,703.0		

様式－4

様式－ 4

年平均被害軽減期待額

水系名：淀川

河川名：淀川

対象河道：なんば線整備

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/70	0.01429	0.0	0.0	0.0	1,019,650.1	0.0	1,820.8	1,820.8	
1/80	0.01250	2,039,300.2	0.0	2,039,300.2	1,120,696.2	0.0	1,556.5	3,377.3	
1/90	0.01111	2,012,384.1	1,810,291.8	202,092.2	199,125.9	0.0	221.3	3,598.6	
1/100	0.01000	2,245,417.1	2,049,257.5	196,159.6	216,454.9	0.0	196.8	3,795.4	
1/110	0.00909	2,329,912.2	2,093,162.0	236,750.2	226,565.4	0.0	316.9	4,112.2	
1/130	0.00769	2,543,858.7	2,327,478.2	216,380.6	2,243,047.2	0.0	2,300.6	6,412.8	
1/150	0.00667	6,739,886.8	2,470,172.9	4,269,713.9					

様式－ 4

年平均被害軽減期待額

水系名：淀川

河川名：淀川

対象河道：なんば線整備：資産+10%

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/70	0.01429	0.0	0.0	0.0	1,117,661.7	0.0	1,995.8	1,995.8	
1/80	0.01250	2,235,323.4	0.0	2,235,323.4	1,228,427.6	0.0	1,706.1	3,702.0	
1/90	0.01111	2,205,839.2	1,984,307.4	221,531.8	218,284.3	0.0	242.5	3,944.5	
1/100	0.01000	2,461,267.9	2,246,231.1	215,036.8	237,283.1	0.0	215.7	4,160.2	
1/110	0.00909	2,553,894.0	2,294,364.7	259,529.3	248,376.0	0.0	347.4	4,507.6	
1/130	0.00769	2,788,440.8	2,551,218.1	237,222.7	2,454,577.0	0.0	2,517.5	7,025.1	
1/150	0.00667	7,379,574.3	2,707,643.0	4,671,931.3					

様式－ 4

年平均被害軽減期待額

水系名：淀川

河川名：淀川

対象河道：なんば線整備：資産-10%

(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/70	0.01429	0.0	0.0	0.0	921,638.4	0.0	1,645.8	1,645.8	
1/80	0.01250	1,843,276.8	0.0	1,843,276.8	1,012,964.7	0.0	1,406.9	3,052.7	
1/90	0.01111	1,818,928.9	1,636,276.4	182,652.5	179,967.7	0.0	200.0	3,252.6	
1/100	0.01000	2,029,566.6	1,852,283.7	177,282.9	195,627.1	0.0	177.8	3,430.5	
1/110	0.00909	2,105,930.4	1,891,959.2	213,971.2	204,754.7	0.0	286.4	3,716.9	
1/130	0.00769	2,299,276.4	2,103,738.3	195,538.1	2,031,517.1	0.0	2,083.6	5,800.5	
1/150	0.00667	6,100,199.1	2,232,703.0	3,867,496.1					

様式 - 5

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (32年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
	H31	2					3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
	H32	3					4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
	H33	4					2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
	H34	5					3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
	H35	6					4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
	H36	7					3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
	H37	8					3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
	H38	9					3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
	H39	10					1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
	H40	11					2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
	H41	12					5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
H42	13					3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7			
H43	14					3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4			
H44	15		6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0			
H45	16		6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0			
H46	17		6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0			
H47	18		6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0			
H48	19		6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0			
H49	20		6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0			
H50	21		6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0			
H51	22		6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0			
H52	23		6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0			
H53	24		6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0			
H54	25		6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0			
H55	26		6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0			
H56	27		6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0			
H57	28		6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0			
H58	29		6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0			
H59	30		6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0			
H60	31		6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0			
H61	32		6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0			
H62	33		6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0			
H63	34		6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0			
H64	35		6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0			
H65	36		6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0			
H66	37		6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0			
H67	38		6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0			
H68	39		6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0			
H69	40		6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0			
H70	41		6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0			
H71	42		6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0			
H72	43		6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0			
H73	44		6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0			
H74	45		6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0			
H75	46		6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0			
H76	47		6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0			
H77	48		6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0			
H78	49		6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0			
H79	50		6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0			
H80	51		6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0			
H81	52		6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0			
H82	53		6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0			
H83	54		6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0			
H84	55		6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0			
H85	56		6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0			
H86	57		6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0			
H87	58		6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0			
H88	59		6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0			
H89	60		6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0			
H90	61		6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0			
H91	62		6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0			
H92	63		6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0			
H93	64		6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0			
合 計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	49,687.2	38,722.2	0.0	0.0	49,687.2	38,722.2	2.05	40,830.6

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (32年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					887.7	853.6		0.0	887.7	853.6		
	H31	2					3,617.9	3,343.7		0.0	3,617.9	3,343.7		
	H32	3					4,408.8	3,918.9		0.0	4,408.8	3,918.9		
	H33	4					2,994.2	2,559.1		0.0	2,994.2	2,559.1		
	H34	5					4,241.6	3,485.3		0.0	4,241.6	3,485.3		
	H35	6					4,539.7	3,588.7		0.0	4,539.7	3,588.7		
	H36	7					4,338.4	3,296.7		0.0	4,338.4	3,296.7		
	H37	8					3,936.9	2,875.7		0.0	3,936.9	2,875.7		
	H38	9					3,586.0	2,520.0		0.0	3,586.0	2,520.0		
	H39	10					2,131.8	1,440.4		0.0	2,131.8	1,440.4		
	H40	11					2,717.0	1,765.4		0.0	2,717.0	1,765.4		
	H41	12					6,375.6	3,982.3		0.0	6,375.6	3,982.3		
	H42	13					4,189.9	2,516.5		0.0	4,189.9	2,516.5		
	H43	14					3,567.3	2,059.6		0.0	3,567.3	2,059.6		
施設完成後の評価期間 (50年)	H44	15	6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H45	16	6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H46	17	6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H47	18	6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H48	19	6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H49	20	6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H50	21	6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H51	22	6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H52	23	6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H53	24	6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H54	25	6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H55	26	6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H56	27	6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H57	28	6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H58	29	6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H59	30	6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H60	31	6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H61	32	6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H62	33	6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H63	34	6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H64	35	6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H65	36	6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H66	37	6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H67	38	6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H68	39	6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H69	40	6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H70	41	6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H71	42	6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H72	43	6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0	0.0		
	H73	44	6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0	0.0		
H74	45	6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0	0.0			
H75	46	6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0	0.0			
H76	47	6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0	0.0			
H77	48	6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0	0.0			
H78	49	6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0	0.0			
H79	50	6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0	0.0			
H80	51	6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0	0.0			
H81	52	6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0	0.0			
H82	53	6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0	0.0			
H83	54	6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0	0.0			
H84	55	6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0	0.0			
H85	56	6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0	0.0			
H86	57	6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0	0.0			
H87	58	6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0	0.0			
H88	59	6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0	0.0			
H89	60	6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0	0.0			
H90	61	6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0	0.0			
H91	62	6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0	0.0			
H92	63	6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0	0.0			
H93	64	6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0	0.0			
合 計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	54,372.0	42,195.4	0.0	0.0	54,372.0	42,195.4	1.89	37,357.4

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (32年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					726.3	698.4		0.0	726.3	698.4		
	H31	2					2,960.1	2,735.8		0.0	2,960.1	2,735.8		
	H32	3					3,607.2	3,206.4		0.0	3,607.2	3,206.4		
	H33	4					2,449.8	2,093.8		0.0	2,449.8	2,093.8		
	H34	5					3,470.4	2,851.6		0.0	3,470.4	2,851.6		
	H35	6					3,714.3	2,936.2		0.0	3,714.3	2,936.2		
	H36	7					3,549.6	2,697.3		0.0	3,549.6	2,697.3		
	H37	8					3,221.1	2,352.9		0.0	3,221.1	2,352.9		
	H38	9					2,934.0	2,061.8		0.0	2,934.0	2,061.8		
	H39	10					1,744.2	1,178.5		0.0	1,744.2	1,178.5		
	H40	11					2,223.0	1,444.4		0.0	2,223.0	1,444.4		
	H41	12					5,216.4	3,258.2		0.0	5,216.4	3,258.2		
	H42	13					3,428.1	2,058.9		0.0	3,428.1	2,058.9		
	H43	14					2,918.7	1,685.2		0.0	2,918.7	1,685.2		
H44	15		6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0			
H45	16		6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0			
H46	17		6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0			
H47	18		6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0			
H48	19		6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0			
H49	20		6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0			
H50	21		6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0			
H51	22		6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0			
H52	23		6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0			
H53	24		6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0			
H54	25		6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0			
H55	26		6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0			
H56	27		6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0			
H57	28		6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0			
H58	29		6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0			
H59	30		6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0			
H60	31		6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0			
H61	32		6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0			
H62	33		6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0			
H63	34		6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0			
H64	35		6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0			
H65	36		6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0			
H66	37		6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0			
H67	38		6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0			
H68	39		6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0			
H69	40		6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0			
H70	41		6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0			
H71	42		6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0			
H72	43		6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0			
H73	44		6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0			
H74	45		6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0			
H75	46		6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0			
H76	47		6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0			
H77	48		6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0			
H78	49		6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0			
H79	50		6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0			
H80	51		6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0			
H81	52		6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0			
H82	53		6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0			
H83	54		6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0			
H84	55		6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0			
H85	56		6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0			
H86	57		6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0			
H87	58		6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0			
H88	59		6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0			
H89	60		6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0			
H90	61		6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0			
H91	62		6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0			
H92	63		6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0			
H93	64		6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0			
合 計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	45,002.4	35,248.9	0.0	0.0	45,002.4	35,248.9	2.26	44,303.9

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (33年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					753.2	724.2		0.0	753.2	724.2		
	H31	2					2,904.3	2,684.2		0.0	2,904.3	2,684.2		
	H32	3					3,644.9	3,239.9		0.0	3,644.9	3,239.9		
	H33	4					2,797.7	2,391.2		0.0	2,797.7	2,391.2		
	H34	5					3,296.5	2,708.7		0.0	3,296.5	2,708.7		
	H35	6					3,761.5	2,973.5		0.0	3,761.5	2,973.5		
	H36	7					3,754.3	2,852.8		0.0	3,754.3	2,852.8		
	H37	8					3,510.7	2,564.5		0.0	3,510.7	2,564.5		
	H38	9					3,212.8	2,257.8		0.0	3,212.8	2,257.8		
	H39	10					2,602.0	1,758.1		0.0	2,602.0	1,758.1		
	H40	11					1,950.7	1,267.5		0.0	1,950.7	1,267.5		
	H41	12					2,970.5	1,855.4		0.0	2,970.5	1,855.4		
	H42	13					5,144.7	3,089.9		0.0	5,144.7	3,089.9		
	H43	14					3,517.3	2,030.8		0.0	3,517.3	2,030.8		
	H44	15					3,026.8	1,680.6		0.0	3,026.8	1,680.6		
施設完成後の評価期間 (50年)	H45	16	6,412.8	3,423.8						0.0	0.0	0.0		
	H46	17	6,412.8	3,292.0						0.0	0.0	0.0		
	H47	18	6,412.8	3,165.2						0.0	0.0	0.0		
	H48	19	6,412.8	3,043.6						0.0	0.0	0.0		
	H49	20	6,412.8	2,926.9						0.0	0.0	0.0		
	H50	21	6,412.8	2,813.9						0.0	0.0	0.0		
	H51	22	6,412.8	2,705.8						0.0	0.0	0.0		
	H52	23	6,412.8	2,601.5						0.0	0.0	0.0		
	H53	24	6,412.8	2,502.1						0.0	0.0	0.0		
	H54	25	6,412.8	2,405.4						0.0	0.0	0.0		
	H55	26	6,412.8	2,313.4						0.0	0.0	0.0		
	H56	27	6,412.8	2,224.3						0.0	0.0	0.0		
	H57	28	6,412.8	2,138.3						0.0	0.0	0.0		
	H58	29	6,412.8	2,056.0						0.0	0.0	0.0		
	H59	30	6,412.8	1,977.4						0.0	0.0	0.0		
	H60	31	6,412.8	1,901.2						0.0	0.0	0.0		
	H61	32	6,412.8	1,828.0						0.0	0.0	0.0		
	H62	33	6,412.8	1,757.9						0.0	0.0	0.0		
	H63	34	6,412.8	1,690.2						0.0	0.0	0.0		
	H64	35	6,412.8	1,625.1						0.0	0.0	0.0		
	H65	36	6,412.8	1,562.6						0.0	0.0	0.0		
	H66	37	6,412.8	1,502.5						0.0	0.0	0.0		
	H67	38	6,412.8	1,444.6						0.0	0.0	0.0		
	H68	39	6,412.8	1,389.3						0.0	0.0	0.0		
	H69	40	6,412.8	1,335.7						0.0	0.0	0.0		
	H70	41	6,412.8	1,284.4						0.0	0.0	0.0		
	H71	42	6,412.8	1,234.9						0.0	0.0	0.0		
	H72	43	6,412.8	1,187.6						0.0	0.0	0.0		
	H73	44	6,412.8	1,141.7						0.0	0.0	0.0		
	H74	45	6,412.8	1,097.9						0.0	0.0	0.0		
	H75	46	6,412.8	1,055.6						0.0	0.0	0.0		
H76	47	6,412.8	1,015.0						0.0	0.0	0.0			
H77	48	6,412.8	975.9						0.0	0.0	0.0			
H78	49	6,412.8	938.5						0.0	0.0	0.0			
H79	50	6,412.8	902.3						0.0	0.0	0.0			
H80	51	6,412.8	867.6						0.0	0.0	0.0			
H81	52	6,412.8	834.2						0.0	0.0	0.0			
H82	53	6,412.8	802.2						0.0	0.0	0.0			
H83	54	6,412.8	771.3						0.0	0.0	0.0			
H84	55	6,412.8	741.7						0.0	0.0	0.0			
H85	56	6,412.8	713.2						0.0	0.0	0.0			
H86	57	6,412.8	685.7						0.0	0.0	0.0			
H87	58	6,412.8	659.3						0.0	0.0	0.0			
H88	59	6,412.8	634.0						0.0	0.0	0.0			
H89	60	6,412.8	609.6						0.0	0.0	0.0			
H90	61	6,412.8	586.2						0.0	0.0	0.0			
H91	62	6,412.8	563.6						0.0	0.0	0.0			
H92	63	6,412.8	541.9						0.0	0.0	0.0			
H93	64	6,412.8	521.1						0.0	0.0	0.0			
H94	65	6,412.8	501.0						0.0	0.0	0.0			
合計			320,640	76,493	0	76,493	49,687	38,069	0	0	49,687	38,069	2.01	38,424.5

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (31年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					1,060.0	1,019.2		0.0	1,060.0	1,019.2		
	H31	2					3,652.6	3,375.8		0.0	3,652.6	3,375.8		
	H32	3					4,019.5	3,572.9		0.0	4,019.5	3,572.9		
	H33	4					3,280.3	2,803.7		0.0	3,280.3	2,803.7		
	H34	5					4,256.8	3,497.8		0.0	4,256.8	3,497.8		
	H35	6					4,360.0	3,446.6		0.0	4,360.0	3,446.6		
	H36	7					4,050.8	3,078.2		0.0	4,050.8	3,078.2		
	H37	8					3,658.0	2,672.0		0.0	3,658.0	2,672.0		
	H38	9					2,595.5	1,824.0		0.0	2,595.5	1,824.0		
	H39	10					2,496.3	1,686.7		0.0	2,496.3	1,686.7		
	H40	11					5,474.3	3,557.1		0.0	5,474.3	3,557.1		
H41	12					4,407.7	2,753.1		0.0	4,407.7	2,753.1			
H42	13					3,536.0	2,123.7		0.0	3,536.0	2,123.7			
施設完成後の評価期間 (50年)	H43	14	6,412.8	3,702.5						0.0	0.0	0.0		
	H44	15	6,412.8	3,560.7						0.0	0.0	0.0		
	H45	16	6,412.8	3,423.8						0.0	0.0	0.0		
	H46	17	6,412.8	3,292.0						0.0	0.0	0.0		
	H47	18	6,412.8	3,165.2						0.0	0.0	0.0		
	H48	19	6,412.8	3,043.6						0.0	0.0	0.0		
	H49	20	6,412.8	2,926.9						0.0	0.0	0.0		
	H50	21	6,412.8	2,813.9						0.0	0.0	0.0		
	H51	22	6,412.8	2,705.8						0.0	0.0	0.0		
	H52	23	6,412.8	2,601.5						0.0	0.0	0.0		
	H53	24	6,412.8	2,502.1						0.0	0.0	0.0		
	H54	25	6,412.8	2,405.4						0.0	0.0	0.0		
	H55	26	6,412.8	2,313.4						0.0	0.0	0.0		
	H56	27	6,412.8	2,224.3						0.0	0.0	0.0		
	H57	28	6,412.8	2,138.3						0.0	0.0	0.0		
	H58	29	6,412.8	2,056.0						0.0	0.0	0.0		
	H59	30	6,412.8	1,977.4						0.0	0.0	0.0		
	H60	31	6,412.8	1,901.2						0.0	0.0	0.0		
	H61	32	6,412.8	1,828.0						0.0	0.0	0.0		
	H62	33	6,412.8	1,757.9						0.0	0.0	0.0		
	H63	34	6,412.8	1,690.2						0.0	0.0	0.0		
	H64	35	6,412.8	1,625.1						0.0	0.0	0.0		
	H65	36	6,412.8	1,562.6						0.0	0.0	0.0		
	H66	37	6,412.8	1,502.5						0.0	0.0	0.0		
	H67	38	6,412.8	1,444.6						0.0	0.0	0.0		
	H68	39	6,412.8	1,389.3						0.0	0.0	0.0		
	H69	40	6,412.8	1,335.7						0.0	0.0	0.0		
	H70	41	6,412.8	1,284.4						0.0	0.0	0.0		
	H71	42	6,412.8	1,234.9						0.0	0.0	0.0		
	H72	43	6,412.8	1,187.6						0.0	0.0	0.0		
	H73	44	6,412.8	1,141.7						0.0	0.0	0.0		
H74	45	6,412.8	1,097.9						0.0	0.0	0.0			
H75	46	6,412.8	1,055.6						0.0	0.0	0.0			
H76	47	6,412.8	1,015.0						0.0	0.0	0.0			
H77	48	6,412.8	975.9						0.0	0.0	0.0			
H78	49	6,412.8	938.5						0.0	0.0	0.0			
H79	50	6,412.8	902.3						0.0	0.0	0.0			
H80	51	6,412.8	867.6						0.0	0.0	0.0			
H81	52	6,412.8	834.2						0.0	0.0	0.0			
H82	53	6,412.8	802.2						0.0	0.0	0.0			
H83	54	6,412.8	771.3						0.0	0.0	0.0			
H84	55	6,412.8	741.7						0.0	0.0	0.0			
H85	56	6,412.8	713.2						0.0	0.0	0.0			
H86	57	6,412.8	685.7						0.0	0.0	0.0			
H87	58	6,412.8	659.3						0.0	0.0	0.0			
H88	59	6,412.8	634.0						0.0	0.0	0.0			
H89	60	6,412.8	609.6						0.0	0.0	0.0			
H90	61	6,412.8	586.2						0.0	0.0	0.0			
H91	62	6,412.8	563.6						0.0	0.0	0.0			
H92	63	6,412.8	541.9						0.0	0.0	0.0			
合計			320,639.5	82,734.2	0.0	82,734.2	49,687.2	39,400.3	0.0	0.0	49,687.2	39,400.3	2.10	43,333.9

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (32年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
	H31	2					3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
	H32	3					4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
	H33	4					2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
	H34	5					3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
	H35	6					4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
	H36	7					3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
	H37	8					3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
	H38	9					3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
	H39	10					1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
	H40	11					2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
	H41	12					5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
	H42	13					3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7		
	H43	14					3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4		
H44	15		7,025.1	3,900.7					0.0	0.0	0.0			
H45	16		7,025.1	3,750.7					0.0	0.0	0.0			
H46	17		7,025.1	3,606.3					0.0	0.0	0.0			
H47	18		7,025.1	3,467.5					0.0	0.0	0.0			
H48	19		7,025.1	3,334.2					0.0	0.0	0.0			
H49	20		7,025.1	3,206.4					0.0	0.0	0.0			
H50	21		7,025.1	3,082.5					0.0	0.0	0.0			
H51	22		7,025.1	2,964.2					0.0	0.0	0.0			
H52	23		7,025.1	2,849.9					0.0	0.0	0.0			
H53	24		7,025.1	2,741.0					0.0	0.0	0.0			
H54	25		7,025.1	2,635.1					0.0	0.0	0.0			
H55	26		7,025.1	2,534.3					0.0	0.0	0.0			
H56	27		7,025.1	2,436.7					0.0	0.0	0.0			
H57	28		7,025.1	2,342.5					0.0	0.0	0.0			
H58	29		7,025.1	2,252.4					0.0	0.0	0.0			
H59	30		7,025.1	2,166.2					0.0	0.0	0.0			
H60	31		7,025.1	2,082.8					0.0	0.0	0.0			
H61	32		7,025.1	2,002.6					0.0	0.0	0.0			
H62	33		7,025.1	1,925.7					0.0	0.0	0.0			
H63	34		7,025.1	1,851.6					0.0	0.0	0.0			
H64	35		7,025.1	1,780.3					0.0	0.0	0.0			
H65	36		7,025.1	1,711.8					0.0	0.0	0.0			
H66	37		7,025.1	1,646.0					0.0	0.0	0.0			
H67	38		7,025.1	1,582.6					0.0	0.0	0.0			
H68	39		7,025.1	1,521.9					0.0	0.0	0.0			
H69	40		7,025.1	1,463.3					0.0	0.0	0.0			
H70	41		7,025.1	1,407.0					0.0	0.0	0.0			
H71	42		7,025.1	1,352.8					0.0	0.0	0.0			
H72	43		7,025.1	1,300.9					0.0	0.0	0.0			
H73	44		7,025.1	1,250.7					0.0	0.0	0.0			
H74	45		7,025.1	1,202.7					0.0	0.0	0.0			
H75	46		7,025.1	1,156.4					0.0	0.0	0.0			
H76	47		7,025.1	1,111.9					0.0	0.0	0.0			
H77	48		7,025.1	1,069.1					0.0	0.0	0.0			
H78	49		7,025.1	1,028.1					0.0	0.0	0.0			
H79	50		7,025.1	988.5					0.0	0.0	0.0			
H80	51		7,025.1	950.5					0.0	0.0	0.0			
H81	52		7,025.1	913.9					0.0	0.0	0.0			
H82	53		7,025.1	878.8					0.0	0.0	0.0			
H83	54		7,025.1	845.0					0.0	0.0	0.0			
H84	55		7,025.1	812.5					0.0	0.0	0.0			
H85	56		7,025.1	781.3					0.0	0.0	0.0			
H86	57		7,025.1	751.2					0.0	0.0	0.0			
H87	58		7,025.1	722.3					0.0	0.0	0.0			
H88	59		7,025.1	694.5					0.0	0.0	0.0			
H89	60		7,025.1	667.8					0.0	0.0	0.0			
H90	61		7,025.1	642.1					0.0	0.0	0.0			
H91	62		7,025.1	617.4					0.0	0.0	0.0			
H92	63		7,025.1	593.7					0.0	0.0	0.0			
H93	64		7,025.1	570.9					0.0	0.0	0.0			
合計			351,255.9	87,149.2	0.0	87,149.2	49,687.2	38,722.2	0.0	0.0	49,687.2	38,722.2	2.25	48,427.0

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (32年)	H12	-17					325.0	606.5		0.0	325.0	606.5		
	H13	-16					325.0	569.1		0.0	325.0	569.1		
	H14	-15					498.0	825.7		0.0	498.0	825.7		
	H15	-14					57.0	90.9		0.0	57.0	90.9		
	H16	-13					19.0	29.2		0.0	19.0	29.2		
	H17	-12					19.0	28.3		0.0	19.0	28.3		
	H18	-11					19.0	27.5		0.0	19.0	27.5		
	H19	-10					19.0	26.8		0.0	19.0	26.8		
	H20	-9					19.0	26.5		0.0	19.0	26.5		
	H21	-8					96.0	124.7		0.0	96.0	124.7		
	H22	-7					96.0	120.1		0.0	96.0	120.1		
	H23	-6					313.0	383.0		0.0	313.0	383.0		
	H24	-5					308.0	357.7		0.0	308.0	357.7		
	H25	-4					276.0	314.7		0.0	276.0	314.7		
	H26	-3					35.0	39.5		0.0	35.0	39.5		
	H27	-2					37.0	40.0		0.0	37.0	40.0		
	H28	-1					33.0	34.3		0.0	33.0	34.3		
	H29	0					345.0	345.0		0.0	345.0	345.0		
	H30	1					807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
	H31	2					3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
	H32	3					4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
	H33	4					2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
	H34	5					3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
	H35	6					4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
	H36	7					3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
	H37	8					3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
	H38	9					3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
	H39	10					1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
	H40	11					2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
	H41	12					5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
	H42	13					3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7		
	H43	14					3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4		
施設完成後の評価期間 (50年)	H44	15	5,800.5	3,220.7						0.0	0.0	0.0		
	H45	16	5,800.5	3,096.9						0.0	0.0	0.0		
	H46	17	5,800.5	2,977.7						0.0	0.0	0.0		
	H47	18	5,800.5	2,863.0						0.0	0.0	0.0		
	H48	19	5,800.5	2,752.9						0.0	0.0	0.0		
	H49	20	5,800.5	2,647.4						0.0	0.0	0.0		
	H50	21	5,800.5	2,545.2						0.0	0.0	0.0		
	H51	22	5,800.5	2,447.5						0.0	0.0	0.0		
	H52	23	5,800.5	2,353.1						0.0	0.0	0.0		
	H53	24	5,800.5	2,263.2						0.0	0.0	0.0		
	H54	25	5,800.5	2,175.7						0.0	0.0	0.0		
	H55	26	5,800.5	2,092.5						0.0	0.0	0.0		
	H56	27	5,800.5	2,012.0						0.0	0.0	0.0		
	H57	28	5,800.5	1,934.1						0.0	0.0	0.0		
	H58	29	5,800.5	1,859.7						0.0	0.0	0.0		
	H59	30	5,800.5	1,788.6						0.0	0.0	0.0		
	H60	31	5,800.5	1,719.7						0.0	0.0	0.0		
	H61	32	5,800.5	1,653.5						0.0	0.0	0.0		
	H62	33	5,800.5	1,590.0						0.0	0.0	0.0		
	H63	34	5,800.5	1,528.9						0.0	0.0	0.0		
	H64	35	5,800.5	1,470.0						0.0	0.0	0.0		
	H65	36	5,800.5	1,413.4						0.0	0.0	0.0		
	H66	37	5,800.5	1,359.1						0.0	0.0	0.0		
	H67	38	5,800.5	1,306.7						0.0	0.0	0.0		
	H68	39	5,800.5	1,256.6						0.0	0.0	0.0		
	H69	40	5,800.5	1,208.2						0.0	0.0	0.0		
	H70	41	5,800.5	1,161.7						0.0	0.0	0.0		
	H71	42	5,800.5	1,117.0						0.0	0.0	0.0		
	H72	43	5,800.5	1,074.2						0.0	0.0	0.0		
	H73	44	5,800.5	1,032.7						0.0	0.0	0.0		
	H74	45	5,800.5	993.1						0.0	0.0	0.0		
H75	46	5,800.5	954.8						0.0	0.0	0.0			
H76	47	5,800.5	918.1						0.0	0.0	0.0			
H77	48	5,800.5	882.7						0.0	0.0	0.0			
H78	49	5,800.5	848.9						0.0	0.0	0.0			
H79	50	5,800.5	816.2						0.0	0.0	0.0			
H80	51	5,800.5	784.8						0.0	0.0	0.0			
H81	52	5,800.5	754.6						0.0	0.0	0.0			
H82	53	5,800.5	725.6						0.0	0.0	0.0			
H83	54	5,800.5	697.7						0.0	0.0	0.0			
H84	55	5,800.5	670.9						0.0	0.0	0.0			
H85	56	5,800.5	645.1						0.0	0.0	0.0			
H86	57	5,800.5	620.2						0.0	0.0	0.0			
H87	58	5,800.5	596.4						0.0	0.0	0.0			
H88	59	5,800.5	573.5						0.0	0.0	0.0			
H89	60	5,800.5	551.4						0.0	0.0	0.0			
H90	61	5,800.5	530.2						0.0	0.0	0.0			
H91	62	5,800.5	509.8						0.0	0.0	0.0			
H92	63	5,800.5	490.2						0.0	0.0	0.0			
H93	64	5,800.5	471.4						0.0	0.0	0.0			
合 計			290,023.1	71,957.5	0.0	71,957.5	49,687.2	38,722.2	0.0	0.0	49,687.2	38,722.2	1.86	33,235.3

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (14年)	残事業期間	H30	1				807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
		H31	2				3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
		H32	3				4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
		H33	4				2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
		H34	5				3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
		H35	6				4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
		H36	7				3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
		H37	8				3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
		H38	9				3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
		H39	10				1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
		H40	11				2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
		H41	12				5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
		H42	13				3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7		
		H43	14				3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4		
施設完成後の評価期間 (50年)		H45	15	6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0		
		H46	16	6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0		
		H47	17	6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0		
		H48	18	6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0		
		H49	19	6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0		
		H50	20	6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0		
		H51	21	6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0		
		H52	22	6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0		
		H53	23	6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0		
		H54	24	6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0		
		H55	25	6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0		
		H56	26	6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0		
		H57	27	6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0		
		H58	28	6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0		
		H59	29	6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0		
		H60	30	6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0		
		H61	31	6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0		
		H62	32	6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0		
		H63	33	6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0		
		H64	34	6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0		
		H65	35	6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0		
		H66	36	6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0		
		H67	37	6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0		
		H68	38	6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0		
		H69	39	6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0		
		H70	40	6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0		
		H71	41	6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0		
		H72	42	6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0		
		H73	43	6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0		
		H74	44	6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0		
		H75	45	6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0		
H76	46	6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0				
H77	47	6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0				
H78	48	6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0				
H79	49	6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0				
H80	50	6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0				
H81	51	6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0				
H82	52	6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0				
H83	53	6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0				
H84	54	6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0				
H85	55	6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0				
H86	56	6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0				
H87	57	6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0				
H88	58	6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0				
H89	59	6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0				
H90	60	6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0				
H91	61	6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0				
H92	62	6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0				
H93	63	6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0				
H94	64	6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0				
合計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	46,848.0	34,732.7	0.0	0.0	46,848.0	34,732.7	2.29	44,820.1

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (14年)	残事業期間	H30	1				887.7	853.6		0.0	887.7	853.6		
		H31	2				3,617.9	3,343.7		0.0	3,617.9	3,343.7		
		H32	3				4,408.8	3,918.9		0.0	4,408.8	3,918.9		
		H33	4				2,994.2	2,559.1		0.0	2,994.2	2,559.1		
		H34	5				4,241.6	3,485.3		0.0	4,241.6	3,485.3		
		H35	6				4,539.7	3,588.7		0.0	4,539.7	3,588.7		
		H36	7				4,338.4	3,296.7		0.0	4,338.4	3,296.7		
		H37	8				3,936.9	2,875.7		0.0	3,936.9	2,875.7		
		H38	9				3,586.0	2,520.0		0.0	3,586.0	2,520.0		
		H39	10				2,131.8	1,440.4		0.0	2,131.8	1,440.4		
		H40	11				2,717.0	1,765.4		0.0	2,717.0	1,765.4		
		H41	12				6,375.6	3,982.3		0.0	6,375.6	3,982.3		
		H42	13				4,189.9	2,516.5		0.0	4,189.9	2,516.5		
		H43	14				3,567.3	2,059.6		0.0	3,567.3	2,059.6		
施設完成後の評価期間 (50年)		H45	15	6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0		
		H46	16	6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0		
		H47	17	6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0		
		H48	18	6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0		
		H49	19	6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0		
		H50	20	6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0		
		H51	21	6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0		
		H52	22	6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0		
		H53	23	6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0		
		H54	24	6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0		
		H55	25	6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0		
		H56	26	6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0		
		H57	27	6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0		
		H58	28	6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0		
		H59	29	6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0		
		H60	30	6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0		
		H61	31	6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0		
		H62	32	6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0		
		H63	33	6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0		
		H64	34	6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0		
		H65	35	6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0		
		H66	36	6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0		
		H67	37	6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0		
		H68	38	6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0		
		H69	39	6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0		
		H70	40	6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0		
		H71	41	6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0		
		H72	42	6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0		
		H73	43	6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0		
		H74	44	6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0		
		H75	45	6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0		
H76	46	6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0				
H77	47	6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0				
H78	48	6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0				
H79	49	6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0				
H80	50	6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0				
H81	51	6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0				
H82	52	6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0				
H83	53	6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0				
H84	54	6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0				
H85	55	6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0				
H86	56	6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0				
H87	57	6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0				
H88	58	6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0				
H89	59	6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0				
H90	60	6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0				
H91	61	6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0				
H92	62	6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0				
H93	63	6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0				
H94	64	6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0				
合計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	51,532.8	38,205.9	0.0	0.0	51,532.8	38,205.9	2.08	41,346.9

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (14年)	残事業期間	H30	1				726.3	698.4		0.0	726.3	698.4		
		H31	2				2,960.1	2,735.8		0.0	2,960.1	2,735.8		
		H32	3				3,607.2	3,206.4		0.0	3,607.2	3,206.4		
		H33	4				2,449.8	2,093.8		0.0	2,449.8	2,093.8		
		H34	5				3,470.4	2,851.6		0.0	3,470.4	2,851.6		
		H35	6				3,714.3	2,936.2		0.0	3,714.3	2,936.2		
		H36	7				3,549.6	2,697.3		0.0	3,549.6	2,697.3		
		H37	8				3,221.1	2,352.9		0.0	3,221.1	2,352.9		
		H38	9				2,934.0	2,061.8		0.0	2,934.0	2,061.8		
		H39	10				1,744.2	1,178.5		0.0	1,744.2	1,178.5		
		H40	11				2,223.0	1,444.4		0.0	2,223.0	1,444.4		
		H41	12				5,216.4	3,258.2		0.0	5,216.4	3,258.2		
		H42	13				3,428.1	2,058.9		0.0	3,428.1	2,058.9		
		H43	14				2,918.7	1,685.2		0.0	2,918.7	1,685.2		
施設完成後の評価期間 (50年)		H45	15	6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0		
		H46	16	6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0		
		H47	17	6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0		
		H48	18	6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0		
		H49	19	6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0		
		H50	20	6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0		
		H51	21	6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0		
		H52	22	6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0		
		H53	23	6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0		
		H54	24	6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0		
		H55	25	6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0		
		H56	26	6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0		
		H57	27	6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0		
		H58	28	6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0		
		H59	29	6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0		
		H60	30	6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0		
		H61	31	6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0		
		H62	32	6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0		
		H63	33	6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0		
		H64	34	6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0		
		H65	35	6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0		
		H66	36	6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0		
		H67	37	6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0		
		H68	38	6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0		
		H69	39	6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0		
		H70	40	6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0		
		H71	41	6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0		
		H72	42	6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0		
		H73	43	6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0		
		H74	44	6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0		
		H75	45	6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0		
H76	46	6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0				
H77	47	6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0				
H78	48	6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0				
H79	49	6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0				
H80	50	6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0				
H81	51	6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0				
H82	52	6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0				
H83	53	6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0				
H84	54	6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0				
H85	55	6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0				
H86	56	6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0				
H87	57	6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0				
H88	58	6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0				
H89	59	6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0				
H90	60	6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0				
H91	61	6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0				
H92	62	6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0				
H93	63	6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0				
H94	64	6,412.8	521.1					0.0	0.0	0.0				
合計			320,639.5	79,552.8	0.0	79,552.8	42,163.2	31,259.4	0.0	0.0	42,163.2	31,259.4	2.54	48,293.4

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
事業期間 (15年)	残事業期間	H30	1					753.2	724.2		0.0	753.2	724.2			
		H31	2					2,904.3	2,684.2		0.0	2,904.3	2,684.2			
		H32	3					3,644.9	3,239.9		0.0	3,644.9	3,239.9			
		H33	4					2,797.7	2,391.2		0.0	2,797.7	2,391.2			
		H34	5					3,296.5	2,708.7		0.0	3,296.5	2,708.7			
		H35	6					3,761.5	2,973.5		0.0	3,761.5	2,973.5			
		H36	7					3,754.3	2,852.8		0.0	3,754.3	2,852.8			
		H37	8					3,510.7	2,564.5		0.0	3,510.7	2,564.5			
		H38	9					3,212.8	2,257.8		0.0	3,212.8	2,257.8			
		H39	10					2,602.0	1,758.1		0.0	2,602.0	1,758.1			
		H40	11					1,950.7	1,267.5		0.0	1,950.7	1,267.5			
		H41	12					2,970.5	1,855.4		0.0	2,970.5	1,855.4			
		H42	13					5,144.7	3,089.9		0.0	5,144.7	3,089.9			
		H43	14					3,517.3	2,030.8		0.0	3,517.3	2,030.8			
		H44	15					3,026.8	1,680.6		0.0	3,026.8	1,680.6			
施設完成後の 評価期間 (50年)		H45	16	6,412.8	3,423.8						0.0	0.0	0.0			
		H46	17	6,412.8	3,292.0							0.0	0.0	0.0		
		H47	18	6,412.8	3,165.2							0.0	0.0	0.0		
		H48	19	6,412.8	3,043.6							0.0	0.0	0.0		
		H49	20	6,412.8	2,926.9							0.0	0.0	0.0		
		H50	21	6,412.8	2,813.9							0.0	0.0	0.0		
		H51	22	6,412.8	2,705.8							0.0	0.0	0.0		
		H52	23	6,412.8	2,601.5							0.0	0.0	0.0		
		H53	24	6,412.8	2,502.1							0.0	0.0	0.0		
		H54	25	6,412.8	2,405.4							0.0	0.0	0.0		
		H55	26	6,412.8	2,313.4							0.0	0.0	0.0		
		H56	27	6,412.8	2,224.3							0.0	0.0	0.0		
		H57	28	6,412.8	2,138.3							0.0	0.0	0.0		
		H58	29	6,412.8	2,056.0							0.0	0.0	0.0		
		H59	30	6,412.8	1,977.4							0.0	0.0	0.0		
		H60	31	6,412.8	1,901.2							0.0	0.0	0.0		
		H61	32	6,412.8	1,828.0							0.0	0.0	0.0		
		H62	33	6,412.8	1,757.9							0.0	0.0	0.0		
		H63	34	6,412.8	1,690.2							0.0	0.0	0.0		
		H64	35	6,412.8	1,625.1							0.0	0.0	0.0		
		H65	36	6,412.8	1,562.6							0.0	0.0	0.0		
		H66	37	6,412.8	1,502.5							0.0	0.0	0.0		
		H67	38	6,412.8	1,444.6							0.0	0.0	0.0		
		H68	39	6,412.8	1,389.3							0.0	0.0	0.0		
		H69	40	6,412.8	1,335.7							0.0	0.0	0.0		
		H70	41	6,412.8	1,284.4							0.0	0.0	0.0		
		H71	42	6,412.8	1,234.9							0.0	0.0	0.0		
		H72	43	6,412.8	1,187.6							0.0	0.0	0.0		
		H73	44	6,412.8	1,141.7							0.0	0.0	0.0		
		H74	45	6,412.8	1,097.9							0.0	0.0	0.0		
H75	46	6,412.8	1,055.6							0.0	0.0	0.0				
H76	47	6,412.8	1,015.0							0.0	0.0	0.0				
H77	48	6,412.8	975.9							0.0	0.0	0.0				
H78	49	6,412.8	938.5							0.0	0.0	0.0				
H79	50	6,412.8	902.3							0.0	0.0	0.0				
H80	51	6,412.8	867.6							0.0	0.0	0.0				
H81	52	6,412.8	834.2							0.0	0.0	0.0				
H82	53	6,412.8	802.2							0.0	0.0	0.0				
H83	54	6,412.8	771.3							0.0	0.0	0.0				
H84	55	6,412.8	741.7							0.0	0.0	0.0				
H85	56	6,412.8	713.2							0.0	0.0	0.0				
H86	57	6,412.8	685.7							0.0	0.0	0.0				
H87	58	6,412.8	659.3							0.0	0.0	0.0				
H88	59	6,412.8	634.0							0.0	0.0	0.0				
H89	60	6,412.8	609.6							0.0	0.0	0.0				
H90	61	6,412.8	586.2							0.0	0.0	0.0				
H91	62	6,412.8	563.6							0.0	0.0	0.0				
H92	63	6,412.8	541.9							0.0	0.0	0.0				
H93	64	6,412.8	521.1							0.0	0.0	0.0				
H94	65	6,412.8	501.0							0.0	0.0	0.0				
合 計				320,640	76,493	0	76,493	46,848	34,079	0	0	46,848	34,079	2.24	42,414.0	

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
事業期間 (13年)	残事業期間	H30	1				1,060.0	1,019.2		0.0	1,060.0	1,019.2		
		H31	2				3,652.6	3,375.8		0.0	3,652.6	3,375.8		
		H32	3				4,019.5	3,572.9		0.0	4,019.5	3,572.9		
		H33	4				3,280.3	2,803.7		0.0	3,280.3	2,803.7		
		H34	5				4,256.8	3,497.8		0.0	4,256.8	3,497.8		
		H35	6				4,360.0	3,446.6		0.0	4,360.0	3,446.6		
		H36	7				4,050.8	3,078.2		0.0	4,050.8	3,078.2		
		H37	8				3,658.0	2,672.0		0.0	3,658.0	2,672.0		
		H38	9				2,595.5	1,824.0		0.0	2,595.5	1,824.0		
		H39	10				2,496.3	1,686.7		0.0	2,496.3	1,686.7		
		H40	11				5,474.3	3,557.1		0.0	5,474.3	3,557.1		
		H41	12				4,407.7	2,753.1		0.0	4,407.7	2,753.1		
		H42	13				3,536.0	2,123.7		0.0	3,536.0	2,123.7		
施設完成後の評価期間 (50年)		H43	14	6,412.8	3,702.5					0.0	0.0	0.0		
		H44	15	6,412.8	3,560.7					0.0	0.0	0.0		
		H45	16	6,412.8	3,423.8					0.0	0.0	0.0		
		H46	17	6,412.8	3,292.0					0.0	0.0	0.0		
		H47	18	6,412.8	3,165.2					0.0	0.0	0.0		
		H48	19	6,412.8	3,043.6					0.0	0.0	0.0		
		H49	20	6,412.8	2,926.9					0.0	0.0	0.0		
		H50	21	6,412.8	2,813.9					0.0	0.0	0.0		
		H51	22	6,412.8	2,705.8					0.0	0.0	0.0		
		H52	23	6,412.8	2,601.5					0.0	0.0	0.0		
		H53	24	6,412.8	2,502.1					0.0	0.0	0.0		
		H54	25	6,412.8	2,405.4					0.0	0.0	0.0		
		H55	26	6,412.8	2,313.4					0.0	0.0	0.0		
		H56	27	6,412.8	2,224.3					0.0	0.0	0.0		
		H57	28	6,412.8	2,138.3					0.0	0.0	0.0		
		H58	29	6,412.8	2,056.0					0.0	0.0	0.0		
		H59	30	6,412.8	1,977.4					0.0	0.0	0.0		
		H60	31	6,412.8	1,901.2					0.0	0.0	0.0		
		H61	32	6,412.8	1,828.0					0.0	0.0	0.0		
		H62	33	6,412.8	1,757.9					0.0	0.0	0.0		
		H63	34	6,412.8	1,690.2					0.0	0.0	0.0		
		H64	35	6,412.8	1,625.1					0.0	0.0	0.0		
		H65	36	6,412.8	1,562.6					0.0	0.0	0.0		
		H66	37	6,412.8	1,502.5					0.0	0.0	0.0		
		H67	38	6,412.8	1,444.6					0.0	0.0	0.0		
		H68	39	6,412.8	1,389.3					0.0	0.0	0.0		
		H69	40	6,412.8	1,335.7					0.0	0.0	0.0		
		H70	41	6,412.8	1,284.4					0.0	0.0	0.0		
		H71	42	6,412.8	1,234.9					0.0	0.0	0.0		
		H72	43	6,412.8	1,187.6					0.0	0.0	0.0		
		H73	44	6,412.8	1,141.7					0.0	0.0	0.0		
		H74	45	6,412.8	1,097.9					0.0	0.0	0.0		
		H75	46	6,412.8	1,055.6					0.0	0.0	0.0		
		H76	47	6,412.8	1,015.0					0.0	0.0	0.0		
H77	48	6,412.8	975.9					0.0	0.0	0.0				
H78	49	6,412.8	938.5					0.0	0.0	0.0				
H79	50	6,412.8	902.3					0.0	0.0	0.0				
H80	51	6,412.8	867.6					0.0	0.0	0.0				
H81	52	6,412.8	834.2					0.0	0.0	0.0				
H82	53	6,412.8	802.2					0.0	0.0	0.0				
H83	54	6,412.8	771.3					0.0	0.0	0.0				
H84	55	6,412.8	741.7					0.0	0.0	0.0				
H85	56	6,412.8	713.2					0.0	0.0	0.0				
H86	57	6,412.8	685.7					0.0	0.0	0.0				
H87	58	6,412.8	659.3					0.0	0.0	0.0				
H88	59	6,412.8	634.0					0.0	0.0	0.0				
H89	60	6,412.8	609.6					0.0	0.0	0.0				
H90	61	6,412.8	586.2					0.0	0.0	0.0				
H91	62	6,412.8	563.6					0.0	0.0	0.0				
H92	63	6,412.8	541.9					0.0	0.0	0.0				
合計			320,639.5	82,734.2	0.0	82,734.2	46,848.0	35,410.8	0.0	0.0	46,848.0	35,410.8	2.34	47,323.4

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
事業期間 (14年)	残事業期間	H30	1					807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
		H31	2					3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
		H32	3					4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
		H33	4					2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
		H34	5					3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
		H35	6					4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
		H36	7					3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
		H37	8					3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
		H38	9					3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
		H39	10					1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
		H40	11					2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
		H41	12					5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
		H42	13					3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7		
		H43	14					3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4		
施設完成後の評価期間 (50年)		H45	15	7,025.1	3,900.7						0.0	0.0	0.0		
		H46	16	7,025.1	3,750.7						0.0	0.0	0.0		
		H47	17	7,025.1	3,606.3						0.0	0.0	0.0		
		H48	18	7,025.1	3,467.5						0.0	0.0	0.0		
		H49	19	7,025.1	3,334.2						0.0	0.0	0.0		
		H50	20	7,025.1	3,206.4						0.0	0.0	0.0		
		H51	21	7,025.1	3,082.5						0.0	0.0	0.0		
		H52	22	7,025.1	2,964.2						0.0	0.0	0.0		
		H53	23	7,025.1	2,849.9						0.0	0.0	0.0		
		H54	24	7,025.1	2,741.0						0.0	0.0	0.0		
		H55	25	7,025.1	2,635.1						0.0	0.0	0.0		
		H56	26	7,025.1	2,534.3						0.0	0.0	0.0		
		H57	27	7,025.1	2,436.7						0.0	0.0	0.0		
		H58	28	7,025.1	2,342.5						0.0	0.0	0.0		
		H59	29	7,025.1	2,252.4						0.0	0.0	0.0		
		H60	30	7,025.1	2,166.2						0.0	0.0	0.0		
		H61	31	7,025.1	2,082.8						0.0	0.0	0.0		
		H62	32	7,025.1	2,002.6						0.0	0.0	0.0		
		H63	33	7,025.1	1,925.7						0.0	0.0	0.0		
		H64	34	7,025.1	1,851.6						0.0	0.0	0.0		
		H65	35	7,025.1	1,780.3						0.0	0.0	0.0		
		H66	36	7,025.1	1,711.8						0.0	0.0	0.0		
		H67	37	7,025.1	1,646.0						0.0	0.0	0.0		
		H68	38	7,025.1	1,582.6						0.0	0.0	0.0		
		H69	39	7,025.1	1,521.9						0.0	0.0	0.0		
		H70	40	7,025.1	1,463.3						0.0	0.0	0.0		
		H71	41	7,025.1	1,407.0						0.0	0.0	0.0		
		H72	42	7,025.1	1,352.8						0.0	0.0	0.0		
		H73	43	7,025.1	1,300.9						0.0	0.0	0.0		
		H74	44	7,025.1	1,250.7						0.0	0.0	0.0		
		H75	45	7,025.1	1,202.7						0.0	0.0	0.0		
H76	46	7,025.1	1,156.4						0.0	0.0	0.0				
H77	47	7,025.1	1,111.9						0.0	0.0	0.0				
H78	48	7,025.1	1,069.1						0.0	0.0	0.0				
H79	49	7,025.1	1,028.1						0.0	0.0	0.0				
H80	50	7,025.1	988.5						0.0	0.0	0.0				
H81	51	7,025.1	950.5						0.0	0.0	0.0				
H82	52	7,025.1	913.9						0.0	0.0	0.0				
H83	53	7,025.1	878.8						0.0	0.0	0.0				
H84	54	7,025.1	845.0						0.0	0.0	0.0				
H85	55	7,025.1	812.5						0.0	0.0	0.0				
H86	56	7,025.1	781.3						0.0	0.0	0.0				
H87	57	7,025.1	751.2						0.0	0.0	0.0				
H88	58	7,025.1	722.3						0.0	0.0	0.0				
H89	59	7,025.1	694.5						0.0	0.0	0.0				
H90	60	7,025.1	667.8						0.0	0.0	0.0				
H91	61	7,025.1	642.1						0.0	0.0	0.0				
H92	62	7,025.1	617.4						0.0	0.0	0.0				
H93	63	7,025.1	593.7						0.0	0.0	0.0				
H94	64	7,025.1	570.9						0.0	0.0	0.0				
合計			351,255.9	87,149.2	0.0	87,149.2	46,848.0	34,732.7	0.0	0.0	46,848.0	34,732.7	2.51	52,416.5	

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
事業期間 (14年)	残事業期間	H30	1					807.0	776.0		0.0	807.0	776.0		
		H31	2					3,289.0	3,039.7		0.0	3,289.0	3,039.7		
		H32	3					4,008.0	3,562.7		0.0	4,008.0	3,562.7		
		H33	4					2,722.0	2,326.5		0.0	2,722.0	2,326.5		
		H34	5					3,856.0	3,168.4		0.0	3,856.0	3,168.4		
		H35	6					4,127.0	3,262.5		0.0	4,127.0	3,262.5		
		H36	7					3,944.0	2,997.0		0.0	3,944.0	2,997.0		
		H37	8					3,579.0	2,614.3		0.0	3,579.0	2,614.3		
		H38	9					3,260.0	2,290.9		0.0	3,260.0	2,290.9		
		H39	10					1,938.0	1,309.5		0.0	1,938.0	1,309.5		
		H40	11					2,470.0	1,604.9		0.0	2,470.0	1,604.9		
		H41	12					5,796.0	3,620.2		0.0	5,796.0	3,620.2		
		H42	13					3,809.0	2,287.7		0.0	3,809.0	2,287.7		
		H43	14					3,243.0	1,872.4		0.0	3,243.0	1,872.4		
施設完成後の評価期間 (50年)		H45	15	5,800.5	3,220.7						0.0	0.0	0.0		
		H46	16	5,800.5	3,096.9						0.0	0.0	0.0		
		H47	17	5,800.5	2,977.7						0.0	0.0	0.0		
		H48	18	5,800.5	2,863.0						0.0	0.0	0.0		
		H49	19	5,800.5	2,752.9						0.0	0.0	0.0		
		H50	20	5,800.5	2,647.4						0.0	0.0	0.0		
		H51	21	5,800.5	2,545.2						0.0	0.0	0.0		
		H52	22	5,800.5	2,447.5						0.0	0.0	0.0		
		H53	23	5,800.5	2,353.1						0.0	0.0	0.0		
		H54	24	5,800.5	2,263.2						0.0	0.0	0.0		
		H55	25	5,800.5	2,175.7						0.0	0.0	0.0		
		H56	26	5,800.5	2,092.5						0.0	0.0	0.0		
		H57	27	5,800.5	2,012.0						0.0	0.0	0.0		
		H58	28	5,800.5	1,934.1						0.0	0.0	0.0		
		H59	29	5,800.5	1,859.7						0.0	0.0	0.0		
		H60	30	5,800.5	1,788.6						0.0	0.0	0.0		
		H61	31	5,800.5	1,719.7						0.0	0.0	0.0		
		H62	32	5,800.5	1,653.5						0.0	0.0	0.0		
		H63	33	5,800.5	1,590.0						0.0	0.0	0.0		
		H64	34	5,800.5	1,528.9						0.0	0.0	0.0		
		H65	35	5,800.5	1,470.0						0.0	0.0	0.0		
		H66	36	5,800.5	1,413.4						0.0	0.0	0.0		
		H67	37	5,800.5	1,359.1						0.0	0.0	0.0		
		H68	38	5,800.5	1,306.7						0.0	0.0	0.0		
		H69	39	5,800.5	1,256.6						0.0	0.0	0.0		
		H70	40	5,800.5	1,208.2						0.0	0.0	0.0		
		H71	41	5,800.5	1,161.7						0.0	0.0	0.0		
		H72	42	5,800.5	1,117.0						0.0	0.0	0.0		
		H73	43	5,800.5	1,074.2						0.0	0.0	0.0		
		H74	44	5,800.5	1,032.7						0.0	0.0	0.0		
		H75	45	5,800.5	993.1						0.0	0.0	0.0		
H76	46	5,800.5	954.8						0.0	0.0	0.0				
H77	47	5,800.5	918.1						0.0	0.0	0.0				
H78	48	5,800.5	882.7						0.0	0.0	0.0				
H79	49	5,800.5	848.9						0.0	0.0	0.0				
H80	50	5,800.5	816.2						0.0	0.0	0.0				
H81	51	5,800.5	784.8						0.0	0.0	0.0				
H82	52	5,800.5	754.6						0.0	0.0	0.0				
H83	53	5,800.5	725.6						0.0	0.0	0.0				
H84	54	5,800.5	697.7						0.0	0.0	0.0				
H85	55	5,800.5	670.9						0.0	0.0	0.0				
H86	56	5,800.5	645.1						0.0	0.0	0.0				
H87	57	5,800.5	620.2						0.0	0.0	0.0				
H88	58	5,800.5	596.4						0.0	0.0	0.0				
H89	59	5,800.5	573.5						0.0	0.0	0.0				
H90	60	5,800.5	551.4						0.0	0.0	0.0				
H91	61	5,800.5	530.2						0.0	0.0	0.0				
H92	62	5,800.5	509.8						0.0	0.0	0.0				
H93	63	5,800.5	490.2						0.0	0.0	0.0				
H94	64	5,800.5	471.4						0.0	0.0	0.0				
合計			290,023.1	71,957.5	0.0	71,957.5	46,848.0	34,732.7	0.0	0.0	46,848.0	34,732.7	2.07	37,224.8	

様式 - 6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川特定構造物改築事業（全体事業費）
-----	--------------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	40,551		
	本工事費			式		0	
			築堤	m			
			護岸	m			
			河道掘削	千m ³			
			堰	箇所			
			樋門・樋管	箇所			
			堤防強化	m			
			緊急河川敷道路	m			
			高規格堤防	m			
			旧堤撤去				
			越流堤				
			排水門				
			耐震対策				
			情報通信設備				
			危機管理型ハード対策				
			その他	式			
		附帯工事費			式	1	40,551
			橋梁	箇所	1	40,551	
			堰	箇所			
	付替道路		m				
	その他		式				
用地費及補償費			式	1	753		
	用地費			式			
	補償費			式	1	753	
間接経費			式	1	4,131		
工事諸費			式	1	4,544		
事業費 計			式	1	49,979		

維持管理費	式	1	0	30年間(H20～H49)
-------	---	---	---	---------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川特定構造物改築事業（残事業費）
-----	-------------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	39,454		
	本工事費			式		0	
		築堤	m				
		護岸	m				
		河道掘削	千m ³				
		堰	箇所				
		樋門・樋管	箇所				
		堤防強化	m				
		緊急河川敷道路	m				
		高規格堤防	m				
		旧堤撤去					
		越流堤					
		排水門					
		耐震対策					
		情報通信設備					
		危機管理型ハード対策					
		その他		式			
	附帯工事費			式	1	39,454	
		橋梁	箇所		1	39,454	
		堰	箇所				
付替道路		m					
その他			式				
用地費及補償費			式	1	753		
用地費			式				
補償費			式	1	753		
間接経費			式	1	3,412		
工事諸費			式	1	4,235		
事業費 計			式	1	47,854		


維持管理費	式	1	0	30年間(H20～H49)
-------	---	---	---	---------------

淀川水系直轄河川改修事業

野洲川直轄河川改修事業

様式 - 1

様式1 氾濫ブロック分割図

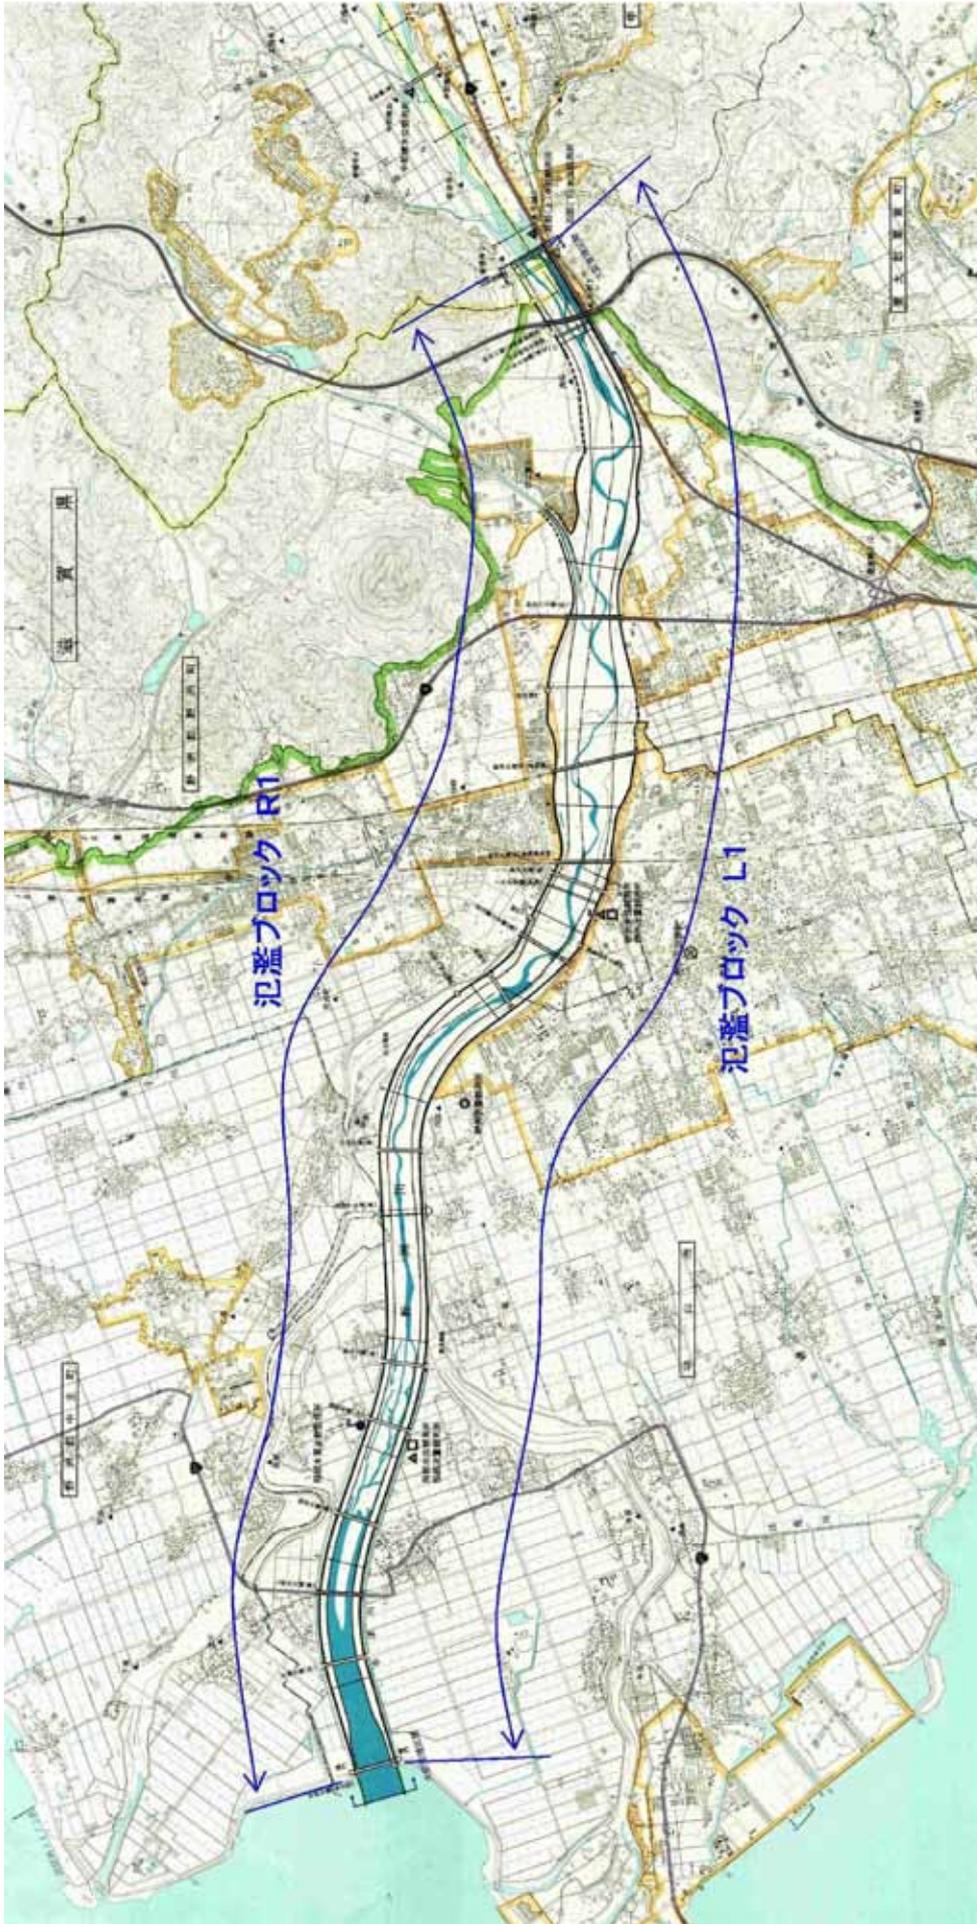

様式－2

様式-2

資産データ

水系名：淀川水系

河川名：野洲川

国勢調査年：平成22年

事業所統計調査年：平成26年

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額							農作物被害額			一般資産額 等合計 (百万円)	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類 別に算出) (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		
											償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)						
野洲川 左岸	6,850	133,533	47,147	63,474	990	914	2,994	142	1,713,594	613,154	205,080	119,015	1,565	499	2,652,907	2,561	99	2,660	2,655,567	
野洲川 右岸	4,681	48,729	17,000	19,337	606	372	2,599	277	696,869	221,096	69,939	37,484	957	306	1,026,651	2,222	192	2,414	1,029,065	
合計	11,531	182,262	64,147	82,811	1,596	1,286	5,593	419	2,410,463	834,250	275,019	156,499	2,522	805	3,679,558	4,783	291	5,074	3,684,632	

様式－3

様式-3 被害額 (事業実施前 H20年度河道) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/10 単位: 百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	2150.7	383.3	455.4	165.6	0.2	0.1	3155.3	18.1	0.1	18.2	5345.1	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	8974.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
合計	2150.7	383.3	455.4	165.6	0.2	0.1	3155.3	18.4	0.1	18.5	5345.1	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	8974.3	

様式-3 被害額 (事業実施前 H20年度河道) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/20 単位: 百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	10335.5	2379.3	2270.3	754.7	2.4	1.0	15743.2	108.1	0.6	108.7	26669.0	1089.2	267.2	465.1	732.3	310.4	0.0	2131.9	44652.8	
野洲川右岸	37.2	20.0	37.0	12.0	0.1	0.0	106.3	2.5	0.0	2.5	180.2	11.0	1.2	2.0	3.2	2.3	0.0	16.5	305.5	
合計	10372.7	2399.3	2307.3	766.7	2.5	1.0	15849.5	110.6	0.6	111.2	26849.2	1100.2	268.4	467.1	735.5	312.7	0.0	2148.4	44958.3	

様式-3 被害額 (事業実施前 H20年度河道) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/30 単位: 百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	13055.4	3448.3	2949.7	976.6	4.1	1.8	20435.9	135.0	0.9	135.9	34618.4	1346.2	327.5	558.5	886.0	396.5	0.0	2628.7	57818.9	
野洲川右岸	3917.6	501.0	681.1	230.1	0.2	0.1	5330.1	22.8	0.2	23.0	9029.2	397.7	95.7	170.3	266.0	107.6	0.0	771.3	15153.6	
合計	16973.0	3949.3	3630.8	1206.7	4.3	1.9	25766.0	157.8	1.1	158.9	43647.6	1743.9	423.2	728.8	1152.0	504.1	0.0	3400.0	72972.5	

様式-3 被害額 (事業実施前 H20年度河道) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/40 単位: 百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	15128.8	4304.7	3448.1	1137.2	5.3	2.4	24026.5	155.6	1.2	156.8	40700.9	1549.7	385.5	644.8	1030.3	470.9	0.0	3050.9	67935.1	
野洲川右岸	6680.0	896.0	927.5	293.5	0.3	0.1	8797.4	30.7	0.3	31.0	14902.7	557.1	165.9	295.0	460.9	164.9	0.0	1182.9	24914.0	
合計	21808.8	5200.7	4375.6	1430.7	5.6	2.5	32823.9	186.3	1.5	187.8	55603.6	2106.8	551.4	939.8	1491.2	635.8	0.0	4233.8	92849.1	

様式-3 被害額 (事業実施前 H20年度河道) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/50 単位: 百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	16932.0	4981.7	3827.2	1276.0	6.4	2.9	27026.2	161.8	1.4	163.2	45782.2	1681.8	425.3	703.2	1128.5	524.1	0.0	3334.4	76306.0	
野洲川右岸	7424.9	1043.9	1049.8	337.3	0.5	0.2	9856.6	42.0	0.4	42.4	16697.0	622.7	184.6	327.9	512.5	185.4	0.0	1320.6	27916.6	
合計	24356.9	6025.6	4877.0	1613.3	6.9	3.1	36882.8	203.8	1.8	205.6	62479.2	2304.5	609.9	1031.1	1641.0	709.5	0.0	4655.0	104222.6	

様式-3		被害額 (事業実施前 H20年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川		流量規模: 1/60			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計							
野洲川左岸	18683.8	5702.7	4151.9	1392.8	7.6	3.4	29942.2	167.2	1.5	168.7	50721.9	1788.5	465.3	761.0	1226.3	570.5	0.0	3585.3	84418.1	
野洲川右岸	8113.3	1200.8	1137.4	365.2	0.7	0.3	10817.7	56.1	0.4	56.5	18325.0	667.8	200.4	355.3	555.7	201.9	0.0	1425.4	30624.6	
合計	26797.1	6903.5	5289.3	1758.0	8.3	3.7	40759.9	223.3	1.9	225.2	69046.9	2456.3	665.7	1116.3	1782.0	772.4	0.0	5010.7	115042.7	

様式-3		被害額 (事業実施前 H20年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川		流量規模: 1/70			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計							
野洲川左岸	19734.4	6162.0	4374.2	1466.6	8.2	3.6	31749.0	171.7	1.6	173.3	53782.8	1859.4	490.0	797.7	1287.7	601.2	0.0	3748.3	89453.4	
野洲川右岸	8544.0	1303.4	1206.7	386.3	0.8	0.4	11441.6	60.4	0.5	60.9	19382.0	701.4	212.2	376.0	588.2	214.2	0.0	1503.8	32388.3	
合計	28278.4	7465.4	5580.9	1852.9	9.0	4.0	43190.6	232.1	2.1	234.2	73164.8	2560.8	702.2	1173.7	1875.9	815.4	0.0	5252.1	121841.7	

様式-3		被害額 (事業実施前 H20年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川		流量規模: 1/80			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計							
野洲川左岸	20699.4	6563.0	4578.7	1546.6	8.7	3.9	33400.3	183.0	1.9	184.9	56579.8	1920.1	512.1	827.5	1339.6	627.8	0.0	3887.5	94052.5	
野洲川右岸	9107.7	1453.5	1277.2	406.3	1.0	0.4	12246.1	66.3	0.5	66.8	20744.8	733.5	224.9	397.8	622.7	227.3	0.0	1583.5	34641.2	
合計	29807.1	8016.5	5855.9	1952.9	9.7	4.3	45646.4	249.3	2.4	251.7	77324.6	2653.6	737.0	1225.3	1962.3	855.1	0.0	5471.0	128693.7	

様式-3		被害額 (事業実施前 H20年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川		流量規模: 1/90			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計							
野洲川左岸	21443.0	6881.9	4747.8	1617.8	9.3	4.2	34704.0	186.3	1.9	188.2	58788.3	1957.3	524.7	845.0	1369.7	643.4	0.0	3970.4	97650.9	
野洲川右岸	9618.5	1582.3	1344.2	429.1	1.2	0.5	12975.8	74.9	0.5	75.4	21981.0	763.8	233.7	413.0	646.7	237.2	0.0	1647.7	36679.9	
合計	31061.5	8464.2	6092.0	2046.9	10.5	4.7	47679.8	261.2	2.4	263.6	80769.3	2721.1	758.4	1258.0	2016.4	880.6	0.0	5618.1	134330.8	

様式-3		被害額 (事業実施前 H20年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川		流量規模: 1/100			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	家屋 家庭用品		一般資産被害額				小計	農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考
			事業所資産		農漁家資産			水稲	畑作物	小計			清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計							
野洲川左岸	22417.7	7171.3	4900.4	1672.0	9.7	4.3	36175.4	190.1	2.0	192.1	61281.0	2009.3	541.1	868.9	1410.0	663.2	0.0	4082.5	101731.0	
野洲川右岸	10077.6	1661.4	1433.9	462.1	1.3	0.5	13636.8	78.4	0.6	79.0	23100.8	820.7	244.8	432.6	677.4	252.9	0.0	1751.0	38567.6	
合計	32495.3	8832.7	6334.3	2134.1	11.0	4.8	49812.2	268.5	2.6	271.1	84381.8	2830.0	785.9	1301.5	2087.4	916.1	0.0	5833.5	140298.6	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/10 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4		

様式-3 被害額（現況 H29年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/20 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	96.5	39.1	74.5	26.4	0.1	0.1	236.7	3.4	0.1	3.5	400.9	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	682.6	
合計	96.5	39.1	74.5	26.4	0.1	0.1	236.7	3.4	0.1	3.5	400.9	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	682.6	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	4645.0	595.7	743.8	246.0	0.2	0.1	6230.8	23.9	0.2	24.1	10555.1	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	17696.2	
合計	4645.0	595.7	743.8	246.0	0.2	0.1	6230.8	23.9	0.2	24.1	10555.1	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	17696.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	6844.9	931.3	950.5	300.8	0.3	0.2	9028.0	32.5	0.3	32.8	15293.3	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	25566.2	
合計	6844.9	931.3	950.5	300.8	0.3	0.2	9028.0	32.5	0.3	32.8	15293.3	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	25566.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	7770.7	1131.0	1098.4	352.5	0.6	0.2	10353.4	45.9	0.4	46.3	17538.6	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	29320.0	
合計	7770.7	1131.0	1098.4	352.5	0.6	0.2	10353.4	45.9	0.4	46.3	17538.6	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	29320.0	

様式-3		被害額 (現況 H29年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川			流量規模: 1/60			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価								
			償却	在庫	償却	在庫							代替活 動等	小計							
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	8324.7	1249.5	1162.0	372.6	0.8	0.3	11109.9	57.8	0.4	58.2	18820.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	31447.0		
合計	8324.7	1249.5	1162.0	372.6	0.8	0.3	11109.9	57.8	0.4	58.2	18820.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	31447.0		

様式-3		被害額 (現況 H29年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川			流量規模: 1/70			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価								
			償却	在庫	償却	在庫							代替活 動等	小計							
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	8872.0	1398.3	1248.8	398.5	0.9	0.4	11918.9	63.9	0.5	64.4	20190.5	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	33729.1		
合計	8872.0	1398.3	1248.8	398.5	0.9	0.4	11918.9	63.9	0.5	64.4	20190.5	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	33729.1		

様式-3		被害額 (現況 H29年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川			流量規模: 1/80			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価								
			償却	在庫	償却	在庫							代替活 動等	小計							
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	9363.5	1516.4	1304.5	415.9	1.1	0.5	12601.9	71.1	0.5	71.6	21347.6	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	35629.8		
合計	9363.5	1516.4	1304.5	415.9	1.1	0.5	12601.9	71.1	0.5	71.6	21347.6	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	35629.8		

様式-3		被害額 (現況 H29年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川			流量規模: 1/90			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価								
			償却	在庫	償却	在庫							代替活 動等	小計							
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	10028.5	1656.1	1428.8	460.6	1.3	0.5	13575.8	78.0	0.6	78.6	22997.4	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	38395.1		
合計	10028.5	1656.1	1428.8	460.6	1.3	0.5	13575.8	78.0	0.6	78.6	22997.4	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	38395.1		

様式-3		被害額 (現況 H29年度河道)						水系名: 淀川水系			河川名: 野洲川			流量規模: 1/100			単位: 百万円				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価								
			償却	在庫	償却	在庫							代替活 動等	小計							
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	10765.1	1850.8	1551.8	501.9	1.6	0.7	14671.9	81.4	0.6	82.0	24854.1	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	41475.2		
合計	10765.1	1850.8	1551.8	501.9	1.6	0.7	14671.9	81.4	0.6	82.0	24854.1	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	41475.2		

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/10 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/20 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/30 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/40 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/50 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/60 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労 働対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/70 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労 働対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/80 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労 働対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/90 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労 働対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後) 水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川 流量規模: 1/100 単位: 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労 働対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/10 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	2365.8	421.6	500.9	182.2	0.2	0.1	3470.8	19.9	0.1	20.0	5879.6	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	9825.8	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
合計	2365.8	421.6	500.9	182.2	0.2	0.1	3470.8	20.2	0.1	20.3	5879.6	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	9826.1	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/20 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	11369.1	2617.2	2497.3	830.2	2.6	1.1	17317.5	118.9	0.7	119.6	29335.9	1089.2	267.2	465.1	732.3	310.4	0.0	2131.9	48904.9	
野洲川右岸	40.9	22.0	40.7	13.2	0.1	0.0	116.9	2.8	0.0	2.8	198.2	11.0	1.2	2.0	3.2	2.3	0.0	16.5	334.4	
合計	11410.0	2639.2	2538.0	843.4	2.7	1.1	17434.4	121.7	0.7	122.4	29534.1	1100.2	268.4	467.1	735.5	312.7	0.0	2148.4	49239.3	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	14360.9	3793.1	3244.7	1074.3	4.5	2.0	22479.5	148.5	1.0	149.5	38080.2	1346.2	327.5	558.5	886.0	396.5	0.0	2628.7	63337.9	
野洲川右岸	4309.4	551.1	749.2	253.1	0.2	0.1	5863.1	25.1	0.2	25.3	9932.1	397.7	95.7	170.3	266.0	107.6	0.0	771.3	16591.8	
合計	18670.3	4344.2	3993.9	1327.4	4.7	2.1	28342.6	173.6	1.2	174.8	48012.3	1743.9	423.2	728.8	1152.0	504.1	0.0	3400.0	79929.7	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	16641.7	4735.2	3792.9	1250.9	5.8	2.6	26429.1	171.2	1.3	172.5	44771.0	1549.7	385.5	644.8	1030.3	470.9	0.0	3050.9	74423.5	
野洲川右岸	7348.0	985.6	1020.3	322.9	0.3	0.1	9677.2	33.8	0.3	34.1	16393.0	557.1	165.9	295.0	460.9	164.9	0.0	1182.9	27287.2	
合計	23989.7	5720.8	4813.2	1573.8	6.1	2.7	36106.3	205.0	1.6	206.6	61164.0	2106.8	551.4	939.8	1491.2	635.8	0.0	4233.8	101710.7	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	18625.2	5479.9	4209.9	1403.6	7.0	3.2	29728.8	178.0	1.5	179.5	50360.4	1681.8	425.3	703.2	1128.5	524.1	0.0	3334.4	83603.1	
野洲川右岸	8167.4	1148.3	1154.8	371.0	0.6	0.2	10842.3	46.2	0.4	46.6	18366.7	622.7	184.6	327.9	512.5	185.4	0.0	1320.6	30576.2	
合計	26792.6	6628.2	5364.7	1774.6	7.6	3.4	40571.1	224.2	1.9	226.1	68727.1	2304.5	609.9	1031.1	1641.0	709.5	0.0	4655.0	114179.3	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	20552.2	6273.0	4567.1	1532.1	8.4	3.7	32936.5	183.9	1.7	185.6	55794.1	1788.5	465.3	761.0	1226.3	570.5	0.0	3585.3	92501.5	
野洲川右岸	8924.6	1320.9	1251.1	401.7	0.8	0.3	11899.4	61.7	0.4	62.1	20157.5	667.8	200.4	355.3	555.7	201.9	0.0	1425.4	33544.4	
合計	29476.8	7593.9	5818.2	1933.8	9.2	4.0	44835.9	245.6	2.1	247.7	75951.6	2456.3	665.7	1116.3	1782.0	772.4	0.0	5010.7	126045.9	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	21707.8	6778.2	4811.6	1613.3	9.0	4.0	34923.9	188.9	1.8	190.7	59161.1	1859.4	490.0	797.7	1287.7	601.2	0.0	3748.3	98024.0	
野洲川右岸	9398.4	1433.7	1327.4	424.9	0.9	0.4	12585.7	66.4	0.6	67.0	21320.2	701.4	212.2	376.0	588.2	214.2	0.0	1503.8	35476.7	
合計	31106.2	8211.9	6139.0	2038.2	9.9	4.4	47509.6	255.3	2.4	257.7	80481.3	2560.8	702.2	1173.7	1875.9	815.4	0.0	5252.1	133500.7	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	22769.3	7219.3	5036.6	1701.3	9.6	4.3	36740.4	201.3	2.1	203.4	62237.8	1920.1	512.1	827.5	1339.6	627.8	0.0	3887.5	103069.1	
野洲川右岸	10018.5	1598.9	1404.9	446.9	1.1	0.4	13470.7	72.9	0.6	73.5	22819.3	733.5	224.9	397.8	622.7	227.3	0.0	1583.5	37947.0	
合計	32787.8	8818.2	6441.5	2148.2	10.7	4.7	50211.1	274.2	2.7	276.9	85057.1	2653.6	737.0	1225.3	1962.3	855.1	0.0	5471.0	141016.1	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	23587.3	7570.1	5222.6	1779.6	10.2	4.6	38174.4	204.9	2.1	207.0	64667.1	1957.3	524.7	845.0	1369.7	643.4	0.0	3970.4	107018.9	
野洲川右岸	10580.4	1740.5	1478.6	472.0	1.3	0.6	14273.4	82.4	0.6	83.0	24179.1	763.8	233.7	413.0	646.7	237.2	0.0	1647.7	40183.2	
合計	34167.7	9310.6	6701.2	2251.6	11.5	5.2	52447.8	287.3	2.7	290.0	88846.2	2721.1	758.4	1258.0	2016.4	880.6	0.0	5618.1	147202.1	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	24659.5	7888.4	5390.4	1839.2	10.7	4.7	39792.9	209.1	2.2	211.3	67409.1	2009.3	541.1	868.9	1410.0	663.2	0.0	4082.5	111495.8	
野洲川右岸	11085.4	1827.5	1577.3	508.3	1.4	0.6	15000.5	86.2	0.7	86.9	25410.9	820.7	244.8	432.6	677.4	252.9	0.0	1751.0	42249.3	
合計	35744.9	9715.9	6967.7	2347.5	12.1	5.3	54793.4	295.3	2.9	298.2	92820.0	2830.0	785.9	1301.5	2087.4	916.1	0.0	5833.5	153745.1	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/10 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/20 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	106.2	43.0	82.0	29.0	0.1	0.1	260.4	3.7	0.1	3.8	441.0	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	746.7	
合計	106.2	43.0	82.0	29.0	0.1	0.1	260.4	3.7	0.1	3.8	441.0	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	746.7	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	5109.5	655.3	818.2	270.6	0.2	0.1	6853.9	26.3	0.2	26.5	11610.6	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	19377.2	
合計	5109.5	655.3	818.2	270.6	0.2	0.1	6853.9	26.3	0.2	26.5	11610.6	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	19377.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	7529.4	1024.4	1045.6	330.9	0.3	0.2	9930.8	35.8	0.3	36.1	16822.6	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	28001.6	
合計	7529.4	1024.4	1045.6	330.9	0.3	0.2	9930.8	35.8	0.3	36.1	16822.6	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	28001.6	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	8547.8	1244.1	1208.2	387.8	0.7	0.2	11388.8	50.5	0.4	50.9	19292.5	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	32113.9	
合計	8547.8	1244.1	1208.2	387.8	0.7	0.2	11388.8	50.5	0.4	50.9	19292.5	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	32113.9	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	9157.2	1374.5	1278.2	409.9	0.9	0.3	12221.0	63.6	0.4	64.0	20702.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	34445.9	
合計	9157.2	1374.5	1278.2	409.9	0.9	0.3	12221.0	63.6	0.4	64.0	20702.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	34445.9	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	9759.2	1538.1	1373.7	438.4	1.0	0.4	13110.8	70.3	0.6	70.9	22209.6	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	36946.6	
合計	9759.2	1538.1	1373.7	438.4	1.0	0.4	13110.8	70.3	0.6	70.9	22209.6	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	36946.6	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	10299.9	1668.0	1435.0	457.5	1.2	0.6	13862.2	78.2	0.6	78.8	23482.4	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	39032.1	
合計	10299.9	1668.0	1435.0	457.5	1.2	0.6	13862.2	78.2	0.6	78.8	23482.4	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	39032.1	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	11031.4	1821.7	1571.7	506.7	1.4	0.6	14933.5	85.8	0.7	86.5	25297.1	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	42060.4	
合計	11031.4	1821.7	1571.7	506.7	1.4	0.6	14933.5	85.8	0.7	86.5	25297.1	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	42060.4	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	11841.6	2035.9	1707.0	552.1	1.8	0.8	16139.2	89.5	0.7	90.2	27339.5	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	45436.1	
合計	11841.6	2035.9	1707.0	552.1	1.8	0.8	16139.2	89.5	0.7	90.2	27339.5	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	45436.1	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産+10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/10 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産+10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/20 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産+10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/30 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産+10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/40 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産+10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/50 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	小計						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額（事業実施後：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	小計						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額（事業実施後：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	小計						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額（事業実施後：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	小計						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額（事業実施後：資産+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価 代替活動等							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	小計						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/10 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	1935.6	345.0	409.9	149.0	0.2	0.1	2839.8	16.3	0.1	16.4	4810.6	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	8122.2	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
合計	1935.6	345.0	409.9	149.0	0.2	0.1	2839.8	16.6	0.1	16.7	4810.6	228.3	59.1	105.0	164.1	63.0	0.0	455.4	8122.5	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/20 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	9302.0	2141.4	2043.3	679.2	2.2	0.9	14169.0	97.3	0.5	97.8	24002.1	1089.2	267.2	465.1	732.3	310.4	0.0	2131.9	40400.8	
野洲川右岸	33.5	18.0	33.3	10.8	0.1	0.0	95.7	2.3	0.0	2.3	162.2	11.0	1.2	2.0	3.2	2.3	0.0	16.5	276.7	
合計	9335.5	2159.4	2076.6	690.0	2.3	0.9	14264.7	99.6	0.5	100.1	24164.3	1100.2	268.4	467.1	735.5	312.7	0.0	2148.4	40677.5	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	11749.9	3103.5	2654.7	878.9	3.7	1.6	18392.3	121.5	0.8	122.3	31156.6	1346.2	327.5	558.5	886.0	396.5	0.0	2628.7	52299.9	
野洲川右岸	3525.8	450.9	613.0	207.1	0.2	0.1	4797.1	20.5	0.2	20.7	8126.3	397.7	95.7	170.3	266.0	107.6	0.0	771.3	13715.4	
合計	15275.7	3554.4	3267.7	1086.0	3.9	1.7	23189.4	142.0	1.0	143.0	39282.9	1743.9	423.2	728.8	1152.0	504.1	0.0	3400.0	66015.3	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	13615.9	3874.2	3103.3	1023.5	4.8	2.2	21623.9	140.0	1.1	141.1	36630.8	1549.7	385.5	644.8	1030.3	470.9	0.0	3050.9	61446.7	
野洲川右岸	6012.0	806.4	834.8	264.2	0.3	0.1	7917.8	27.6	0.3	27.9	13412.4	557.1	165.9	295.0	460.9	164.9	0.0	1182.9	22541.0	
合計	19627.9	4680.6	3938.1	1287.7	5.1	2.3	29541.7	167.6	1.4	169.0	50043.2	2106.8	551.4	939.8	1491.2	635.8	0.0	4233.8	83987.7	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	15238.8	4483.5	3444.5	1148.4	5.8	2.6	24323.6	145.6	1.3	146.9	41204.0	1681.8	425.3	703.2	1128.5	524.1	0.0	3334.4	69008.9	
野洲川右岸	6682.4	939.5	944.8	303.6	0.5	0.2	8871.0	37.8	0.4	38.2	15027.3	622.7	184.6	327.9	512.5	185.4	0.0	1320.6	25257.1	
合計	21921.2	5423.0	4389.3	1452.0	6.3	2.8	33194.6	183.4	1.7	185.1	56231.3	2304.5	609.9	1031.1	1641.0	709.5	0.0	4655.0	94266.0	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	16815.4	5132.4	3736.7	1253.5	6.8	3.1	26947.9	150.5	1.4	151.9	45649.7	1788.5	465.3	761.0	1226.3	570.5	0.0	3585.3	76334.8	
野洲川右岸	7302.0	1080.7	1023.7	328.7	0.6	0.3	9736.0	50.5	0.4	50.9	16492.5	667.8	200.4	355.3	555.7	201.9	0.0	1425.4	27704.8	
合計	24117.4	6213.1	4760.4	1582.2	7.4	3.4	36683.9	201.0	1.8	202.8	62142.2	2456.3	665.7	1116.3	1782.0	772.4	0.0	5010.7	104039.6	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	17761.0	5545.8	3936.8	1319.9	7.4	3.2	28574.1	154.5	1.4	155.9	48404.5	1859.4	490.0	797.7	1287.7	601.2	0.0	3748.3	80882.8	
野洲川右岸	7689.6	1173.1	1086.0	347.7	0.7	0.4	10297.5	54.4	0.5	54.9	17443.8	701.4	212.2	376.0	588.2	214.2	0.0	1503.8	29300.0	
合計	25450.6	6718.9	5022.8	1667.6	8.1	3.6	38871.6	208.9	1.9	210.8	65848.3	2560.8	702.2	1173.7	1875.9	815.4	0.0	5252.1	110182.8	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	18629.5	5906.7	4120.8	1391.9	7.8	3.5	30060.2	164.7	1.7	166.4	50921.8	1920.1	512.1	827.5	1339.6	627.8	0.0	3887.5	85035.9	
野洲川右岸	8196.9	1308.2	1149.5	365.7	0.9	0.4	11021.6	59.7	0.5	60.2	18670.3	733.5	224.9	397.8	622.7	227.3	0.0	1583.5	31335.6	
合計	26826.4	7214.9	5270.3	1757.6	8.7	3.9	41081.8	224.4	2.2	226.6	69592.1	2653.6	737.0	1225.3	1962.3	855.1	0.0	5471.0	116371.5	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	19298.7	6193.7	4273.0	1456.0	8.4	3.8	31233.6	167.7	1.7	169.4	52909.5	1957.3	524.7	845.0	1369.7	643.4	0.0	3970.4	88282.9	
野洲川右岸	8656.7	1424.1	1209.8	386.2	1.1	0.5	11678.4	67.4	0.5	67.9	19782.9	763.8	233.7	413.0	646.7	237.2	0.0	1647.7	33176.9	
合計	27955.4	7617.8	5482.8	1842.2	9.5	4.3	42912.0	235.1	2.2	237.3	72692.4	2721.1	758.4	1258.0	2016.4	880.6	0.0	5618.1	121459.8	

様式-3 被害額（事業実施前 H20年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活 動等						小計
野洲川左岸	20175.9	6454.2	4410.4	1504.8	8.7	3.9	32557.9	171.1	1.8	172.9	55152.9	2009.3	541.1	868.9	1410.0	663.2	0.0	4082.5	91966.2	
野洲川右岸	9069.8	1495.3	1290.5	415.9	1.2	0.5	12273.2	70.6	0.5	71.1	20790.7	820.7	244.8	432.6	677.4	252.9	0.0	1751.0	34886.0	
合計	29245.7	7949.5	5700.9	1920.7	9.9	4.4	44831.1	241.7	2.3	244.0	75943.6	2830.0	785.9	1301.5	2087.4	916.1	0.0	5833.5	126852.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/10 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/20 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	86.9	35.2	67.1	23.8	0.1	0.1	213.2	3.1	0.1	3.2	360.8	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	618.7	
合計	86.9	35.2	67.1	23.8	0.1	0.1	213.2	3.1	0.1	3.2	360.8	26.1	3.8	6.7	10.5	4.9	0.0	41.5	618.7	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/30 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	4180.5	536.1	669.4	221.4	0.2	0.1	5607.7	21.5	0.2	21.7	9499.6	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	16015.2	
合計	4180.5	536.1	669.4	221.4	0.2	0.1	5607.7	21.5	0.2	21.7	9499.6	442.3	115.4	205.4	320.8	123.1	0.0	886.2	16015.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/40 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	6160.4	838.2	855.5	270.7	0.3	0.2	8125.3	29.3	0.3	29.6	13764.0	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	23131.0	
合計	6160.4	838.2	855.5	270.7	0.3	0.2	8125.3	29.3	0.3	29.6	13764.0	569.2	170.6	303.2	473.8	169.1	0.0	1212.1	23131.0	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/50 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家屋における応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働対価	代替活動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	6993.6	1017.9	988.6	317.3	0.5	0.2	9318.1	41.3	0.4	41.7	15784.7	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	26526.2	
合計	6993.6	1017.9	988.6	317.3	0.5	0.2	9318.1	41.3	0.4	41.7	15784.7	648.9	193.9	344.1	538.0	194.8	0.0	1381.7	26526.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	7492.2	1124.6	1045.8	335.3	0.7	0.3	9998.9	52.0	0.4	52.4	16938.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	28448.2	
合計	7492.2	1124.6	1045.8	335.3	0.7	0.3	9998.9	52.0	0.4	52.4	16938.2	680.7	206.0	365.2	571.2	206.8	0.0	1458.7	28448.2	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	7984.8	1258.5	1123.9	358.7	0.8	0.4	10727.1	57.5	0.5	58.0	18171.5	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	30511.9	
合計	7984.8	1258.5	1123.9	358.7	0.8	0.4	10727.1	57.5	0.5	58.0	18171.5	722.3	220.4	389.9	610.3	222.7	0.0	1555.3	30511.9	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	8427.2	1364.8	1174.1	374.3	1.0	0.5	11341.9	64.0	0.5	64.5	19212.8	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	32227.9	
合計	8427.2	1364.8	1174.1	374.3	1.0	0.5	11341.9	64.0	0.5	64.5	19212.8	745.0	228.5	403.9	632.4	231.3	0.0	1608.7	32227.9	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	9025.7	1490.5	1285.9	414.5	1.2	0.5	12218.3	70.2	0.5	70.7	20697.7	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	34730.0	
合計	9025.7	1490.5	1285.9	414.5	1.2	0.5	12218.3	70.2	0.5	70.7	20697.7	817.3	243.7	430.6	674.3	251.7	0.0	1743.3	34730.0	

様式-3 被害額（現況 H29年度河道：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働対価	代替活動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	9688.6	1665.7	1396.6	451.7	1.4	0.6	13204.6	73.3	0.5	73.8	22368.7	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	37514.3	
合計	9688.6	1665.7	1396.6	451.7	1.4	0.6	13204.6	73.3	0.5	73.8	22368.7	878.8	259.1	457.0	716.1	272.3	0.0	1867.2	37514.3	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産-10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/10 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産-10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/20 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産-10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/30 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産-10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/40 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額 (事業実施後 : 資産-10%) 水系名 : 淀川水系 河川名 : 野洲川 流量規模 : 1/50 単位 : 百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						小計
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/60 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/70 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/80 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/90 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式-3 被害額（事業実施後：資産-10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 流量規模：1/100 単位：百万円

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土 木施設 等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所 におけ る応急 対策費	その他 の間接 被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用 品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価							
			償却	在庫	償却	在庫							小計	代替活 動等						
野洲川左岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
野洲川右岸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

様式－4

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川

対象河道：事業実施前-現況 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	8,974.3	0.4	8,973.9	4,487.0	0.100	448.7	448.7	
1/20	0.05000	44,958.3	682.6	44,275.7	26,624.8	0.050	1,331.2	1,779.9	
1/30	0.03333	72,972.5	17,696.2	55,276.3	49,776.0	0.017	846.2	2,626.1	
1/40	0.02500	92,849.1	25,566.2	67,282.9	61,279.6	0.008	490.2	3,116.3	
1/50	0.02000	104,222.6	29,320.0	74,902.6	71,092.8	0.005	355.5	3,471.8	
1/60	0.01667	115,042.7	31,447.0	83,595.7	79,249.2	0.003	237.7	3,709.5	
1/70	0.01429	121,841.7	33,729.1	88,112.6	85,854.2	0.002	171.7	3,881.2	
1/80	0.01250	128,693.7	35,629.8	93,063.9	90,588.3	0.002	181.2	4,062.4	
1/90	0.01111	134,330.8	38,395.1	95,935.7	94,499.8	0.001	94.5	4,156.9	
1/100	0.01000	140,298.6	41,475.2	98,823.4	97,379.6	0.001	97.4	4,254.3	

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川

対象河道：事業実施前-事業実施後 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	8,974.3	0.0	8,974.3	4,487.2	0.100	448.7	448.7	
1/20	0.05000	44,958.3	0.0	44,958.3	26,966.3	0.050	1,348.3	1,797.0	
1/30	0.03333	72,972.5	0.0	72,972.5	58,965.4	0.017	1,002.4	2,799.4	
1/40	0.02500	92,849.1	0.0	92,849.1	82,910.8	0.008	663.3	3,462.7	
1/50	0.02000	104,222.6	0.0	104,222.6	98,535.9	0.005	492.7	3,955.4	
1/60	0.01667	115,042.7	0.0	115,042.7	109,632.7	0.003	328.9	4,284.3	
1/70	0.01429	121,841.7	0.0	121,841.7	118,442.2	0.002	236.9	4,521.2	
1/80	0.01250	128,693.7	0.0	128,693.7	125,267.7	0.002	250.5	4,771.7	
1/90	0.01111	134,330.8	0.0	134,330.8	131,512.3	0.001	131.5	4,903.2	
1/100	0.01000	140,298.6	0.0	140,298.6	137,314.7	0.001	137.3	5,040.5	

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：事業実施前-現況 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	9,826.1	0.4	9,825.7	4,912.9	0.100	491.3	491.3	
1/20	0.05000	49,239.3	746.7	48,492.6	29,159.2	0.050	1,458.0	1,949.3	
1/30	0.03333	79,929.7	19,377.2	60,552.5	54,522.6	0.017	926.9	2,876.2	
1/40	0.02500	101,710.7	28,001.6	73,709.1	67,130.8	0.008	537.0	3,413.2	
1/50	0.02000	114,179.3	32,113.9	82,065.4	77,887.3	0.005	389.4	3,802.6	
1/60	0.01667	126,045.9	34,445.9	91,600.0	86,832.7	0.003	260.5	4,063.1	
1/70	0.01429	133,500.7	36,946.6	96,554.1	94,077.1	0.002	188.2	4,251.3	
1/80	0.01250	141,016.1	39,032.1	101,984.0	99,269.1	0.002	198.5	4,449.8	
1/90	0.01111	147,202.1	42,060.4	105,141.7	103,562.9	0.001	103.6	4,553.4	
1/100	0.01000	153,745.1	45,436.1	108,309.0	106,725.4	0.001	106.7	4,660.1	

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業：資産＋10％） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：事業実施前-事業実施後 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	9,826.1	0.0	9,826.1	4,913.1	0.100	491.3	491.3	
1/20	0.05000	49,239.3	0.0	49,239.3	29,532.7	0.050	1,476.6	1,967.9	
1/30	0.03333	79,929.7	0.0	79,929.7	64,584.5	0.017	1,097.9	3,065.8	
1/40	0.02500	101,710.7	0.0	101,710.7	90,820.2	0.008	726.6	3,792.4	
1/50	0.02000	114,179.3	0.0	114,179.3	107,945.0	0.005	539.7	4,332.1	
1/60	0.01667	126,045.9	0.0	126,045.9	120,112.6	0.003	360.3	4,692.4	
1/70	0.01429	133,500.7	0.0	133,500.7	129,773.3	0.002	259.5	4,951.9	
1/80	0.01250	141,016.1	0.0	141,016.1	137,258.4	0.002	274.5	5,226.4	
1/90	0.01111	147,202.1	0.0	147,202.1	144,109.1	0.001	144.1	5,370.5	
1/100	0.01000	153,745.1	0.0	153,745.1	150,473.6	0.001	150.5	5,521.0	

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業：資産－10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：事業実施前-現況 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	8,122.5	0.4	8,122.1	4,061.1	0.100	406.1	406.1	
1/20	0.05000	40,677.5	618.7	40,058.8	24,090.5	0.050	1,204.5	1,610.6	
1/30	0.03333	66,015.3	16,015.2	50,000.1	45,029.5	0.017	765.5	2,376.1	
1/40	0.02500	83,987.7	23,131.0	60,856.7	55,428.4	0.008	443.4	2,819.5	
1/50	0.02000	94,266.0	26,526.2	67,739.8	64,298.3	0.005	321.5	3,141.0	
1/60	0.01667	104,039.6	28,448.2	75,591.4	71,665.6	0.003	215.0	3,356.0	
1/70	0.01429	110,182.8	30,511.9	79,670.9	77,631.2	0.002	155.3	3,511.3	
1/80	0.01250	116,371.5	32,227.9	84,143.6	81,907.3	0.002	163.8	3,675.1	
1/90	0.01111	121,459.8	34,730.0	86,729.8	85,436.7	0.001	85.4	3,760.5	
1/100	0.01000	126,852.2	37,514.3	89,337.9	88,033.9	0.001	88.0	3,848.5	

様式－４ 年平均被害軽減期待額（全体事業：資産－10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 対象河道：事業実施前-事業実施後 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	
1/10	0.10000	8,122.5	0.0	8,122.5	4,061.3	0.100	406.1	406.1	
1/20	0.05000	40,677.5	0.0	40,677.5	24,400.0	0.050	1,220.0	1,626.1	
1/30	0.03333	66,015.3	0.0	66,015.3	53,346.4	0.017	906.9	2,533.0	
1/40	0.02500	83,987.7	0.0	83,987.7	75,001.5	0.008	600.0	3,133.0	
1/50	0.02000	94,266.0	0.0	94,266.0	89,126.9	0.005	445.6	3,578.6	
1/60	0.01667	104,039.6	0.0	104,039.6	99,152.8	0.003	297.5	3,876.1	
1/70	0.01429	110,182.8	0.0	110,182.8	107,111.2	0.002	214.2	4,090.3	
1/80	0.01250	116,371.5	0.0	116,371.5	113,277.2	0.002	226.6	4,316.9	
1/90	0.01111	121,459.8	0.0	121,459.8	118,915.7	0.001	118.9	4,435.8	
1/100	0.01000	126,852.2	0.0	126,852.2	124,156.0	0.001	124.2	4,560.0	

様式 - 5

様式-5

費用対便益 (全体事業)

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	413.7	566.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,521.7	2,002.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	1,907.4	2,412.9			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	2,170.6	2,641.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	3,028.7	3,543.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	3,302.3	3,715.1			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,623.3	3,920.4			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	3,871.7	4,026.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	4,119.9	4,119.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	4,254.3	4,092.6			67.6	65.0	91.3	87.8	158.9	152.8		
	H31	2	4,297.7	3,975.4			527.0	487.5	94.1	87.0	621.1	574.5		
	H32	3	4,636.2	4,121.6			629.4	559.5	733.6	652.2	1,363.0	1,211.7		
	H33	4	5,040.5	4,309.6			365.9	312.8	876.1	749.1	1,242.0	1,061.9		
	H34	5	5,040.5	4,143.3			102.4	84.2	509.3	418.6	611.7	502.8		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	6	5,040.5	3,982.0					142.5	112.6	142.5	112.6		
	H36	7	5,040.5	3,830.8					294.0	223.4	294.0	223.4		
	H37	8	5,040.5	3,684.6					294.0	214.9	294.0	214.9		
	H38	9	5,040.5	3,543.5					294.0	206.7	294.0	206.7		
	H39	10	5,040.5	3,407.4					294.0	198.7	294.0	198.7		
	H40	11	5,040.5	3,276.3					294.0	191.1	294.0	191.1		
	H41	12	5,040.5	3,150.3					294.0	183.8	294.0	183.8		
	H42	13	5,040.5	3,029.3					294.0	176.7	294.0	176.7		
	H43	14	5,040.5	2,908.4					294.0	169.6	294.0	169.6		
	H44	15	5,040.5	2,797.5					294.0	163.2	294.0	163.2		
	H45	16	5,040.5	2,691.6					294.0	157.0	294.0	157.0		
	H46	17	5,040.5	2,585.8					294.0	150.8	294.0	150.8		
	H47	18	5,040.5	2,490.0					294.0	145.2	294.0	145.2		
	H48	19	5,040.5	2,394.2					294.0	139.7	294.0	139.7		
	H49	20	5,040.5	2,298.5					294.0	134.1	294.0	134.1		
	H50	21	5,040.5	2,212.8					294.0	129.1	294.0	129.1		
	H51	22	5,040.5	2,127.1					294.0	124.1	294.0	124.1		
	H52	23	5,040.5	2,046.4					294.0	119.4	294.0	119.4		
	H53	24	5,040.5	1,965.8					294.0	114.7	294.0	114.7		
	H54	25	5,040.5	1,890.2					294.0	110.3	294.0	110.3		
	H55	26	5,040.5	1,819.6					294.0	106.1	294.0	106.1		
	H56	27	5,040.5	1,749.1					294.0	102.0	294.0	102.0		
	H57	28	5,040.5	1,678.5					294.0	97.9	294.0	97.9		
	H58	29	5,040.5	1,618.0					294.0	94.4	294.0	94.4		
	H59	30	5,040.5	1,552.5					294.0	90.6	294.0	90.6		
	H60	31	5,040.5	1,492.0					294.0	87.0	294.0	87.0		
	H61	32	5,040.5	1,436.5					294.0	83.8	294.0	83.8		
	H62	33	5,040.5	1,381.1					294.0	80.6	294.0	80.6		
	H63	34	5,040.5	1,330.7					294.0	77.6	294.0	77.6		
	H64	35	5,040.5	1,275.2					294.0	74.4	294.0	74.4		
	H65	36	5,040.5	1,229.9					294.0	71.7	294.0	71.7		
H66	37	5,040.5	1,179.5					294.0	68.8	294.0	68.8			
H67	38	5,040.5	1,134.1					294.0	66.2	294.0	66.2			
H68	39	5,040.5	1,093.8					294.0	63.8	294.0	63.8			
H69	40	5,040.5	1,048.4					294.0	61.2	294.0	61.2			
H70	41	5,040.5	1,008.1					294.0	58.8	294.0	58.8			
H71	42	5,040.5	972.8					294.0	56.7	294.0	56.7			
H72	43	5,040.5	932.5					294.0	54.4	294.0	54.4			
H73	44	5,040.5	897.2					294.0	52.3	294.0	52.3			
H74	45	5,040.5	861.9					294.0	50.3	294.0	50.3			
H75	46	5,040.5	831.7					294.0	48.5	294.0	48.5			
H76	47	5,040.5	796.4					294.0	46.5	294.0	46.5			
H77	48	5,040.5	766.2					294.0	44.7	294.0	44.7			
H78	49	5,040.5	735.9					294.0	42.9	294.0	42.9			
H79	50	5,040.5	710.7					294.0	41.5	294.0	41.5			
H80	51	5,040.5	680.5					294.0	39.7	294.0	39.7			
H81	52	5,040.5	655.3					294.0	38.2	294.0	38.2			
H82	53	5,040.5	630.1					294.0	36.8	294.0	36.8			
H83	54	5,040.5	604.9					294.0	35.3	294.0	35.3			
H84	55	5,040.5	584.7					294.0	34.1	294.0	34.1			
合 計			299,253.5	136,591.9	15.5	136,607.4	3,769.5	4,210.3	18,816.3	9,424.7	22,585.8	13,635.0	10.02	122,972.4

様式-5		費用対便益 (全体事業：残事業費+10%)				水系名：淀川水系 河川名：野洲川						単位：百万円		
年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間(15年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.0		
	H21	-8	413.7	566.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.0		
	H22	-7	1,521.7	2,002.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.0		
	H23	-6	1,907.4	2,412.9			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.0		
	H24	-5	2,170.6	2,641.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	982.0		
	H25	-4	3,028.7	3,543.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	596.0		
	H26	-3	3,302.3	3,715.1			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	374.0		
	H27	-2	3,623.3	3,920.4			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.0		
	H28	-1	3,871.7	4,026.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	417.0		
	H29	0	4,119.9	4,119.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.0		
	H30	1	4,254.3	4,092.6			74.4	71.6	91.3	87.8	165.7	159.0		
	H31	2	4,297.7	3,975.4			579.7	536.2	94.1	87.0	673.8	623.0		
	H32	3	4,636.2	4,121.6			692.4	615.5	733.6	652.2	1,426.0	1,268.0		
	H33	4	5,040.5	4,309.6			402.5	344.1	876.1	749.1	1,278.6	1,093.0		
	H34	5	5,040.5	4,143.3			112.6	92.6	509.3	418.6	621.9	511.0		
施設完成後の評価期間(50年)	H35	6	5,040.5	3,982.0					142.5	112.6	142.5	113.0		
	H36	7	5,040.5	3,830.8					294.0	223.4	294.0	223.0		
	H37	8	5,040.5	3,684.6					294.0	214.9	294.0	215.0		
	H38	9	5,040.5	3,543.5					294.0	206.7	294.0	207.0		
	H39	10	5,040.5	3,407.4					294.0	198.7	294.0	199.0		
	H40	11	5,040.5	3,276.3					294.0	191.1	294.0	191.0		
	H41	12	5,040.5	3,150.3					294.0	183.8	294.0	184.0		
	H42	13	5,040.5	3,029.3					294.0	176.7	294.0	177.0		
	H43	14	5,040.5	2,908.4					294.0	169.6	294.0	170.0		
	H44	15	5,040.5	2,797.5					294.0	163.2	294.0	163.0		
	H45	16	5,040.5	2,691.6					294.0	157.0	294.0	157.0		
	H46	17	5,040.5	2,585.8					294.0	150.8	294.0	151.0		
	H47	18	5,040.5	2,490.0					294.0	145.2	294.0	145.0		
	H48	19	5,040.5	2,394.2					294.0	139.7	294.0	140.0		
	H49	20	5,040.5	2,298.5					294.0	134.1	294.0	134.0		
	H50	21	5,040.5	2,212.8					294.0	129.1	294.0	129.0		
	H51	22	5,040.5	2,127.1					294.0	124.1	294.0	124.0		
	H52	23	5,040.5	2,046.4					294.0	119.4	294.0	119.0		
	H53	24	5,040.5	1,965.8					294.0	114.7	294.0	115.0		
	H54	25	5,040.5	1,890.2					294.0	110.3	294.0	110.0		
	H55	26	5,040.5	1,819.6					294.0	106.1	294.0	106.0		
	H56	27	5,040.5	1,749.1					294.0	102.0	294.0	102.0		
	H57	28	5,040.5	1,678.5					294.0	97.9	294.0	98.0		
	H58	29	5,040.5	1,618.0					294.0	94.4	294.0	94.0		
	H59	30	5,040.5	1,552.5					294.0	90.6	294.0	91.0		
	H60	31	5,040.5	1,492.0					294.0	87.0	294.0	87.0		
	H61	32	5,040.5	1,436.5					294.0	83.8	294.0	84.0		
	H62	33	5,040.5	1,381.1					294.0	80.6	294.0	81.0		
	H63	34	5,040.5	1,330.7					294.0	77.6	294.0	78.0		
	H64	35	5,040.5	1,275.2					294.0	74.4	294.0	74.0		
	H65	36	5,040.5	1,229.9					294.0	71.7	294.0	72.0		
	H66	37	5,040.5	1,179.5					294.0	68.8	294.0	69.0		
	H67	38	5,040.5	1,134.1					294.0	66.2	294.0	66.0		
	H68	39	5,040.5	1,093.8					294.0	63.8	294.0	64.0		
	H69	40	5,040.5	1,048.4					294.0	61.2	294.0	61.0		
H70	41	5,040.5	1,008.1					294.0	58.8	294.0	59.0			
H71	42	5,040.5	972.8					294.0	56.7	294.0	57.0			
H72	43	5,040.5	932.5					294.0	54.4	294.0	54.0			
H73	44	5,040.5	897.2					294.0	52.3	294.0	52.0			
H74	45	5,040.5	861.9					294.0	50.3	294.0	50.0			
H75	46	5,040.5	831.7					294.0	48.5	294.0	49.0			
H76	47	5,040.5	796.4					294.0	46.5	294.0	47.0			
H77	48	5,040.5	766.2					294.0	44.7	294.0	45.0			
H78	49	5,040.5	735.9					294.0	42.9	294.0	43.0			
H79	50	5,040.5	710.7					294.0	41.5	294.0	42.0			
H80	51	5,040.5	680.5					294.0	39.7	294.0	40.0			
H81	52	5,040.5	655.3					294.0	38.2	294.0	38.0			
H82	53	5,040.5	630.1					294.0	36.8	294.0	37.0			
H83	54	5,040.5	604.9					294.0	35.3	294.0	35.0			
H84	55	5,040.5	584.7					294.0	34.1	294.0	34.0			
合計			299,253.5	136,591.9	16.3	136,608.2	3,938.8	4,361.3	18,816.3	9,424.7	22,755.1	13,788.0	9.91	122,820.2

様式-5		費用対便益 (全体事業：残事業費-10%)				水系名：淀川水系 河川名：野洲川						単位：百万円		
年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間(15年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	413.7	566.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,521.7	2,002.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	1,907.4	2,412.9			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	2,170.6	2,641.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	3,028.7	3,543.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	3,302.3	3,715.1			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,623.3	3,920.4			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	3,871.7	4,026.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	4,119.9	4,119.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	4,254.3	4,092.6			60.8	58.5	91.3	87.8	152.1	146.3		
	H31	2	4,297.7	3,975.4			474.3	438.7	94.1	87.0	568.4	525.7		
	H32	3	4,636.2	4,121.6			566.4	503.5	733.6	652.2	1,300.0	1,155.7		
	H33	4	5,040.5	4,309.6			329.3	281.6	876.1	749.1	1,205.4	1,030.7		
	H34	5	5,040.5	4,143.3			92.2	75.8	509.3	418.6	601.5	494.4		
施設完成後の評価期間(50年)	H35	6	5,040.5	3,982.0					142.5	112.6	142.5	112.6		
	H36	7	5,040.5	3,830.8					294.0	223.4	294.0	223.4		
	H37	8	5,040.5	3,684.6					294.0	214.9	294.0	214.9		
	H38	9	5,040.5	3,543.5					294.0	206.7	294.0	206.7		
	H39	10	5,040.5	3,407.4					294.0	198.7	294.0	198.7		
	H40	11	5,040.5	3,276.3					294.0	191.1	294.0	191.1		
	H41	12	5,040.5	3,150.3					294.0	183.8	294.0	183.8		
	H42	13	5,040.5	3,029.3					294.0	176.7	294.0	176.7		
	H43	14	5,040.5	2,908.4					294.0	169.6	294.0	169.6		
	H44	15	5,040.5	2,797.5					294.0	163.2	294.0	163.2		
	H45	16	5,040.5	2,691.6					294.0	157.0	294.0	157.0		
	H46	17	5,040.5	2,585.8					294.0	150.8	294.0	150.8		
	H47	18	5,040.5	2,490.0					294.0	145.2	294.0	145.2		
	H48	19	5,040.5	2,394.2					294.0	139.7	294.0	139.7		
	H49	20	5,040.5	2,298.5					294.0	134.1	294.0	134.1		
	H50	21	5,040.5	2,212.8					294.0	129.1	294.0	129.1		
	H51	22	5,040.5	2,127.1					294.0	124.1	294.0	124.1		
	H52	23	5,040.5	2,046.4					294.0	119.4	294.0	119.4		
	H53	24	5,040.5	1,965.8					294.0	114.7	294.0	114.7		
	H54	25	5,040.5	1,890.2					294.0	110.3	294.0	110.3		
	H55	26	5,040.5	1,819.6					294.0	106.1	294.0	106.1		
	H56	27	5,040.5	1,749.1					294.0	102.0	294.0	102.0		
	H57	28	5,040.5	1,678.5					294.0	97.9	294.0	97.9		
	H58	29	5,040.5	1,618.0					294.0	94.4	294.0	94.4		
	H59	30	5,040.5	1,552.5					294.0	90.6	294.0	90.6		
	H60	31	5,040.5	1,492.0					294.0	87.0	294.0	87.0		
	H61	32	5,040.5	1,436.5					294.0	83.8	294.0	83.8		
	H62	33	5,040.5	1,381.1					294.0	80.6	294.0	80.6		
	H63	34	5,040.5	1,330.7					294.0	77.6	294.0	77.6		
	H64	35	5,040.5	1,275.2					294.0	74.4	294.0	74.4		
	H65	36	5,040.5	1,229.9					294.0	71.7	294.0	71.7		
	H66	37	5,040.5	1,179.5					294.0	68.8	294.0	68.8		
	H67	38	5,040.5	1,134.1					294.0	66.2	294.0	66.2		
	H68	39	5,040.5	1,093.8					294.0	63.8	294.0	63.8		
	H69	40	5,040.5	1,048.4					294.0	61.2	294.0	61.2		
H70	41	5,040.5	1,008.1					294.0	58.8	294.0	58.8			
H71	42	5,040.5	972.8					294.0	56.7	294.0	56.7			
H72	43	5,040.5	932.5					294.0	54.4	294.0	54.4			
H73	44	5,040.5	897.2					294.0	52.3	294.0	52.3			
H74	45	5,040.5	861.9					294.0	50.3	294.0	50.3			
H75	46	5,040.5	831.7					294.0	48.5	294.0	48.5			
H76	47	5,040.5	796.4					294.0	46.5	294.0	46.5			
H77	48	5,040.5	766.2					294.0	44.7	294.0	44.7			
H78	49	5,040.5	735.9					294.0	42.9	294.0	42.9			
H79	50	5,040.5	710.7					294.0	41.5	294.0	41.5			
H80	51	5,040.5	680.5					294.0	39.7	294.0	39.7			
H81	52	5,040.5	655.3					294.0	38.2	294.0	38.2			
H82	53	5,040.5	630.1					294.0	36.8	294.0	36.8			
H83	54	5,040.5	604.9					294.0	35.3	294.0	35.3			
H84	55	5,040.5	584.7					294.0	34.1	294.0	34.1			
合計			299,253.5	136,591.9	14.6	136,606.5	3,600.2	4,059.4	18,816.3	9,424.7	22,416.5	13,484.1	10.13	123,122.4

様式-5

費用対便益 (全体事業：残工期+10%)

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (16年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	413.7	566.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,521.7	2,002.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	1,907.4	2,412.9			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	2,170.6	2,641.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	3,028.7	3,543.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	3,302.3	3,715.1			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,623.3	3,920.4			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	3,871.7	4,026.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	4,119.9	4,119.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	4,254.3	4,092.6			56.3	54.2	91.3	87.8	147.6	142.0		
	H31	2	4,287.2	3,965.7			362.6	335.4	78.4	72.5	441.0	407.9		
	H32	3	4,499.0	3,999.6			490.4	436.0	504.7	448.7	995.1	884.7		
	H33	4	4,785.5	4,091.6			436.6	373.3	682.6	583.6	1,119.2	956.9		
	H34	5	5,040.5	4,143.3			261.0	214.5	607.7	499.5	868.7	714.0		
	H35	6	5,040.5	3,982.0			85.3	67.4	363.3	287.0	448.6	354.4		
施設完成後の評価期間 (50年)	H36	7	5,040.5	3,830.8					118.7	90.2	118.7	90.2		
	H37	8	5,040.5	3,684.6					275.6	201.5	275.6	201.5		
	H38	9	5,040.5	3,543.5					275.6	193.7	275.6	193.7		
	H39	10	5,040.5	3,407.4					275.6	186.3	275.6	186.3		
	H40	11	5,040.5	3,276.3					275.6	179.1	275.6	179.1		
	H41	12	5,040.5	3,150.3					275.6	172.3	275.6	172.3		
	H42	13	5,040.5	3,029.3					275.6	165.6	275.6	165.6		
	H43	14	5,040.5	2,908.4					275.6	159.0	275.6	159.0		
	H44	15	5,040.5	2,797.5					275.6	153.0	275.6	153.0		
	H45	16	5,040.5	2,691.6					275.6	147.2	275.6	147.2		
	H46	17	5,040.5	2,585.8					275.6	141.4	275.6	141.4		
	H47	18	5,040.5	2,490.0					275.6	136.1	275.6	136.1		
	H48	19	5,040.5	2,394.2					275.6	130.9	275.6	130.9		
	H49	20	5,040.5	2,298.5					275.6	125.7	275.6	125.7		
	H50	21	5,040.5	2,212.8					275.6	121.0	275.6	121.0		
	H51	22	5,040.5	2,127.1					275.6	116.3	275.6	116.3		
	H52	23	5,040.5	2,046.4					275.6	111.9	275.6	111.9		
	H53	24	5,040.5	1,965.8					275.6	107.5	275.6	107.5		
	H54	25	5,040.5	1,890.2					275.6	103.4	275.6	103.4		
	H55	26	5,040.5	1,819.6					275.6	99.5	275.6	99.5		
	H56	27	5,040.5	1,749.1					275.6	95.6	275.6	95.6		
	H57	28	5,040.5	1,678.5					275.6	91.8	275.6	91.8		
	H58	29	5,040.5	1,618.0					275.6	88.5	275.6	88.5		
	H59	30	5,040.5	1,552.5					275.6	84.9	275.6	84.9		
	H60	31	5,040.5	1,492.0					275.6	81.6	275.6	81.6		
	H61	32	5,040.5	1,436.5					275.6	78.5	275.6	78.5		
	H62	33	5,040.5	1,381.1					275.6	75.5	275.6	75.5		
	H63	34	5,040.5	1,330.7					275.6	72.8	275.6	72.8		
	H64	35	5,040.5	1,275.2					275.6	69.7	275.6	69.7		
	H65	36	5,040.5	1,229.9					275.6	67.2	275.6	67.2		
	H66	37	5,040.5	1,179.5					275.6	64.5	275.6	64.5		
	H67	38	5,040.5	1,134.1					275.6	62.0	275.6	62.0		
	H68	39	5,040.5	1,093.8					275.6	59.8	275.6	59.8		
	H69	40	5,040.5	1,048.4					275.6	57.3	275.6	57.3		
	H70	41	5,040.5	1,008.1					275.6	55.1	275.6	55.1		
	H71	42	5,040.5	972.8					275.6	53.2	275.6	53.2		
H72	43	5,040.5	932.5					275.6	51.0	275.6	51.0			
H73	44	5,040.5	897.2					275.6	49.1	275.6	49.1			
H74	45	5,040.5	861.9					275.6	47.1	275.6	47.1			
H75	46	5,040.5	831.7					275.6	45.5	275.6	45.5			
H76	47	5,040.5	796.4					275.6	43.5	275.6	43.5			
H77	48	5,040.5	766.2					275.6	41.9	275.6	41.9			
H78	49	5,040.5	735.9					275.6	40.2	275.6	40.2			
H79	50	5,040.5	710.7					275.6	38.9	275.6	38.9			
H80	51	5,040.5	680.5					275.6	37.2	275.6	37.2			
H81	52	5,040.5	655.3					275.6	35.8	275.6	35.8			
H82	53	5,040.5	630.1					275.6	34.5	275.6	34.5			
H83	54	5,040.5	604.9					275.6	33.1	275.6	33.1			
H84	55	5,040.5	584.7					275.6	32.0	275.6	32.0			
H85	56	5,040.5	559.5					275.6	30.6	275.6	30.6			
合 計			303,891	136,802	15	136,817	3,769	4,182	17,915	8,897	21,684	13,079	10.46	123.737

様式-5 費用対便益 (全体事業: 残工期-10%)

水系名: 淀川水系 河川名: 野洲川

単位: 百万円

年次	年度	t	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (14年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	413.7	566.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,521.7	2,002.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	1,907.4	2,412.9			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	2,170.6	2,641.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	3,028.7	3,543.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	3,302.3	3,715.1			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,623.3	3,920.4			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	3,871.7	4,026.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	4,119.9	4,119.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	4,254.3	4,092.6			199.4	191.8	91.3	87.8	290.7	279.6		
	H31	2	4,358.9	4,032.0			710.0	656.8	277.6	256.8	987.6	913.6		
	H32	3	4,731.4	4,206.2			589.2	523.8	988.3	878.6	1,577.5	1,402.4		
	H33	4	5,040.5	4,309.6			193.9	165.8	820.2	701.3	1,014.1	867.1		
施設完成後の評価期間 (50年)	H34	5	5,040.5	4,143.3					269.9	221.9	269.9	221.9		
	H35	6	5,040.5	3,982.0					315.1	248.9	315.1	248.9		
	H36	7	5,040.5	3,830.8					315.1	239.5	315.1	239.5		
	H37	8	5,040.5	3,684.6					315.1	230.3	315.1	230.3		
	H38	9	5,040.5	3,543.5					315.1	221.5	315.1	221.5		
	H39	10	5,040.5	3,407.4					315.1	213.0	315.1	213.0		
	H40	11	5,040.5	3,276.3					315.1	204.8	315.1	204.8		
	H41	12	5,040.5	3,150.3					315.1	196.9	315.1	196.9		
	H42	13	5,040.5	3,029.3					315.1	189.4	315.1	189.4		
	H43	14	5,040.5	2,908.4					315.1	181.8	315.1	181.8		
	H44	15	5,040.5	2,797.5					315.1	174.9	315.1	174.9		
	H45	16	5,040.5	2,691.6					315.1	168.3	315.1	168.3		
	H46	17	5,040.5	2,585.8					315.1	161.6	315.1	161.6		
	H47	18	5,040.5	2,490.0					315.1	155.7	315.1	155.7		
	H48	19	5,040.5	2,394.2					315.1	149.7	315.1	149.7		
	H49	20	5,040.5	2,298.5					315.1	143.7	315.1	143.7		
	H50	21	5,040.5	2,212.8					315.1	138.3	315.1	138.3		
	H51	22	5,040.5	2,127.1					315.1	133.0	315.1	133.0		
	H52	23	5,040.5	2,046.4					315.1	127.9	315.1	127.9		
	H53	24	5,040.5	1,965.8					315.1	122.9	315.1	122.9		
	H54	25	5,040.5	1,890.2					315.1	118.2	315.1	118.2		
	H55	26	5,040.5	1,819.6					315.1	113.8	315.1	113.8		
	H56	27	5,040.5	1,749.1					315.1	109.3	315.1	109.3		
	H57	28	5,040.5	1,678.5					315.1	104.9	315.1	104.9		
	H58	29	5,040.5	1,618.0					315.1	101.1	315.1	101.1		
	H59	30	5,040.5	1,552.5					315.1	97.1	315.1	97.1		
	H60	31	5,040.5	1,492.0					315.1	93.3	315.1	93.3		
	H61	32	5,040.5	1,436.5					315.1	89.8	315.1	89.8		
	H62	33	5,040.5	1,381.1					315.1	86.3	315.1	86.3		
	H63	34	5,040.5	1,330.7					315.1	83.2	315.1	83.2		
	H64	35	5,040.5	1,275.2					315.1	79.7	315.1	79.7		
	H65	36	5,040.5	1,229.9					315.1	76.9	315.1	76.9		
	H66	37	5,040.5	1,179.5					315.1	73.7	315.1	73.7		
	H67	38	5,040.5	1,134.1					315.1	70.9	315.1	70.9		
	H68	39	5,040.5	1,093.8					315.1	68.4	315.1	68.4		
	H69	40	5,040.5	1,048.4					315.1	65.5	315.1	65.5		
	H70	41	5,040.5	1,008.1					315.1	63.0	315.1	63.0		
	H71	42	5,040.5	972.8					315.1	60.8	315.1	60.8		
	H72	43	5,040.5	932.5					315.1	58.3	315.1	58.3		
	H73	44	5,040.5	897.2					315.1	56.1	315.1	56.1		
	H74	45	5,040.5	861.9					315.1	53.9	315.1	53.9		
	H75	46	5,040.5	831.7					315.1	52.0	315.1	52.0		
	H76	47	5,040.5	796.4					315.1	49.8	315.1	49.8		
	H77	48	5,040.5	766.2					315.1	47.9	315.1	47.9		
	H78	49	5,040.5	735.9					315.1	46.0	315.1	46.0		
	H79	50	5,040.5	710.7					315.1	44.4	315.1	44.4		
	H80	51	5,040.5	680.5					315.1	42.5	315.1	42.5		
	H81	52	5,040.5	655.3					315.1	41.0	315.1	41.0		
	H82	53	5,040.5	630.1					315.1	39.4	315.1	39.4		
	H83	54	5,040.5	604.9					315.1	37.8	315.1	37.8		
合 計			294,369.4	136,148.4	16.1	136,164.5	3,769.7	4,239.5	19,850.6	10,031.6	23,620.3	14,271.1	9.54	121.893

様式-5 費用対便益 (全体事業:資産+10%)

水系名:淀川水系 河川名:野洲川

単位:百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	453.2	620.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,666.9	2,193.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	2,089.3	2,643.0			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	2,377.6	2,893.5			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	3,317.6	3,881.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	3,617.3	4,069.5			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,968.9	4,294.3			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	4,241.0	4,410.6			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	4,512.9	4,512.9			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	4,660.1	4,483.0			67.6	65.0	91.3	87.8	158.9	152.8		
	H31	2	4,707.6	4,354.5			527.0	487.5	94.1	87.0	621.1	574.5		
	H32	3	5,078.3	4,514.6			629.4	559.5	733.6	652.2	1,363.0	1,211.7		
	H33	4	5,521.0	4,720.5			365.9	312.8	876.1	749.1	1,242.0	1,061.9		
	H34	5	5,521.0	4,538.3			102.4	84.2	509.3	418.6	611.7	502.8		
施設完成後の評価期間 (50年)	H35	6	5,521.0	4,361.6					142.5	112.6	142.5	112.6		
	H36	7	5,521.0	4,196.0					294.0	223.4	294.0	223.4		
	H37	8	5,521.0	4,035.9					294.0	214.9	294.0	214.9		
	H38	9	5,521.0	3,881.3					294.0	206.7	294.0	206.7		
	H39	10	5,521.0	3,732.2					294.0	198.7	294.0	198.7		
	H40	11	5,521.0	3,588.7					294.0	191.1	294.0	191.1		
	H41	12	5,521.0	3,450.6					294.0	183.8	294.0	183.8		
	H42	13	5,521.0	3,318.1					294.0	176.7	294.0	176.7		
	H43	14	5,521.0	3,185.6					294.0	169.6	294.0	169.6		
	H44	15	5,521.0	3,064.2					294.0	163.2	294.0	163.2		
	H45	16	5,521.0	2,948.2					294.0	157.0	294.0	157.0		
	H46	17	5,521.0	2,832.3					294.0	150.8	294.0	150.8		
	H47	18	5,521.0	2,727.4					294.0	145.2	294.0	145.2		
	H48	19	5,521.0	2,622.5					294.0	139.7	294.0	139.7		
	H49	20	5,521.0	2,517.6					294.0	134.1	294.0	134.1		
	H50	21	5,521.0	2,423.7					294.0	129.1	294.0	129.1		
	H51	22	5,521.0	2,329.9					294.0	124.1	294.0	124.1		
	H52	23	5,521.0	2,241.5					294.0	119.4	294.0	119.4		
	H53	24	5,521.0	2,153.2					294.0	114.7	294.0	114.7		
	H54	25	5,521.0	2,070.4					294.0	110.3	294.0	110.3		
	H55	26	5,521.0	1,993.1					294.0	106.1	294.0	106.1		
	H56	27	5,521.0	1,915.8					294.0	102.0	294.0	102.0		
	H57	28	5,521.0	1,838.5					294.0	97.9	294.0	97.9		
	H58	29	5,521.0	1,772.2					294.0	94.4	294.0	94.4		
	H59	30	5,521.0	1,700.5					294.0	90.6	294.0	90.6		
	H60	31	5,521.0	1,634.2					294.0	87.0	294.0	87.0		
	H61	32	5,521.0	1,573.5					294.0	83.8	294.0	83.8		
	H62	33	5,521.0	1,512.8					294.0	80.6	294.0	80.6		
	H63	34	5,521.0	1,457.5					294.0	77.6	294.0	77.6		
	H64	35	5,521.0	1,396.8					294.0	74.4	294.0	74.4		
	H65	36	5,521.0	1,347.1					294.0	71.7	294.0	71.7		
	H66	37	5,521.0	1,291.9					294.0	68.8	294.0	68.8		
	H67	38	5,521.0	1,242.2					294.0	66.2	294.0	66.2		
	H68	39	5,521.0	1,198.1					294.0	63.8	294.0	63.8		
	H69	40	5,521.0	1,148.4					294.0	61.2	294.0	61.2		
H70	41	5,521.0	1,104.2					294.0	58.8	294.0	58.8			
H71	42	5,521.0	1,065.6					294.0	56.7	294.0	56.7			
H72	43	5,521.0	1,021.4					294.0	54.4	294.0	54.4			
H73	44	5,521.0	982.7					294.0	52.3	294.0	52.3			
H74	45	5,521.0	944.1					294.0	50.3	294.0	50.3			
H75	46	5,521.0	911.0					294.0	48.5	294.0	48.5			
H76	47	5,521.0	872.3					294.0	46.5	294.0	46.5			
H77	48	5,521.0	839.2					294.0	44.7	294.0	44.7			
H78	49	5,521.0	806.1					294.0	42.9	294.0	42.9			
H79	50	5,521.0	778.5					294.0	41.5	294.0	41.5			
H80	51	5,521.0	745.3					294.0	39.7	294.0	39.7			
H81	52	5,521.0	717.7					294.0	38.2	294.0	38.2			
H82	53	5,521.0	690.1					294.0	36.8	294.0	36.8			
H83	54	5,521.0	662.5					294.0	35.3	294.0	35.3			
H84	55	5,521.0	640.4					294.0	34.1	294.0	34.1			
合 計			327,782.7	149,614.9	15.5	149,630.4	3,769.5	4,210.3	18,816.3	9,424.7	22,585.8	13,635.0	10.97	135,995.4

様式-5 費用対便益 (全体事業：資産-10%)

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0			202.0	294.3	0.0	0.0	202.0	294.3		
	H21	-8	374.3	512.4			541.0	782.8	146.0	211.3	687.0	994.1		
	H22	-7	1,376.6	1,811.6			188.3	261.7	167.4	232.6	355.7	494.3		
	H23	-6	1,725.5	2,182.8			128.5	168.1	159.0	208.0	287.5	376.1		
	H24	-5	1,963.5	2,389.6			419.0	535.9	348.6	445.9	767.6	981.8		
	H25	-4	2,739.8	3,205.6			133.6	160.5	362.2	435.2	495.8	595.7		
	H26	-3	2,987.3	3,360.7			156.7	175.2	177.3	198.3	334.0	373.5		
	H27	-2	3,277.7	3,546.5			121.3	131.2	154.5	167.2	275.8	298.4		
	H28	-1	3,502.4	3,642.5			121.2	126.0	279.7	290.9	400.9	416.9		
	H29	0	3,727.0	3,727.0			65.6	65.6	168.7	168.7	234.3	234.3		
	H30	1	3,848.5	3,702.3			67.6	65.0	91.3	87.8	158.9	152.8		
	H31	2	3,887.8	3,596.2			527.0	487.5	94.1	87.0	621.1	574.5		
	H32	3	4,194.1	3,728.6			629.4	559.5	733.6	652.2	1,363.0	1,211.7		
	H33	4	4,560.0	3,898.8			365.9	312.8	876.1	749.1	1,242.0	1,061.9		
	H34	5	4,560.0	3,748.3			102.4	84.2	509.3	418.6	611.7	502.8		
施設完成後の評価期間 (50年)	H35	6	4,560.0	3,602.4					142.5	112.6	142.5	112.6		
	H36	7	4,560.0	3,465.6					294.0	223.4	294.0	223.4		
	H37	8	4,560.0	3,333.4					294.0	214.9	294.0	214.9		
	H38	9	4,560.0	3,205.7					294.0	206.7	294.0	206.7		
	H39	10	4,560.0	3,082.6					294.0	198.7	294.0	198.7		
	H40	11	4,560.0	2,964.0					294.0	191.1	294.0	191.1		
	H41	12	4,560.0	2,850.0					294.0	183.8	294.0	183.8		
	H42	13	4,560.0	2,740.6					294.0	176.7	294.0	176.7		
	H43	14	4,560.0	2,631.1					294.0	169.6	294.0	169.6		
	H44	15	4,560.0	2,530.8					294.0	163.2	294.0	163.2		
	H45	16	4,560.0	2,435.0					294.0	157.0	294.0	157.0		
	H46	17	4,560.0	2,339.3					294.0	150.8	294.0	150.8		
	H47	18	4,560.0	2,252.6					294.0	145.2	294.0	145.2		
	H48	19	4,560.0	2,166.0					294.0	139.7	294.0	139.7		
	H49	20	4,560.0	2,079.4					294.0	134.1	294.0	134.1		
	H50	21	4,560.0	2,001.8					294.0	129.1	294.0	129.1		
	H51	22	4,560.0	1,924.3					294.0	124.1	294.0	124.1		
	H52	23	4,560.0	1,851.4					294.0	119.4	294.0	119.4		
	H53	24	4,560.0	1,778.4					294.0	114.7	294.0	114.7		
	H54	25	4,560.0	1,710.0					294.0	110.3	294.0	110.3		
	H55	26	4,560.0	1,646.2					294.0	106.1	294.0	106.1		
	H56	27	4,560.0	1,582.3					294.0	102.0	294.0	102.0		
	H57	28	4,560.0	1,518.5					294.0	97.9	294.0	97.9		
	H58	29	4,560.0	1,463.8					294.0	94.4	294.0	94.4		
	H59	30	4,560.0	1,404.5					294.0	90.6	294.0	90.6		
	H60	31	4,560.0	1,349.8					294.0	87.0	294.0	87.0		
	H61	32	4,560.0	1,299.6					294.0	83.8	294.0	83.8		
	H62	33	4,560.0	1,249.4					294.0	80.6	294.0	80.6		
	H63	34	4,560.0	1,203.8					294.0	77.6	294.0	77.6		
	H64	35	4,560.0	1,153.7					294.0	74.4	294.0	74.4		
	H65	36	4,560.0	1,112.6					294.0	71.7	294.0	71.7		
	H66	37	4,560.0	1,067.0					294.0	68.8	294.0	68.8		
	H67	38	4,560.0	1,026.0					294.0	66.2	294.0	66.2		
	H68	39	4,560.0	989.5					294.0	63.8	294.0	63.8		
	H69	40	4,560.0	948.5					294.0	61.2	294.0	61.2		
H70	41	4,560.0	912.0					294.0	58.8	294.0	58.8			
H71	42	4,560.0	880.1					294.0	56.7	294.0	56.7			
H72	43	4,560.0	843.6					294.0	54.4	294.0	54.4			
H73	44	4,560.0	811.7					294.0	52.3	294.0	52.3			
H74	45	4,560.0	779.8					294.0	50.3	294.0	50.3			
H75	46	4,560.0	752.4					294.0	48.5	294.0	48.5			
H76	47	4,560.0	720.5					294.0	46.5	294.0	46.5			
H77	48	4,560.0	693.1					294.0	44.7	294.0	44.7			
H78	49	4,560.0	665.8					294.0	42.9	294.0	42.9			
H79	50	4,560.0	643.0					294.0	41.5	294.0	41.5			
H80	51	4,560.0	615.6					294.0	39.7	294.0	39.7			
H81	52	4,560.0	592.8					294.0	38.2	294.0	38.2			
H82	53	4,560.0	570.0					294.0	36.8	294.0	36.8			
H83	54	4,560.0	547.2					294.0	35.3	294.0	35.3			
H84	55	4,560.0	529.0					294.0	34.1	294.0	34.1			
合 計			270,724.5	123,569.1	15.5	123,584.6	3,769.5	4,210.3	18,816.3	9,424.7	22,585.8	13,635.0	9.06	109,949.6

様式-5

費用対便益（残事業）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値		
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0												
	H21	-8		0.0												
	H22	-7		0.0												
	H23	-6		0.0												
	H24	-5		0.0												
	H25	-4		0.0												
	H26	-3		0.0												
	H27	-2		0.0												
	H28	-1		0.0												
	H29	0		0.0												
	H30	1		0.0												
	H31	2		43.4	40.1			67.6	65.0		0.0	67.6	65.0			
	H32	3		381.9	339.5			527.0	487.5		94.1	87.0	621.1	574.5		
	H33	4		786.2	672.2			629.4	559.5		733.6	652.2	1,363.0	1,211.7		
	H34	5		786.2	646.3			365.9	312.8		876.1	749.1	1,242.0	1,061.9		
H35	6		786.2	621.1			102.4	84.2		509.3	418.6	611.7	502.8			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	7	786.2	597.5						142.5	112.6	142.5	112.6			
	H37	8	786.2	574.7						471.1	358.0	471.1	358.0			
	H38	9	786.2	552.7						471.1	344.4	471.1	344.4			
	H39	10	786.2	531.5						471.1	331.2	471.1	331.2			
	H40	11	786.2	511.0						471.1	318.5	471.1	318.5			
	H41	12	786.2	491.4						471.1	306.2	471.1	306.2			
	H42	13	786.2	472.5						471.1	294.4	471.1	294.4			
	H43	14	786.2	453.6						471.1	283.1	471.1	283.1			
	H44	15	786.2	436.3						471.1	271.8	471.1	271.8			
	H45	16	786.2	419.8						471.1	261.5	471.1	261.5			
	H46	17	786.2	403.3						471.1	251.6	471.1	251.6			
	H47	18	786.2	388.4						471.1	241.7	471.1	241.7			
	H48	19	786.2	373.4						471.1	232.7	471.1	232.7			
	H49	20	786.2	358.5						471.1	223.8	471.1	223.8			
	H50	21	786.2	345.1						471.1	214.8	471.1	214.8			
	H51	22	786.2	331.8						471.1	206.8	471.1	206.8			
	H52	23	786.2	319.2						471.1	198.8	471.1	198.8			
	H53	24	786.2	306.6						471.1	191.3	471.1	191.3			
	H54	25	786.2	294.8						471.1	183.7	471.1	183.7			
	H55	26	786.2	283.8						471.1	176.7	471.1	176.7			
	H56	27	786.2	272.8						471.1	170.1	471.1	170.1			
	H57	28	786.2	261.8						471.1	163.5	471.1	163.5			
	H58	29	786.2	252.4						471.1	156.9	471.1	156.9			
	H59	30	786.2	242.1						471.1	151.2	471.1	151.2			
	H60	31	786.2	232.7						471.1	145.1	471.1	145.1			
	H61	32	786.2	224.1						471.1	139.4	471.1	139.4			
	H62	33	786.2	215.4						471.1	134.3	471.1	134.3			
	H63	34	786.2	207.6						471.1	129.1	471.1	129.1			
	H64	35	786.2	198.9						471.1	124.4	471.1	124.4			
	H65	36	786.2	191.8						471.1	119.2	471.1	119.2			
	H66	37	786.2	184.0						471.1	114.9	471.1	114.9			
	H67	38	786.2	176.9						471.1	110.2	471.1	110.2			
	H68	39	786.2	170.6						471.1	106.0	471.1	106.0			
	H69	40	786.2	163.5						471.1	102.2	471.1	102.2			
	H70	41	786.2	157.2						471.1	98.0	471.1	98.0			
	H71	42	786.2	151.7						471.1	94.2	471.1	94.2			
H72	43	786.2	145.4						471.1	90.9	471.1	90.9				
H73	44	786.2	139.9						471.1	87.2	471.1	87.2				
H74	45	786.2	134.4						471.1	83.9	471.1	83.9				
H75	46	786.2	129.7						471.1	80.6	471.1	80.6				
H76	47	786.2	124.2						471.1	77.7	471.1	77.7				
H77	48	786.2	119.5						471.1	74.4	471.1	74.4				
H78	49	786.2	114.8						471.1	71.6	471.1	71.6				
H79	50	786.2	110.9						471.1	68.8	471.1	68.8				
H80	51	786.2	106.1						471.1	66.4	471.1	66.4				
H81	52	786.2	102.2						471.1	63.6	471.1	63.6				
H82	53	786.2	98.3						471.1	61.2	471.1	61.2				
H83	54	786.2	94.3						471.1	58.9	471.1	58.9				
H84	55	786.2	91.2						471.1	56.5	471.1	56.5				
合 計			41,307.7	15,579.5	12.5	15,592.0	1,692.3	1,509.0	25,439.5	9,965.5	27,131.8	11,474.5	1.36	4,117.5		

様式-5

費用対便益（残事業：残事業費+10%）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0											
	H21	-8		0.0											
	H22	-7		0.0											
	H23	-6		0.0											
	H24	-5		0.0											
	H25	-4		0.0											
	H26	-3		0.0											
	H27	-2		0.0											
	H28	-1		0.0											
	H29	0		0.0											
	H30	1		0.0											
	H31	2		43.4	40.1			74.4	71.6		0.0	74.4	71.6		
	H32	3		381.9	339.5			579.7	536.2	94.1	87.0	673.8	623.2		
	H33	4		786.2	672.2			692.4	615.5	733.6	652.2	1,426.0	1,267.7		
	H34	5		786.2	646.3			402.5	344.1	876.1	749.1	1,278.6	1,093.2		
H35	6		786.2	621.1			112.6	92.6	509.3	418.6	621.9	511.2			
H36	7		786.2	597.5					142.5	112.6	142.5	112.6			
H37	8		786.2	574.7					471.1	358.0	471.1	358.0			
H38	9		786.2	552.7					471.1	344.4	471.1	344.4			
H39	10		786.2	531.5					471.1	331.2	471.1	331.2			
H40	11		786.2	511.0					471.1	318.5	471.1	318.5			
H41	12		786.2	491.4					471.1	306.2	471.1	306.2			
H42	13		786.2	472.5					471.1	294.4	471.1	294.4			
H43	14		786.2	453.6					471.1	283.1	471.1	283.1			
H44	15		786.2	436.3					471.1	271.8	471.1	271.8			
H45	16		786.2	419.8					471.1	261.5	471.1	261.5			
H46	17		786.2	403.3					471.1	251.6	471.1	251.6			
H47	18		786.2	388.4					471.1	241.7	471.1	241.7			
H48	19		786.2	373.4					471.1	232.7	471.1	232.7			
H49	20		786.2	358.5					471.1	223.8	471.1	223.8			
H50	21		786.2	345.1					471.1	214.8	471.1	214.8			
H51	22		786.2	331.8					471.1	206.8	471.1	206.8			
H52	23		786.2	319.2					471.1	198.8	471.1	198.8			
H53	24		786.2	306.6					471.1	191.3	471.1	191.3			
H54	25		786.2	294.8					471.1	183.7	471.1	183.7			
H55	26		786.2	283.8					471.1	176.7	471.1	176.7			
H56	27		786.2	272.8					471.1	170.1	471.1	170.1			
H57	28		786.2	261.8					471.1	163.5	471.1	163.5			
H58	29		786.2	252.4					471.1	156.9	471.1	156.9			
H59	30		786.2	242.1					471.1	151.2	471.1	151.2			
H60	31		786.2	232.7					471.1	145.1	471.1	145.1			
H61	32		786.2	224.1					471.1	139.4	471.1	139.4			
H62	33		786.2	215.4					471.1	134.3	471.1	134.3			
H63	34		786.2	207.6					471.1	129.1	471.1	129.1			
H64	35		786.2	198.9					471.1	124.4	471.1	124.4			
H65	36		786.2	191.8					471.1	119.2	471.1	119.2			
H66	37		786.2	184.0					471.1	114.9	471.1	114.9			
H67	38		786.2	176.9					471.1	110.2	471.1	110.2			
H68	39		786.2	170.6					471.1	106.0	471.1	106.0			
H69	40		786.2	163.5					471.1	102.2	471.1	102.2			
H70	41		786.2	157.2					471.1	98.0	471.1	98.0			
H71	42		786.2	151.7					471.1	94.2	471.1	94.2			
H72	43		786.2	145.4					471.1	90.9	471.1	90.9			
H73	44		786.2	139.9					471.1	87.2	471.1	87.2			
H74	45		786.2	134.4					471.1	83.9	471.1	83.9			
H75	46		786.2	129.7					471.1	80.6	471.1	80.6			
H76	47		786.2	124.2					471.1	77.7	471.1	77.7			
H77	48		786.2	119.5					471.1	74.4	471.1	74.4			
H78	49		786.2	114.8					471.1	71.6	471.1	71.6			
H79	50		786.2	110.9					471.1	68.8	471.1	68.8			
H80	51		786.2	106.1					471.1	66.4	471.1	66.4			
H81	52		786.2	102.2					471.1	63.6	471.1	63.6			
H82	53		786.2	98.3					471.1	61.2	471.1	61.2			
H83	54		786.2	94.3					471.1	58.9	471.1	58.9			
H84	55		786.2	91.2					471.1	56.5	471.1	56.5			
合計			41,307.7	15,579.5	13.7	15,593.2	1,861.6	1,660.0	25,439.5	9,965.5	27,301.1	11,625.5	1.34	3,967.7	

様式-5

費用対便益（残事業：残事業費-10%）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0										
	H21	-8		0.0										
	H22	-7		0.0										
	H23	-6		0.0										
	H24	-5		0.0										
	H25	-4		0.0										
	H26	-3		0.0										
	H27	-2		0.0										
	H28	-1		0.0										
	H29	0		0.0										
	H30	1		0.0										
	H31	2		43.4	40.1			60.8	58.5		0.0	60.8	58.5	
	H32	3		381.9	339.5			474.3	438.7		94.1	87.0	568.4	525.7
	H33	4		786.2	672.2			566.4	503.5		733.6	652.2	1,300.0	1,155.7
	H34	5		786.2	646.3			329.3	281.6		876.1	749.1	1,205.4	1,030.7
H35	6		786.2	621.1			92.2	75.8		509.3	418.6	601.5	494.4	
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	6	786.2	621.1						142.5	112.6	142.5	112.6	
	H36	7	786.2	597.5						471.1	358.0	471.1	358.0	
	H37	8	786.2	574.7						471.1	344.4	471.1	344.4	
	H38	9	786.2	552.7						471.1	331.2	471.1	331.2	
	H39	10	786.2	531.5						471.1	318.5	471.1	318.5	
	H40	11	786.2	511.0						471.1	306.2	471.1	306.2	
	H41	12	786.2	491.4						471.1	294.4	471.1	294.4	
	H42	13	786.2	472.5						471.1	283.1	471.1	283.1	
	H43	14	786.2	453.6						471.1	271.8	471.1	271.8	
	H44	15	786.2	436.3						471.1	261.5	471.1	261.5	
	H45	16	786.2	419.8						471.1	251.6	471.1	251.6	
	H46	17	786.2	403.3						471.1	241.7	471.1	241.7	
	H47	18	786.2	388.4						471.1	232.7	471.1	232.7	
	H48	19	786.2	373.4						471.1	223.8	471.1	223.8	
	H49	20	786.2	358.5						471.1	214.8	471.1	214.8	
	H50	21	786.2	345.1						471.1	206.8	471.1	206.8	
	H51	22	786.2	331.8						471.1	198.8	471.1	198.8	
	H52	23	786.2	319.2						471.1	191.3	471.1	191.3	
	H53	24	786.2	306.6						471.1	183.7	471.1	183.7	
	H54	25	786.2	294.8						471.1	176.7	471.1	176.7	
	H55	26	786.2	283.8						471.1	170.1	471.1	170.1	
	H56	27	786.2	272.8						471.1	163.5	471.1	163.5	
	H57	28	786.2	261.8						471.1	156.9	471.1	156.9	
	H58	29	786.2	252.4						471.1	151.2	471.1	151.2	
	H59	30	786.2	242.1						471.1	145.1	471.1	145.1	
	H60	31	786.2	232.7						471.1	139.4	471.1	139.4	
	H61	32	786.2	224.1						471.1	134.3	471.1	134.3	
	H62	33	786.2	215.4						471.1	129.1	471.1	129.1	
	H63	34	786.2	207.6						471.1	124.4	471.1	124.4	
	H64	35	786.2	198.9						471.1	119.2	471.1	119.2	
	H65	36	786.2	191.8						471.1	114.9	471.1	114.9	
	H66	37	786.2	184.0						471.1	110.2	471.1	110.2	
	H67	38	786.2	176.9						471.1	106.0	471.1	106.0	
	H68	39	786.2	170.6						471.1	102.2	471.1	102.2	
	H69	40	786.2	163.5						471.1	98.0	471.1	98.0	
H70	41	786.2	157.2						471.1	94.2	471.1	94.2		
H71	42	786.2	151.7						471.1	90.9	471.1	90.9		
H72	43	786.2	145.4						471.1	87.2	471.1	87.2		
H73	44	786.2	139.9						471.1	83.9	471.1	83.9		
H74	45	786.2	134.4						471.1	80.6	471.1	80.6		
H75	46	786.2	129.7						471.1	77.7	471.1	77.7		
H76	47	786.2	124.2						471.1	74.4	471.1	74.4		
H77	48	786.2	119.5						471.1	71.6	471.1	71.6		
H78	49	786.2	114.8						471.1	68.8	471.1	68.8		
H79	50	786.2	110.9						471.1	66.4	471.1	66.4		
H80	51	786.2	106.1						471.1	63.6	471.1	63.6		
H81	52	786.2	102.2						471.1	61.2	471.1	61.2		
H82	53	786.2	98.3						471.1	58.9	471.1	58.9		
H83	54	786.2	94.3						471.1	56.5	471.1	56.5		
H84	55	786.2	91.2						471.1	54.6	471.1	54.6		
合計			41,307.7	15,579.5	11.2	15,590.7	1,523.0	1,358.1	25,439.5	9,965.5	26,962.5	11,323.6	1.38	4,267.1

様式-5 費用対便益（残事業：残工期+10%） 水系名：淀川水系 河川名：野洲川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (16年)	H20	-9		0.0										
	H21	-8		0.0										
	H22	-7		0.0										
	H23	-6		0.0										
	H24	-5		0.0										
	H25	-4		0.0										
	H26	-3		0.0										
	H27	-2		0.0										
	H28	-1		0.0										
	H29	0		0.0										
	H30	1		0.0										
	H31	2		32.9	30.4		56.3	54.2		0.0	56.3	54.2		
	H32	3		244.7	217.5		362.6	335.4	78.4	72.5	441.0	407.9		
	H33	4		531.2	454.2		490.4	436.0	504.7	448.7	995.1	884.7		
	H34	5		786.2	646.3		436.6	373.3	682.6	583.6	1,119.2	956.9		
	H35	6		786.2	621.1		261.0	214.5	607.7	499.5	868.7	714.0		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	7	786.2	597.5		85.3	67.4	363.3	287.0	448.6	354.4			
	H37	8	786.2	574.7					118.7	90.2	118.7	90.2		
	H38	9	786.2	552.7					392.6	287.0	392.6	287.0		
	H39	10	786.2	531.5					392.6	276.0	392.6	276.0		
	H40	11	786.2	511.0					392.6	265.4	392.6	265.4		
	H41	12	786.2	491.4					392.6	265.4	392.6	265.4		
	H42	13	786.2	472.5					392.6	255.2	392.6	255.2		
	H43	14	786.2	453.6					392.6	245.4	392.6	245.4		
	H44	15	786.2	436.3					392.6	245.4	392.6	245.4		
	H45	16	786.2	419.8					392.6	236.0	392.6	236.0		
	H46	17	786.2	403.3					392.6	236.0	392.6	236.0		
	H47	18	786.2	388.4					392.6	226.5	392.6	226.5		
	H48	19	786.2	373.4					392.6	226.5	392.6	226.5		
	H49	20	786.2	358.5					392.6	217.9	392.6	217.9		
	H50	21	786.2	345.1					392.6	217.9	392.6	217.9		
	H51	22	786.2	331.8					392.6	209.6	392.6	209.6		
	H52	23	786.2	319.2					392.6	209.6	392.6	209.6		
	H53	24	786.2	306.6					392.6	201.4	392.6	201.4		
	H54	25	786.2	294.8					392.6	201.4	392.6	201.4		
	H55	26	786.2	283.8					392.6	193.9	392.6	193.9		
	H56	27	786.2	272.8					392.6	193.9	392.6	193.9		
	H57	28	786.2	261.8					392.6	186.5	392.6	186.5		
	H58	29	786.2	252.4					392.6	186.5	392.6	186.5		
	H59	30	786.2	242.1					392.6	179.0	392.6	179.0		
	H60	31	786.2	232.7					392.6	179.0	392.6	179.0		
	H61	32	786.2	224.1					392.6	172.4	392.6	172.4		
	H62	33	786.2	215.4					392.6	172.4	392.6	172.4		
	H63	34	786.2	207.6					392.6	165.7	392.6	165.7		
	H64	35	786.2	198.9					392.6	165.7	392.6	165.7		
	H65	36	786.2	191.8					392.6	159.4	392.6	159.4		
	H66	37	786.2	184.0					392.6	159.4	392.6	159.4		
	H67	38	786.2	176.9					392.6	153.1	392.6	153.1		
	H68	39	786.2	170.6					392.6	153.1	392.6	153.1		
	H69	40	786.2	163.5					392.6	147.2	392.6	147.2		
	H70	41	786.2	157.2					392.6	147.2	392.6	147.2		
	H71	42	786.2	151.7					392.6	141.7	392.6	141.7		
	H72	43	786.2	145.4					392.6	141.7	392.6	141.7		
	H73	44	786.2	139.9					392.6	136.2	392.6	136.2		
	H74	45	786.2	134.4					392.6	136.2	392.6	136.2		
	H75	46	786.2	129.7					392.6	130.7	392.6	130.7		
	H76	47	786.2	124.2					392.6	130.7	392.6	130.7		
H77	48	786.2	119.5					392.6	126.0	392.6	126.0			
H78	49	786.2	114.8					392.6	126.0	392.6	126.0			
H79	50	786.2	110.9					392.6	120.9	392.6	120.9			
H80	51	786.2	106.1					392.6	120.9	392.6	120.9			
H81	52	786.2	102.2					392.6	116.2	392.6	116.2			
H82	53	786.2	98.3					392.6	116.2	392.6	116.2			
H83	54	786.2	94.3					392.6	111.9	392.6	111.9			
H84	55	786.2	91.2					392.6	111.9	392.6	111.9			
H85	56	786.2	87.3					392.6	107.6	392.6	107.6			
合計			41,691	15,317	12	15,329	1,692	1,481	21,593	8,349	23,285	9,829	1.56	5,500

様式-5 費用対便益（残事業：残工期-10%）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (14年)	H20	-9		0.0										
	H21	-8		0.0										
	H22	-7		0.0										
	H23	-6		0.0										
	H24	-5		0.0										
	H25	-4		0.0										
	H26	-3		0.0										
	H27	-2		0.0										
	H28	-1		0.0										
	H29	0		0.0										
H30	1		0.0											
H31	2		104.6	96.8			199.4	191.8		0.0	199.4	191.8		
H32	3		477.1	424.1			710.0	656.8		277.6	256.8	987.6	913.6	
H33	4		786.2	672.2			589.2	523.8		988.3	878.6	1,577.5	1,402.4	
H34	5		786.2	646.3			193.9	165.8		820.2	701.3	1,014.1	867.1	
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35	6	786.2	621.1							269.9	221.9	269.9	221.9
	H36	7	786.2	597.5							589.0	465.3	589.0	465.3
	H37	8	786.2	574.7							589.0	447.6	589.0	447.6
	H38	9	786.2	552.7							589.0	430.6	589.0	430.6
	H39	10	786.2	531.5							589.0	414.1	589.0	414.1
	H40	11	786.2	511.0							589.0	398.2	589.0	398.2
	H41	12	786.2	491.4							589.0	382.9	589.0	382.9
	H42	13	786.2	472.5							589.0	368.1	589.0	368.1
	H43	14	786.2	453.6							589.0	354.0	589.0	354.0
	H44	15	786.2	436.3							589.0	350.0	589.0	350.0
	H45	16	786.2	419.8							589.0	339.9	589.0	339.9
	H46	17	786.2	403.3							589.0	326.9	589.0	326.9
	H47	18	786.2	388.4							589.0	314.5	589.0	314.5
	H48	19	786.2	373.4							589.0	302.2	589.0	302.2
	H49	20	786.2	358.5							589.0	302.2	589.0	302.2
	H50	21	786.2	345.1							589.0	291.0	589.0	291.0
	H51	22	786.2	331.8							589.0	279.8	589.0	279.8
	H52	23	786.2	319.2							589.0	268.6	589.0	268.6
	H53	24	786.2	306.6							589.0	258.6	589.0	258.6
	H54	25	786.2	294.8							589.0	248.6	589.0	248.6
	H55	26	786.2	283.8							589.0	239.1	589.0	239.1
	H56	27	786.2	272.8							589.0	229.7	589.0	229.7
	H57	28	786.2	261.8							589.0	220.9	589.0	220.9
	H58	29	786.2	252.4							589.0	212.6	589.0	212.6
	H59	30	786.2	242.1							589.0	204.4	589.0	204.4
	H60	31	786.2	232.7							589.0	196.1	589.0	196.1
	H61	32	786.2	224.1							589.0	189.1	589.0	189.1
	H62	33	786.2	215.4							589.0	181.4	589.0	181.4
	H63	34	786.2	207.6							589.0	174.3	589.0	174.3
	H64	35	786.2	198.9							589.0	167.9	589.0	167.9
H65	36	786.2	191.8							589.0	161.4	589.0	161.4	
H66	37	786.2	184.0							589.0	155.5	589.0	155.5	
H67	38	786.2	176.9							589.0	149.0	589.0	149.0	
H68	39	786.2	170.6							589.0	143.7	589.0	143.7	
H69	40	786.2	163.5							589.0	137.8	589.0	137.8	
H70	41	786.2	157.2							589.0	132.5	589.0	132.5	
H71	42	786.2	151.7							589.0	127.8	589.0	127.8	
H72	43	786.2	145.4							589.0	122.5	589.0	122.5	
H73	44	786.2	139.9							589.0	117.8	589.0	117.8	
H74	45	786.2	134.4							589.0	113.7	589.0	113.7	
H75	46	786.2	129.7							589.0	109.0	589.0	109.0	
H76	47	786.2	124.2							589.0	104.8	589.0	104.8	
H77	48	786.2	119.5							589.0	100.7	589.0	100.7	
H78	49	786.2	114.8							589.0	97.2	589.0	97.2	
H79	50	786.2	110.9							589.0	93.1	589.0	93.1	
H80	51	786.2	106.1							589.0	89.5	589.0	89.5	
H81	52	786.2	102.2							589.0	86.0	589.0	86.0	
H82	53	786.2	98.3							589.0	83.0	589.0	83.0	
H83	54	786.2	94.3							589.0	79.5	589.0	79.5	
合計			40,677.9	15,629.6	13.0	15,642.6	1,692.5	1,538.2	31,217.0	12,390.4	32,909.5	13,928.6	1.12	1,714

様式-5

費用対便益（残事業：資産+10%）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0										
	H21	-8		0.0										
	H22	-7		0.0										
	H23	-6		0.0										
	H24	-5		0.0										
	H25	-4		0.0										
	H26	-3		0.0										
	H27	-2		0.0										
	H28	-1		0.0										
	H29	0		0.0										
	H30	1		0.0										
	H31	2		47.6	44.0			67.6	65.0		0.0	67.6	65.0	
	H32	3		418.3	371.9			527.0	487.5		94.1	87.0	621.1	574.5
	H33	4		861.0	736.2			629.4	559.5		733.6	652.2	1,363.0	1,211.7
	H34	5		861.0	707.7			365.9	312.8		876.1	749.1	1,242.0	1,061.9
H35	6		861.0	680.2			102.4	84.2		509.3	418.6	611.7	502.8	
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	7	861.0	654.4						142.5	112.6	142.5	112.6	
	H37	8	861.0	629.4						471.1	358.0	471.1	358.0	
	H38	9	861.0	605.3						471.1	344.4	471.1	344.4	
	H39	10	861.0	582.0						471.1	331.2	471.1	331.2	
	H40	11	861.0	559.7						471.1	318.5	471.1	318.5	
	H41	12	861.0	538.1						471.1	306.2	471.1	306.2	
	H42	13	861.0	517.5						471.1	294.4	471.1	294.4	
	H43	14	861.0	496.8						471.1	283.1	471.1	283.1	
	H44	15	861.0	477.9						471.1	271.8	471.1	271.8	
	H45	16	861.0	459.8						471.1	261.5	471.1	261.5	
	H46	17	861.0	441.7						471.1	251.6	471.1	251.6	
	H47	18	861.0	425.3						471.1	241.7	471.1	241.7	
	H48	19	861.0	409.0						471.1	232.7	471.1	232.7	
	H49	20	861.0	392.6						471.1	223.8	471.1	223.8	
	H50	21	861.0	378.0						471.1	214.8	471.1	214.8	
	H51	22	861.0	363.3						471.1	214.8	471.1	214.8	
	H52	23	861.0	349.6						471.1	206.8	471.1	206.8	
	H53	24	861.0	335.8						471.1	206.8	471.1	206.8	
	H54	25	861.0	322.9						471.1	198.8	471.1	198.8	
	H55	26	861.0	310.8						471.1	191.3	471.1	191.3	
	H56	27	861.0	298.8						471.1	183.7	471.1	183.7	
	H57	28	861.0	286.7						471.1	176.7	471.1	176.7	
	H58	29	861.0	276.4						471.1	170.1	471.1	170.1	
	H59	30	861.0	265.2						471.1	170.1	471.1	170.1	
	H60	31	861.0	254.9						471.1	163.5	471.1	163.5	
	H61	32	861.0	245.4						471.1	163.5	471.1	163.5	
	H62	33	861.0	235.9						471.1	156.9	471.1	156.9	
	H63	34	861.0	227.3						471.1	156.9	471.1	156.9	
	H64	35	861.0	217.8						471.1	151.2	471.1	151.2	
	H65	36	861.0	210.1						471.1	151.2	471.1	151.2	
	H66	37	861.0	201.5						471.1	145.1	471.1	145.1	
	H67	38	861.0	193.7						471.1	145.1	471.1	145.1	
	H68	39	861.0	186.8						471.1	139.4	471.1	139.4	
	H69	40	861.0	179.1						471.1	139.4	471.1	139.4	
H70	41	861.0	172.2						471.1	134.3	471.1	134.3		
H71	42	861.0	166.2						471.1	134.3	471.1	134.3		
H72	43	861.0	159.3						471.1	129.1	471.1	129.1		
H73	44	861.0	153.3						471.1	129.1	471.1	129.1		
H74	45	861.0	147.2						471.1	124.4	471.1	124.4		
H75	46	861.0	142.1						471.1	124.4	471.1	124.4		
H76	47	861.0	136.0						471.1	119.2	471.1	119.2		
H77	48	861.0	130.9						471.1	119.2	471.1	119.2		
H78	49	861.0	125.7						471.1	114.9	471.1	114.9		
H79	50	861.0	121.4						471.1	110.2	471.1	110.2		
H80	51	861.0	116.2						471.1	106.0	471.1	106.0		
H81	52	861.0	111.9						471.1	106.0	471.1	106.0		
H82	53	861.0	107.6						471.1	102.2	471.1	102.2		
H83	54	861.0	103.3						471.1	98.0	471.1	98.0		
H84	55	861.0	99.9						471.1	98.0	471.1	98.0		
合計			45,237.9	17,062.7	12.5	17,075.2	1,692.3	1,509.0	25,439.5	9,965.5	27,131.8	11,474.5	1.49	5,600.7

様式-5

費用対便益（残事業：資産-10%）

水系名：淀川水系 河川名：野洲川

単位：百万円

年次	年度	t	便益(B)		残存価値 ②	計 ①+②	費用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (15年)	H20	-9		0.0										
	H21	-8		0.0										
	H22	-7		0.0										
	H23	-6		0.0										
	H24	-5		0.0										
	H25	-4		0.0										
	H26	-3		0.0										
	H27	-2		0.0										
	H28	-1		0.0										
	H29	0		0.0										
	H30	1		0.0										
	H31	2		39.3	36.4			67.6	65.0		0.0	67.6	65.0	
	H32	3		345.6	307.2			527.0	487.5	94.1	87.0	621.1	574.5	
	H33	4		711.4	608.2			629.4	559.5	733.6	652.2	1,363.0	1,211.7	
	H34	5		711.4	584.8			365.9	312.8	876.1	749.1	1,242.0	1,061.9	
H35	6		711.4	562.0			102.4	84.2	509.3	418.6	611.7	502.8		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H36	7	711.4	540.7					142.5	112.6	142.5	112.6		
	H37	8	711.4	520.0					471.1	358.0	471.1	358.0		
	H38	9	711.4	500.1					471.1	344.4	471.1	344.4		
	H39	10	711.4	480.9					471.1	331.2	471.1	331.2		
	H40	11	711.4	462.4					471.1	318.5	471.1	318.5		
	H41	12	711.4	444.6					471.1	306.2	471.1	306.2		
	H42	13	711.4	427.6					471.1	294.4	471.1	294.4		
	H43	14	711.4	410.5					471.1	283.1	471.1	283.1		
	H44	15	711.4	394.8					471.1	271.8	471.1	271.8		
	H45	16	711.4	379.9					471.1	261.5	471.1	261.5		
	H46	17	711.4	364.9					471.1	251.6	471.1	251.6		
	H47	18	711.4	351.4					471.1	241.7	471.1	241.7		
	H48	19	711.4	337.9					471.1	232.7	471.1	232.7		
	H49	20	711.4	324.4					471.1	223.8	471.1	223.8		
	H50	21	711.4	312.3					471.1	214.8	471.1	214.8		
	H51	22	711.4	300.2					471.1	206.8	471.1	206.8		
	H52	23	711.4	288.8					471.1	198.8	471.1	198.8		
	H53	24	711.4	277.4					471.1	191.3	471.1	191.3		
	H54	25	711.4	266.8					471.1	183.7	471.1	183.7		
	H55	26	711.4	256.8					471.1	176.7	471.1	176.7		
	H56	27	711.4	246.9					471.1	170.1	471.1	170.1		
	H57	28	711.4	236.9					471.1	163.5	471.1	163.5		
	H58	29	711.4	228.4					471.1	156.9	471.1	156.9		
	H59	30	711.4	219.1					471.1	151.2	471.1	151.2		
	H60	31	711.4	210.6					471.1	145.1	471.1	145.1		
	H61	32	711.4	202.7					471.1	139.4	471.1	139.4		
	H62	33	711.4	194.9					471.1	134.3	471.1	134.3		
	H63	34	711.4	187.8					471.1	129.1	471.1	129.1		
	H64	35	711.4	180.0					471.1	124.4	471.1	124.4		
	H65	36	711.4	173.6					471.1	119.2	471.1	119.2		
	H66	37	711.4	166.5					471.1	114.9	471.1	114.9		
	H67	38	711.4	160.1					471.1	110.2	471.1	110.2		
	H68	39	711.4	154.4					471.1	106.0	471.1	106.0		
	H69	40	711.4	148.0					471.1	102.2	471.1	102.2		
	H70	41	711.4	142.3					471.1	98.0	471.1	98.0		
H71	42	711.4	137.3					471.1	94.2	471.1	94.2			
H72	43	711.4	131.6					471.1	90.9	471.1	90.9			
H73	44	711.4	126.6					471.1	87.2	471.1	87.2			
H74	45	711.4	121.6					471.1	83.9	471.1	83.9			
H75	46	711.4	117.4					471.1	80.6	471.1	80.6			
H76	47	711.4	112.4					471.1	77.7	471.1	77.7			
H77	48	711.4	108.1					471.1	74.4	471.1	74.4			
H78	49	711.4	103.9					471.1	71.6	471.1	71.6			
H79	50	711.4	100.3					471.1	68.8	471.1	68.8			
H80	51	711.4	96.0					471.1	66.4	471.1	66.4			
H81	52	711.4	92.5					471.1	63.6	471.1	63.6			
H82	53	711.4	88.9					471.1	61.2	471.1	61.2			
H83	54	711.4	85.4					471.1	58.9	471.1	58.9			
H84	55	711.4	82.5					471.1	56.5	471.1	56.5			
合計			37,377.7	14,097.7	12.5	14,110.2	1,692.3	1,509.0	25,439.5	9,965.5	27,131.8	11,474.5	1.23	2,635.7

様式 - 6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	野洲川直轄河川改修事業 (全体事業費)
-----	---------------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	2,093		
	本工事費			式	1	2,093	
		野洲川堤防強化	m	12,700	1,133		
		危機管理型ハード対策	m	1,850	240		
		水防拠点整備等	式	1	720		
附帯工事費			式	-	-		
用地費及補償費			式	1	3		
	用地費		式	-	-		
	補償費		式	1	3		
間接経費			式	1	1,213		
工事諸費			式	1	669		
事業費 計			式	1	3,978		

維持管理費	式	1	9,037	30年間(H20～H49)
-------	---	---	-------	---------------

事業費の内訳書

河川事業

事業名	野洲川直轄河川改修事業	(残事業費)
-----	-------------	--------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	1,120		
	本工事費			式	1	1,120	
		野洲川堤防強化	m	420	190		
		危機管理型ハード対策	m	1,650	210		
		水防拠点整備等	式	1	720		
	附帯工事費			式	-	-	
用地費及補償費			式	-	-		
	用地費			式	-	-	
	補償費			式	-	-	
間接経費			式	1	383		
工事諸費			式	1	301		
事業費 計			式	1	1,804		


維持管理費	式	1	9,540	20年間(H30～H49)
-------	---	---	-------	---------------

淀川水系直轄河川改修事業

猪名川直轄河川改修事業

様式 - 1

様式-1 氾濫ブロック分割図

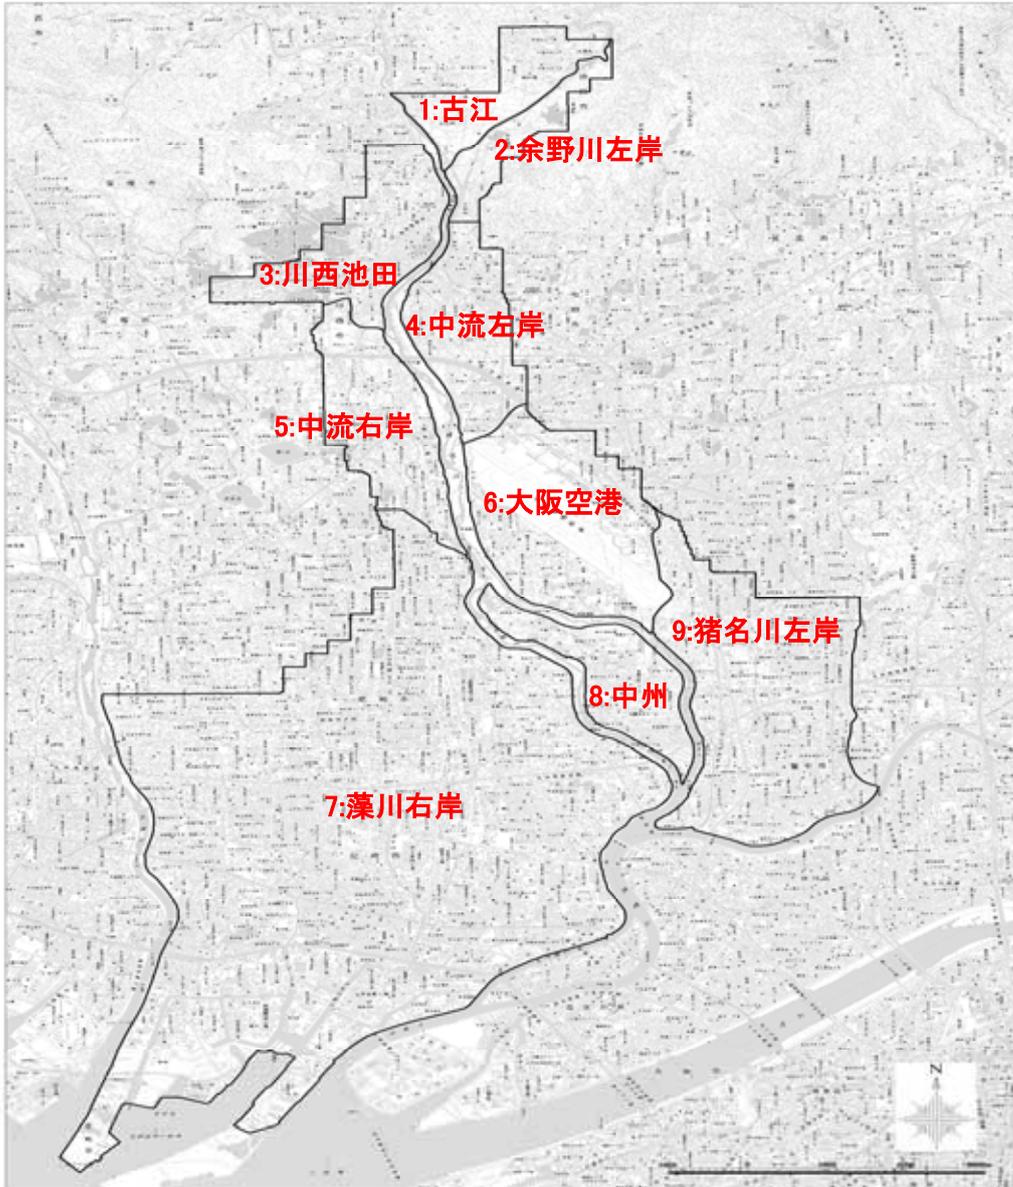

様式－2

氾濫 ブロック	面積 (ha)	人口 (人)	世帯数	一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)						農作物資産(百万円)			一般資産額等 合計					
				従業者数(人) (産業分類別に算出)										農漁 家数 (戸)	延床 面積 (千m ²)	水田 面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	
				鉱業	建設業	製造業	電気 ガス	運輸 通信	小売業	金融 保険	不動産	サービ ス業	公務							償却	在庫	償却						在庫
1:古江	244	6,957	2,516	0	94	109	7	14	186	7	18	671	6	65	304	10	70	61,746	32,718	3,310	1,351	102	33	99,260	8	391	399	99,659
2:余野川左岸	162	2,090	749	0	96	11	3	0	99	0	18	538	9	62	91	12	25	18,521	9,749	2,206	713	99	32	31,320	9	143	152	31,472
3:川西池田	420	35,108	14,951	0	531	319	64	627	2,996	542	679	8,181	931	87	2,139	3	5	414,804	194,452	49,018	15,783	138	44	674,239	3	14	17	674,256
4:中流左岸	375	29,056	12,855	0	365	5,344	88	578	2,018	406	395	5,647	1,029	62	1,735	1	12	353,848	167,201	62,341	33,605	98	31	617,124	1	69	70	617,194
5:中流右岸	410	25,905	10,199	0	596	4,915	13	1,320	2,521	50	196	3,695	975	91	1,253	21	13	243,088	132,675	49,397	31,738	144	46	457,088	17	35	52	457,140
6:大阪空港	689	17,981	8,382	0	669	4,866	86	3,635	1,698	66	453	4,208	563	48	980	13	1	196,410	109,034	74,779	34,658	76	24	414,981	10	3	13	414,994
7:藻川右岸	4,269	413,001	190,461	36	11,155	41,280	875	16,567	36,964	3,876	5,434	81,625	4,278	318	22,307	15	0	4,326,280	2,477,075	739,089	355,984	505	158	7,899,091	12	0	12	7,899,103
8:中州	301	25,243	11,419	0	485	1,086	46	441	1,182	51	188	3,204	22	26	1,872	11	0	364,890	148,513	25,837	10,759	42	14	550,055	9	0	9	550,064
9:猪名川左岸	1,013	107,988	49,582	0	2,437	9,955	249	3,197	8,260	339	1,701	19,634	396	76	5,547	2	3	1,129,777	644,858	183,473	85,705	122	38	2,043,973	2	18	20	2,043,993
合計	7,883	663,329	301,114	36	16,428	67,885	1,431	26,379	55,924	5,337	9,082	127,403	8,209	835	36,228	87	129	7,109,364	3,916,275	1,189,450	570,296	1,326	420	12,787,131	71	673	744	12,787,875

様式－3

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	14,752	14,189.4	5,809.5	1,808.7	377.6	1.1	0.5	22,186.8	0.3	0.0	0.3	37,584.3	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	62,470.4	62,470.4	
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	14,189.4	5,809.5	1,808.7	377.6	1.1	0.5	22,186.8	0.3	0.0	0.3	37,584.3	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	62,470.4	62,470.4	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,621	5,064.6	2,426.7	5,642.8	1,545.0	4.1	1.9	14,685.1	3.6	0.6	4.2	24,876.3	947.6	137.6	189.7	327.3	300.1	0.0	1,575.0	41,140.6	41,140.6	
7：藻川右岸	58,973	54,585.3	30,284.4	20,690.9	5,116.4	4.0	1.7	110,682.7	0.0	0.0	0.0	187,496.4	10,139.7	2,730.2	4,576.9	7,307.1	3,361.6	0.0	20,808.4	318,987.5	318,987.5	
8：中州	15,530	24,809.1	12,624.2	3,179.8	696.1	2.4	1.1	41,312.7	0.4	0.0	0.4	69,983.5	1,070.8	879.7	1,328.0	2,207.7	552.1	0.0	3,830.6	115,127.2	115,127.2	
9：猪名川左岸	40,761	29,171.3	16,502.2	12,031.1	3,117.4	3.2	1.3	60,826.5	0.0	0.0	0.0	103,040.1	4,633.1	1,539.1	2,630.5	4,169.6	1,696.5	0.0	10,499.2	174,365.8	174,365.8	
合計	117,885	113,630.3	61,837.5	41,544.6	10,474.9	13.7	6.0	227,507.0	4.0	0.6	4.6	385,396.3	16,791.2	5,286.6	8,725.1	14,011.7	5,910.3	0.0	36,713.2	649,621.1	649,621.1	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	520	722.4	126.2	253.8	122.3	0.1	0.1	1,224.9	0.2	0.0	0.2	2,075.2	107.0	14.1	24.9	39.0	8.3	0.0	154.3	3,454.6		
5：中流右岸	9,586	19,687.3	18,587.2	9,950.5	5,102.8	12.6	5.7	53,346.1	0.7	5.9	6.6	90,368.4	3,689.7	1,227.8	1,191.9	2,419.7	1,362.4	0.0	7,471.8	151,192.9		
6：大阪空港	2,908	6,902.2	3,612.2	7,656.6	2,179.0	5.8	2.8	20,358.6	3.7	0.9	4.6	34,487.3	1,228.9	197.7	246.8	444.5	425.2	0.0	2,098.6	56,949.1		
7：藻川右岸	120,886	126,536.9	80,328.3	48,569.5	14,146.4	21.2	8.6	269,610.9	1.4	0.0	1.4	456,721.0	22,876.0	6,774.5	10,203.4	16,977.9	7,987.5	0.0	47,841.4	774,174.7		
8：中州	18,205	48,781.0	28,987.0	7,518.6	1,834.9	7.5	3.4	87,132.4	3.2	0.0	3.2	147,602.3	1,910.3	1,738.2	2,100.4	3,838.6	1,202.9	0.0	6,951.8	241,689.7		
9：猪名川左岸	43,911	40,418.9	27,818.9	16,233.4	4,205.6	5.3	2.3	88,684.4	0.1	0.4	0.5	150,231.4	5,498.1	2,006.0	3,288.6	5,294.6	2,202.5	0.0	12,995.2	251,911.5		
合計	196,016	243,048.7	159,459.8	90,182.4	27,591.0	52.5	22.9	520,357.3	9.3	7.2	16.5	881,485.6	35,310.0	11,958.3	17,056.0	29,014.3	13,188.8	0.0	77,513.1	1,479,372.5		

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	6	15.8	0.5	8.2	1.9	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	44.7	1.9	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	2.4	73.5		
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	34	95.2	16.1	4.4	1.4	0.0	0.0	117.1	0.0	0.4	0.4	198.3	1.8	1.2	2.0	3.2	0.7	0.0	5.7	321.5		
4：中流左岸	6,759	10,233.9	3,882.3	3,272.3	1,510.0	3.2	1.5	18,903.2	0.3	2.0	2.3	32,021.9	1,053.6	290.4	463.1	753.5	258.5	0.0	2,065.6	52,993.0		
5：中流右岸	9,767	21,470.1	20,241.6	10,802.6	5,632.0	13.8	6.3	58,166.4	0.7	6.1	6.8	98,534.0	3,945.7	1,324.6	1,249.0	2,573.6	1,474.5	0.0	7,993.8	164,701.0		
6：大阪空港	3,023	8,095.6	4,285.3	8,737.5	2,572.6	6.8	3.3	23,701.1	3.9	0.9	4.8	40,149.7	1,391.8	228.6	276.8	505.4	503.5	0.0	2,400.7	66,256.3		
7：藻川右岸	126,607	143,400.2	94,937.9	55,372.7	16,015.6	23.7	9.7	309,759.8	1.4	0.0	1.4	524,733.0	24,951.1	7,583.3	11,202.8	18,786.1	8,996.1	0.0	52,733.3	887,227.5		
8：中州	18,385	58,331.3	34,720.2	8,764.5	2,233.8	8.4	3.9	104,062.1	3.3	0.0	3.3	176,281.2	2,206.3	2,053.2	2,289.8	4,343.0	1,497.9	0.0	8,047.2	288,393.8		
9：猪名川左岸	45,128	46,620.0	34,070.6	18,609.8	4,892.3	6.4	2.8	104,201.9	0.1	0.4	0.5	176,518.1	5,967.0	2,285.0	3,615.8	5,900.8	2,514.9	0.0	14,382.7	295,103.2		
合計	209,709	288,262.1	192,154.5	105,572.0	32,859.6	62.3	27.5	618,938.0	9.7	9.8	19.5	1,048,480.9	39,519.2	13,766.4	19,099.5	32,865.9	15,246.3	0.0	87,631.4	1,755,069.8		

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	21	86.6	4.9	40.8	9.6	0.1	0.0	142.0	0.1	0.0	0.1	240.5	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	392.4		
2：余野川左岸	69	100.9	8.5	5.3	1.3	0.0	0.0	116.0	0.0	1.2	1.2	196.4	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	323.9		
3：川西池田	1,699	4,790.7	1,904.2	332.5	102.0	1.7	0.8	7,131.9	0.0	2.9	2.9	12,081.4	91.0	101.5	131.7	233.2	63.5	0.0	387.7	19,603.9		
4：中流左岸	8,424	15,830.9	6,736.2	5,128.1	2,513.0	5.3	2.5	30,216.0	0.3	2.0	2.3	51,186.0	1,556.6	447.0	660.4	1,107.4	416.6	0.0	3,080.6	84,484.9		
5：中流右岸	11,219	25,354.4	22,808.7	12,393.5	6,536.1	15.9	7.3	67,115.9	3.6	9.1	12.7	113,694.5	4,503.8	1,499.9	1,388.3	2,888.2	1,683.4	0.0	9,075.4	189,898.5		
6：大阪空港	3,396	10,142.1	5,671.0	10,784.5	3,345.0	8.5	4.1	29,955.2	3.9	1.2	5.1	50,744.1	1,746.9	301.7	334.8	636.5	665.9	0.0	3,049.3	83,753.7		
7：藻川右岸	133,811	167,001.9	116,652.6	67,034.1	19,523.1	27.2	11.3	370,250.2	1.5	0.0	1.5	627,203.6	28,492.1	8,790.5	12,591.8	21,382.3	10,579.6	0.0	60,454.0	1,057,909.3		
8：中州	18,516	78,376.2	49,068.6	12,099.8	3,328.6	11.7	5.6	142,890.5	3.5	0.0	3.5	242,056.5	2,914.0	2,834.4	2,759.0	5,593.4	2,225.5	0.0	10,732.9	395,683.4		
9：猪名川左岸	47,013	60,815.5	48,748.6	24,209.3	6,500.0	8.7	3.9	140,286.0	0.0	0.4	0.4	237,644.5	6,937.1	2,945.7	4,330.6	7,276.3	3,235.7	0.0	17,449.1	395,380.0		
合計	224,168	362,499.2	251,603.3	132,027.9	41,858.7	79.1	35.5	788,103.7	12.9	16.8	29.7	1,335,047.5	46,252.8	16,922.8	22,200.4	39,123.2	18,873.1	0.0	104,249.1	2,227,430.0		

様式-3 被害額（整備計画着手時河道）

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)		小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	174.6	13.4	82.9	19.6	0.2	0.1	290.8	0.3	3.2	3.5	492.5	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	803.3
2：余野川左岸	151	181.3	29.7	13.4	3.2	0.1	0.0	227.7	0.2	4.7	4.9	385.8	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	643.3
3：川西池田	1,784	5,625.6	2,238.7	373.1	116.9	2.0	0.9	8,357.2	0.0	2.9	2.9	14,157.0	100.7	116.7	145.5	262.2	73.7	0.0	436.6	22,953.7
4：中流左岸	8,902	18,510.1	8,508.8	5,976.8	2,985.5	6.5	3.0	35,990.7	0.3	2.3	2.6	60,968.1	1,778.3	534.9	749.8	1,284.7	497.6	0.0	3,560.6	100,522.0
5：中流右岸	11,613	27,843.8	24,498.7	13,533.5	7,213.9	17.7	8.2	73,115.8	4.0	10.5	14.5	123,858.1	4,864.4	1,610.4	1,464.4	3,074.8	1,813.8	0.0	9,753.0	206,741.4
6：大阪空港	3,562	11,914.1	6,899.1	12,289.8	3,969.2	10.2	4.8	35,087.2	3.9	1.2	5.1	59,437.8	2,018.6	365.4	380.2	745.6	800.0	0.0	3,564.2	98,094.3
7：藻川右岸	138,881	183,150.6	130,996.0	75,041.4	22,051.1	29.4	12.3	411,280.8	1.5	0.0	1.5	696,709.9	30,703.3	9,654.8	13,499.9	23,154.7	11,733.1	0.0	65,591.1	1,173,583.3
8：中州	18,531	102,096.6	60,229.6	14,309.4	4,304.7	14.3	6.5	180,961.1	3.5	0.0	3.5	306,548.0	3,617.0	3,519.7	3,038.1	6,557.8	2,940.8	0.0	13,115.6	500,628.2
9：猪名川左岸	49,220	70,279.1	58,983.9	28,626.6	7,902.0	10.1	4.6	165,806.3	0.4	4.2	4.6	280,875.9	7,903.9	3,442.8	4,841.2	8,284.0	3,854.1	0.0	20,042.0	466,728.8
合計	232,674	419,775.8	292,397.9	150,246.9	48,566.1	90.5	40.4	911,117.6	14.1	29.0	43.1	1,543,433.1	51,007.5	19,249.6	24,127.6	43,377.2	21,719.8	0.0	116,104.5	2,570,698.3

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	14,752	14,189.4	5,809.5	1,808.7	377.6	1.1	0.5	22,186.8	0.3	0.0	0.3	37,584.3	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	62,470.4	62,470.4	
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	14,189.4	5,809.5	1,808.7	377.6	1.1	0.5	22,186.8	0.3	0.0	0.3	37,584.3	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	62,470.4	62,470.4	

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	1,286	2,099.2	757.6	2,206.4	535.6	1.2	0.5	5,600.5	2.7	0.0	2.7	9,487.4	401.2	46.3	73.7	120.0	105.2	0.0	626.4	15,717.0	15,717.0	
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	15,545	25,385.2	12,976.8	3,254.0	714.7	2.5	1.1	42,334.3	0.4	0.0	0.4	71,714.3	1,082.6	899.4	1,344.8	2,244.2	563.0	0.0	3,889.8	117,938.8	117,938.8	
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	16,831	27,484.4	13,734.4	5,460.4	1,250.3	3.7	1.6	47,934.8	3.1	0.0	3.1	81,201.7	1,483.8	945.7	1,418.5	2,364.2	668.2	0.0	4,516.2	133,655.8	133,655.8	

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	1,854	3,524.6	1,400.9	3,701.6	983.5	2.3	1.0	9,613.9	3.5	0.0	3.5	16,286.0	646.1	80.7	119.6	200.3	189.7	0.0	1,036.1	26,939.5		
7：藻川右岸	61,734	58,581.9	32,816.7	22,186.9	5,463.6	4.3	1.8	119,055.2	0.0	0.0	0.0	201,679.5	10,748.4	2,913.6	4,870.3	7,783.9	3,598.6	0.0	22,130.9	342,865.6		
8：中州	18,137	42,579.6	25,137.3	6,805.1	1,617.9	6.9	3.1	76,149.9	3.1	0.0	3.1	128,997.8	1,746.9	1,528.9	1,966.3	3,495.2	1,026.1	0.0	6,268.2	211,419.0		
9：猪名川左岸	42,871	36,496.1	24,012.4	14,757.0	3,816.1	4.6	2.0	79,088.2	0.1	0.0	0.1	133,975.1	5,194.0	1,845.0	3,065.4	4,910.4	2,023.3	0.0	12,127.7	225,191.1		
合計	124,596	141,182.2	83,367.3	47,450.6	11,881.1	18.1	7.9	283,907.2	6.7	0.0	6.7	480,938.4	18,335.4	6,368.2	10,021.6	16,389.8	6,837.7	0.0	41,562.9	806,415.2		

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	3	7.9	0.3	4.1	1.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	22.3	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	36.7
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,773	5,869.2	2,898.0	6,500.6	1,838.7	4.7	2.2	17,113.4	3.7	0.9	4.6	28,990.2	1,072.7	163.9	214.5	378.4	357.1	0.0	1,808.2	47,916.4	
7：藻川右岸	71,042	76,347.1	46,553.5	29,185.5	7,211.0	6.0	2.5	159,305.6	0.0	0.0	0.0	269,863.9	13,079.4	3,730.0	6,075.0	9,805.0	4,671.6	0.0	27,556.0	456,725.5	
8：中州	18,286	53,398.6	31,962.1	8,185.4	2,040.5	8.0	3.7	95,598.3	3.2	0.0	3.2	161,943.3	2,064.5	1,902.4	2,203.9	4,106.3	1,357.3	0.0	7,528.1	265,072.9	
9：猪名川左岸	44,336	42,733.8	30,210.4	17,061.7	4,454.7	5.7	2.5	94,468.8	0.1	0.4	0.5	160,029.9	5,659.0	2,115.0	3,409.3	5,524.3	2,318.4	0.0	13,501.7	268,000.9	
合計	136,440	178,356.6	111,624.3	60,937.3	15,545.9	24.4	10.9	366,499.4	7.0	1.3	8.3	620,849.6	21,876.5	7,911.3	11,902.8	19,814.1	8,704.5	0.0	50,395.1	1,037,752.4	

様式－3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	21	86.6	4.9	40.8	9.6	0.1	0.0	142.0	0.1	0.0	0.1	240.5	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	392.4
2：余野川左岸	69	100.9	8.5	5.3	1.3	0.0	0.0	116.0	0.0	1.2	1.2	196.4	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	323.9
3：川西池田	1,550	4,216.7	1,532.1	280.5	87.5	1.3	0.6	6,118.7	0.0	2.8	2.8	10,364.9	78.7	85.3	111.6	196.9	53.2	0.0	328.8	16,815.2
4：中流左岸	3,139	3,065.7	815.4	1,008.8	447.7	0.6	0.2	5,338.4	0.2	1.6	1.8	9,043.4	447.2	92.2	160.9	253.1	74.2	0.0	774.5	15,158.1
5：中流右岸	10,245	15,252.1	13,062.9	8,168.2	3,774.2	10.1	4.6	40,272.1	3.3	7.4	10.7	68,220.9	3,050.2	924.3	1,073.4	1,997.7	1,007.9	0.0	6,055.8	114,559.5
6：大阪空港	2,944	7,383.3	3,913.4	8,194.3	2,367.6	6.3	3.0	21,867.9	3.8	0.9	4.7	37,044.3	1,302.2	211.5	259.4	470.9	461.8	0.0	2,234.9	61,151.8
7：藻川右岸	104,523	121,302.1	83,516.2	50,143.0	13,791.8	15.7	6.5	268,775.3	1.3	0.0	1.3	455,305.1	21,344.5	6,433.8	9,522.1	15,955.9	8,010.1	0.0	45,310.5	769,392.2
8：中州	18,459	69,862.7	42,571.4	10,529.8	2,828.0	9.9	4.7	125,806.5	3.4	0.0	3.4	213,116.2	2,593.8	2,488.6	2,550.2	5,038.8	1,911.6	0.0	9,544.2	348,470.3
9：猪名川左岸	46,016	54,720.9	42,288.3	21,643.5	5,722.0	7.7	3.4	124,385.8	0.0	0.4	0.4	210,709.4	6,460.0	2,641.4	4,008.6	6,650.0	2,891.1	0.0	16,001.1	351,096.7
合計	186,966	275,991.0	187,713.1	100,014.2	29,029.7	51.7	23.0	592,822.7	12.1	14.3	26.4	1,004,241.1	35,287.9	12,879.2	17,690.0	30,569.2	14,412.8	0.0	80,269.9	1,677,360.1

様式-3 被害額 (H29末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	174.6	13.4	82.9	19.6	0.2	0.1	290.8	0.3	3.2	3.5	492.5	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	803.3
2：余野川左岸	151	181.3	29.7	13.4	3.2	0.1	0.0	227.7	0.2	4.7	4.9	385.8	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	643.3
3：川西池田	1,751	5,352.8	2,136.5	359.2	112.7	1.9	0.9	7,964.0	0.0	2.9	2.9	13,491.2	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	21,880.3
4：中流左岸	3,272	9,467.5	3,711.2	3,467.2	1,921.9	3.8	1.8	18,573.4	0.3	1.7	2.0	31,463.5	858.9	198.3	269.4	467.7	135.3	0.0	1,461.9	51,500.8
5：中流右岸	11,249	18,692.0	16,119.0	9,551.5	4,549.2	12.4	5.7	48,929.8	3.7	8.9	12.6	82,887.1	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	138,900.4
6：大阪空港	3,929	9,429.9	4,882.9	9,622.9	2,895.2	7.4	3.6	26,841.9	3.9	1.1	5.0	45,470.3	1,607.3	275.5	338.9	614.4	579.9	0.0	2,801.6	75,118.8
7：藻川右岸	114,662	141,260.3	100,363.9	59,366.1	16,681.0	19.3	8.0	317,698.6	1.3	0.0	1.3	538,181.3	24,415.3	7,488.4	10,805.2	18,293.6	9,353.2	0.0	52,062.1	907,943.3
8：中州	18,208	43,480.4	27,314.0	7,891.8	1,874.7	8.7	4.1	80,573.7	3.4	0.0	3.4	136,491.6	1,863.2	1,621.5	2,057.9	3,679.4	1,092.8	0.0	6,635.4	223,704.1
9：猪名川左岸	47,453	63,506.2	51,522.4	25,371.0	6,851.8	9.1	4.1	147,264.6	0.0	0.4	0.4	249,466.2	7,150.0	3,078.6	4,465.7	7,544.3	3,392.2	0.0	18,086.5	414,817.7
合計	200,705	291,545.0	206,093.0	115,726.0	34,909.3	62.9	28.3	648,364.5	13.1	22.9	36.0	1,098,329.5	39,541.5	13,889.8	19,299.9	33,189.7	15,850.8	0.0	88,582.0	1,835,312.0

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	15,045	19,275.2	9,383.9	2,483.8	522.7	1.9	0.8	31,668.3	0.4	0.0	0.4	53,646.2	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	88,562.8	88,562.8
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	19,275.2	9,383.9	2,483.8	522.7	1.9	0.8	31,668.3	0.4	0.0	0.4	53,646.2	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	88,562.8	88,562.8

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	1,549	2,675.9	960.7	2,796.8	722.1	1.5	0.6	7,157.6	3.0	0.0	3.0	12,125.1	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	20,082.1		
7：藻川右岸	61,391	57,697.2	32,215.6	21,847.4	5,388.2	4.2	1.8	117,154.4	0.0	0.0	0.0	198,459.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	337,474.0		
8：中州	17,941	32,880.6	18,685.1	5,331.2	1,193.0	5.4	2.4	58,097.7	3.1	0.0	3.1	98,417.3	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	161,612.3		
9：猪名川左岸	42,924	36,935.2	24,491.0	14,935.1	3,860.9	4.6	2.0	80,228.8	0.1	0.0	0.1	135,907.7	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	228,356.3		
合計	123,805	130,188.9	76,352.4	44,910.5	11,164.2	15.7	6.8	262,638.5	6.2	0.0	6.2	444,909.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	747,524.7		

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,735	5,510.1	2,627.3	6,051.6	1,701.6	4.3	2.0	15,896.9	3.7	0.9	4.6	26,929.3	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	44,527.9		
7：藻川右岸	70,472	75,153.6	45,683.9	28,731.3	7,104.5	5.9	2.5	156,681.7	0.0	0.0	0.0	265,418.9	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	449,337.6		
8：中州	18,157	44,706.6	26,280.2	7,004.3	1,684.1	7.0	3.2	79,685.4	3.1	0.0	3.1	134,987.2	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	221,150.9		
9：猪名川左岸	44,386	43,100.1	30,613.8	17,213.0	4,498.2	5.8	2.5	95,433.4	0.1	0.0	0.1	161,664.2	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	270,686.2		
合計	135,750	168,470.4	105,205.2	59,000.2	14,988.4	23.0	10.2	347,697.4	6.9	0.9	7.8	588,999.6	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	985,702.6		

様式－3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	14	56.5	2.0	23.1	5.5	0.0	0.0	87.1	0.0	0.0	0.0	147.5	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	240.6		
2：余野川左岸	14	51.9	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	54.7	0.0	0.0	0.0	92.5	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	149.1		
3：川西池田	1,550	4,293.4	1,579.2	286.0	89.2	1.3	0.6	6,249.7	0.0	2.8	2.8	10,587.0	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	17,174.1		
4：中流左岸	3,139	3,093.8	822.8	1,011.3	448.8	0.6	0.2	5,377.5	0.2	1.6	1.8	9,109.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	15,264.6		
5：中流右岸	10,367	15,413.2	13,204.4	8,249.3	3,812.1	10.3	4.7	40,694.0	3.3	7.7	11.0	68,935.5	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	115,755.4		
6：大阪空港	2,932	7,126.2	3,798.6	8,006.9	2,290.8	6.1	2.9	21,231.5	3.7	0.9	4.6	35,966.3	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	59,380.5		
7：藻川右岸	105,063	121,336.1	83,275.0	50,083.9	13,793.6	15.7	6.5	268,510.8	1.3	0.0	1.3	454,857.3	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	768,754.8		
8：中州	18,425	61,671.4	37,543.3	9,377.9	2,426.5	9.1	4.3	111,032.5	3.4	0.0	3.4	188,088.8	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	307,640.4		
9：猪名川左岸	46,397	55,227.2	42,752.9	21,880.3	5,806.0	7.8	3.5	125,677.7	0.0	0.4	0.4	212,897.7	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	354,762.0		
合計	187,901	268,269.7	182,979.8	98,919.7	28,672.7	50.9	22.7	578,915.5	11.9	13.4	25.3	980,682.3	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,639,121.5		

様式-3 被害額 (H33末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	125.3	8.1	55.9	13.0	0.1	0.0	202.4	0.1	0.8	0.9	342.9	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	558.4
2：余野川左岸	69	118.4	9.3	5.4	1.3	0.0	0.0	134.4	0.0	3.2	3.2	227.6	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	375.6
3：川西池田	1,751	5,352.8	2,136.5	359.2	112.7	1.9	0.9	7,964.0	0.0	2.9	2.9	13,491.2	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	21,880.3
4：中流左岸	3,299	9,605.6	3,780.9	3,502.0	1,941.0	3.9	1.8	18,835.2	0.3	1.7	2.0	31,906.9	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	52,221.2
5：中流右岸	11,249	18,692.0	16,119.0	9,551.5	4,549.2	12.4	5.7	48,929.8	3.7	8.9	12.6	82,887.1	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	138,900.4
6：大阪空港	3,939	9,084.0	4,701.3	9,281.8	2,771.8	7.2	3.4	25,849.5	3.9	1.0	4.9	43,789.2	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	72,359.9
7：藻川右岸	114,885	140,888.1	99,835.1	59,110.5	16,612.6	19.2	7.9	316,473.4	1.3	0.0	1.3	536,105.9	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	904,538.8
8：中州	18,180	42,955.1	26,815.6	7,801.3	1,846.9	8.4	4.0	79,431.3	3.4	0.0	3.4	134,556.8	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	220,551.6
9：猪名川左岸	47,453	64,265.9	52,448.3	25,672.0	6,949.6	9.2	4.2	149,349.2	0.0	0.4	0.4	252,997.6	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	420,601.3
合計	200,849	291,087.2	205,854.1	115,339.6	34,798.1	62.3	27.9	647,169.2	12.7	18.9	31.6	1,096,305.2	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	1,831,987.5

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	15,045	19,275.2	9,383.9	2,483.8	522.7	1.9	0.8	31,668.3	0.4	0.0	0.4	53,646.2	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	88,562.8	88,562.8
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	19,275.2	9,383.9	2,483.8	522.7	1.9	0.8	31,668.3	0.4	0.0	0.4	53,646.2	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	88,562.8	88,562.8

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	1,549	2,675.9	960.7	2,796.8	722.1	1.5	0.6	7,157.6	3.0	0.0	3.0	12,125.1	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	20,082.1		
7：藻川右岸	61,391	57,697.2	32,215.6	21,847.4	5,388.2	4.2	1.8	117,154.4	0.0	0.0	0.0	198,459.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	337,474.0		
8：中州	17,941	32,880.6	18,685.1	5,331.2	1,193.0	5.4	2.4	58,097.7	3.1	0.0	3.1	98,417.3	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	161,612.3		
9：猪名川左岸	42,924	36,935.2	24,491.0	14,935.1	3,860.9	4.6	2.0	80,228.8	0.1	0.0	0.1	135,907.7	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	228,356.3		
合計	123,805	130,188.9	76,352.4	44,910.5	11,164.2	15.7	6.8	262,638.5	6.2	0.0	6.2	444,909.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	747,524.7		

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,735	5,510.1	2,627.3	6,051.6	1,701.6	4.3	2.0	15,896.9	3.7	0.9	4.6	26,929.3	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	44,527.9		
7：藻川右岸	70,472	75,153.6	45,683.9	28,731.3	7,104.5	5.9	2.5	156,681.7	0.0	0.0	0.0	265,418.9	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	449,337.6		
8：中州	18,157	44,706.6	26,280.2	7,004.3	1,684.1	7.0	3.2	79,685.4	3.1	0.0	3.1	134,987.2	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	221,150.9		
9：猪名川左岸	44,386	43,100.1	30,613.8	17,213.0	4,498.2	5.8	2.5	95,433.4	0.1	0.0	0.1	161,664.2	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	270,686.2		
合計	135,750	168,470.4	105,205.2	59,000.2	14,988.4	23.0	10.2	347,697.4	6.9	0.9	7.8	588,999.6	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	985,702.6		

様式－3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	14	56.5	2.0	23.1	5.5	0.0	0.0	87.1	0.0	0.0	0.0	147.5	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	240.6		
2：余野川左岸	14	51.9	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	54.7	0.0	0.0	0.0	92.5	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	149.1		
3：川西池田	1,550	4,293.4	1,579.2	286.0	89.2	1.3	0.6	6,249.7	0.0	2.8	2.8	10,587.0	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	17,174.1		
4：中流左岸	3,139	3,093.8	822.8	1,011.3	448.8	0.6	0.2	5,377.5	0.2	1.6	1.8	9,109.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	15,264.6		
5：中流右岸	10,367	15,413.2	13,204.4	8,249.3	3,812.1	10.3	4.7	40,694.0	3.3	7.7	11.0	68,935.5	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	115,755.4		
6：大阪空港	2,932	7,126.2	3,798.6	8,006.9	2,290.8	6.1	2.9	21,231.5	3.7	0.9	4.6	35,966.3	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	59,380.5		
7：藻川右岸	105,063	121,336.1	83,275.0	50,083.9	13,793.6	15.7	6.5	268,510.8	1.3	0.0	1.3	454,857.3	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	768,754.8		
8：中州	18,425	61,671.4	37,543.3	9,377.9	2,426.5	9.1	4.3	111,032.5	3.4	0.0	3.4	188,088.8	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	307,640.4		
9：猪名川左岸	46,397	55,227.2	42,752.9	21,880.3	5,806.0	7.8	3.5	125,677.7	0.0	0.4	0.4	212,897.7	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	354,762.0		
合計	187,901	268,269.7	182,979.8	98,919.7	28,672.7	50.9	22.7	578,915.5	11.9	13.4	25.3	980,682.3	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,639,121.5		

様式-3 被害額 (H41末時点)

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	125.3	8.1	55.9	13.0	0.1	0.0	202.4	0.1	0.8	0.9	342.9	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	558.4
2：余野川左岸	69	118.4	9.3	5.4	1.3	0.0	0.0	134.4	0.0	3.2	3.2	227.6	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	375.6
3：川西池田	1,751	5,352.8	2,136.5	359.2	112.7	1.9	0.9	7,964.0	0.0	2.9	2.9	13,491.2	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	21,880.3
4：中流左岸	3,299	9,605.6	3,780.9	3,502.0	1,941.0	3.9	1.8	18,835.2	0.3	1.7	2.0	31,906.9	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	52,221.2
5：中流右岸	11,249	18,692.0	16,119.0	9,551.5	4,549.2	12.4	5.7	48,929.8	3.7	8.9	12.6	82,887.1	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	138,900.4
6：大阪空港	3,939	9,084.0	4,701.3	9,281.8	2,771.8	7.2	3.4	25,849.5	3.9	1.0	4.9	43,789.2	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	72,359.9
7：藻川右岸	114,885	140,888.1	99,835.1	59,110.5	16,612.6	19.2	7.9	316,473.4	1.3	0.0	1.3	536,105.9	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	904,538.8
8：中州	18,180	42,955.1	26,815.6	7,801.3	1,846.9	8.4	4.0	79,431.3	3.4	0.0	3.4	134,556.8	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	220,551.6
9：猪名川左岸	47,453	64,265.9	52,448.3	25,672.0	6,949.6	9.2	4.2	149,349.2	0.0	0.4	0.4	252,997.6	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	420,601.3
合計	200,849	291,087.2	205,854.1	115,339.6	34,798.1	62.3	27.9	647,169.2	12.7	18.9	31.6	1,096,305.2	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	1,831,987.5

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	14,752	15,608.3	6,390.5	1,989.6	415.4	1.2	0.6	24,405.6	0.3	0.0	0.3	41,342.7	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	68,447.6	0.0	2,699.0	68,447.6
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	15,608.3	6,390.5	1,989.6	415.4	1.2	0.6	24,405.6	0.3	0.0	0.3	41,342.7	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	68,447.6	0.0	2,699.0	68,447.6

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,621	5,571.1	2,669.4	6,207.1	1,699.5	4.5	2.1	16,153.7	4.0	0.7	4.7	27,363.9	947.6	137.6	189.7	327.3	300.1	0.0	1,575.0	45,097.3	0.0	1,575.0	45,097.3
7：藻川右岸	58,973	60,043.8	33,312.8	22,760.0	5,628.0	4.4	1.9	121,750.9	0.0	0.0	0.0	206,246.0	10,139.7	2,730.2	4,576.9	7,307.1	3,361.6	0.0	20,808.4	348,805.3	0.0	20,808.4	348,805.3
8：中州	15,530	27,290.0	13,886.6	3,497.8	765.7	2.6	1.2	45,443.9	0.4	0.0	0.4	76,981.9	1,070.8	879.7	1,328.0	2,207.7	552.1	0.0	3,830.6	126,256.8	0.0	3,830.6	126,256.8
9：猪名川左岸	40,761	32,088.4	18,152.4	13,234.2	3,429.1	3.5	1.4	66,909.0	0.0	0.0	0.0	113,344.1	4,633.1	1,539.1	2,630.5	4,169.6	1,696.5	0.0	10,499.2	190,752.3	0.0	10,499.2	190,752.3
合計	117,885	124,993.3	68,021.2	45,699.1	11,522.3	15.0	6.6	250,257.5	4.4	0.7	5.1	423,935.9	16,791.2	5,286.6	8,725.1	14,011.7	5,910.3	0.0	36,713.2	710,911.7	0.0	36,713.2	710,911.7

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	520	794.6	138.8	279.2	134.5	0.1	0.1	1,347.3	0.2	0.0	0.2	2,282.7	107.0	14.1	24.9	39.0	8.3	0.0	154.3	3,784.5	
5：中流右岸	9,586	21,656.0	20,445.9	10,945.6	5,613.1	13.9	6.3	58,680.8	0.8	6.5	7.3	99,405.2	3,689.7	1,227.8	1,191.9	2,419.7	1,362.4	0.0	7,471.8	165,565.1	
6：大阪空港	2,908	7,592.4	3,973.4	8,422.3	2,396.9	6.4	3.1	22,394.5	4.1	1.0	5.1	37,936.0	1,228.9	197.7	246.8	444.5	425.2	0.0	2,098.6	62,434.2	
7：藻川右岸	120,886	139,190.6	88,361.1	53,426.5	15,561.0	23.3	9.5	296,572.0	1.5	0.0	1.5	502,393.1	22,876.0	6,774.5	10,203.4	16,977.9	7,987.5	0.0	47,841.4	846,808.0	
8：中州	18,205	53,659.1	31,885.7	8,270.5	2,018.4	8.3	3.7	95,845.7	3.5	0.0	3.5	162,362.5	1,910.3	1,738.2	2,100.4	3,838.6	1,202.9	0.0	6,951.8	265,163.5	
9：猪名川左岸	43,911	44,460.8	30,600.8	17,856.7	4,626.2	5.8	2.5	97,552.8	0.1	0.4	0.5	165,254.5	5,498.1	2,006.0	3,288.6	5,294.6	2,202.5	0.0	12,995.2	275,803.0	
合計	196,016	267,353.5	175,405.7	99,200.8	30,350.1	57.8	25.2	572,393.1	10.2	7.9	18.1	969,634.0	35,310.0	11,958.3	17,056.0	29,014.3	13,188.8	0.0	77,513.1	1,619,558.3	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	6	17.4	0.6	9.0	2.1	0.0	0.0	29.1	0.0	0.0	0.0	49.2	1.9	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	2.4	80.7
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	34	104.7	17.7	4.8	1.5	0.0	0.0	128.7	0.0	0.4	0.4	218.1	1.8	1.2	2.0	3.2	0.7	0.0	5.7	352.9
4：中流左岸	6,759	11,257.3	4,270.5	3,599.5	1,661.0	3.5	1.7	20,793.5	0.3	2.2	2.5	35,224.1	1,053.6	290.4	463.1	753.5	258.5	0.0	2,065.6	58,085.7
5：中流右岸	9,767	23,617.1	22,265.8	11,882.9	6,195.2	15.2	6.9	63,983.1	0.8	6.7	7.5	108,387.4	3,945.7	1,324.6	1,249.0	2,573.6	1,474.5	0.0	7,993.8	180,371.8
6：大阪空港	3,023	8,905.2	4,713.8	9,611.3	2,829.9	7.5	3.6	26,071.3	4.3	1.0	5.3	44,164.7	1,391.8	228.6	276.8	505.4	503.5	0.0	2,400.7	72,642.0
7：藻川右岸	126,607	157,740.2	104,431.7	60,910.0	17,617.2	26.1	10.7	340,735.9	1.5	0.0	1.5	577,206.3	24,951.1	7,583.3	11,202.8	18,786.1	8,996.1	0.0	52,733.3	970,677.0
8：中州	18,385	64,164.4	38,192.2	9,641.0	2,457.2	9.2	4.3	114,468.3	3.6	0.0	3.6	193,909.3	2,206.3	2,053.2	2,289.8	4,343.0	1,497.9	0.0	8,047.2	316,428.4
9：猪名川左岸	45,128	51,282.0	37,477.7	20,470.8	5,381.5	7.0	3.1	114,622.1	0.1	0.4	0.5	194,169.9	5,967.0	2,285.0	3,615.8	5,900.8	2,514.9	0.0	14,382.7	323,175.2
合計	209,709	317,088.3	211,370.0	116,129.3	36,145.6	68.5	30.3	680,832.0	10.6	10.7	21.3	1,153,329.0	39,519.2	13,766.4	19,099.5	32,865.9	15,246.3	0.0	87,631.4	1,921,813.7

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産＋10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	21	95.3	5.4	44.9	10.6	0.1	0.0	156.3	0.1	0.0	0.1	264.6	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	430.8
2：余野川左岸	69	111.0	9.4	5.8	1.4	0.0	0.0	127.6	0.0	1.3	1.3	216.0	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	355.2
3：川西池田	1,699	5,269.8	2,094.6	365.8	112.2	1.9	0.9	7,845.2	0.0	3.2	3.2	13,289.5	91.0	101.5	131.7	233.2	63.5	0.0	387.7	21,525.6
4：中流左岸	8,424	17,414.0	7,409.8	5,640.9	2,764.3	5.8	2.8	33,237.6	0.3	2.2	2.5	56,304.6	1,556.6	447.0	660.4	1,107.4	416.6	0.0	3,080.6	92,625.3
5：中流右岸	11,219	27,889.8	25,089.6	13,632.9	7,189.7	17.5	8.0	73,827.5	4.0	10.0	14.0	125,064.0	4,503.8	1,499.9	1,388.3	2,888.2	1,683.4	0.0	9,075.4	207,980.9
6：大阪空港	3,396	11,156.3	6,238.1	11,863.0	3,679.5	9.4	4.5	32,950.8	4.3	1.3	5.6	55,818.5	1,746.9	301.7	334.8	636.5	665.9	0.0	3,049.3	91,824.2
7：藻川右岸	133,811	183,702.1	128,317.9	73,737.5	21,475.4	29.9	12.4	407,275.2	1.7	0.0	1.7	689,924.0	28,492.1	8,790.5	12,591.8	21,382.3	10,579.6	0.0	60,454.0	1,157,654.9
8：中州	18,516	86,213.8	53,975.5	13,309.8	3,661.5	12.9	6.2	157,179.7	3.9	0.0	3.9	266,262.2	2,914.0	2,834.4	2,759.0	5,593.4	2,225.5	0.0	10,732.9	434,178.7
9：猪名川左岸	47,013	66,897.1	53,623.5	26,630.2	7,150.0	9.6	4.3	154,314.7	0.0	0.4	0.4	261,409.0	6,937.1	2,945.7	4,330.6	7,276.3	3,235.7	0.0	17,449.1	433,173.2
合計	224,168	398,749.2	276,763.8	145,230.8	46,044.6	87.1	39.1	866,914.6	14.3	18.4	32.7	1,468,552.4	46,252.8	16,922.8	22,200.4	39,123.2	18,873.1	0.0	104,249.1	2,439,748.8

様式-3 被害額（整備計画着手時河道）【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	192.1	14.7	91.2	21.6	0.2	0.1	319.9	0.3	3.5	3.8	541.8	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	882.0
2：余野川左岸	151	199.4	32.7	14.7	3.5	0.1	0.0	250.4	0.2	5.2	5.4	424.4	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	705.1
3：川西池田	1,784	6,188.2	2,462.6	410.4	128.6	2.2	1.0	9,193.0	0.0	3.2	3.2	15,572.7	100.7	116.7	145.5	262.2	73.7	0.0	436.6	25,205.5
4：中流左岸	8,902	20,361.1	9,359.7	6,574.5	3,284.1	7.2	3.3	39,589.9	0.3	2.5	2.8	67,064.9	1,778.3	534.9	749.8	1,284.7	497.6	0.0	3,560.6	110,218.2
5：中流右岸	11,613	30,628.2	26,948.6	14,886.9	7,935.3	19.5	9.0	80,427.5	4.4	11.6	16.0	136,243.9	4,864.4	1,610.4	1,464.4	3,074.8	1,813.8	0.0	9,753.0	226,440.4
6：大阪空港	3,562	13,105.5	7,589.0	13,518.8	4,366.1	11.2	5.3	38,595.9	4.3	1.3	5.6	65,381.6	2,018.6	365.4	380.2	745.6	800.0	0.0	3,564.2	107,547.3
7：藻川右岸	138,881	201,465.7	144,095.6	82,545.5	24,256.2	32.3	13.5	452,408.8	1.7	0.0	1.7	766,380.9	30,703.3	9,654.8	13,499.9	23,154.7	11,733.1	0.0	65,591.1	1,284,382.5
8：中州	18,531	112,306.3	66,252.6	15,740.3	4,735.2	15.7	7.2	199,057.3	3.9	0.0	3.9	337,202.8	3,617.0	3,519.7	3,038.1	6,557.8	2,940.8	0.0	13,115.6	549,379.6
9：猪名川左岸	49,220	77,307.0	64,882.3	31,489.3	8,692.2	11.1	5.1	182,387.0	0.4	4.6	5.0	308,963.5	7,903.9	3,442.8	4,841.2	8,284.0	3,854.1	0.0	20,042.0	511,397.5
合計	232,674	461,753.5	321,637.8	165,271.6	53,422.8	99.5	44.5	#####	15.5	31.9	47.4	1,697,776.5	51,007.5	19,249.6	24,127.6	43,377.2	21,719.8	0.0	116,104.5	2,816,158.1

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	14,752	15,608.3	6,390.5	1,989.6	415.4	1.2	0.6	24,405.6	0.3	0.0	0.3	41,342.7	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	68,447.6	68,447.6	
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	15,608.3	6,390.5	1,989.6	415.4	1.2	0.6	24,405.6	0.3	0.0	0.3	41,342.7	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	68,447.6	68,447.6	

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	1,286	2,309.1	833.4	2,427.0	589.2	1.3	0.6	6,160.6	3.0	0.0	3.0	10,436.1	401.2	46.3	73.7	120.0	105.2	0.0	626.4	17,226.1	17,226.1	
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	15,545	27,923.7	14,274.5	3,579.4	786.2	2.8	1.2	46,567.8	0.4	0.0	0.4	78,885.7	1,082.6	899.4	1,344.8	2,244.2	563.0	0.0	3,889.8	129,343.7	129,343.7	
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	16,831	30,232.8	15,107.9	6,006.4	1,375.4	4.1	1.8	52,728.4	3.4	0.0	3.4	89,321.8	1,483.8	945.7	1,418.5	2,364.2	668.2	0.0	4,516.2	146,569.8	146,569.8	

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	1,854	3,877.1	1,541.0	4,071.8	1,081.9	2.5	1.1	10,575.4	3.9	0.0	3.9	17,914.6	646.1	80.7	119.6	200.3	189.7	0.0	1,036.1	29,530.0		
7：藻川右岸	61,734	64,440.1	36,098.4	24,405.6	6,010.0	4.7	2.0	130,960.8	0.0	0.0	0.0	221,847.5	10,748.4	2,913.6	4,870.3	7,783.9	3,598.6	0.0	22,130.9	374,939.2		
8：中州	18,137	46,837.6	27,651.0	7,485.6	1,779.7	7.6	3.4	83,764.9	3.4	0.0	3.4	141,897.6	1,746.9	1,528.9	1,966.3	3,495.2	1,026.1	0.0	6,268.2	231,934.1		
9：猪名川左岸	42,871	40,145.7	26,413.6	16,232.7	4,197.7	5.1	2.2	86,997.0	0.1	0.0	0.1	147,372.6	5,194.0	1,845.0	3,065.4	4,910.4	2,023.3	0.0	12,127.7	246,497.4		
合計	124,596	155,300.5	91,704.0	52,195.7	13,069.3	19.9	8.7	312,298.1	7.4	0.0	7.4	529,032.3	18,335.4	6,368.2	10,021.6	16,389.8	6,837.7	0.0	41,562.9	882,900.7		

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	3	8.7	0.3	4.5	1.1	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	24.5	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	40.2		
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,773	6,456.1	3,187.8	7,150.7	2,022.6	5.2	2.4	18,824.8	4.1	1.0	5.1	31,889.2	1,072.7	163.9	214.5	378.4	357.1	0.0	1,808.2	52,527.3			
7：藻川右岸	71,042	83,981.8	51,208.9	32,104.1	7,932.1	6.6	2.8	175,236.3	0.0	0.0	0.0	296,850.3	13,079.4	3,730.0	6,075.0	9,805.0	4,671.6	0.0	27,556.0	499,642.6			
8：中州	18,286	58,738.5	35,158.3	9,003.9	2,244.6	8.8	4.1	105,158.2	3.5	0.0	3.5	178,137.6	2,064.5	1,902.4	2,203.9	4,106.3	1,357.3	0.0	7,528.1	290,827.4			
9：猪名川左岸	44,336	47,007.2	33,231.4	18,767.9	4,900.2	6.3	2.8	103,915.8	0.1	0.4	0.5	176,032.9	5,659.0	2,115.0	3,409.3	5,524.3	2,318.4	0.0	13,501.7	293,450.9			
合計	136,440	196,192.3	122,786.7	67,031.1	17,100.6	26.9	12.1	403,149.7	7.7	1.4	9.1	682,934.5	21,876.5	7,911.3	11,902.8	19,814.1	8,704.5	0.0	50,395.1	1,136,488.4			

様式－3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1：古江	21	95.3	5.4	44.9	10.6	0.1	0.0	156.3	0.1	0.0	0.1	264.6	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	430.8		
2：余野川左岸	69	111.0	9.4	5.8	1.4	0.0	0.0	127.6	0.0	1.3	1.3	216.0	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	355.2		
3：川西池田	1,550	4,638.4	1,685.3	308.6	96.3	1.4	0.7	6,730.7	0.0	3.1	3.1	11,401.4	78.7	85.3	111.6	196.9	53.2	0.0	328.8	18,464.0		
4：中流左岸	3,139	3,372.3	896.9	1,109.7	492.5	0.7	0.2	5,872.3	0.2	1.8	2.0	9,947.7	447.2	92.2	160.9	253.1	74.2	0.0	774.5	16,596.5		
5：中流右岸	10,245	16,777.3	14,369.2	8,985.0	4,151.6	11.1	5.1	44,299.3	3.6	8.1	11.7	75,043.0	3,050.2	924.3	1,073.4	1,997.7	1,007.9	0.0	6,055.8	125,409.8		
6：大阪空港	2,944	8,121.6	4,304.7	9,013.7	2,604.4	6.9	3.3	24,054.6	4.2	1.0	5.2	40,748.7	1,302.2	211.5	259.4	470.9	461.8	0.0	2,234.9	67,043.4		
7：藻川右岸	104,523	133,432.3	91,867.8	55,157.3	15,171.0	17.3	7.2	295,652.9	1.4	0.0	1.4	500,835.6	21,344.5	6,433.8	9,522.1	15,955.9	8,010.1	0.0	45,310.5	841,800.4		
8：中州	18,459	76,849.0	46,828.5	11,582.8	3,110.8	10.9	5.2	138,387.2	3.7	0.0	3.7	234,427.8	2,593.8	2,488.6	2,550.2	5,038.8	1,911.6	0.0	9,544.2	382,362.9		
9：猪名川左岸	46,016	60,193.0	46,517.1	23,807.9	6,294.2	8.5	3.7	136,824.4	0.0	0.4	0.4	231,780.3	6,460.0	2,641.4	4,008.6	6,650.0	2,891.1	0.0	16,001.1	384,606.2		
合計	186,966	303,590.2	206,484.3	110,015.7	31,932.8	56.9	25.4	652,105.3	13.2	15.7	28.9	1,104,665.1	35,287.9	12,879.2	17,690.0	30,569.2	14,412.8	0.0	80,269.9	1,837,069.2		

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産+10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	192.1	14.7	91.2	21.6	0.2	0.1	319.9	0.3	3.5	3.8	541.8	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	882.0
2：余野川左岸	151	199.4	32.7	14.7	3.5	0.1	0.0	250.4	0.2	5.2	5.4	424.4	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	705.1
3：川西池田	1,751	5,888.1	2,350.2	395.1	124.0	2.1	1.0	8,760.5	0.0	3.2	3.2	14,840.3	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	24,026.2
4：中流左岸	3,272	10,414.3	4,082.3	3,813.9	2,114.1	4.2	2.0	20,430.8	0.3	1.9	2.2	34,609.9	858.9	198.3	269.4	467.7	135.3	0.0	1,461.9	56,504.8
5：中流右岸	11,249	20,561.2	17,730.9	10,506.7	5,004.1	13.6	6.3	53,822.8	4.1	9.8	13.9	91,175.8	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	152,083.4
6：大阪空港	3,929	10,372.9	5,371.2	10,585.2	3,184.7	8.1	4.0	29,526.1	4.3	1.2	5.5	50,017.3	1,607.3	275.5	338.9	614.4	579.9	0.0	2,801.6	82,350.5
7：藻川右岸	114,662	155,386.3	110,400.3	65,302.7	18,349.1	21.2	8.8	349,468.4	1.4	0.0	1.4	591,999.4	24,415.3	7,488.4	10,805.2	18,293.6	9,353.2	0.0	52,062.1	993,531.3
8：中州	18,208	47,828.4	30,045.4	8,681.0	2,062.2	9.6	4.5	88,631.1	3.7	0.0	3.7	150,140.8	1,863.2	1,621.5	2,057.9	3,679.4	1,092.8	0.0	6,635.4	245,411.0
9：猪名川左岸	47,453	69,856.8	56,674.6	27,908.1	7,537.0	10.0	4.5	161,991.0	0.0	0.4	0.4	274,412.8	7,150.0	3,078.6	4,465.7	7,544.3	3,392.2	0.0	18,086.5	454,490.7
合計	200,705	320,699.5	226,702.3	127,298.6	38,400.3	69.1	31.2	713,201.0	14.3	25.2	39.5	1,208,162.5	39,541.5	13,889.8	19,299.9	33,189.7	15,850.8	0.0	88,582.0	2,009,985.0

様式－3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)		
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	15,045	21,202.7	10,322.3	2,732.2	575.0	2.1	0.9	34,835.2	0.4	0.0	0.4	59,010.8	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	97,094.3	97,094.3	
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	21,202.7	10,322.3	2,732.2	575.0	2.1	0.9	34,835.2	0.4	0.0	0.4	59,010.8	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	97,094.3	97,094.3	

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					小計 (百万円)	合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)			その他 間接被害 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	1,549	2,943.5	1,056.8	3,076.5	794.3	1.7	0.7	7,873.5	3.3	0.0	3.3	13,337.6	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	22,010.8			
7:藻川右岸	61,391	63,466.9	35,437.2	24,032.1	5,927.0	4.6	2.0	128,869.8	0.0	0.0	0.0	218,305.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	369,035.4			
8:中州	17,941	36,168.7	20,553.6	5,864.3	1,312.3	5.9	2.6	63,907.4	3.4	0.0	3.4	108,259.0	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	177,264.0			
9:猪名川左岸	42,924	40,628.7	26,940.1	16,428.6	4,247.0	5.1	2.2	88,251.7	0.1	0.0	0.1	149,498.5	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	249,970.0			
合計	123,805	143,207.8	83,987.7	49,401.5	12,280.6	17.3	7.5	288,902.4	6.8	0.0	6.8	489,400.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	818,280.2			

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					小計 (百万円)	合計 (百万円)				
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)			その他 間接被害 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	2,735	6,061.1	2,890.0	6,656.8	1,871.8	4.7	2.2	17,486.6	4.1	1.0	5.1	29,622.2	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	48,811.0			
7:藻川右岸	70,472	82,669.0	50,252.3	31,604.4	7,815.0	6.5	2.8	172,350.0	0.0	0.0	0.0	291,960.8	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	491,547.8			
8:中州	18,157	49,177.3	28,908.2	7,704.7	1,852.5	7.7	3.5	87,653.9	3.4	0.0	3.4	148,485.9	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	242,618.4			
9:猪名川左岸	44,386	47,410.1	33,675.2	18,934.3	4,948.0	6.4	2.8	104,976.8	0.1	0.0	0.1	177,830.6	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	296,396.0			
合計	135,750	185,317.5	115,725.7	64,900.2	16,487.3	25.3	11.3	382,467.3	7.6	1.0	8.6	647,899.5	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	1,079,373.2			

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					小計 (百万円)	合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)			その他 間接被害 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1:古江	14	62.2	2.2	25.4	6.1	0.0	0.0	95.9	0.0	0.0	0.0	162.3	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	264.2
2:余野川左岸	14	57.1	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	60.2	0.0	0.0	0.0	101.8	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	163.9
3:川西池田	1,550	4,722.7	1,737.1	314.6	98.1	1.4	0.7	6,874.6	0.0	3.1	3.1	11,645.7	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	18,858.0
4:中流左岸	3,139	3,403.2	905.1	1,112.4	493.7	0.7	0.2	5,915.3	0.2	1.8	2.0	10,020.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	16,713.6
5:中流右岸	10,367	16,954.5	14,524.8	9,074.2	4,193.3	11.3	5.2	44,763.3	3.6	8.5	12.1	75,829.1	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	126,719.4
6:大阪空港	2,932	7,838.8	4,178.5	8,807.6	2,519.9	6.7	3.2	23,354.7	4.1	1.0	5.1	39,562.9	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	65,100.8
7:藻川右岸	105,063	133,469.7	91,602.5	55,092.3	15,173.0	17.3	7.2	295,362.0	1.4	0.0	1.4	500,343.0	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	841,091.8
8:中州	18,425	67,838.5	41,297.6	10,315.7	2,669.2	10.0	4.7	122,135.7	3.7	0.0	3.7	206,897.7	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	337,552.8
9:猪名川左岸	46,397	60,749.9	47,028.2	24,068.3	6,386.6	8.6	3.9	138,245.5	0.0	0.4	0.4	234,187.5	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	388,619.6
合計	187,901	295,096.6	201,277.8	108,811.6	31,540.1	56.0	25.1	636,807.2	13.0	14.8	27.8	1,078,750.7	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,795,084.1

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産+10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	137.8	8.9	61.5	14.3	0.1	0.0	222.6	0.1	0.9	1.0	377.2	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	613.0
2：余野川左岸	69	130.2	10.2	5.9	1.4	0.0	0.0	147.7	0.0	3.5	3.5	250.4	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	412.0
3：川西池田	1,751	5,888.1	2,350.2	395.1	124.0	2.1	1.0	8,760.5	0.0	3.2	3.2	14,840.3	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	24,026.2
4：中流左岸	3,299	10,566.2	4,159.0	3,852.2	2,135.1	4.3	2.0	20,718.8	0.3	1.9	2.2	35,097.6	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	57,295.7
5：中流右岸	11,249	20,561.2	17,730.9	10,506.7	5,004.1	13.6	6.3	53,822.8	4.1	9.8	13.9	91,175.8	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	152,083.4
6：大阪空港	3,939	9,992.4	5,171.4	10,210.0	3,049.0	7.9	3.7	28,434.4	4.3	1.1	5.4	48,168.1	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	79,324.2
7：藻川右岸	114,885	154,976.9	109,818.6	65,021.6	18,273.9	21.1	8.7	348,120.8	1.4	0.0	1.4	589,716.5	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	989,796.9
8：中州	18,180	47,250.6	29,497.2	8,581.4	2,031.6	9.2	4.4	87,374.4	3.7	0.0	3.7	148,012.5	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	241,950.7
9：猪名川左岸	47,453	70,692.5	57,693.1	28,239.2	7,644.6	10.1	4.6	164,284.1	0.0	0.4	0.4	278,297.4	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	460,836.0
合計	200,849	320,195.9	226,439.5	126,873.6	38,278.0	68.4	30.7	711,886.1	13.9	20.8	34.7	1,205,935.8	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	2,006,338.1

様式－3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)			
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)						
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	15,045	21,202.7	10,322.3	2,732.2	575.0	2.1	0.9	34,835.2	0.4	0.0	0.4	59,010.8	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	97,094.3	97,094.3	
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	21,202.7	10,322.3	2,732.2	575.0	2.1	0.9	34,835.2	0.4	0.0	0.4	59,010.8	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	97,094.3	97,094.3	

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	1,549	2,943.5	1,056.8	3,076.5	794.3	1.7	0.7	7,873.5	3.3	0.0	3.3	13,337.6	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	22,010.8	
7:藻川右岸	61,391	63,466.9	35,437.2	24,032.1	5,927.0	4.6	2.0	128,869.8	0.0	0.0	0.0	218,305.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	369,035.4	
8:中州	17,941	36,168.7	20,553.6	5,864.3	1,312.3	5.9	2.6	63,907.4	3.4	0.0	3.4	108,259.0	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	177,264.0	
9:猪名川左岸	42,924	40,628.7	26,940.1	16,428.6	4,247.0	5.1	2.2	88,251.7	0.1	0.0	0.1	149,498.5	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	249,970.0	
合計	123,805	143,207.8	83,987.7	49,401.5	12,280.6	17.3	7.5	288,902.4	6.8	0.0	6.8	489,400.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	818,280.2	

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	2,735	6,061.1	2,890.0	6,656.8	1,871.8	4.7	2.2	17,486.6	4.1	1.0	5.1	29,622.2	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	48,811.0	
7:藻川右岸	70,472	82,669.0	50,252.3	31,604.4	7,815.0	6.5	2.8	172,350.0	0.0	0.0	0.0	291,960.8	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	491,547.8	
8:中州	18,157	49,177.3	28,908.2	7,704.7	1,852.5	7.7	3.5	87,653.9	3.4	0.0	3.4	148,485.9	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	242,618.4	
9:猪名川左岸	44,386	47,410.1	33,675.2	18,934.3	4,948.0	6.4	2.8	104,976.8	0.1	0.0	0.1	177,830.6	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	296,396.0	
合計	135,750	185,317.5	115,725.7	64,900.2	16,487.3	25.3	11.3	382,467.3	7.6	1.0	8.6	647,899.5	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	1,079,373.2	

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1:古江	14	62.2	2.2	25.4	6.1	0.0	0.0	95.9	0.0	0.0	0.0	162.3	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	264.2
2:余野川左岸	14	57.1	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	60.2	0.0	0.0	0.0	101.8	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	163.9
3:川西池田	1,550	4,722.7	1,737.1	314.6	98.1	1.4	0.7	6,874.6	0.0	3.1	3.1	11,645.7	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	18,858.0
4:中流左岸	3,139	3,403.2	905.1	1,112.4	493.7	0.7	0.2	5,915.3	0.2	1.8	2.0	10,020.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	16,713.6
5:中流右岸	10,367	16,954.5	14,524.8	9,074.2	4,193.3	11.3	5.2	44,763.3	3.6	8.5	12.1	75,829.1	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	126,719.4
6:大阪空港	2,932	7,838.8	4,178.5	8,807.6	2,519.9	6.7	3.2	23,354.7	4.1	1.0	5.1	39,562.9	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	65,100.8
7:藻川右岸	105,063	133,469.7	91,602.5	55,092.3	15,173.0	17.3	7.2	295,362.0	1.4	0.0	1.4	500,343.0	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	841,091.8
8:中州	18,425	67,838.5	41,297.6	10,315.7	2,669.2	10.0	4.7	122,135.7	3.7	0.0	3.7	206,897.7	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	337,552.8
9:猪名川左岸	46,397	60,749.9	47,028.2	24,068.3	6,386.6	8.6	3.9	138,245.5	0.0	0.4	0.4	234,187.5	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	388,619.6
合計	187,901	295,096.6	201,277.8	108,811.6	31,540.1	56.0	25.1	636,807.2	13.0	14.8	27.8	1,078,750.7	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,795,084.1

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産+10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	137.8	8.9	61.5	14.3	0.1	0.0	222.6	0.1	0.9	1.0	377.2	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	613.0
2：余野川左岸	69	130.2	10.2	5.9	1.4	0.0	0.0	147.7	0.0	3.5	3.5	250.4	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	412.0
3：川西池田	1,751	5,888.1	2,350.2	395.1	124.0	2.1	1.0	8,760.5	0.0	3.2	3.2	14,840.3	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	24,026.2
4：中流左岸	3,299	10,566.2	4,159.0	3,852.2	2,135.1	4.3	2.0	20,718.8	0.3	1.9	2.2	35,097.6	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	57,295.7
5：中流右岸	11,249	20,561.2	17,730.9	10,506.7	5,004.1	13.6	6.3	53,822.8	4.1	9.8	13.9	91,175.8	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	152,083.4
6：大阪空港	3,939	9,992.4	5,171.4	10,210.0	3,049.0	7.9	3.7	28,434.4	4.3	1.1	5.4	48,168.1	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	79,324.2
7：藻川右岸	114,885	154,976.9	109,818.6	65,021.6	18,273.9	21.1	8.7	348,120.8	1.4	0.0	1.4	589,716.5	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	989,796.9
8：中州	18,180	47,250.6	29,497.2	8,581.4	2,031.6	9.2	4.4	87,374.4	3.7	0.0	3.7	148,012.5	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	241,950.7
9：猪名川左岸	47,453	70,692.5	57,693.1	28,239.2	7,644.6	10.1	4.6	164,284.1	0.0	0.4	0.4	278,297.4	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	460,836.0
合計	200,849	320,195.9	226,439.5	126,873.6	38,278.0	68.4	30.7	711,886.1	13.9	20.8	34.7	1,205,935.8	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	2,006,338.1

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7：藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8：中州	14,752	12,770.5	5,228.6	1,627.8	339.8	1.0	0.5	19,968.2	0.3	0.0	0.3	33,825.9	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	0.0	2,699.0	56,493.4	
9：猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	12,770.5	5,228.6	1,627.8	339.8	1.0	0.5	19,968.2	0.3	0.0	0.3	33,825.9	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	0.0	2,699.0	56,493.4	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)				
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)							
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5：中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6：大阪空港	2,621	4,558.1	2,184.0	5,078.5	1,390.5	3.7	1.7	13,216.5	3.2	0.5	3.7	22,388.7	947.6	137.6	189.7	327.3	300.1	0.0	1,575.0	0.0	1,575.0	37,183.9	
7：藻川右岸	58,973	49,126.8	27,256.0	18,621.8	4,604.8	3.6	1.5	99,614.5	0.0	0.0	0.0	168,746.8	10,139.7	2,730.2	4,576.9	7,307.1	3,361.6	0.0	20,808.4	0.0	20,808.4	289,169.7	
8：中州	15,530	22,328.2	11,361.8	2,861.8	626.5	2.2	1.0	37,181.5	0.4	0.0	0.4	62,985.2	1,070.8	879.7	1,328.0	2,207.7	552.1	0.0	3,830.6	0.0	3,830.6	103,997.7	
9：猪名川左岸	40,761	26,254.2	14,852.0	10,828.0	2,805.7	2.9	1.2	54,744.0	0.0	0.0	0.0	92,736.1	4,633.1	1,539.1	2,630.5	4,169.6	1,696.5	0.0	10,499.2	0.0	10,499.2	157,979.3	
合計	117,885	102,267.3	55,653.8	37,390.1	9,427.5	12.4	5.4	204,756.5	3.6	0.5	4.1	346,856.8	16,791.2	5,286.6	8,725.1	14,011.7	5,910.3	0.0	36,713.2	0.0	36,713.2	588,330.6	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)			
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1：古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4：中流左岸	520	650.2	113.6	228.4	110.1	0.1	0.1	1,102.5	0.2	0.0	0.2	1,867.7	107.0	14.1	24.9	39.0	8.3	0.0	154.3	3,124.7	
5：中流右岸	9,586	17,718.6	16,728.5	8,955.5	4,592.5	11.3	5.1	48,011.5	0.6	5.3	5.9	81,331.6	3,689.7	1,227.8	1,191.9	2,419.7	1,362.4	0.0	7,471.8	136,820.8	
6：大阪空港	2,908	6,212.0	3,251.0	6,890.9	1,961.1	5.2	2.5	18,322.7	3.3	0.8	4.1	31,038.6	1,228.9	197.7	246.8	444.5	425.2	0.0	2,098.6	51,464.0	
7：藻川右岸	120,886	113,883.2	72,295.5	43,712.6	12,731.8	19.1	7.7	242,649.9	1.3	0.0	1.3	411,048.9	22,876.0	6,774.5	10,203.4	16,977.9	7,987.5	0.0	47,841.4	701,541.5	
8：中州	18,205	43,902.9	26,088.3	6,766.7	1,651.4	6.8	3.1	78,419.2	2.9	0.0	2.9	132,842.1	1,910.3	1,738.2	2,100.4	3,838.6	1,202.9	0.0	6,951.8	218,216.0	
9：猪名川左岸	43,911	36,377.0	25,037.0	14,610.1	3,785.0	4.8	2.1	79,816.0	0.1	0.4	0.5	135,208.3	5,498.1	2,006.0	3,288.6	5,294.6	2,202.5	0.0	12,995.2	228,020.0	
合計	196,016	218,743.9	143,513.9	81,164.2	24,831.9	47.3	20.6	468,321.8	8.4	6.5	14.9	793,337.2	35,310.0	11,958.3	17,056.0	29,014.3	13,188.8	0.0	77,513.1	1,339,187.0	

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	6	14.2	0.5	7.4	1.7	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	40.2	1.9	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	2.4	66.4
2：余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3：川西池田	34	85.7	14.5	4.0	1.3	0.0	0.0	105.5	0.0	0.4	0.4	178.5	1.8	1.2	2.0	3.2	0.7	0.0	5.7	290.1
4：中流左岸	6,759	9,210.5	3,494.1	2,945.1	1,359.0	2.9	1.4	17,013.0	0.3	1.8	2.1	28,819.7	1,053.6	290.4	463.1	753.5	258.5	0.0	2,065.6	47,900.4
5：中流右岸	9,767	19,323.1	18,217.4	9,722.3	5,068.8	12.4	5.7	52,349.7	0.6	5.5	6.1	88,680.6	3,945.7	1,324.6	1,249.0	2,573.6	1,474.5	0.0	7,993.8	149,030.2
6：大阪空港	3,023	7,286.0	3,856.8	7,863.8	2,315.3	6.1	3.0	21,331.0	3.5	0.8	4.3	36,134.7	1,391.8	228.6	276.8	505.4	503.5	0.0	2,400.7	59,870.7
7：藻川右岸	126,607	129,060.2	85,444.1	49,835.4	14,414.0	21.3	8.7	278,783.7	1.3	0.0	1.3	472,259.7	24,951.1	7,583.3	11,202.8	18,786.1	8,996.1	0.0	52,733.3	803,778.0
8：中州	18,385	52,498.2	31,248.2	7,888.1	2,010.4	7.6	3.5	93,656.0	3.0	0.0	3.0	158,653.1	2,206.3	2,053.2	2,289.8	4,343.0	1,497.9	0.0	8,047.2	260,359.3
9：猪名川左岸	45,128	41,958.0	30,663.5	16,748.8	4,403.1	5.8	2.5	93,781.7	0.1	0.4	0.5	158,866.3	5,967.0	2,285.0	3,615.8	5,900.8	2,514.9	0.0	14,382.7	267,031.2
合計	209,709	259,435.9	172,939.1	95,014.9	29,573.6	56.1	24.8	557,044.4	8.8	8.9	17.7	943,632.8	39,519.2	13,766.4	19,099.5	32,865.9	15,246.3	0.0	87,631.4	1,588,326.3

様式－3 被害額（整備計画着手時河道）【資産－10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額					合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)		その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	21	77.9	4.4	36.7	8.6	0.1	0.0	127.7	0.1	0.0	0.1	216.5	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	354.1
2：余野川左岸	69	90.8	7.7	4.8	1.2	0.0	0.0	104.5	0.0	1.1	1.1	176.8	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	292.7
3：川西池田	1,699	4,311.6	1,713.8	299.3	91.8	1.5	0.7	6,418.7	0.0	2.6	2.6	10,873.3	91.0	101.5	131.7	233.2	63.5	0.0	387.7	17,682.3
4：中流左岸	8,424	14,247.8	6,062.6	4,615.3	2,261.7	4.8	2.3	27,194.5	0.3	1.8	2.1	46,067.4	1,556.6	447.0	660.4	1,107.4	416.6	0.0	3,080.6	76,344.6
5：中流右岸	11,219	22,819.0	20,527.8	11,154.2	5,882.5	14.3	6.6	60,404.4	3.2	8.2	11.4	102,325.1	4,503.8	1,499.9	1,388.3	2,888.2	1,683.4	0.0	9,075.4	171,816.3
6：大阪空港	3,396	9,127.9	5,103.9	9,706.1	3,010.5	7.7	3.7	26,959.8	3.5	1.1	4.6	45,669.7	1,746.9	301.7	334.8	636.5	665.9	0.0	3,049.3	75,683.4
7：藻川右岸	133,811	150,301.7	104,987.3	60,330.7	17,570.8	24.5	10.2	333,225.2	1.4	0.0	1.4	564,483.2	28,492.1	8,790.5	12,591.8	21,382.3	10,579.6	0.0	60,454.0	958,163.8
8：中州	18,516	70,538.6	44,161.7	10,889.8	2,995.7	10.5	5.0	128,601.3	3.2	0.0	3.2	217,850.9	2,914.0	2,834.4	2,759.0	5,593.4	2,225.5	0.0	10,732.9	357,188.3
9：猪名川左岸	47,013	54,734.0	43,873.7	21,788.4	5,850.0	7.8	3.5	126,257.4	0.0	0.4	0.4	213,880.1	6,937.1	2,945.7	4,330.6	7,276.3	3,235.7	0.0	17,449.1	357,587.0
合計	224,168	326,249.3	226,442.9	118,825.3	37,672.8	71.2	32.0	709,293.5	11.7	15.2	26.9	1,201,543.0	46,252.8	16,922.8	22,200.4	39,123.2	18,873.1	0.0	104,249.1	2,015,112.5

様式-3 被害額（整備計画着手時河道）【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)	営業停止 損失 (百万円)		家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)	小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	157.1	12.1	74.6	17.6	0.2	0.1	261.7	0.3	2.9	3.2	443.3	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	724.7
2：余野川左岸	151	163.2	26.7	12.1	2.9	0.1	0.0	205.0	0.2	4.2	4.4	347.2	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	581.5
3：川西池田	1,784	5,063.0	2,014.8	335.8	105.2	1.8	0.8	7,521.4	0.0	2.6	2.6	12,741.3	100.7	116.7	145.5	262.2	73.7	0.0	436.6	20,701.9
4：中流左岸	8,902	16,659.1	7,657.9	5,379.1	2,687.0	5.9	2.7	32,391.7	0.3	2.1	2.4	54,871.3	1,778.3	534.9	749.8	1,284.7	497.6	0.0	3,560.6	90,826.0
5：中流右岸	11,613	25,059.4	22,048.8	12,180.2	6,492.5	15.9	7.4	65,804.2	3.6	9.5	13.1	111,472.3	4,864.4	1,610.4	1,464.4	3,074.8	1,813.8	0.0	9,753.0	187,042.6
6：大阪空港	3,562	10,722.7	6,209.2	11,060.8	3,572.3	9.2	4.3	31,578.5	3.5	1.1	4.6	53,494.0	2,018.6	365.4	380.2	745.6	800.0	0.0	3,564.2	88,641.3
7：藻川右岸	138,881	164,835.5	117,896.4	67,537.3	19,846.0	26.5	11.1	370,152.8	1.4	0.0	1.4	627,038.9	30,703.3	9,654.8	13,499.9	23,154.7	11,733.1	0.0	65,591.1	1,062,784.2
8：中州	18,531	91,886.9	54,206.6	12,878.5	3,874.2	12.9	5.9	162,865.0	3.2	0.0	3.2	275,893.2	3,617.0	3,519.7	3,038.1	6,557.8	2,940.8	0.0	13,115.6	451,877.0
9：猪名川左岸	49,220	63,251.2	53,085.5	25,763.9	7,111.8	9.1	4.1	149,225.6	0.4	3.8	4.2	252,788.3	7,903.9	3,442.8	4,841.2	8,284.0	3,854.1	0.0	20,042.0	422,060.1
合計	232,674	377,798.1	263,158.0	135,222.3	43,709.5	81.6	36.4	820,005.9	12.9	26.2	39.1	1,389,089.8	51,007.5	19,249.6	24,127.6	43,377.2	21,719.8	0.0	116,104.5	2,325,239.3

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	14,752	12,770.5	5,228.6	1,627.8	339.8	1.0	0.5	19,968.2	0.3	0.0	0.3	33,825.9	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	56,493.4	56,493.4
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	14,752	12,770.5	5,228.6	1,627.8	339.8	1.0	0.5	19,968.2	0.3	0.0	0.3	33,825.9	805.8	562.7	967.1	1,529.8	363.4	0.0	2,699.0	56,493.4	56,493.4

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	1,286	1,889.3	681.8	1,985.8	482.0	1.1	0.5	5,040.5	2.4	0.0	2.4	8,538.7	401.2	46.3	73.7	120.0	105.2	0.0	626.4	14,208.0	14,208.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	15,545	22,846.7	11,679.1	2,928.6	643.2	2.3	1.0	38,100.9	0.4	0.0	0.4	64,542.9	1,082.6	899.4	1,344.8	2,244.2	563.0	0.0	3,889.8	106,534.0	106,534.0
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	16,831	24,736.0	12,360.9	4,914.4	1,125.2	3.4	1.5	43,141.4	2.8	0.0	2.8	73,081.6	1,483.8	945.7	1,418.5	2,364.2	668.2	0.0	4,516.2	120,742.0	120,742.0

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	1,854	3,172.1	1,260.8	3,331.4	885.2	2.1	0.9	8,652.5	3.2	0.0	3.2	14,657.4	646.1	80.7	119.6	200.3	189.7	0.0	1,036.1	24,349.2	
7:藻川右岸	61,734	52,723.7	29,535.0	19,968.2	4,917.2	3.9	1.6	107,149.6	0.0	0.0	0.0	181,511.6	10,748.4	2,913.6	4,870.3	7,783.9	3,598.6	0.0	22,130.9	310,792.1	
8:中州	18,137	38,321.6	22,623.6	6,124.6	1,456.1	6.2	2.8	68,534.9	2.8	0.0	2.8	116,098.0	1,746.9	1,528.9	1,966.3	3,495.2	1,026.1	0.0	6,268.2	190,903.9	
9:猪名川左岸	42,871	32,846.5	21,611.2	13,281.3	3,434.5	4.1	1.8	71,179.4	0.1	0.0	0.1	120,577.6	5,194.0	1,845.0	3,065.4	4,910.4	2,023.3	0.0	12,127.7	203,884.8	
合計	124,596	127,063.9	75,030.6	42,705.5	10,693.0	16.3	7.1	255,516.4	6.1	0.0	6.1	432,844.6	18,335.4	6,368.2	10,021.6	16,389.8	6,837.7	0.0	41,562.9	729,930.0	

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1:古江	3	7.1	0.3	3.7	0.9	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	1.1	33.2
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	2,773	5,282.3	2,608.2	5,850.5	1,654.8	4.2	2.0	15,402.0	3.3	0.8	4.1	26,091.2	1,072.7	163.9	214.5	378.4	357.1	0.0	1,808.2	43,305.5
7:藻川右岸	71,042	68,712.4	41,898.2	26,267.0	6,489.9	5.4	2.3	143,375.2	0.0	0.0	0.0	242,877.5	13,079.4	3,730.0	6,075.0	9,805.0	4,671.6	0.0	27,556.0	413,808.7
8:中州	18,286	48,058.7	28,765.9	7,366.9	1,836.5	7.2	3.3	86,038.5	2.9	0.0	2.9	145,749.0	2,064.5	1,902.4	2,203.9	4,106.3	1,357.3	0.0	7,528.1	239,318.5
9:猪名川左岸	44,336	38,460.4	27,189.4	15,355.5	4,009.2	5.1	2.3	85,021.9	0.1	0.4	0.5	144,026.9	5,659.0	2,115.0	3,409.3	5,524.3	2,318.4	0.0	13,501.7	242,551.0
合計	136,440	160,520.9	100,462.0	54,843.6	13,991.3	21.9	9.9	329,849.6	6.3	1.2	7.5	558,764.7	21,876.5	7,911.3	11,902.8	19,814.1	8,704.5	0.0	50,395.1	939,016.9

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1:古江	21	77.9	4.4	36.7	8.6	0.1	0.0	127.7	0.1	0.0	0.1	216.5	7.8	0.4	0.7	1.1	0.9	0.0	9.8	354.1
2:余野川左岸	69	90.8	7.7	4.8	1.2	0.0	0.0	104.5	0.0	1.1	1.1	176.8	3.5	1.7	3.1	4.8	2.0	0.0	10.3	292.7
3:川西池田	1,550	3,795.0	1,378.9	252.5	78.8	1.2	0.5	5,506.9	0.0	2.5	2.5	9,328.4	78.7	85.3	111.6	196.9	53.2	0.0	328.8	15,166.6
4:中流左岸	3,139	2,759.1	733.9	907.9	402.9	0.5	0.2	4,804.5	0.2	1.4	1.6	8,139.1	447.2	92.2	160.9	253.1	74.2	0.0	774.5	13,719.7
5:中流右岸	10,245	13,726.9	11,756.6	7,351.4	3,396.8	9.1	4.1	36,244.9	3.0	6.7	9.7	61,398.8	3,050.2	924.3	1,073.4	1,997.7	1,007.9	0.0	6,055.8	103,709.2
6:大阪空港	2,944	6,645.0	3,522.1	7,374.9	2,130.8	5.7	2.7	19,681.2	3.4	0.8	4.2	33,339.9	1,302.2	211.5	259.4	470.9	461.8	0.0	2,234.9	55,260.2
7:藻川右岸	104,523	109,171.9	75,164.6	45,128.7	12,412.6	14.1	5.9	241,897.8	1.2	0.0	1.2	409,774.6	21,344.5	6,433.8	9,522.1	15,955.9	8,010.1	0.0	45,310.5	696,984.1
8:中州	18,459	62,876.4	38,314.3	9,476.8	2,545.2	8.9	4.2	113,225.8	3.1	0.0	3.1	191,804.6	2,593.8	2,488.6	2,550.2	5,038.8	1,911.6	0.0	9,544.2	314,577.7
9:猪名川左岸	46,016	49,248.8	38,059.5	19,479.2	5,149.8	6.9	3.1	111,947.3	0.0	0.4	0.4	189,638.5	6,460.0	2,641.4	4,008.6	6,650.0	2,891.1	0.0	16,001.1	317,587.3
合計	186,966	248,391.8	168,942.0	90,012.9	26,126.7	46.5	20.7	533,540.6	11.0	12.9	23.9	903,817.2	35,287.9	12,879.2	17,690.0	30,569.2	14,412.8	0.0	80,269.9	1,517,651.6

様式-3 被害額 (H29末時点) 【資産-10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	30	157.1	12.1	74.6	17.6	0.2	0.1	261.7	0.3	2.9	3.2	443.3	12.9	0.7	1.2	1.9	1.7	0.0	16.5	724.7
2：余野川左岸	151	163.2	26.7	12.1	2.9	0.1	0.0	205.0	0.2	4.2	4.4	347.2	8.4	4.2	7.3	11.5	5.0	0.0	24.9	581.5
3：川西池田	1,751	4,817.5	1,922.9	323.3	101.4	1.7	0.8	7,167.6	0.0	2.6	2.6	12,142.1	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	19,734.5
4：中流左岸	3,272	8,520.8	3,340.1	3,120.5	1,729.7	3.4	1.6	16,716.1	0.3	1.5	1.8	28,317.2	858.9	198.3	269.4	467.7	135.3	0.0	1,461.9	46,497.0
5：中流右岸	11,249	16,822.8	14,507.1	8,596.4	4,094.3	11.2	5.1	44,036.9	3.3	8.0	11.3	74,598.4	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	125,717.5
6：大阪空港	3,929	8,486.9	4,394.6	8,660.6	2,605.7	6.7	3.2	24,157.7	3.5	1.0	4.5	40,923.3	1,607.3	275.5	338.9	614.4	579.9	0.0	2,801.6	67,887.1
7：藻川右岸	114,662	127,134.3	90,327.5	53,429.5	15,012.9	17.4	7.2	285,928.8	1.2	0.0	1.2	484,363.2	24,415.3	7,488.4	10,805.2	18,293.6	9,353.2	0.0	52,062.1	822,355.3
8：中州	18,208	39,132.4	24,582.6	7,102.6	1,687.2	7.8	3.7	72,516.3	3.1	0.0	3.1	122,842.4	1,863.2	1,621.5	2,057.9	3,679.4	1,092.8	0.0	6,635.4	201,997.2
9：猪名川左岸	47,453	57,155.6	46,370.2	22,833.9	6,166.6	8.2	3.7	132,538.2	0.0	0.4	0.4	224,519.6	7,150.0	3,078.6	4,465.7	7,544.3	3,392.2	0.0	18,086.5	375,144.7
合計	200,705	262,390.6	185,483.8	104,153.5	31,418.3	56.7	25.4	583,528.3	11.9	20.6	32.5	988,496.7	39,541.5	13,889.8	19,299.9	33,189.7	15,850.8	0.0	88,582.0	1,660,639.5

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7: 藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8: 中州	15,045	17,347.7	8,445.5	2,235.4	470.4	1.7	0.7	28,501.4	0.4	0.0	0.4	48,281.6	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	80,031.3	80,031.3
9: 猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	17,347.7	8,445.5	2,235.4	470.4	1.7	0.7	28,501.4	0.4	0.0	0.4	48,281.6	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	80,031.3	80,031.3

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	1,549	2,408.3	864.6	2,517.1	649.9	1.4	0.5	6,441.8	2.7	0.0	2.7	10,912.6	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	18,153.5	
7: 藻川右岸	61,391	51,927.5	28,994.0	19,662.7	4,849.4	3.8	1.6	105,439.0	0.0	0.0	0.0	178,613.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	305,912.6	
8: 中州	17,941	29,592.5	16,816.6	4,798.1	1,073.7	4.9	2.2	52,288.0	2.8	0.0	2.8	88,575.6	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	145,960.6	
9: 猪名川左岸	42,924	33,241.7	22,041.9	13,441.6	3,474.8	4.1	1.8	72,205.9	0.1	0.0	0.1	122,316.9	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	206,742.6	
合計	123,805	117,170.0	68,717.1	40,419.5	10,047.8	14.2	6.1	236,374.7	5.6	0.0	5.6	400,418.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	676,769.3	

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	2,735	4,959.1	2,364.6	5,446.4	1,531.4	3.9	1.8	14,307.2	3.3	0.8	4.1	24,236.4	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	40,244.8	
7: 藻川右岸	70,472	67,638.2	41,115.5	25,858.2	6,394.1	5.3	2.3	141,013.6	0.0	0.0	0.0	238,877.0	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	407,127.6	
8: 中州	18,157	40,235.9	23,652.2	6,303.9	1,515.7	6.3	2.9	71,716.9	2.8	0.0	2.8	121,488.5	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	199,683.4	
9: 猪名川左岸	44,386	38,790.1	27,552.4	15,491.7	4,048.4	5.2	2.3	85,890.1	0.1	0.0	0.1	145,497.8	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	244,976.5	
合計	135,750	151,623.3	94,684.7	53,100.2	13,489.6	20.7	9.3	312,927.8	6.2	0.8	7.0	530,099.7	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	892,032.3	

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1: 古江	14	50.9	1.8	20.8	5.0	0.0	0.0	78.5	0.0	0.0	0.0	132.8	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	217.3
2: 余野川左岸	14	46.7	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	83.3	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	134.4
3: 川西池田	1,550	3,864.1	1,421.3	257.4	80.3	1.2	0.5	5,624.8	0.0	2.5	2.5	9,528.3	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	15,490.2
4: 中流左岸	3,139	2,784.4	740.5	910.2	403.9	0.5	0.2	4,839.7	0.2	1.4	1.6	8,198.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	13,815.6
5: 中流右岸	10,367	13,871.9	11,884.0	7,424.4	3,430.9	9.3	4.2	36,624.7	3.0	6.9	9.9	62,042.0	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	104,791.5
6: 大阪空港	2,932	6,413.6	3,418.7	7,206.2	2,061.7	5.5	2.6	19,108.3	3.3	0.8	4.1	32,369.7	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	53,660.2
7: 藻川右岸	105,063	109,202.5	74,947.5	45,075.5	12,414.2	14.1	5.9	241,659.7	1.2	0.0	1.2	409,371.6	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	696,417.9
8: 中州	18,425	55,504.3	33,789.0	8,440.1	2,183.9	8.2	3.9	99,929.4	3.1	0.0	3.1	169,279.9	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	277,728.1
9: 猪名川左岸	46,397	49,704.5	38,477.6	19,692.3	5,225.4	7.0	3.2	113,110.0	0.0	0.4	0.4	191,607.9	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	320,904.5
合計	187,901	241,442.9	164,681.8	89,027.8	25,805.5	45.8	20.5	521,024.3	10.8	12.0	22.8	882,614.2	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,483,159.7

様式-3 被害額 (H33末時点) 【資産-10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	112.8	7.3	50.3	11.7	0.1	0.0	182.2	0.1	0.7	0.8	308.6	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	503.8
2：余野川左岸	69	106.6	8.4	4.9	1.2	0.0	0.0	121.1	0.0	2.9	2.9	204.8	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	339.2
3：川西池田	1,751	4,817.5	1,922.9	323.3	101.4	1.7	0.8	7,167.6	0.0	2.6	2.6	12,142.1	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	19,734.5
4：中流左岸	3,299	8,645.0	3,402.8	3,151.8	1,746.9	3.5	1.6	16,951.6	0.3	1.5	1.8	28,716.2	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	47,146.7
5：中流右岸	11,249	16,822.8	14,507.1	8,596.4	4,094.3	11.2	5.1	44,036.9	3.3	8.0	11.3	74,598.4	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	125,717.5
6：大阪空港	3,939	8,175.6	4,231.2	8,353.6	2,494.6	6.5	3.1	23,264.6	3.5	0.9	4.4	39,410.3	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	65,395.6
7：藻川右岸	114,885	126,799.3	89,851.6	53,199.5	14,951.3	17.3	7.1	284,826.1	1.2	0.0	1.2	482,495.3	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	819,280.8
8：中州	18,180	38,659.6	24,134.0	7,021.2	1,662.2	7.6	3.6	71,488.2	3.1	0.0	3.1	121,101.1	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	199,152.5
9：猪名川左岸	47,453	57,839.3	47,203.5	23,104.8	6,254.6	8.3	3.8	134,414.3	0.0	0.4	0.4	227,697.8	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	380,366.6
合計	200,849	261,978.5	185,268.8	103,805.8	31,318.2	56.2	25.1	582,452.6	11.5	17.0	28.5	986,674.6	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	1,657,637.2

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/20

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/30

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名：淀川水系 河川名：猪名川 流量規模：1/50

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1:古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2:余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3:川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4:中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5:中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6:大阪空港	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7:藻川右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8:中州	15,045	17,347.7	8,445.5	2,235.4	470.4	1.7	0.7	28,501.4	0.4	0.0	0.4	48,281.6	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	80,031.3	80,031.3
9:猪名川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	15,045	17,347.7	8,445.5	2,235.4	470.4	1.7	0.7	28,501.4	0.4	0.0	0.4	48,281.6	933.3	708.3	1,153.8	1,862.1	452.5	0.0	3,247.9	80,031.3	80,031.3

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/80

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	1,549	2,408.3	864.6	2,517.1	649.9	1.4	0.5	6,441.8	2.7	0.0	2.7	10,912.6	506.5	58.6	91.4	150.0	139.9	0.0	796.4	18,153.5	
7: 藻川右岸	61,391	51,927.5	28,994.0	19,662.7	4,849.4	3.8	1.6	105,439.0	0.0	0.0	0.0	178,613.6	10,616.7	2,878.4	4,815.0	7,693.4	3,549.9	0.0	21,860.0	305,912.6	
8: 中州	17,941	29,592.5	16,816.6	4,798.1	1,073.7	4.9	2.2	52,288.0	2.8	0.0	2.8	88,575.6	1,450.1	1,198.5	1,686.7	2,885.2	758.9	0.0	5,094.2	145,960.6	
9: 猪名川左岸	42,924	33,241.7	22,041.9	13,441.6	3,474.8	4.1	1.8	72,205.9	0.1	0.0	0.1	122,316.9	5,225.8	1,862.4	3,089.2	4,951.6	2,042.3	0.0	12,219.7	206,742.6	
合計	123,805	117,170.0	68,717.1	40,419.5	10,047.8	14.2	6.1	236,374.7	5.6	0.0	5.6	400,418.7	17,799.1	5,997.9	9,682.3	15,680.2	6,491.0	0.0	39,970.3	676,769.3	

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/100

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)		
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)	
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)					
1: 古江	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2: 余野川左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3: 川西池田	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4: 中流左岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5: 中流右岸	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6: 大阪空港	2,735	4,959.1	2,364.6	5,446.4	1,531.4	3.9	1.8	14,307.2	3.3	0.8	4.1	24,236.4	1,014.0	150.8	202.1	352.9	330.2	0.0	1,697.1	40,244.8	
7: 藻川右岸	70,472	67,638.2	41,115.5	25,858.2	6,394.1	5.3	2.3	141,013.6	0.0	0.0	0.0	238,877.0	12,947.1	3,680.5	6,000.3	9,680.8	4,609.1	0.0	27,237.0	407,127.6	
8: 中州	18,157	40,235.9	23,652.2	6,303.9	1,515.7	6.3	2.9	71,716.9	2.8	0.0	2.8	121,488.5	1,798.2	1,590.9	2,005.2	3,596.1	1,080.9	0.0	6,475.2	199,683.4	
9: 猪名川左岸	44,386	38,790.1	27,552.4	15,491.7	4,048.4	5.2	2.3	85,890.1	0.1	0.0	0.1	145,497.8	5,687.3	2,132.7	3,430.5	5,563.2	2,338.0	0.0	13,588.5	244,976.5	
合計	135,750	151,623.3	94,684.7	53,100.2	13,489.6	20.7	9.3	312,927.8	6.2	0.8	7.0	530,099.7	21,446.6	7,554.9	11,638.1	19,193.0	8,358.2	0.0	48,997.8	892,032.3	

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】 水系名: 淀川水系 河川名: 猪名川 流量規模: 1/150

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稲 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1: 古江	14	50.9	1.8	20.8	5.0	0.0	0.0	78.5	0.0	0.0	0.0	132.8	4.9	0.2	0.4	0.6	0.5	0.0	6.0	217.3
2: 余野川左岸	14	46.7	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	83.3	0.5	0.4	0.7	1.1	0.3	0.0	1.9	134.4
3: 川西池田	1,550	3,864.1	1,421.3	257.4	80.3	1.2	0.5	5,624.8	0.0	2.5	2.5	9,528.3	79.7	87.0	113.7	200.7	54.2	0.0	334.6	15,490.2
4: 中流左岸	3,139	2,784.4	740.5	910.2	403.9	0.5	0.2	4,839.7	0.2	1.4	1.6	8,198.7	447.7	92.4	161.2	253.6	74.3	0.0	775.6	13,815.6
5: 中流右岸	10,367	13,871.9	11,884.0	7,424.4	3,430.9	9.3	4.2	36,624.7	3.0	6.9	9.9	62,042.0	3,081.3	933.1	1,083.2	2,016.3	1,017.3	0.0	6,114.9	104,791.5
6: 大阪空港	2,932	6,413.6	3,418.7	7,206.2	2,061.7	5.5	2.6	19,108.3	3.3	0.8	4.1	32,369.7	1,270.2	207.0	254.9	461.9	446.0	0.0	2,178.1	53,660.2
7: 藻川右岸	105,063	109,202.5	74,947.5	45,075.5	12,414.2	14.1	5.9	241,659.7	1.2	0.0	1.2	409,371.6	21,398.3	6,440.2	9,539.0	15,979.2	8,007.9	0.0	45,385.4	696,417.9
8: 中州	18,425	55,504.3	33,789.0	8,440.1	2,183.9	8.2	3.9	99,929.4	3.1	0.0	3.1	169,279.9	2,323.3	2,191.5	2,388.5	4,580.0	1,612.4	0.0	8,515.7	277,728.1
9: 猪名川左岸	46,397	49,704.5	38,477.6	19,692.3	5,225.4	7.0	3.2	113,110.0	0.0	0.4	0.4	191,607.9	6,531.8	2,676.2	4,048.1	6,724.3	2,930.1	0.0	16,186.2	320,904.5
合計	187,901	241,442.9	164,681.8	89,027.8	25,805.5	45.8	20.5	521,024.3	10.8	12.0	22.8	882,614.2	35,137.7	12,628.0	17,589.7	30,217.7	14,143.0	0.0	79,498.4	1,483,159.7

様式-3 被害額 (H41末時点) 【資産-10%】

水系名：淀川水系

河川名：猪名川

流量規模：1/200

ブロック名	人口 (人)	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額 (百万円)	間接被害額						合計 (百万円)	
		家屋 (百万円)	家庭用品 (百万円)	事業所資産		農漁家資産		小計 (百万円)	水稻 (百万円)	畑作物 (百万円)	小計 (百万円)		営業停止 損失 (百万円)	家庭における応急対策費用			事業所応急 対策費用 (百万円)	その他 間接被害 (百万円)		小計 (百万円)
				償却 (百万円)	在庫 (百万円)	償却 (百万円)	在庫 (百万円)							清掃労働対価 (百万円)	代替活動 (百万円)	小計 (百万円)				
1：古江	24	112.8	7.3	50.3	11.7	0.1	0.0	182.2	0.1	0.7	0.8	308.6	9.6	0.5	0.9	1.4	1.2	0.0	12.2	503.8
2：余野川左岸	69	106.6	8.4	4.9	1.2	0.0	0.0	121.1	0.0	2.9	2.9	204.8	3.5	1.8	3.1	4.9	2.0	0.0	10.4	339.2
3：川西池田	1,751	4,817.5	1,922.9	323.3	101.4	1.7	0.8	7,167.6	0.0	2.6	2.6	12,142.1	98.0	112.7	140.2	252.9	71.3	0.0	422.2	19,734.5
4：中流左岸	3,299	8,645.0	3,402.8	3,151.8	1,746.9	3.5	1.6	16,951.6	0.3	1.5	1.8	28,716.2	864.9	201.9	272.9	474.8	137.4	0.0	1,477.1	47,146.7
5：中流右岸	11,249	16,822.8	14,507.1	8,596.4	4,094.3	11.2	5.1	44,036.9	3.3	8.0	11.3	74,598.4	3,527.5	1,109.9	1,214.1	2,324.0	1,219.4	0.0	7,070.9	125,717.5
6：大阪空港	3,939	8,175.6	4,231.2	8,353.6	2,494.6	6.5	3.1	23,264.6	3.5	0.9	4.4	39,410.3	1,560.3	266.5	334.2	600.7	555.3	0.0	2,716.3	65,395.6
7：藻川右岸	114,885	126,799.3	89,851.6	53,199.5	14,951.3	17.3	7.1	284,826.1	1.2	0.0	1.2	482,495.3	24,378.8	7,470.4	10,790.1	18,260.5	9,318.9	0.0	51,958.2	819,280.8
8：中州	18,180	38,659.6	24,134.0	7,021.2	1,662.2	7.6	3.6	71,488.2	3.1	0.0	3.1	121,101.1	1,843.5	1,599.3	2,041.2	3,640.5	1,076.1	0.0	6,560.1	199,152.5
9：猪名川左岸	47,453	57,839.3	47,203.5	23,104.8	6,254.6	8.3	3.8	134,414.3	0.0	0.4	0.4	227,697.8	7,200.3	3,115.9	4,503.4	7,619.3	3,434.5	0.0	18,254.1	380,366.6
合計	200,849	261,978.5	185,268.8	103,805.8	31,318.2	56.2	25.1	582,452.6	11.5	17.0	28.5	986,674.6	39,486.4	13,878.9	19,300.1	33,179.0	15,816.1	0.0	88,481.5	1,657,637.2

様式－4

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H20.3⇒H30.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	62,470.4	62,470.4	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	649,621.1	133,655.8	515,965.3	257,982.7	0.013	3,353.8	3,353.8	
1/80	0.013	1,479,372.5	806,415.2	672,957.3	594,461.3	0.007	4,161.2	7,515.0	
1/100	0.010	1,755,069.8	1,037,752.4	717,317.4	695,137.4	0.003	2,085.4	9,600.4	
1/150	0.007	2,227,430.0	1,677,360.1	550,069.9	633,693.7	0.003	1,901.1	11,501.5	
1/200	0.005	2,570,698.3	1,835,312.0	735,386.3	642,728.1	0.002	1,285.5	12,787.0	

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H30.4⇒H34.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	62,470.4	0.0	62,470.4	31,235.2	0.017	531.0	531.0	
1/50	0.020	133,655.8	88,562.8	45,093.0	53,781.7	0.013	699.2	1,230.2	
1/80	0.013	806,415.2	747,524.7	58,890.5	51,991.8	0.007	363.9	1,594.1	
1/100	0.010	1,037,752.4	985,702.6	52,049.8	55,470.2	0.003	166.4	1,760.5	
1/150	0.007	1,677,360.1	1,639,121.5	38,238.6	45,144.2	0.003	135.4	1,895.9	
1/200	0.005	1,835,312.0	1,831,987.5	3,324.5	20,781.6	0.002	41.6	1,937.5	

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H34.4⇒H42.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	88,562.8	88,562.8	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	
1/80	0.013	747,524.7	747,524.7	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	
1/100	0.010	985,702.6	985,702.6	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/150	0.007	1,639,121.5	1,639,121.5	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/200	0.005	1,831,987.5	1,831,987.5	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産＋10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H20.3⇒H30.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	68,447.6	68,447.6	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	710,911.7	146,569.8	564,341.9	282,171.0	0.013	3,668.2	3,668.2	
1/80	0.013	1,619,558.3	882,900.7	736,657.6	650,499.8	0.007	4,553.5	8,221.7	
1/100	0.010	1,921,813.7	1,136,488.4	785,325.3	760,991.5	0.003	2,283.0	10,504.7	
1/150	0.007	2,439,748.8	1,837,069.2	602,679.6	694,002.5	0.003	2,082.0	12,586.7	
1/200	0.005	2,816,158.1	2,009,985.0	806,173.1	704,426.4	0.002	1,408.9	13,995.6	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産＋10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H30.4⇒H34.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	68,447.6	0.0	68,447.6	34,223.8	0.017	581.8	581.8	
1/50	0.020	146,569.8	97,094.3	49,475.5	58,961.6	0.013	766.5	1,348.3	
1/80	0.013	882,900.7	818,280.2	64,620.5	57,048.0	0.007	399.3	1,747.6	
1/100	0.010	1,136,488.4	1,079,373.2	57,115.2	60,867.9	0.003	182.6	1,930.2	
1/150	0.007	1,837,069.2	1,795,084.1	41,985.1	49,550.2	0.003	148.7	2,078.9	
1/200	0.005	2,009,985.0	2,006,338.1	3,646.9	22,816.0	0.002	45.6	2,124.5	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産＋10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H34.4⇒H42.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	97,094.3	97,094.3	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	
1/80	0.013	818,280.2	818,280.2	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	
1/100	0.010	1,079,373.2	1,079,373.2	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/150	0.007	1,795,084.1	1,795,084.1	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/200	0.005	2,006,338.1	2,006,338.1	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産－10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H20.3⇒H30.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	56,493.4	56,493.4	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	588,330.6	120,742.0	467,588.6	233,794.3	0.013	3,039.3	3,039.3	
1/80	0.013	1,339,187.0	729,930.0	609,257.0	538,422.8	0.007	3,769.0	6,808.3	
1/100	0.010	1,588,326.3	939,016.9	649,309.4	629,283.2	0.003	1,887.8	8,696.1	
1/150	0.007	2,015,112.5	1,517,651.6	497,460.9	573,385.2	0.003	1,720.2	10,416.3	
1/200	0.005	2,325,239.3	1,660,639.5	664,599.8	581,030.4	0.002	1,162.1	11,578.4	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産－10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H30.4⇒H34.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	56,493.4	0.0	56,493.4	28,246.7	0.017	480.2	480.2	
1/50	0.020	120,742.0	80,031.3	40,710.7	48,602.1	0.013	631.8	1,112.0	
1/80	0.013	729,930.0	676,769.3	53,160.7	46,935.7	0.007	328.5	1,440.5	
1/100	0.010	939,016.9	892,032.3	46,984.6	50,072.7	0.003	150.2	1,590.7	
1/150	0.007	1,517,651.6	1,483,159.7	34,491.9	40,738.3	0.003	122.2	1,712.9	
1/200	0.005	1,660,639.5	1,657,637.2	3,002.3	18,747.1	0.002	37.5	1,750.4	

様式－４ 年平均被害軽減期待額 【資産－10%】

水系名：淀川水系 河川名：猪名川

対象河道：H34.4⇒H42.3(単位：百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の 累計 =年平均被害 軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①－②					
1/20	0.050	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.0	
1/30	0.033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.017	0.0	0.0	
1/50	0.020	80,031.3	80,031.3	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	
1/80	0.013	676,769.3	676,769.3	0.0	0.0	0.007	0.0	0.0	
1/100	0.010	892,032.3	892,032.3	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/150	0.007	1,483,159.7	1,483,159.7	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	
1/200	0.005	1,657,637.2	1,657,637.2	0.0	0.0	0.002	0.0	0.0	

様式 - 5

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (22年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5		
		H21	-8	1,042.6	1,426.3		1,426.3	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8		
		H22	-7	3,567.7	4,694.3		4,694.3	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6		
		H23	-6	4,860.2	6,152.2		6,152.2	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1		
		H24	-5	5,931.7	7,216.2		7,216.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7		
		H25	-4	9,285.0	10,859.6		10,859.6	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6		
	残事業期間	H26	-3	10,743.6	12,085.0		12,085.0	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4		
		H27	-2	11,385.7	12,308.9		12,308.9	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6		
		H28	-1	11,971.2	12,444.1		12,444.1	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7		
		H29	0	12,407.5	12,407.5		12,407.5	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4		
		H30	1	12,787.0	12,295.2		12,295.2	594.0	571.2	141.4	136.0	735.4	707.2		
		H31	2	13,281.2	12,274.7		12,274.7	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H32	3	13,765.3	12,235.8		12,235.8	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4			
	H33	4	14,255.5	12,184.2		12,184.2	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8			
	H34	5	14,724.5	12,099.0		12,099.0	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6			
	H35	6	14,724.5	11,639.9		11,639.9	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	179.9			
	H36	7	14,724.5	11,188.8		11,188.8	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3			
	H37	8	14,724.5	10,755.7		10,755.7	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2			
	H38	9	14,724.5	10,347.5		10,347.5	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8			
	H39	10	14,724.5	9,949.0		9,949.0	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1			
	H40	11	14,724.5	9,567.6		9,567.6	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7			
	H41	12	14,724.5	9,197.1		9,197.1	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6			
	H42	13	14,724.5	8,843.5		8,843.5			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43	14	14,724.5	8,501.4		8,501.4			236.0	136.3	236.0	136.3			
	H44	15	14,724.5	8,175.7		8,175.7			236.0	131.0	236.0	131.0			
	H45	16	14,724.5	7,861.5		7,861.5			236.0	126.0	236.0	126.0			
	H46	17	14,724.5	7,558.8		7,558.8			236.0	121.1	236.0	121.1			
	H47	18	14,724.5	7,267.8		7,267.8			236.0	116.5	236.0	116.5			
	H48	19	14,724.5	6,988.4		6,988.4			236.0	112.0	236.0	112.0			
	H49	20	14,724.5	6,720.4		6,720.4			236.0	107.7	236.0	107.7			
	H50	21	14,724.5	6,460.9		6,460.9			236.0	103.6	236.0	103.6			
	H51	22	14,724.5	6,212.9		6,212.9			236.0	99.6	236.0	99.6			
H52	23	14,724.5	5,973.4		5,973.4			236.0	95.7	236.0	95.7				
H53	24	14,724.5	5,745.0		5,745.0			236.0	92.1	236.0	92.1				
H54	25	14,724.5	5,523.1		5,523.1			236.0	88.5	236.0	88.5				
H55	26	14,724.5	5,311.9		5,311.9			236.0	85.1	236.0	85.1				
H56	27	14,724.5	5,107.4		5,107.4			236.0	81.9	236.0	81.9				
H57	28	14,724.5	4,909.8		4,909.8			236.0	78.7	236.0	78.7				
H58	29	14,724.5	4,720.9		4,720.9			236.0	75.7	236.0	75.7				
H59	30	14,724.5	4,540.4		4,540.4			236.0	72.8	236.0	72.8				
H60	31	14,724.5	4,365.4		4,365.4			236.0	70.0	236.0	70.0				
H61	32	14,724.5	4,197.4		4,197.4			236.0	67.3	236.0	67.3				
H62	33	14,724.5	4,036.3		4,036.3			236.0	64.7	236.0	64.7				
H63	34	14,724.5	3,881.0		3,881.0			236.0	62.2	236.0	62.2				
H64	35	14,724.5	3,731.5		3,731.5			236.0	59.8	236.0	59.8				
H65	36	14,724.5	3,587.8		3,587.8			236.0	57.5	236.0	57.5				
H66	37	14,724.5	3,450.0		3,450.0			236.0	55.3	236.0	55.3				
H67	38	14,724.5	3,317.1		3,317.1			236.0	53.2	236.0	53.2				
H68	39	14,724.5	3,189.9		3,189.9			236.0	51.1	236.0	51.1				
H69	40	14,724.5	3,067.0		3,067.0			236.0	49.2	236.0	49.2				
H70	41	14,724.5	2,949.0		2,949.0			236.0	47.3	236.0	47.3				
H71	42	14,724.5	2,835.5		2,835.5			236.0	45.4	236.0	45.4				
H72	43	14,724.5	2,726.8		2,726.8			236.0	43.7	236.0	43.7				
H73	44	14,724.5	2,621.4		2,621.4			236.0	42.0	236.0	42.0				
H74	45	14,724.5	2,520.9		2,520.9			236.0	40.4	236.0	40.4				
H75	46	14,724.5	2,423.8		2,423.8			236.0	38.8	236.0	38.8				
H76	47	14,724.5	2,330.6		2,330.6			236.0	37.4	236.0	37.4				
H77	48	14,724.5	2,240.8		2,240.8			236.0	35.9	236.0	35.9				
H78	49	14,724.5	2,154.9		2,154.9			236.0	34.5	236.0	34.5				
H79	50	14,724.5	2,071.8		2,071.8			236.0	33.2	236.0	33.2				
H80	51	14,724.5	1,992.2		1,992.2			236.0	31.9	236.0	31.9				
H81	52	14,724.5	1,915.5		1,915.5			236.0	30.7	236.0	30.7				
H82	53	14,724.5	1,841.9		1,841.9			236.0	29.5	236.0	29.5				
H83	54	14,724.5	1,771.0		1,771.0			236.0	28.4	236.0	28.4				
H84	55	14,724.5	1,703.0		1,703.0			236.0	27.3	236.0	27.3				
H85	56	14,724.5	1,637.5		1,637.5			236.0	26.2	236.0	26.2				
H86	57	14,724.5	1,574.5		1,574.5			236.0	25.2	236.0	25.2				
H87	58	14,724.5	1,513.9		1,513.9			236.0	24.3	236.0	24.3				
H88	59	14,724.5	1,455.7		1,455.7			236.0	23.3	236.0	23.3				
H89	60	14,724.5	1,399.7		1,399.7			236.0	22.4	236.0	22.4				
H90	61	14,724.5	1,345.9		1,345.9			236.0	21.6	236.0	21.6				
H91	62	14,724.5	1,294.1		1,294.1			236.0	20.7	236.0	20.7				
合 計			979,305.2	410,895.6	114.2	411,009.8	15,181.9	18,003.8	16,756.5	8,688.6	31,938.4	26,692.4	15.40	384,317.4	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (22年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5		
		H21	-8	1,042.6	1,426.3		1,426.3	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8		
		H22	-7	3,567.7	4,694.3		4,694.3	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6		
		H23	-6	4,860.2	6,152.2		6,152.2	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1		
		H24	-5	5,931.7	7,216.2		7,216.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7		
		H25	-4	9,285.0	10,859.6		10,859.6	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6		
	残事業期間	H26	-3	10,743.6	12,085.0		12,085.0	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4		
		H27	-2	11,385.7	12,308.9		12,308.9	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6		
		H28	-1	11,971.2	12,444.1		12,444.1	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7		
		H29	0	12,407.5	12,407.5		12,407.5	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4		
		H30	1	12,787.0	12,295.2		12,295.2	653.4	628.3	141.4	136.0	794.8	764.3		
		H31	2	13,281.2	12,274.7		12,274.7	640.1	591.6	246.5	227.8	866.6	819.4		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H32	3	13,765.3	12,235.8		12,235.8	648.1	576.1	241.5	214.7	889.6	790.8			
	H33	4	14,255.5	12,184.2		12,184.2	620.1	530.0	244.5	209.0	864.6	739.0			
	H34	5	14,724.5	12,099.0		12,099.0	209.3	172.0	233.9	192.2	443.2	364.2			
	H35	6	14,724.5	11,639.9		11,639.9	188.4	148.9	79.0	62.5	267.4	211.4			
	H36	7	14,724.5	11,188.8		11,188.8	177.1	134.6	71.1	54.0	248.2	188.6			
	H37	8	14,724.5	10,755.7		10,755.7	184.4	134.7	66.8	48.8	251.2	183.5			
	H38	9	14,724.5	10,347.5		10,347.5	217.4	152.8	69.6	48.9	287.0	201.7			
	H39	10	14,724.5	9,949.0		9,949.0	194.8	131.6	82.0	55.4	276.8	187.0			
	H40	11	14,724.5	9,567.6		9,567.6	157.2	102.1	73.5	47.8	230.7	149.9			
	H41	12	14,724.5	9,197.1		9,197.1	177.1	110.6	59.3	37.0	236.4	147.6			
	H42	13	14,724.5	8,843.5		8,843.5			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43	14	14,724.5	8,501.4		8,501.4			236.0	136.3	236.0	136.3			
	H44	15	14,724.5	8,175.7		8,175.7			236.0	131.0	236.0	131.0			
	H45	16	14,724.5	7,861.5		7,861.5			236.0	126.0	236.0	126.0			
	H46	17	14,724.5	7,558.8		7,558.8			236.0	121.1	236.0	121.1			
	H47	18	14,724.5	7,267.8		7,267.8			236.0	116.5	236.0	116.5			
	H48	19	14,724.5	6,988.4		6,988.4			236.0	112.0	236.0	112.0			
	H49	20	14,724.5	6,720.4		6,720.4			236.0	107.7	236.0	107.7			
	H50	21	14,724.5	6,460.9		6,460.9			236.0	103.6	236.0	103.6			
H51	22	14,724.5	6,212.9		6,212.9			236.0	99.6	236.0	99.6				
H52	23	14,724.5	5,973.4		5,973.4			236.0	95.7	236.0	95.7				
H53	24	14,724.5	5,745.0		5,745.0			236.0	92.1	236.0	92.1				
H54	25	14,724.5	5,523.1		5,523.1			236.0	88.5	236.0	88.5				
H55	26	14,724.5	5,311.9		5,311.9			236.0	85.1	236.0	85.1				
H56	27	14,724.5	5,107.4		5,107.4			236.0	81.9	236.0	81.9				
H57	28	14,724.5	4,909.8		4,909.8			236.0	78.7	236.0	78.7				
H58	29	14,724.5	4,720.9		4,720.9			236.0	75.7	236.0	75.7				
H59	30	14,724.5	4,540.4		4,540.4			236.0	72.8	236.0	72.8				
H60	31	14,724.5	4,365.4		4,365.4			236.0	70.0	236.0	70.0				
H61	32	14,724.5	4,197.4		4,197.4			236.0	67.3	236.0	67.3				
H62	33	14,724.5	4,036.3		4,036.3			236.0	64.7	236.0	64.7				
H63	34	14,724.5	3,881.0		3,881.0			236.0	62.2	236.0	62.2				
H64	35	14,724.5	3,731.5		3,731.5			236.0	59.8	236.0	59.8				
H65	36	14,724.5	3,587.8		3,587.8			236.0	57.5	236.0	57.5				
H66	37	14,724.5	3,450.0		3,450.0			236.0	55.3	236.0	55.3				
H67	38	14,724.5	3,317.1		3,317.1			236.0	53.2	236.0	53.2				
H68	39	14,724.5	3,189.9		3,189.9			236.0	51.1	236.0	51.1				
H69	40	14,724.5	3,067.0		3,067.0			236.0	49.2	236.0	49.2				
H70	41	14,724.5	2,949.0		2,949.0			236.0	47.3	236.0	47.3				
H71	42	14,724.5	2,835.5		2,835.5			236.0	45.4	236.0	45.4				
H72	43	14,724.5	2,726.8		2,726.8			236.0	43.7	236.0	43.7				
H73	44	14,724.5	2,621.4		2,621.4			236.0	42.0	236.0	42.0				
H74	45	14,724.5	2,520.9		2,520.9			236.0	40.4	236.0	40.4				
H75	46	14,724.5	2,423.8		2,423.8			236.0	38.8	236.0	38.8				
H76	47	14,724.5	2,330.6		2,330.6			236.0	37.4	236.0	37.4				
H77	48	14,724.5	2,240.8		2,240.8			236.0	35.9	236.0	35.9				
H78	49	14,724.5	2,154.9		2,154.9			236.0	34.5	236.0	34.5				
H79	50	14,724.5	2,071.8		2,071.8			236.0	33.2	236.0	33.2				
H80	51	14,724.5	1,992.2		1,992.2			236.0	31.9	236.0	31.9				
H81	52	14,724.5	1,915.5		1,915.5			236.0	30.7	236.0	30.7				
H82	53	14,724.5	1,841.9		1,841.9			236.0	29.5	236.0	29.5				
H83	54	14,724.5	1,771.0		1,771.0			236.0	28.4	236.0	28.4				
H84	55	14,724.5	1,703.0		1,703.0			236.0	27.3	236.0	27.3				
H85	56	14,724.5	1,637.5		1,637.5			236.0	26.2	236.0	26.2				
H86	57	14,724.5	1,574.5		1,574.5			236.0	25.2	236.0	25.2				
H87	58	14,724.5	1,513.9		1,513.9			236.0	24.3	236.0	24.3				
H88	59	14,724.5	1,455.7		1,455.7			236.0	23.3	236.0	23.3				
H89	60	14,724.5	1,399.7		1,399.7			236.0	22.4	236.0	22.4				
H90	61	14,724.5	1,345.9		1,345.9			236.0	21.6	236.0	21.6				
H91	62	14,724.5	1,294.1		1,294.1			236.0	20.7	236.0	20.7				
合 計			979,305.2	410,895.6	125.6	411,021.2	15,551.7	18,314.0	16,756.5	8,688.6	32,308.2	27,002.6	15.22	384,018.6	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (22年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5		
		H21	-8	1,042.6	1,426.3		1,426.3	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8		
		H22	-7	3,567.7	4,694.3		4,694.3	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6		
		H23	-6	4,860.2	6,152.2		6,152.2	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1		
		H24	-5	5,931.7	7,216.2		7,216.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7		
		H25	-4	9,285.0	10,859.6		10,859.6	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6		
		H26	-3	10,743.6	12,085.0		12,085.0	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4		
		H27	-2	11,385.7	12,308.9		12,308.9	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6		
		H28	-1	11,971.2	12,444.1		12,444.1	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7		
	H29	0	12,407.5	12,407.5		12,407.5	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4			
	残事業期間	H30	1	12,787.0	12,295.2		12,295.2	534.6	514.0	141.4	136.0	676.0	650.0		
		H31	2	13,281.2	12,274.7		12,274.7	523.7	484.0	246.5	227.8	770.2	711.8		
		H32	3	13,765.3	12,235.8		12,235.8	530.3	471.4	241.5	214.7	771.8	686.1		
		H33	4	14,255.5	12,184.2		12,184.2	507.3	433.6	244.5	209.0	751.8	642.6		
		H34	5	14,724.5	12,099.0		12,099.0	171.3	140.8	233.9	192.2	405.2	333.0		
		H35	6	14,724.5	11,639.9		11,639.9	154.2	121.9	79.0	62.5	233.2	184.4		
		H36	7	14,724.5	11,188.8		11,188.8	144.9	110.1	71.1	54.0	216.0	164.1		
		H37	8	14,724.5	10,755.7		10,755.7	150.8	110.2	66.8	48.8	217.6	159.0		
		H38	9	14,724.5	10,347.5		10,347.5	177.8	124.9	69.6	48.9	247.4	173.8		
		H39	10	14,724.5	9,949.0		9,949.0	159.4	107.7	82.0	55.4	241.4	163.1		
		H40	11	14,724.5	9,567.6		9,567.6	128.6	83.6	73.5	47.8	202.1	131.4		
		H41	12	14,724.5	9,197.1		9,197.1	144.9	90.5	59.3	37.0	204.2	127.5		
	施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	14,724.5	8,843.5		8,843.5			66.8	40.1	66.8	40.1		
		H43	14	14,724.5	8,501.4		8,501.4			236.0	136.3	236.0	136.3		
		H44	15	14,724.5	8,175.7		8,175.7			236.0	131.0	236.0	131.0		
		H45	16	14,724.5	7,861.5		7,861.5			236.0	126.0	236.0	126.0		
		H46	17	14,724.5	7,558.8		7,558.8			236.0	121.1	236.0	121.1		
		H47	18	14,724.5	7,267.8		7,267.8			236.0	116.5	236.0	116.5		
		H48	19	14,724.5	6,988.4		6,988.4			236.0	112.0	236.0	112.0		
		H49	20	14,724.5	6,720.4		6,720.4			236.0	107.7	236.0	107.7		
		H50	21	14,724.5	6,460.9		6,460.9			236.0	103.6	236.0	103.6		
		H51	22	14,724.5	6,212.9		6,212.9			236.0	99.6	236.0	99.6		
		H52	23	14,724.5	5,973.4		5,973.4			236.0	95.7	236.0	95.7		
		H53	24	14,724.5	5,745.0		5,745.0			236.0	92.1	236.0	92.1		
		H54	25	14,724.5	5,523.1		5,523.1			236.0	88.5	236.0	88.5		
		H55	26	14,724.5	5,311.9		5,311.9			236.0	85.1	236.0	85.1		
		H56	27	14,724.5	5,107.4		5,107.4			236.0	81.9	236.0	81.9		
		H57	28	14,724.5	4,909.8		4,909.8			236.0	78.7	236.0	78.7		
		H58	29	14,724.5	4,720.9		4,720.9			236.0	75.7	236.0	75.7		
		H59	30	14,724.5	4,540.4		4,540.4			236.0	72.8	236.0	72.8		
		H60	31	14,724.5	4,365.4		4,365.4			236.0	70.0	236.0	70.0		
H61		32	14,724.5	4,197.4		4,197.4			236.0	67.3	236.0	67.3			
H62		33	14,724.5	4,036.3		4,036.3			236.0	64.7	236.0	64.7			
H63		34	14,724.5	3,881.0		3,881.0			236.0	62.2	236.0	62.2			
H64		35	14,724.5	3,731.5		3,731.5			236.0	59.8	236.0	59.8			
H65		36	14,724.5	3,587.8		3,587.8			236.0	57.5	236.0	57.5			
H66		37	14,724.5	3,450.0		3,450.0			236.0	55.3	236.0	55.3			
H67		38	14,724.5	3,317.1		3,317.1			236.0	53.2	236.0	53.2			
H68		39	14,724.5	3,189.9		3,189.9			236.0	51.1	236.0	51.1			
H69		40	14,724.5	3,067.0		3,067.0			236.0	49.2	236.0	49.2			
H70		41	14,724.5	2,949.0		2,949.0			236.0	47.3	236.0	47.3			
H71		42	14,724.5	2,835.5		2,835.5			236.0	45.4	236.0	45.4			
H72		43	14,724.5	2,726.8		2,726.8			236.0	43.7	236.0	43.7			
H73		44	14,724.5	2,621.4		2,621.4			236.0	42.0	236.0	42.0			
H74		45	14,724.5	2,520.9		2,520.9			236.0	40.4	236.0	40.4			
H75		46	14,724.5	2,423.8		2,423.8			236.0	38.8	236.0	38.8			
H76		47	14,724.5	2,330.6		2,330.6			236.0	37.4	236.0	37.4			
H77		48	14,724.5	2,240.8		2,240.8			236.0	35.9	236.0	35.9			
H78		49	14,724.5	2,154.9		2,154.9			236.0	34.5	236.0	34.5			
H79		50	14,724.5	2,071.8		2,071.8			236.0	33.2	236.0	33.2			
H80		51	14,724.5	1,992.2		1,992.2			236.0	31.9	236.0	31.9			
H81	52	14,724.5	1,915.5		1,915.5			236.0	30.7	236.0	30.7				
H82	53	14,724.5	1,841.9		1,841.9			236.0	29.5	236.0	29.5				
H83	54	14,724.5	1,771.0		1,771.0			236.0	28.4	236.0	28.4				
H84	55	14,724.5	1,703.0		1,703.0			236.0	27.3	236.0	27.3				
H85	56	14,724.5	1,637.5		1,637.5			236.0	26.2	236.0	26.2				
H86	57	14,724.5	1,574.5		1,574.5			236.0	25.2	236.0	25.2				
H87	58	14,724.5	1,513.9		1,513.9			236.0	24.3	236.0	24.3				
H88	59	14,724.5	1,455.7		1,455.7			236.0	23.3	236.0	23.3				
H89	60	14,724.5	1,399.7		1,399.7			236.0	22.4	236.0	22.4				
H90	61	14,724.5	1,345.9		1,345.9			236.0	21.6	236.0	21.6				
H91	62	14,724.5	1,294.1		1,294.1			236.0	20.7	236.0	20.7				
合 計			979,305.2	410,895.6	102.7	410,998.3	14,812.1	17,693.4	16,756.5	8,688.6	31,568.6	26,382.0	15.58	384,616.3	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (23年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5			
		H21	-8	1,042.6	1,426.3		1,426.3	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8			
		H22	-7	3,567.7	4,694.3		4,694.3	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6			
		H23	-6	4,860.2	6,152.2		6,152.2	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1			
		H24	-5	5,931.7	7,216.2		7,216.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7			
		H25	-4	9,285.0	10,859.6		10,859.6	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6			
		H26	-3	10,743.6	12,085.0		12,085.0	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4			
		H27	-2	11,385.7	12,308.9		12,308.9	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6			
		H28	-1	11,971.2	12,444.1		12,444.1	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7			
		H29	0	12,407.5	12,407.5		12,407.5	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4			
		残事業期間	H30	1	12,787.0	12,295.2		12,295.2	548.3	527.2	141.4	136.0	689.7	663.2		
			H31	2	13,221.3	12,219.3		12,219.3	538.1	497.3	227.5	210.3	765.6	707.6		
	H32		3	13,647.6	12,131.2		12,131.2	542.8	482.5	223.3	198.5	766.1	681.0			
	H33		4	14,077.6	12,032.1		12,032.1	526.2	449.7	225.3	192.6	751.5	642.3			
	H34		5	14,494.4	11,909.9		11,909.9	290.5	238.7	218.4	179.5	508.9	418.2			
	H35		6	14,724.5	11,639.9		11,639.9	165.4	130.8	120.6	95.3	286.0	226.1			
	H36		7	14,724.5	11,188.8		11,188.8	153.4	116.6	68.6	52.1	222.0	168.7			
	H37		8	14,724.5	10,755.7		10,755.7	151.2	110.4	63.7	46.5	214.9	156.9			
	H38		9	14,724.5	10,347.5		10,347.5	163.9	115.2	62.7	44.1	226.6	159.3			
	H39		10	14,724.5	9,949.0		9,949.0	177.7	120.1	68.0	45.9	245.7	166.0			
	H40		11	14,724.5	9,567.6		9,567.6	158.2	102.8	73.7	47.9	231.9	150.7			
	H41		12	14,724.5	9,197.1		9,197.1	133.3	83.3	65.7	41.0	199.0	124.3			
	H42	13	14,724.5	8,843.5		8,843.5	148.6	89.2	55.3	33.2	203.9	122.4				
	施設完成後の 評価期間 (50年)	H43	14	14,724.5	8,501.4		8,501.4			61.7	35.6	61.7	35.6			
H44		15	14,724.5	8,175.7		8,175.7			225.8	125.4	225.8	125.4				
H45		16	14,724.5	7,861.5		7,861.5			225.8	120.6	225.8	120.6				
H46		17	14,724.5	7,558.8		7,558.8			225.8	115.9	225.8	115.9				
H47		18	14,724.5	7,267.8		7,267.8			225.8	111.5	225.8	111.5				
H48		19	14,724.5	6,988.4		6,988.4			225.8	107.2	225.8	107.2				
H49		20	14,724.5	6,720.4		6,720.4			225.8	103.1	225.8	103.1				
H50		21	14,724.5	6,460.9		6,460.9			225.8	99.1	225.8	99.1				
H51		22	14,724.5	6,212.9		6,212.9			225.8	95.3	225.8	95.3				
H52		23	14,724.5	5,973.4		5,973.4			225.8	91.6	225.8	91.6				
H53		24	14,724.5	5,745.0		5,745.0			225.8	88.1	225.8	88.1				
H54		25	14,724.5	5,523.1		5,523.1			225.8	84.7	225.8	84.7				
H55		26	14,724.5	5,311.9		5,311.9			225.8	81.5	225.8	81.5				
H56		27	14,724.5	5,107.4		5,107.4			225.8	78.3	225.8	78.3				
H57		28	14,724.5	4,909.8		4,909.8			225.8	75.3	225.8	75.3				
H58		29	14,724.5	4,720.9		4,720.9			225.8	72.4	225.8	72.4				
H59		30	14,724.5	4,540.4		4,540.4			225.8	69.6	225.8	69.6				
H60		31	14,724.5	4,365.4		4,365.4			225.8	66.9	225.8	66.9				
H61		32	14,724.5	4,197.4		4,197.4			225.8	64.4	225.8	64.4				
H62		33	14,724.5	4,036.3		4,036.3			225.8	61.9	225.8	61.9				
H63		34	14,724.5	3,881.0		3,881.0			225.8	59.5	225.8	59.5				
H64		35	14,724.5	3,731.5		3,731.5			225.8	57.2	225.8	57.2				
H65		36	14,724.5	3,587.8		3,587.8			225.8	55.0	225.8	55.0				
H66		37	14,724.5	3,450.0		3,450.0			225.8	52.9	225.8	52.9				
H67		38	14,724.5	3,317.1		3,317.1			225.8	50.9	225.8	50.9				
H68		39	14,724.5	3,189.9		3,189.9			225.8	48.9	225.8	48.9				
H69		40	14,724.5	3,067.0		3,067.0			225.8	47.0	225.8	47.0				
H70		41	14,724.5	2,949.0		2,949.0			225.8	45.2	225.8	45.2				
H71		42	14,724.5	2,835.5		2,835.5			225.8	43.5	225.8	43.5				
H72		43	14,724.5	2,726.8		2,726.8			225.8	41.8	225.8	41.8				
H73		44	14,724.5	2,621.4		2,621.4			225.8	40.2	225.8	40.2				
H74		45	14,724.5	2,520.9		2,520.9			225.8	38.7	225.8	38.7				
H75		46	14,724.5	2,423.8		2,423.8			225.8	37.2	225.8	37.2				
H76		47	14,724.5	2,330.6		2,330.6			225.8	35.7	225.8	35.7				
H77		48	14,724.5	2,240.8		2,240.8			225.8	34.4	225.8	34.4				
H78		49	14,724.5	2,154.9		2,154.9			225.8	33.0	225.8	33.0				
H79	50	14,724.5	2,071.8		2,071.8			225.8	31.8	225.8	31.8					
H80	51	14,724.5	1,992.2		1,992.2			225.8	30.6	225.8	30.6					
H81	52	14,724.5	1,915.5		1,915.5			225.8	29.4	225.8	29.4					
H82	53	14,724.5	1,841.9		1,841.9			225.8	28.2	225.8	28.2					
H83	54	14,724.5	1,771.0		1,771.0			225.8	27.2	225.8	27.2					
H84	55	14,724.5	1,703.0		1,703.0			225.8	26.1	225.8	26.1					
H85	56	14,724.5	1,637.5		1,637.5			225.8	25.1	225.8	25.1					
H86	57	14,724.5	1,574.5		1,574.5			225.8	24.1	225.8	24.1					
H87	58	14,724.5	1,513.9		1,513.9			225.8	23.2	225.8	23.2					
H88	59	14,724.5	1,455.7		1,455.7			225.8	22.3	225.8	22.3					
H89	60	14,724.5	1,399.7		1,399.7			225.8	21.5	225.8	21.5					
H90	61	14,724.5	1,345.9		1,345.9			225.8	20.6	225.8	20.6					
H91	62	14,724.5	1,294.1		1,294.1			225.8	19.8	225.8	19.8					
H92	63	14,724.5	1,244.4		1,244.4			225.8	19.1	225.8	19.1					
合 計			993,444.1	411,638.8	109.8	411,748.6	15,181.9	17,964.5	16,256.7	8,431.1	31,438.6	26,395.6	15.60	385,353.0		

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間 (21年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5		
		H21	-8	1,042.6	1,426.3		1,426.3	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8		
		H22	-7	3,567.7	4,694.3		4,694.3	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6		
		H23	-6	4,860.2	6,152.2		6,152.2	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1		
		H24	-5	5,931.7	7,216.2		7,216.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7		
		H25	-4	9,285.0	10,859.6		10,859.6	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6		
		H26	-3	10,743.6	12,085.0		12,085.0	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4		
		H27	-2	11,385.7	12,308.9		12,308.9	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6		
		H28	-1	11,971.2	12,444.1		12,444.1	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7		
		H29	0	12,407.5	12,407.5		12,407.5	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4		
	残事業期間	H30	1	12,787.0	12,295.2		12,295.2	646.9	622.0	141.4	136.0	788.3	758.0		
		H31	2	13,309.7	12,301.0		12,301.0	636.1	587.9	268.5	248.2	904.6	836.1		
		H32	3	13,823.6	12,287.6		12,287.6	635.8	565.2	264.0	234.7	899.8	799.9		
		H33	4	14,337.4	12,254.2		12,254.2	479.2	409.5	263.9	225.6	743.1	635.1		
		H34	5	14,724.5	12,099.0		12,099.0	199.0	163.5	198.9	163.4	397.9	326.9		
		H35	6	14,724.5	11,639.9		11,639.9	181.3	143.3	82.6	65.3	263.9	208.6		
		H36	7	14,724.5	11,188.8		11,188.8	179.8	136.7	75.2	57.1	255.0	193.8		
		H37	8	14,724.5	10,755.7		10,755.7	204.7	149.5	74.6	54.5	279.3	204.0		
		H38	9	14,724.5	10,347.5		10,347.5	198.8	139.7	84.9	59.7	283.7	199.4		
		H39	10	14,724.5	9,949.0		9,949.0	162.1	109.5	82.5	55.7	244.6	165.2		
施設完成後の評価期間 (50年)	H40	11	14,724.5	9,567.6		9,567.6	174.0	113.1	67.3	43.7	241.3	156.8			
	H41	12	14,724.5	9,197.1		9,197.1			72.2	45.1	72.2	45.1			
	H42	13	14,724.5	8,843.5		8,843.5			247.3	148.5	247.3	148.5			
	H43	14	14,724.5	8,501.4		8,501.4			247.3	142.8	247.3	142.8			
	H44	15	14,724.5	8,175.7		8,175.7			247.3	137.3	247.3	137.3			
	H45	16	14,724.5	7,861.5		7,861.5			247.3	132.0	247.3	132.0			
	H46	17	14,724.5	7,558.8		7,558.8			247.3	127.0	247.3	127.0			
	H47	18	14,724.5	7,267.8		7,267.8			247.3	122.1	247.3	122.1			
	H48	19	14,724.5	6,988.4		6,988.4			247.3	117.4	247.3	117.4			
	H49	20	14,724.5	6,720.4		6,720.4			247.3	112.9	247.3	112.9			
	H50	21	14,724.5	6,460.9		6,460.9			247.3	108.5	247.3	108.5			
	H51	22	14,724.5	6,212.9		6,212.9			247.3	104.3	247.3	104.3			
	H52	23	14,724.5	5,973.4		5,973.4			247.3	100.3	247.3	100.3			
	H53	24	14,724.5	5,745.0		5,745.0			247.3	96.5	247.3	96.5			
	H54	25	14,724.5	5,523.1		5,523.1			247.3	92.8	247.3	92.8			
	H55	26	14,724.5	5,311.9		5,311.9			247.3	89.2	247.3	89.2			
	H56	27	14,724.5	5,107.4		5,107.4			247.3	85.8	247.3	85.8			
	H57	28	14,724.5	4,909.8		4,909.8			247.3	82.5	247.3	82.5			
	H58	29	14,724.5	4,720.9		4,720.9			247.3	79.3	247.3	79.3			
	H59	30	14,724.5	4,540.4		4,540.4			247.3	76.3	247.3	76.3			
	H60	31	14,724.5	4,365.4		4,365.4			247.3	73.3	247.3	73.3			
	H61	32	14,724.5	4,197.4		4,197.4			247.3	70.5	247.3	70.5			
	H62	33	14,724.5	4,036.3		4,036.3			247.3	67.8	247.3	67.8			
	H63	34	14,724.5	3,881.0		3,881.0			247.3	65.2	247.3	65.2			
	H64	35	14,724.5	3,731.5		3,731.5			247.3	62.7	247.3	62.7			
	H65	36	14,724.5	3,587.8		3,587.8			247.3	60.3	247.3	60.3			
	H66	37	14,724.5	3,450.0		3,450.0			247.3	57.9	247.3	57.9			
	H67	38	14,724.5	3,317.1		3,317.1			247.3	55.7	247.3	55.7			
	H68	39	14,724.5	3,189.9		3,189.9			247.3	53.6	247.3	53.6			
	H69	40	14,724.5	3,067.0		3,067.0			247.3	51.5	247.3	51.5			
H70	41	14,724.5	2,949.0		2,949.0			247.3	49.5	247.3	49.5				
H71	42	14,724.5	2,835.5		2,835.5			247.3	47.6	247.3	47.6				
H72	43	14,724.5	2,726.8		2,726.8			247.3	45.8	247.3	45.8				
H73	44	14,724.5	2,621.4		2,621.4			247.3	44.0	247.3	44.0				
H74	45	14,724.5	2,520.9		2,520.9			247.3	42.3	247.3	42.3				
H75	46	14,724.5	2,423.8		2,423.8			247.3	40.7	247.3	40.7				
H76	47	14,724.5	2,330.6		2,330.6			247.3	39.1	247.3	39.1				
H77	48	14,724.5	2,240.8		2,240.8			247.3	37.6	247.3	37.6				
H78	49	14,724.5	2,154.9		2,154.9			247.3	36.2	247.3	36.2				
H79	50	14,724.5	2,071.8		2,071.8			247.3	34.8	247.3	34.8				
H80	51	14,724.5	1,992.2		1,992.2			247.3	33.5	247.3	33.5				
H81	52	14,724.5	1,915.5		1,915.5			247.3	32.2	247.3	32.2				
H82	53	14,724.5	1,841.9		1,841.9			247.3	30.9	247.3	30.9				
H83	54	14,724.5	1,771.0		1,771.0			247.3	29.7	247.3	29.7				
H84	55	14,724.5	1,703.0		1,703.0			247.3	28.6	247.3	28.6				
H85	56	14,724.5	1,637.5		1,637.5			247.3	27.5	247.3	27.5				
H86	57	14,724.5	1,574.5		1,574.5			247.3	26.4	247.3	26.4				
H87	58	14,724.5	1,513.9		1,513.9			247.3	25.4	247.3	25.4				
H88	59	14,724.5	1,455.7		1,455.7			247.3	24.4	247.3	24.4				
H89	60	14,724.5	1,399.7		1,399.7			247.3	23.5	247.3	23.5				
H90	61	14,724.5	1,345.9		1,345.9			247.3	22.6	247.3	22.6				
合 計			964,749.4	409,749.6	118.7	409,868.3	15,181.9	18,040.6	17,310.3	8,975.0	32,492.2	27,015.6	15.17	382,852.7	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (22年間)	実施済	H20 -9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5		
		H21 -8	1,141.2	1,561.1		1,561.1	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8		
		H22 -7	3,904.9	5,138.0		5,138.0	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6		
		H23 -6	5,319.6	6,733.7		6,733.7	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1		
		H24 -5	6,492.4	7,898.3		7,898.3	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7		
		H25 -4	10,162.6	11,886.1		11,886.1	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6		
	残事業期間	H26 -3	11,759.1	13,227.3		13,227.3	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4		
		H27 -2	12,461.9	13,472.3		13,472.3	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6		
		H28 -1	13,102.7	13,620.3		13,620.3	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7		
		H29 0	13,580.3	13,580.3		13,580.3	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4		
		H30 1	13,995.6	13,457.3		13,457.3	594.0	571.2	141.4	136.0	735.4	707.2		
		H31 2	14,537.5	13,435.8		13,435.8	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H32 3	15,068.3	13,394.0		13,394.0	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4			
	H33 4	15,605.9	13,338.4		13,338.4	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8			
	H34 5	16,120.1	13,245.8		13,245.8	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6			
	H35 6	16,120.1	12,743.2		12,743.2	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	171.9			
	H36 7	16,120.1	12,249.3		12,249.3	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3			
	H37 8	16,120.1	11,775.1		11,775.1	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2			
	H38 9	16,120.1	11,328.3		11,328.3	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8			
	H39 10	16,120.1	10,892.0		10,892.0	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1			
	H40 11	16,120.1	10,474.4		10,474.4	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7			
	H41 12	16,120.1	10,068.8		10,068.8	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6			
	H42 13	16,120.1	9,681.7		9,681.7			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43 14	16,120.1	9,307.2		9,307.2			236.0	136.3	236.0	136.3			
	H44 15	16,120.1	8,950.6		8,950.6			236.0	131.0	236.0	131.0			
	H45 16	16,120.1	8,606.6		8,606.6			236.0	126.0	236.0	126.0			
	H46 17	16,120.1	8,275.2		8,275.2			236.0	121.1	236.0	121.1			
	H47 18	16,120.1	7,956.6		7,956.6			236.0	116.5	236.0	116.5			
	H48 19	16,120.1	7,650.7		7,650.7			236.0	112.0	236.0	112.0			
	H49 20	16,120.1	7,357.4		7,357.4			236.0	107.7	236.0	107.7			
	H50 21	16,120.1	7,073.3		7,073.3			236.0	103.6	236.0	103.6			
H51 22	16,120.1	6,801.7		6,801.7			236.0	99.6	236.0	99.6				
H52 23	16,120.1	6,539.6		6,539.6			236.0	95.7	236.0	95.7				
H53 24	16,120.1	6,289.5		6,289.5			236.0	92.1	236.0	92.1				
H54 25	16,120.1	6,046.5		6,046.5			236.0	88.5	236.0	88.5				
H55 26	16,120.1	5,815.3		5,815.3			236.0	85.1	236.0	85.1				
H56 27	16,120.1	5,591.4		5,591.4			236.0	81.9	236.0	81.9				
H57 28	16,120.1	5,375.2		5,375.2			236.0	78.7	236.0	78.7				
H58 29	16,120.1	5,168.4		5,168.4			236.0	75.7	236.0	75.7				
H59 30	16,120.1	4,970.7		4,970.7			236.0	72.8	236.0	72.8				
H60 31	16,120.1	4,779.2		4,779.2			236.0	70.0	236.0	70.0				
H61 32	16,120.1	4,595.2		4,595.2			236.0	67.3	236.0	67.3				
H62 33	16,120.1	4,418.9		4,418.9			236.0	64.7	236.0	64.7				
H63 34	16,120.1	4,248.8		4,248.8			236.0	62.2	236.0	62.2				
H64 35	16,120.1	4,085.2		4,085.2			236.0	59.8	236.0	59.8				
H65 36	16,120.1	3,927.9		3,927.9			236.0	57.5	236.0	57.5				
H66 37	16,120.1	3,777.0		3,777.0			236.0	55.3	236.0	55.3				
H67 38	16,120.1	3,631.5		3,631.5			236.0	53.2	236.0	53.2				
H68 39	16,120.1	3,492.2		3,492.2			236.0	51.1	236.0	51.1				
H69 40	16,120.1	3,357.7		3,357.7			236.0	49.2	236.0	49.2				
H70 41	16,120.1	3,228.5		3,228.5			236.0	47.3	236.0	47.3				
H71 42	16,120.1	3,104.2		3,104.2			236.0	45.4	236.0	45.4				
H72 43	16,120.1	2,985.2		2,985.2			236.0	43.7	236.0	43.7				
H73 44	16,120.1	2,869.9		2,869.9			236.0	42.0	236.0	42.0				
H74 45	16,120.1	2,759.8		2,759.8			236.0	40.4	236.0	40.4				
H75 46	16,120.1	2,653.5		2,653.5			236.0	38.8	236.0	38.8				
H76 47	16,120.1	2,551.5		2,551.5			236.0	37.4	236.0	37.4				
H77 48	16,120.1	2,453.2		2,453.2			236.0	35.9	236.0	35.9				
H78 49	16,120.1	2,359.2		2,359.2			236.0	34.5	236.0	34.5				
H79 50	16,120.1	2,268.2		2,268.2			236.0	33.2	236.0	33.2				
H80 51	16,120.1	2,181.0		2,181.0			236.0	31.9	236.0	31.9				
H81 52	16,120.1	2,097.1		2,097.1			236.0	30.7	236.0	30.7				
H82 53	16,120.1	2,016.5		2,016.5			236.0	29.5	236.0	29.5				
H83 54	16,120.1	1,938.9		1,938.9			236.0	28.4	236.0	28.4				
H84 55	16,120.1	1,864.5		1,864.5			236.0	27.3	236.0	27.3				
H85 56	16,120.1	1,792.7		1,792.7			236.0	26.2	236.0	26.2				
H86 57	16,120.1	1,723.7		1,723.7			236.0	25.2	236.0	25.2				
H87 58	16,120.1	1,657.4		1,657.4			236.0	24.3	236.0	24.3				
H88 59	16,120.1	1,593.7		1,593.7			236.0	23.3	236.0	23.3				
H89 60	16,120.1	1,532.3		1,532.3			236.0	22.4	236.0	22.4				
H90 61	16,120.1	1,473.5		1,473.5			236.0	21.6	236.0	21.6				
H91 62	16,120.1	1,416.8		1,416.8			236.0	20.7	236.0	20.7				
合 計			1,072,097.8	449,812.3	114.2	449,926.5	15,181.9	18,003.8	16,756.5	8,688.6	31,938.4	26,692.4	16.86	423,234.1

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (22年間)	実施済	H20	-9					936.4	1,363.5	0.0	0.0	936.4	1,363.5			
		H21	-8	944.1	1,291.5		1,291.5	2,267.8	3,277.9	368.7	532.9	2,636.5	3,810.8			
		H22	-7	3,230.5	4,250.7		4,250.7	1,160.9	1,612.4	366.6	509.2	1,527.5	2,121.6			
		H23	-6	4,400.9	5,570.8		5,570.8	962.3	1,260.0	336.1	440.1	1,298.4	1,700.1			
		H24	-5	5,371.1	6,534.2		6,534.2	3,011.7	3,852.4	556.1	711.3	3,567.8	4,563.7			
		H25	-4	8,407.4	9,833.2		9,833.2	1,310.0	1,572.8	606.2	727.8	1,916.2	2,300.6			
		H26	-3	9,728.2	10,942.9		10,942.9	576.7	645.1	304.2	340.3	880.9	985.4			
		H27	-2	10,309.6	11,145.5		11,145.5	525.8	568.4	412.7	446.2	938.5	1,014.6			
		H28	-1	10,839.7	11,267.9		11,267.9	391.9	407.4	403.4	419.3	795.3	826.7			
		H29	0	11,234.8	11,234.8		11,234.8	340.8	340.8	162.6	162.6	503.4	503.4			
		残事業期間	H30	1	11,578.4	11,133.1		11,133.1	594.0	571.2	141.4	136.0	735.4	707.2		
			H31	2	12,024.9	11,113.6		11,113.6	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6		
			H32	3	12,462.2	11,077.5		11,077.5	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4		
	H33		4	12,905.1	11,030.0		11,030.0	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8			
	H34		5	13,328.8	10,952.2		10,952.2	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6			
	H35		6	13,328.8	10,536.6		10,536.6	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	197.9			
	H36		7	13,328.8	10,128.3		10,128.3	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3			
	H37		8	13,328.8	9,736.2		9,736.2	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2			
	H38		9	13,328.8	9,366.7		9,366.7	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8			
	H39		10	13,328.8	9,005.9		9,005.9	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1			
	H40		11	13,328.8	8,660.7		8,660.7	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7			
	H41		12	13,328.8	8,325.3		8,325.3	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6			
	施設完成後の 評価期間 (50年)		H42	13	13,328.8	8,005.3		8,005.3			66.8	40.1	66.8	40.1		
			H43	14	13,328.8	7,695.6		7,695.6			236.0	136.3	236.0	136.3		
			H44	15	13,328.8	7,400.8		7,400.8			236.0	131.0	236.0	131.0		
			H45	16	13,328.8	7,116.3		7,116.3			236.0	126.0	236.0	126.0		
		H46	17	13,328.8	6,842.3		6,842.3			236.0	121.1	236.0	121.1			
		H47	18	13,328.8	6,578.9		6,578.9			236.0	116.5	236.0	116.5			
		H48	19	13,328.8	6,326.0		6,326.0			236.0	112.0	236.0	112.0			
H49		20	13,328.8	6,083.4		6,083.4			236.0	107.7	236.0	107.7				
H50		21	13,328.8	5,848.5		5,848.5			236.0	103.6	236.0	103.6				
H51		22	13,328.8	5,624.0		5,624.0			236.0	99.6	236.0	99.6				
H52		23	13,328.8	5,407.2		5,407.2			236.0	95.7	236.0	95.7				
H53		24	13,328.8	5,200.5		5,200.5			236.0	92.1	236.0	92.1				
H54		25	13,328.8	4,999.5		4,999.5			236.0	88.5	236.0	88.5				
H55		26	13,328.8	4,808.4		4,808.4			236.0	85.1	236.0	85.1				
H56		27	13,328.8	4,623.2		4,623.2			236.0	81.9	236.0	81.9				
H57		28	13,328.8	4,444.4		4,444.4			236.0	78.7	236.0	78.7				
H58		29	13,328.8	4,273.4		4,273.4			236.0	75.7	236.0	75.7				
H59		30	13,328.8	4,110.0		4,110.0			236.0	72.8	236.0	72.8				
H60		31	13,328.8	3,951.6		3,951.6			236.0	70.0	236.0	70.0				
H61		32	13,328.8	3,799.5		3,799.5			236.0	67.3	236.0	67.3				
H62		33	13,328.8	3,653.7		3,653.7			236.0	64.7	236.0	64.7				
H63		34	13,328.8	3,513.1		3,513.1			236.0	62.2	236.0	62.2				
H64		35	13,328.8	3,377.8		3,377.8			236.0	59.8	236.0	59.8				
H65		36	13,328.8	3,247.8		3,247.8			236.0	57.5	236.0	57.5				
H66		37	13,328.8	3,123.0		3,123.0			236.0	55.3	236.0	55.3				
H67		38	13,328.8	3,002.7		3,002.7			236.0	53.2	236.0	53.2				
H68		39	13,328.8	2,887.5		2,887.5			236.0	51.1	236.0	51.1				
H69		40	13,328.8	2,776.3		2,776.3			236.0	49.2	236.0	49.2				
H70		41	13,328.8	2,669.5		2,669.5			236.0	47.3	236.0	47.3				
H71		42	13,328.8	2,566.7		2,566.7			236.0	45.4	236.0	45.4				
H72	43	13,328.8	2,468.3		2,468.3			236.0	43.7	236.0	43.7					
H73	44	13,328.8	2,372.9		2,372.9			236.0	42.0	236.0	42.0					
H74	45	13,328.8	2,281.9		2,281.9			236.0	40.4	236.0	40.4					
H75	46	13,328.8	2,194.0		2,194.0			236.0	38.8	236.0	38.8					
H76	47	13,328.8	2,109.7		2,109.7			236.0	37.4	236.0	37.4					
H77	48	13,328.8	2,028.4		2,028.4			236.0	35.9	236.0	35.9					
H78	49	13,328.8	1,950.7		1,950.7			236.0	34.5	236.0	34.5					
H79	50	13,328.8	1,875.4		1,875.4			236.0	33.2	236.0	33.2					
H80	51	13,328.8	1,803.4		1,803.4			236.0	31.9	236.0	31.9					
H81	52	13,328.8	1,733.9		1,733.9			236.0	30.7	236.0	30.7					
H82	53	13,328.8	1,667.4		1,667.4			236.0	29.5	236.0	29.5					
H83	54	13,328.8	1,603.2		1,603.2			236.0	28.4	236.0	28.4					
H84	55	13,328.8	1,541.6		1,541.6			236.0	27.3	236.0	27.3					
H85	56	13,328.8	1,482.3		1,482.3			236.0	26.2	236.0	26.2					
H86	57	13,328.8	1,425.2		1,425.2			236.0	25.2	236.0	25.2					
H87	58	13,328.8	1,370.4		1,370.4			236.0	24.3	236.0	24.3					
H88	59	13,328.8	1,317.7		1,317.7			236.0	23.3	236.0	23.3					
H89	60	13,328.8	1,267.0		1,267.0			236.0	22.4	236.0	22.4					
H90	61	13,328.8	1,218.4		1,218.4			236.0	21.6	236.0	21.6					
H91	62	13,328.8	1,171.5		1,171.5			236.0	20.7	236.0	20.7					
合 計			886,507.3	371,977.8	114.2	372,092.0	15,181.9	18,003.8	16,756.5	8,688.6	31,938.4	26,692.4	13.94	345,399.6		

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (12年間)	残事業期間	H30	1				594.0	571.2	0.0	0.0	594.0	571.2			
		H31	2	494.2	456.7	456.7	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6			
		H32	3	978.3	869.6	869.6	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4			
		H33	4	1,468.5	1,255.1	1,255.1	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8			
		H34	5	1,937.5	1,592.0	1,592.0	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6			
		H35	6	1,937.5	1,531.6	1,531.6	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	197.9			
		H36	7	1,937.5	1,472.3	1,472.3	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3			
		H37	8	1,937.5	1,415.3	1,415.3	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2			
		H38	9	1,937.5	1,361.6	1,361.6	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8			
		H39	10	1,937.5	1,309.1	1,309.1	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1			
		H40	11	1,937.5	1,258.9	1,258.9	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7			
		H41	12	1,937.5	1,210.2	1,210.2	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	1,937.5	1,163.7	1,163.7			66.8	40.1	66.8	40.1				
	H43	14	1,937.5	1,118.6	1,118.6			127.9	73.8	127.9	73.8				
	H44	15	1,937.5	1,075.8	1,075.8			127.9	71.0	127.9	71.0				
	H45	16	1,937.5	1,034.4	1,034.4			127.9	68.3	127.9	68.3				
	H46	17	1,937.5	994.6	994.6			127.9	65.7	127.9	65.7				
	H47	18	1,937.5	956.3	956.3			127.9	63.1	127.9	63.1				
	H48	19	1,937.5	919.6	919.6			127.9	60.7	127.9	60.7				
	H49	20	1,937.5	884.3	884.3			127.9	58.4	127.9	58.4				
	H50	21	1,937.5	850.2	850.2			127.9	56.1	127.9	56.1				
	H51	22	1,937.5	817.5	817.5			127.9	54.0	127.9	54.0				
	H52	23	1,937.5	786.0	786.0			127.9	51.9	127.9	51.9				
	H53	24	1,937.5	756.0	756.0			127.9	49.9	127.9	49.9				
	H54	25	1,937.5	726.7	726.7			127.9	48.0	127.9	48.0				
	H55	26	1,937.5	699.0	699.0			127.9	46.1	127.9	46.1				
	H56	27	1,937.5	672.0	672.0			127.9	44.4	127.9	44.4				
	H57	28	1,937.5	646.0	646.0			127.9	42.6	127.9	42.6				
	H58	29	1,937.5	621.2	621.2			127.9	41.0	127.9	41.0				
	H59	30	1,937.5	597.4	597.4			127.9	39.4	127.9	39.4				
	H60	31	1,937.5	574.4	574.4			127.9	37.9	127.9	37.9				
	H61	32	1,937.5	552.3	552.3			127.9	36.5	127.9	36.5				
	H62	33	1,937.5	531.1	531.1			127.9	35.1	127.9	35.1				
	H63	34	1,937.5	510.7	510.7			127.9	33.7	127.9	33.7				
	H64	35	1,937.5	491.0	491.0			127.9	32.4	127.9	32.4				
	H65	36	1,937.5	472.1	472.1			127.9	31.2	127.9	31.2				
	H66	37	1,937.5	454.0	454.0			127.9	30.0	127.9	30.0				
	H67	38	1,937.5	436.5	436.5			127.9	28.8	127.9	28.8				
	H68	39	1,937.5	419.7	419.7			127.9	27.7	127.9	27.7				
	H69	40	1,937.5	403.6	403.6			127.9	26.6	127.9	26.6				
	H70	41	1,937.5	388.0	388.0			127.9	25.6	127.9	25.6				
	H71	42	1,937.5	373.1	373.1			127.9	24.6	127.9	24.6				
	H72	43	1,937.5	358.8	358.8			127.9	23.7	127.9	23.7				
	H73	44	1,937.5	344.9	344.9			127.9	22.8	127.9	22.8				
	H74	45	1,937.5	331.7	331.7			127.9	21.9	127.9	21.9				
	H75	46	1,937.5	318.9	318.9			127.9	21.1	127.9	21.1				
	H76	47	1,937.5	306.7	306.7			127.9	20.2	127.9	20.2				
	H77	48	1,937.5	294.9	294.9			127.9	19.5	127.9	19.5				
H78	49	1,937.5	283.6	283.6			127.9	18.7	127.9	18.7					
H79	50	1,937.5	272.6	272.6			127.9	18.0	127.9	18.0					
H80	51	1,937.5	262.1	262.1			127.9	17.3	127.9	17.3					
H81	52	1,937.5	252.0	252.0			127.9	16.6	127.9	16.6					
H82	53	1,937.5	242.4	242.4			127.9	16.0	127.9	16.0					
H83	54	1,937.5	233.0	233.0			127.9	15.4	127.9	15.4					
H84	55	1,937.5	224.1	224.1			127.9	14.8	127.9	14.8					
H85	56	1,937.5	215.5	215.5			127.9	14.2	127.9	14.2					
H86	57	1,937.5	207.2	207.2			127.9	13.7	127.9	13.7					
H87	58	1,937.5	199.2	199.2			127.9	13.2	127.9	13.2					
H88	59	1,937.5	191.5	191.5			127.9	12.6	127.9	12.6					
H89	60	1,937.5	184.2	184.2			127.9	12.2	127.9	12.2					
H90	61	1,937.5	177.1	177.1			127.9	11.7	127.9	11.7					
H91	62	1,937.5	170.3	170.3			127.9	11.2	127.9	11.2					
合 計			115,316.0	39,728.9	92.0	39,820.9	3,697.6	3,103.1	7,801.6	2,877.5	11,499.2	5,980.6	6.66	33,840.3	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (1-2年間)	残事業期間	H30	1				653.4	628.3	0.0	0.0	653.4	628.3			
		H31	2	494.2	456.7		456.7	640.1	591.6	246.5	227.8	886.6	819.4		
		H32	3	978.3	869.6		869.6	648.1	576.1	241.5	214.7	889.6	790.8		
		H33	4	1,468.5	1,255.1		1,255.1	620.1	530.0	244.5	209.0	864.6	739.0		
		H34	5	1,937.5	1,592.0		1,592.0	209.3	172.0	233.9	192.2	443.2	364.2		
		H35	6	1,937.5	1,531.6		1,531.6	188.4	148.9	79.0	62.5	267.4	211.4		
		H36	7	1,937.5	1,472.3		1,472.3	177.1	134.6	71.1	54.0	248.2	188.6		
		H37	8	1,937.5	1,415.3		1,415.3	184.4	134.7	66.8	48.8	251.2	183.5		
		H38	9	1,937.5	1,361.6		1,361.6	217.4	152.8	69.6	48.9	287.0	201.7		
		H39	10	1,937.5	1,309.1		1,309.1	194.8	131.6	82.0	55.4	276.8	187.0		
		H40	11	1,937.5	1,258.9		1,258.9	157.2	102.1	73.5	47.8	230.7	149.9		
		H41	12	1,937.5	1,210.2		1,210.2	177.1	110.6	59.3	37.0	236.4	147.6		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	1,937.5	1,163.7		1,163.7			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43	14	1,937.5	1,118.6		1,118.6			127.9	73.8	127.9	73.8			
	H44	15	1,937.5	1,075.8		1,075.8			127.9	71.0	127.9	71.0			
	H45	16	1,937.5	1,034.4		1,034.4			127.9	68.3	127.9	68.3			
	H46	17	1,937.5	994.6		994.6			127.9	65.7	127.9	65.7			
	H47	18	1,937.5	956.3		956.3			127.9	63.1	127.9	63.1			
	H48	19	1,937.5	919.6		919.6			127.9	60.7	127.9	60.7			
	H49	20	1,937.5	884.3		884.3			127.9	58.4	127.9	58.4			
	H50	21	1,937.5	850.2		850.2			127.9	56.1	127.9	56.1			
	H51	22	1,937.5	817.5		817.5			127.9	54.0	127.9	54.0			
	H52	23	1,937.5	786.0		786.0			127.9	51.9	127.9	51.9			
	H53	24	1,937.5	756.0		756.0			127.9	49.9	127.9	49.9			
	H54	25	1,937.5	726.7		726.7			127.9	48.0	127.9	48.0			
	H55	26	1,937.5	699.0		699.0			127.9	46.1	127.9	46.1			
	H56	27	1,937.5	672.0		672.0			127.9	44.4	127.9	44.4			
	H57	28	1,937.5	646.0		646.0			127.9	42.6	127.9	42.6			
	H58	29	1,937.5	621.2		621.2			127.9	41.0	127.9	41.0			
	H59	30	1,937.5	597.4		597.4			127.9	39.4	127.9	39.4			
	H60	31	1,937.5	574.4		574.4			127.9	37.9	127.9	37.9			
	H61	32	1,937.5	552.3		552.3			127.9	36.5	127.9	36.5			
	H62	33	1,937.5	531.1		531.1			127.9	35.1	127.9	35.1			
	H63	34	1,937.5	510.7		510.7			127.9	33.7	127.9	33.7			
	H64	35	1,937.5	491.0		491.0			127.9	32.4	127.9	32.4			
	H65	36	1,937.5	472.1		472.1			127.9	31.2	127.9	31.2			
	H66	37	1,937.5	454.0		454.0			127.9	30.0	127.9	30.0			
	H67	38	1,937.5	436.5		436.5			127.9	28.8	127.9	28.8			
	H68	39	1,937.5	419.7		419.7			127.9	27.7	127.9	27.7			
	H69	40	1,937.5	403.6		403.6			127.9	26.6	127.9	26.6			
	H70	41	1,937.5	388.0		388.0			127.9	25.6	127.9	25.6			
	H71	42	1,937.5	373.1		373.1			127.9	24.6	127.9	24.6			
	H72	43	1,937.5	358.8		358.8			127.9	23.7	127.9	23.7			
	H73	44	1,937.5	344.9		344.9			127.9	22.8	127.9	22.8			
	H74	45	1,937.5	331.7		331.7			127.9	21.9	127.9	21.9			
	H75	46	1,937.5	318.9		318.9			127.9	21.1	127.9	21.1			
	H76	47	1,937.5	306.7		306.7			127.9	20.2	127.9	20.2			
	H77	48	1,937.5	294.9		294.9			127.9	19.5	127.9	19.5			
H78	49	1,937.5	283.6		283.6			127.9	18.7	127.9	18.7				
H79	50	1,937.5	272.6		272.6			127.9	18.0	127.9	18.0				
H80	51	1,937.5	262.1		262.1			127.9	17.3	127.9	17.3				
H81	52	1,937.5	252.0		252.0			127.9	16.6	127.9	16.6				
H82	53	1,937.5	242.4		242.4			127.9	16.0	127.9	16.0				
H83	54	1,937.5	233.0		233.0			127.9	15.4	127.9	15.4				
H84	55	1,937.5	224.1		224.1			127.9	14.8	127.9	14.8				
H85	56	1,937.5	215.5		215.5			127.9	14.2	127.9	14.2				
H86	57	1,937.5	207.2		207.2			127.9	13.7	127.9	13.7				
H87	58	1,937.5	199.2		199.2			127.9	13.2	127.9	13.2				
H88	59	1,937.5	191.5		191.5			127.9	12.6	127.9	12.6				
H89	60	1,937.5	184.2		184.2			127.9	12.2	127.9	12.2				
H90	61	1,937.5	177.1		177.1			127.9	11.7	127.9	11.7				
H91	62	1,937.5	170.3		170.3			127.9	11.2	127.9	11.2				
合 計			115,316.0	39,728.9	101.2	39,830.1	4,067.4	3,413.3	7,801.6	2,877.5	11,869.0	6,290.8	6.33	33,539.3	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (12年間)	残事業期間	H30	1				534.6	514.0	0.0	0.0	534.6	514.0			
		H31	2	494.2	456.7	456.7	523.7	484.0	246.5	227.8	770.2	711.8			
		H32	3	978.3	869.6	869.6	530.3	471.4	241.5	214.7	771.8	686.1			
		H33	4	1,468.5	1,255.1	1,255.1	507.3	433.6	244.5	209.0	751.8	642.6			
		H34	5	1,937.5	1,592.0	1,592.0	171.3	140.8	233.9	192.2	405.2	333.0			
		H35	6	1,937.5	1,531.6	1,531.6	154.2	121.9	79.0	62.5	233.2	184.4			
		H36	7	1,937.5	1,472.3	1,472.3	144.9	110.1	71.1	54.0	216.0	164.1			
		H37	8	1,937.5	1,415.3	1,415.3	150.8	110.2	66.8	48.8	217.6	159.0			
		H38	9	1,937.5	1,361.6	1,361.6	177.8	124.9	69.6	48.9	247.4	173.8			
		H39	10	1,937.5	1,309.1	1,309.1	159.4	107.7	82.0	55.4	241.4	163.1			
		H40	11	1,937.5	1,258.9	1,258.9	128.6	83.6	73.5	47.8	202.1	131.4			
		H41	12	1,937.5	1,210.2	1,210.2	144.9	90.5	59.3	37.0	204.2	127.5			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	1,937.5	1,163.7	1,163.7			66.8	40.1	66.8	40.1				
	H43	14	1,937.5	1,118.6	1,118.6			127.9	73.8	127.9	73.8				
	H44	15	1,937.5	1,075.8	1,075.8			127.9	71.0	127.9	71.0				
	H45	16	1,937.5	1,034.4	1,034.4			127.9	68.3	127.9	68.3				
	H46	17	1,937.5	994.6	994.6			127.9	65.7	127.9	65.7				
	H47	18	1,937.5	956.3	956.3			127.9	63.1	127.9	63.1				
	H48	19	1,937.5	919.6	919.6			127.9	60.7	127.9	60.7				
	H49	20	1,937.5	884.3	884.3			127.9	58.4	127.9	58.4				
	H50	21	1,937.5	850.2	850.2			127.9	56.1	127.9	56.1				
	H51	22	1,937.5	817.5	817.5			127.9	54.0	127.9	54.0				
	H52	23	1,937.5	786.0	786.0			127.9	51.9	127.9	51.9				
	H53	24	1,937.5	756.0	756.0			127.9	49.9	127.9	49.9				
	H54	25	1,937.5	726.7	726.7			127.9	48.0	127.9	48.0				
	H55	26	1,937.5	699.0	699.0			127.9	46.1	127.9	46.1				
	H56	27	1,937.5	672.0	672.0			127.9	44.4	127.9	44.4				
	H57	28	1,937.5	646.0	646.0			127.9	42.6	127.9	42.6				
	H58	29	1,937.5	621.2	621.2			127.9	41.0	127.9	41.0				
	H59	30	1,937.5	597.4	597.4			127.9	39.4	127.9	39.4				
	H60	31	1,937.5	574.4	574.4			127.9	37.9	127.9	37.9				
	H61	32	1,937.5	552.3	552.3			127.9	36.5	127.9	36.5				
	H62	33	1,937.5	531.1	531.1			127.9	35.1	127.9	35.1				
	H63	34	1,937.5	510.7	510.7			127.9	33.7	127.9	33.7				
	H64	35	1,937.5	491.0	491.0			127.9	32.4	127.9	32.4				
	H65	36	1,937.5	472.1	472.1			127.9	31.2	127.9	31.2				
	H66	37	1,937.5	454.0	454.0			127.9	30.0	127.9	30.0				
	H67	38	1,937.5	436.5	436.5			127.9	28.8	127.9	28.8				
	H68	39	1,937.5	419.7	419.7			127.9	27.7	127.9	27.7				
	H69	40	1,937.5	403.6	403.6			127.9	26.6	127.9	26.6				
	H70	41	1,937.5	388.0	388.0			127.9	25.6	127.9	25.6				
	H71	42	1,937.5	373.1	373.1			127.9	24.6	127.9	24.6				
	H72	43	1,937.5	358.8	358.8			127.9	23.7	127.9	23.7				
	H73	44	1,937.5	344.9	344.9			127.9	22.8	127.9	22.8				
	H74	45	1,937.5	331.7	331.7			127.9	21.9	127.9	21.9				
	H75	46	1,937.5	318.9	318.9			127.9	21.1	127.9	21.1				
	H76	47	1,937.5	306.7	306.7			127.9	20.2	127.9	20.2				
	H77	48	1,937.5	294.9	294.9			127.9	19.5	127.9	19.5				
H78	49	1,937.5	283.6	283.6			127.9	18.7	127.9	18.7					
H79	50	1,937.5	272.6	272.6			127.9	18.0	127.9	18.0					
H80	51	1,937.5	262.1	262.1			127.9	17.3	127.9	17.3					
H81	52	1,937.5	252.0	252.0			127.9	16.6	127.9	16.6					
H82	53	1,937.5	242.4	242.4			127.9	16.0	127.9	16.0					
H83	54	1,937.5	233.0	233.0			127.9	15.4	127.9	15.4					
H84	55	1,937.5	224.1	224.1			127.9	14.8	127.9	14.8					
H85	56	1,937.5	215.5	215.5			127.9	14.2	127.9	14.2					
H86	57	1,937.5	207.2	207.2			127.9	13.7	127.9	13.7					
H87	58	1,937.5	199.2	199.2			127.9	13.2	127.9	13.2					
H88	59	1,937.5	191.5	191.5			127.9	12.6	127.9	12.6					
H89	60	1,937.5	184.2	184.2			127.9	12.2	127.9	12.2					
H90	61	1,937.5	177.1	177.1			127.9	11.7	127.9	11.7					
H91	62	1,937.5	170.3	170.3			127.9	11.2	127.9	11.2					
合 計			115,316.0	39,728.9	82.8	39,811.7	3,327.8	2,792.7	7,801.6	2,877.5	11,129.4	5,670.2	7.02	34,141.5	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
実施済	H20	-9														
	H21	-8														
	H22	-7														
	H23	-6														
	H24	-5														
	H25	-4														
	H26	-3														
	H27	-2														
	H28	-1														
	H29	0														
整備期間 (13年間)	残事業期間	H30	1				548.3	527.2	0.0	0.0	548.3	527.2				
		H31	2	434.3	401.4		401.4	538.1	497.3	227.5	210.3	765.6	707.6			
		H32	3	860.6	765.0		765.0	542.8	482.5	223.3	198.5	766.1	681.0			
		H33	4	1,290.6	1,103.1		1,103.1	526.2	449.7	225.3	192.6	751.5	642.3			
		H34	5	1,707.4	1,403.0		1,403.0	290.5	238.7	218.4	179.5	508.9	418.2			
		H35	6	1,937.5	1,531.6		1,531.6	165.4	130.8	120.6	95.3	286.0	226.1			
		H36	7	1,937.5	1,472.3		1,472.3	153.4	116.6	68.6	52.1	222.0	168.7			
		H37	8	1,937.5	1,415.3		1,415.3	151.2	110.4	63.7	46.5	214.9	156.9			
		H38	9	1,937.5	1,361.6		1,361.6	163.9	115.2	62.7	44.1	226.6	159.3			
		H39	10	1,937.5	1,309.1		1,309.1	177.7	120.1	68.0	45.9	245.7	166.0			
		H40	11	1,937.5	1,258.9		1,258.9	158.2	102.8	73.7	47.9	231.9	150.7			
		H41	12	1,937.5	1,210.2		1,210.2	133.3	83.3	65.7	41.0	199.0	124.3			
		H42	13	1,937.5	1,163.7		1,163.7	148.6	89.2	55.3	33.2	203.9	122.4			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H43	14	1,937.5	1,118.6		1,118.6			61.7	35.6	61.7	35.6				
	H44	15	1,937.5	1,075.8		1,075.8			118.0	65.5	118.0	65.5				
	H45	16	1,937.5	1,034.4		1,034.4			118.0	63.0	118.0	63.0				
	H46	17	1,937.5	994.6		994.6			118.0	60.6	118.0	60.6				
	H47	18	1,937.5	956.3		956.3			118.0	58.2	118.0	58.2				
	H48	19	1,937.5	919.6		919.6			118.0	56.0	118.0	56.0				
	H49	20	1,937.5	884.3		884.3			118.0	53.9	118.0	53.9				
	H50	21	1,937.5	850.2		850.2			118.0	51.8	118.0	51.8				
	H51	22	1,937.5	817.5		817.5			118.0	49.8	118.0	49.8				
	H52	23	1,937.5	786.0		786.0			118.0	47.9	118.0	47.9				
	H53	24	1,937.5	756.0		756.0			118.0	46.0	118.0	46.0				
	H54	25	1,937.5	726.7		726.7			118.0	44.3	118.0	44.3				
	H55	26	1,937.5	699.0		699.0			118.0	42.6	118.0	42.6				
	H56	27	1,937.5	672.0		672.0			118.0	40.9	118.0	40.9				
	H57	28	1,937.5	646.0		646.0			118.0	39.3	118.0	39.3				
	H58	29	1,937.5	621.2		621.2			118.0	37.8	118.0	37.8				
	H59	30	1,937.5	597.4		597.4			118.0	36.4	118.0	36.4				
	H60	31	1,937.5	574.4		574.4			118.0	35.0	118.0	35.0				
	H61	32	1,937.5	552.3		552.3			118.0	33.6	118.0	33.6				
	H62	33	1,937.5	531.1		531.1			118.0	32.3	118.0	32.3				
	H63	34	1,937.5	510.7		510.7			118.0	31.1	118.0	31.1				
	H64	35	1,937.5	491.0		491.0			118.0	29.9	118.0	29.9				
	H65	36	1,937.5	472.1		472.1			118.0	28.8	118.0	28.8				
	H66	37	1,937.5	454.0		454.0			118.0	27.6	118.0	27.6				
	H67	38	1,937.5	436.5		436.5			118.0	26.6	118.0	26.6				
	H68	39	1,937.5	419.7		419.7			118.0	25.6	118.0	25.6				
	H69	40	1,937.5	403.6		403.6			118.0	24.6	118.0	24.6				
	H70	41	1,937.5	388.0		388.0			118.0	23.6	118.0	23.6				
	H71	42	1,937.5	373.1		373.1			118.0	22.7	118.0	22.7				
	H72	43	1,937.5	358.8		358.8			118.0	21.9	118.0	21.9				
	H73	44	1,937.5	344.9		344.9			118.0	21.0	118.0	21.0				
	H74	45	1,937.5	331.7		331.7			118.0	20.2	118.0	20.2				
	H75	46	1,937.5	318.9		318.9			118.0	19.4	118.0	19.4				
	H76	47	1,937.5	306.7		306.7			118.0	18.7	118.0	18.7				
H77	48	1,937.5	294.9		294.9			118.0	18.0	118.0	18.0					
H78	49	1,937.5	283.6		283.6			118.0	17.3	118.0	17.3					
H79	50	1,937.5	272.6		272.6			118.0	16.6	118.0	16.6					
H80	51	1,937.5	262.1		262.1			118.0	16.0	118.0	16.0					
H81	52	1,937.5	252.0		252.0			118.0	15.4	118.0	15.4					
H82	53	1,937.5	242.4		242.4			118.0	14.8	118.0	14.8					
H83	54	1,937.5	233.0		233.0			118.0	14.2	118.0	14.2					
H84	55	1,937.5	224.1		224.1			118.0	13.6	118.0	13.6					
H85	56	1,937.5	215.5		215.5			118.0	13.1	118.0	13.1					
H86	57	1,937.5	207.2		207.2			118.0	12.6	118.0	12.6					
H87	58	1,937.5	199.2		199.2			118.0	12.1	118.0	12.1					
H88	59	1,937.5	191.5		191.5			118.0	11.7	118.0	11.7					
H89	60	1,937.5	184.2		184.2			118.0	11.2	118.0	11.2					
H90	61	1,937.5	177.1		177.1			118.0	10.8	118.0	10.8					
H91	62	1,937.5	170.3		170.3			118.0	10.4	118.0	10.4					
H92	63	1,937.5	163.7		163.7			118.0	10.0	118.0	10.0					
合 計			116,667.9	39,391.7	88.5	39,480.2	3,697.6	3,063.8	7,316.5	2,676.9	11,014.1	5,740.7	6.88	33,739.5		

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (1年間)	残事業期間	H30	1				646.9	622.0	0.0	0.0	646.9	622.0			
		H31	2	522.7	483.1		483.1	636.1	587.9	268.5	248.2	904.6	836.1		
		H32	3	1,036.6	921.4		921.4	635.8	565.2	264.0	234.7	899.8	799.9		
		H33	4	1,550.3	1,325.0		1,325.0	479.2	409.6	263.9	225.6	743.1	635.2		
		H34	5	1,937.5	1,592.0		1,592.0	199.0	163.5	198.9	163.4	397.9	326.9		
		H35	6	1,937.5	1,531.6		1,531.6	181.2	143.2	82.6	65.3	263.8	208.5		
		H36	7	1,937.5	1,472.3		1,472.3	179.9	136.7	75.2	57.1	255.1	193.8		
		H37	8	1,937.5	1,415.3		1,415.3	204.6	149.5	74.7	54.6	279.3	204.1		
		H38	9	1,937.5	1,361.6		1,361.6	198.8	139.7	84.9	59.7	283.7	199.4		
		H39	10	1,937.5	1,309.1		1,309.1	162.1	109.5	82.5	55.7	244.6	165.2		
		H40	11	1,937.5	1,258.9		1,258.9	174.0	113.1	67.3	43.7	241.3	156.8		
施設完成後の 評価期間(50年)	H41	12	1,937.5	1,210.2		1,210.2			72.2	45.1	72.2	45.1			
	H42	13	1,937.5	1,163.7		1,163.7			139.5	83.8	139.5	83.8			
	H43	14	1,937.5	1,118.6		1,118.6			139.5	80.5	139.5	80.5			
	H44	15	1,937.5	1,075.8		1,075.8			139.5	77.5	139.5	77.5			
	H45	16	1,937.5	1,034.4		1,034.4			139.5	74.5	139.5	74.5			
	H46	17	1,937.5	994.6		994.6			139.5	71.6	139.5	71.6			
	H47	18	1,937.5	956.3		956.3			139.5	68.9	139.5	68.9			
	H48	19	1,937.5	919.6		919.6			139.5	66.2	139.5	66.2			
	H49	20	1,937.5	884.3		884.3			139.5	63.7	139.5	63.7			
	H50	21	1,937.5	850.2		850.2			139.5	61.2	139.5	61.2			
	H51	22	1,937.5	817.5		817.5			139.5	58.9	139.5	58.9			
	H52	23	1,937.5	786.0		786.0			139.5	56.6	139.5	56.6			
	H53	24	1,937.5	756.0		756.0			139.5	54.4	139.5	54.4			
	H54	25	1,937.5	726.7		726.7			139.5	52.3	139.5	52.3			
	H55	26	1,937.5	699.0		699.0			139.5	50.3	139.5	50.3			
	H56	27	1,937.5	672.0		672.0			139.5	48.4	139.5	48.4			
	H57	28	1,937.5	646.0		646.0			139.5	46.5	139.5	46.5			
	H58	29	1,937.5	621.2		621.2			139.5	44.7	139.5	44.7			
	H59	30	1,937.5	597.4		597.4			139.5	43.0	139.5	43.0			
	H60	31	1,937.5	574.4		574.4			139.5	41.4	139.5	41.4			
	H61	32	1,937.5	552.3		552.3			139.5	39.8	139.5	39.8			
	H62	33	1,937.5	531.1		531.1			139.5	38.2	139.5	38.2			
	H63	34	1,937.5	510.7		510.7			139.5	36.8	139.5	36.8			
	H64	35	1,937.5	491.0		491.0			139.5	35.4	139.5	35.4			
	H65	36	1,937.5	472.1		472.1			139.5	34.0	139.5	34.0			
	H66	37	1,937.5	454.0		454.0			139.5	32.7	139.5	32.7			
	H67	38	1,937.5	436.5		436.5			139.5	31.4	139.5	31.4			
	H68	39	1,937.5	419.7		419.7			139.5	30.2	139.5	30.2			
	H69	40	1,937.5	403.6		403.6			139.5	29.1	139.5	29.1			
	H70	41	1,937.5	388.0		388.0			139.5	27.9	139.5	27.9			
	H71	42	1,937.5	373.1		373.1			139.5	26.9	139.5	26.9			
	H72	43	1,937.5	358.8		358.8			139.5	25.8	139.5	25.8			
	H73	44	1,937.5	344.9		344.9			139.5	24.8	139.5	24.8			
	H74	45	1,937.5	331.7		331.7			139.5	23.9	139.5	23.9			
	H75	46	1,937.5	318.9		318.9			139.5	23.0	139.5	23.0			
	H76	47	1,937.5	306.7		306.7			139.5	22.1	139.5	22.1			
	H77	48	1,937.5	294.9		294.9			139.5	21.2	139.5	21.2			
	H78	49	1,937.5	283.6		283.6			139.5	20.4	139.5	20.4			
	H79	50	1,937.5	272.6		272.6			139.5	19.6	139.5	19.6			
	H80	51	1,937.5	262.1		262.1			139.5	18.9	139.5	18.9			
H81	52	1,937.5	252.0		252.0			139.5	18.1	139.5	18.1				
H82	53	1,937.5	242.4		242.4			139.5	17.5	139.5	17.5				
H83	54	1,937.5	233.0		233.0			139.5	16.8	139.5	16.8				
H84	55	1,937.5	224.1		224.1			139.5	16.1	139.5	16.1				
H85	56	1,937.5	215.5		215.5			139.5	15.5	139.5	15.5				
H86	57	1,937.5	207.2		207.2			139.5	14.9	139.5	14.9				
H87	58	1,937.5	199.2		199.2			139.5	14.3	139.5	14.3				
H88	59	1,937.5	191.5		191.5			139.5	13.8	139.5	13.8				
H89	60	1,937.5	184.2		184.2			139.5	13.3	139.5	13.3				
H90	61	1,937.5	177.1		177.1			139.5	12.8	139.5	12.8				
合計			113,547.1	39,706.7	95.7	39,802.4	3,697.6	3,139.9	8,370.2	3,112.7	12,067.8	6,252.6	6.37	33,549.8	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (12年間)	残事業期間	H30	1				594.0	571.2	0.0	0.0	594.0	571.2			
		H31	2	541.9	500.8		500.8	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6		
		H32	3	1,072.7	953.5		953.5	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4		
		H33	4	1,610.3	1,376.3		1,376.3	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8		
		H34	5	2,124.5	1,745.7		1,745.7	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6		
		H35	6	2,124.5	1,679.4		1,679.4	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	197.9		
		H36	7	2,124.5	1,614.4		1,614.4	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3		
		H37	8	2,124.5	1,551.9		1,551.9	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2		
		H38	9	2,124.5	1,493.0		1,493.0	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8		
		H39	10	2,124.5	1,435.5		1,435.5	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1		
		H40	11	2,124.5	1,380.4		1,380.4	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7		
		H41	12	2,124.5	1,327.0		1,327.0	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	2,124.5	1,276.0		1,276.0			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43	14	2,124.5	1,226.6		1,226.6			127.9	73.8	127.9	73.8			
	H44	15	2,124.5	1,179.6		1,179.6			127.9	71.0	127.9	71.0			
	H45	16	2,124.5	1,134.3		1,134.3			127.9	68.3	127.9	68.3			
	H46	17	2,124.5	1,090.6		1,090.6			127.9	65.7	127.9	65.7			
	H47	18	2,124.5	1,048.6		1,048.6			127.9	63.1	127.9	63.1			
	H48	19	2,124.5	1,008.3		1,008.3			127.9	60.7	127.9	60.7			
	H49	20	2,124.5	969.6		969.6			127.9	58.4	127.9	58.4			
	H50	21	2,124.5	932.2		932.2			127.9	56.1	127.9	56.1			
	H51	22	2,124.5	896.4		896.4			127.9	54.0	127.9	54.0			
	H52	23	2,124.5	861.9		861.9			127.9	51.9	127.9	51.9			
	H53	24	2,124.5	828.9		828.9			127.9	49.9	127.9	49.9			
	H54	25	2,124.5	796.9		796.9			127.9	48.0	127.9	48.0			
	H55	26	2,124.5	766.4		766.4			127.9	46.1	127.9	46.1			
	H56	27	2,124.5	736.9		736.9			127.9	44.4	127.9	44.4			
	H57	28	2,124.5	708.4		708.4			127.9	42.6	127.9	42.6			
	H58	29	2,124.5	681.1		681.1			127.9	41.0	127.9	41.0			
	H59	30	2,124.5	655.1		655.1			127.9	39.4	127.9	39.4			
	H60	31	2,124.5	629.9		629.9			127.9	37.9	127.9	37.9			
	H61	32	2,124.5	605.6		605.6			127.9	36.5	127.9	36.5			
	H62	33	2,124.5	582.4		582.4			127.9	35.1	127.9	35.1			
	H63	34	2,124.5	560.0		560.0			127.9	33.7	127.9	33.7			
	H64	35	2,124.5	538.4		538.4			127.9	32.4	127.9	32.4			
	H65	36	2,124.5	517.7		517.7			127.9	31.2	127.9	31.2			
	H66	37	2,124.5	497.8		497.8			127.9	30.0	127.9	30.0			
	H67	38	2,124.5	478.6		478.6			127.9	28.8	127.9	28.8			
	H68	39	2,124.5	460.2		460.2			127.9	27.7	127.9	27.7			
	H69	40	2,124.5	442.5		442.5			127.9	26.6	127.9	26.6			
	H70	41	2,124.5	425.5		425.5			127.9	25.6	127.9	25.6			
	H71	42	2,124.5	409.1		409.1			127.9	24.6	127.9	24.6			
	H72	43	2,124.5	393.4		393.4			127.9	23.7	127.9	23.7			
	H73	44	2,124.5	378.2		378.2			127.9	22.8	127.9	22.8			
	H74	45	2,124.5	363.7		363.7			127.9	21.9	127.9	21.9			
	H75	46	2,124.5	349.7		349.7			127.9	21.1	127.9	21.1			
	H76	47	2,124.5	336.3		336.3			127.9	20.2	127.9	20.2			
	H77	48	2,124.5	323.3		323.3			127.9	19.5	127.9	19.5			
H78	49	2,124.5	310.9		310.9			127.9	18.7	127.9	18.7				
H79	50	2,124.5	298.9		298.9			127.9	18.0	127.9	18.0				
H80	51	2,124.5	287.4		287.4			127.9	17.3	127.9	17.3				
H81	52	2,124.5	276.4		276.4			127.9	16.6	127.9	16.6				
H82	53	2,124.5	265.8		265.8			127.9	16.0	127.9	16.0				
H83	54	2,124.5	255.5		255.5			127.9	15.4	127.9	15.4				
H84	55	2,124.5	245.7		245.7			127.9	14.8	127.9	14.8				
H85	56	2,124.5	236.3		236.3			127.9	14.2	127.9	14.2				
H86	57	2,124.5	227.2		227.2			127.9	13.7	127.9	13.7				
H87	58	2,124.5	218.4		218.4			127.9	13.2	127.9	13.2				
H88	59	2,124.5	210.0		210.0			127.9	12.6	127.9	12.6				
H89	60	2,124.5	201.9		201.9			127.9	12.2	127.9	12.2				
H90	61	2,124.5	194.2		194.2			127.9	11.7	127.9	11.7				
H91	62	2,124.5	186.7		186.7			127.9	11.2	127.9	11.2				
合 計			126,445.9	43,563.3	92.0	43,655.3	3,697.6	3,103.1	7,801.6	2,877.5	11,499.2	5,980.6	7.30	37,674.7	

年次	年度	t	便 益(B)				費 用(C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
実施済	H20	-9													
	H21	-8													
	H22	-7													
	H23	-6													
	H24	-5													
	H25	-4													
	H26	-3													
	H27	-2													
	H28	-1													
	H29	0													
整備期間 (1-2年間)	残事業期間	H30	1				594.0	571.2	0.0	0.0	594.0	571.2			
		H31	2	446.5	412.7		412.7	581.9	537.8	246.5	227.8	828.4	765.6		
		H32	3	883.8	785.6		785.6	589.2	523.7	241.5	214.7	830.7	738.4		
		H33	4	1,326.7	1,133.9		1,133.9	563.7	481.8	244.5	209.0	808.2	690.8		
		H34	5	1,750.4	1,438.3		1,438.3	190.3	156.4	233.9	192.2	424.2	348.6		
		H35	6	1,750.4	1,383.7		1,383.7	171.3	135.4	79.0	62.5	250.3	197.9		
		H36	7	1,750.4	1,330.1		1,330.1	161.0	122.3	71.1	54.0	232.1	176.3		
		H37	8	1,750.4	1,278.6		1,278.6	167.6	122.4	66.8	48.8	234.4	171.2		
		H38	9	1,750.4	1,230.1		1,230.1	197.6	138.9	69.6	48.9	267.2	187.8		
		H39	10	1,750.4	1,182.7		1,182.7	177.1	119.7	82.0	55.4	259.1	175.1		
		H40	11	1,750.4	1,137.4		1,137.4	142.9	92.9	73.5	47.8	216.4	140.7		
		H41	12	1,750.4	1,093.3		1,093.3	161.0	100.6	59.3	37.0	220.3	137.6		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H42	13	1,750.4	1,051.3		1,051.3			66.8	40.1	66.8	40.1			
	H43	14	1,750.4	1,010.6		1,010.6			127.9	73.8	127.9	73.8			
	H44	15	1,750.4	971.9		971.9			127.9	71.0	127.9	71.0			
	H45	16	1,750.4	934.5		934.5			127.9	68.3	127.9	68.3			
	H46	17	1,750.4	898.6		898.6			127.9	65.7	127.9	65.7			
	H47	18	1,750.4	864.0		864.0			127.9	63.1	127.9	63.1			
	H48	19	1,750.4	830.8		830.8			127.9	60.7	127.9	60.7			
	H49	20	1,750.4	798.9		798.9			127.9	58.4	127.9	58.4			
	H50	21	1,750.4	768.1		768.1			127.9	56.1	127.9	56.1			
	H51	22	1,750.4	738.6		738.6			127.9	54.0	127.9	54.0			
	H52	23	1,750.4	710.1		710.1			127.9	51.9	127.9	51.9			
	H53	24	1,750.4	682.9		682.9			127.9	49.9	127.9	49.9			
	H54	25	1,750.4	656.6		656.6			127.9	48.0	127.9	48.0			
	H55	26	1,750.4	631.5		631.5			127.9	46.1	127.9	46.1			
	H56	27	1,750.4	607.1		607.1			127.9	44.4	127.9	44.4			
	H57	28	1,750.4	583.7		583.7			127.9	42.6	127.9	42.6			
	H58	29	1,750.4	561.2		561.2			127.9	41.0	127.9	41.0			
	H59	30	1,750.4	539.7		539.7			127.9	39.4	127.9	39.4			
	H60	31	1,750.4	518.9		518.9			127.9	37.9	127.9	37.9			
	H61	32	1,750.4	499.0		499.0			127.9	36.5	127.9	36.5			
	H62	33	1,750.4	479.8		479.8			127.9	35.1	127.9	35.1			
	H63	34	1,750.4	461.4		461.4			127.9	33.7	127.9	33.7			
	H64	35	1,750.4	443.6		443.6			127.9	32.4	127.9	32.4			
	H65	36	1,750.4	426.5		426.5			127.9	31.2	127.9	31.2			
	H66	37	1,750.4	410.1		410.1			127.9	30.0	127.9	30.0			
	H67	38	1,750.4	394.3		394.3			127.9	28.8	127.9	28.8			
	H68	39	1,750.4	379.2		379.2			127.9	27.7	127.9	27.7			
	H69	40	1,750.4	364.6		364.6			127.9	26.6	127.9	26.6			
	H70	41	1,750.4	350.6		350.6			127.9	25.6	127.9	25.6			
	H71	42	1,750.4	337.1		337.1			127.9	24.6	127.9	24.6			
	H72	43	1,750.4	324.1		324.1			127.9	23.7	127.9	23.7			
	H73	44	1,750.4	311.6		311.6			127.9	22.8	127.9	22.8			
	H74	45	1,750.4	299.7		299.7			127.9	21.9	127.9	21.9			
	H75	46	1,750.4	288.1		288.1			127.9	21.1	127.9	21.1			
	H76	47	1,750.4	277.0		277.0			127.9	20.2	127.9	20.2			
	H77	48	1,750.4	266.4		266.4			127.9	19.5	127.9	19.5			
H78	49	1,750.4	256.2		256.2			127.9	18.7	127.9	18.7				
H79	50	1,750.4	246.3		246.3			127.9	18.0	127.9	18.0				
H80	51	1,750.4	236.8		236.8			127.9	17.3	127.9	17.3				
H81	52	1,750.4	227.7		227.7			127.9	16.6	127.9	16.6				
H82	53	1,750.4	219.0		219.0			127.9	16.0	127.9	16.0				
H83	54	1,750.4	210.5		210.5			127.9	15.4	127.9	15.4				
H84	55	1,750.4	202.5		202.5			127.9	14.8	127.9	14.8				
H85	56	1,750.4	194.7		194.7			127.9	14.2	127.9	14.2				
H86	57	1,750.4	187.2		187.2			127.9	13.7	127.9	13.7				
H87	58	1,750.4	180.0		180.0			127.9	13.2	127.9	13.2				
H88	59	1,750.4	173.0		173.0			127.9	12.6	127.9	12.6				
H89	60	1,750.4	166.4		166.4			127.9	12.2	127.9	12.2				
H90	61	1,750.4	160.0		160.0			127.9	11.7	127.9	11.7				
H91	62	1,750.4	153.8		153.8			127.9	11.2	127.9	11.2				
合 計			104,180.2	35,892.6	92.0	35,984.6	3,697.6	3,103.1	7,801.6	2,877.5	11,499.2	5,980.6	6.02	30,004.0	

様式 - 6

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川水系猪名川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	------------------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	10,286		
	本工事費			式	1	9,157	
		築堤	m	100	47		
		護岸	m	617	238		
		根固め工	m ²	2,706	34		
		河道掘削	千m ³	471.2	4,718		
		堰	箇所	3	157		
		堤防強化	m	6,140	940		
		耐震対策(堤防)	m	90	118		
		耐震対策(樋門・樋管)	箇所	3	8		
		耐震対策(排水機場)	箇所	1	77		
		防災拠点	箇所	1	153		
		橋梁接続	箇所	2	180		
		堤防拡幅	m	3,050	652		
		その他	式	1	1,835		
	附帯工事費			式	1	1,129	
		橋梁保護	橋	7	485		
		伏越保護	箇所	5	380		
樋門・樋管		箇所	1	110			
堰		箇所	1	154			
用地費及補償費			式	1	3		
	用地費			式	-	-	
	補償費			式	1	3	
間接経費			式	1	3,851		
工事諸費			式	1	1,861		
事業費 計			式	1	16,001		
維持管理費			式	1	7,325	30年間(H20～H49)	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	淀川水系猪名川直轄河川改修事業 (残事業費)
-----	------------------------

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	2,455		
	本工事費			式	1	2,345	
		護岸	m	392	141		
		河道掘削	千m ³	60.4	608		
		堤防強化	m	1,500	480		
		耐震対策(樋門・樋管)	箇所	3	8		
		耐震対策(排水機場)	箇所	1	77		
		防災拠点	箇所	1	130		
		橋梁接続	箇所	2	180		
		堤防拡幅	m	2,760	587		
	その他	式	1	134			
附帯工事費			式	1	110		
	樋門・樋管	箇所	1	110			
用地費及補償費			式	-	-		
用地費			式	-	-		
補償費			式	-	-		
間接経費			式	1	830		
工事諸費			式	1	657		
事業費 計			式	1	3,942		


維持管理費	式	1	2,624	20年間(H30~H49)
-------	---	---	-------	---------------



国近整企画127号
平成29年11月2日

滋賀県知事 殿

近畿地方整備局長



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(依頼)

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)において、再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。

このたび、平成29年11月30日(木)に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、平成29年11月21日(火)までに、別紙について貴職の御意見を承りたく依頼いたします。

※御意見の送付・問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 06-6942-1141

FAX 06-6942-7463

(別紙)

(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
淀川水系直轄河川改修事業	事業継続	
淀川総合水系環境整備事業	事業継続	


※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



国近整企画127号
平成29年11月2日

京都府知事 殿

近畿地方整備局長



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(依頼)

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)において、再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。

このたび、平成29年11月30日(木)に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、平成29年11月21日(火)までに、別紙について貴職の御意見を承りたく依頼いたします。

※御意見の送付・問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 06-6942-1141

FAX 06-6942-7463

(別紙)

(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
淀川水系直轄河川改修事業	事業継続	
淀川総合水系環境整備事業	事業継続	

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。




国近整企画127号

平成29年11月2日

大阪府知事 殿

近畿地方整備局長



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(依頼)

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)において、再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。

このたび、平成29年11月30日(木)に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、平成29年11月21日(火)までに、別紙について貴職の御意見を承りたく依頼いたします。

※御意見の送付・問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 06-6942-1141

FAX 06-6942-7463

(別紙)

(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
淀川水系直轄河川改修事業	事業継続	
淀川総合水系環境整備事業	事業継続	
大和川総合水系環境整備事業	事業継続	


※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



国近整企画127号
平成29年11月2日

兵庫県知事 殿

近畿地方整備局長



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(依頼)

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)において、再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。

このたび、平成29年11月30日(木)に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、平成29年11月21日(火)までに、別紙について貴職の御意見を承りたく依頼いたします。

※御意見の送付・問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 06-6942-1141

FAX 06-6942-7463

(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
淀川水系直轄河川改修事業	事業継続	
円山川直轄河川改修事業	事業継続	
淀川総合水系環境整備事業	事業継続	

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
一般国道2号相生有年道路	事業継続	


※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



国近整企画127号
平成29年11月2日

三重県知事 殿

近畿地方整備局長



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(依頼)

貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対する御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当地方整備局管内における直轄事業については、国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、事業採択後一定期間が経過している事業等について、その効率性、実施過程の透明性を図るべく、近畿地方整備局事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)において、再評価に係る対応方針(原案)について審議しております。

このたび、平成29年11月30日(木)に委員会を開催することとなりましたので、実施要領に基づき、委員会に諮る対応方針(原案)の作成にあたり、平成29年11月21日(火)までに、別紙について貴職の御意見を承りたく依頼いたします。

※御意見の送付・問い合わせ先

近畿地方整備局 企画部 企画課 事業評価係

電話 06-6942-1141

FAX 06-6942-7463

(別紙)

(再評価)

【河川事業】


事業名	「対応方針(原案)」案※	備考
淀川水系直轄河川改修事業	事業継続	
熊野川直轄河川改修事業	事業継続	

※貴職の意見を踏まえ、近畿地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

滋 広 政 第 200 号
平成 29 年(2017 年)11 月 21 日

近畿地方整備局長 様

滋賀県知事 三日月 大造



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

平成 29 年 11 月 2 日付け国近整企画第 127 号にて照会のありました標記の
件について、下記のとおり回答します。

記

1. 淀川水系直轄河川改修事業

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。

琵琶湖周辺の浸水被害の軽減が図られるよう琵琶湖の後期放流対策としての事業効果の早期発現に向けて、さらなる整備促進をお願いしたい。

なお、事業推進にあたって必要な予算の確保とともに、より一層のコスト縮減に取り組んでいただきたい。

2. 淀川総合水系環境整備事業

「対応方針（原案）」案のとおり「事業継続」で異論はない。


なお、事業推進にあたって必要な予算の確保とともに、より一層のコスト削減に取り組んでいただきたい。



9 河 第 3 4 7 号
平成29年12月22日

近畿地方整備局長 様

京都府知事 山田 啓



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成
に係る意見照会について（回答）

平成29年11月2日付け国近整企画127号で意見照会のうち、淀川水系直轄河
川改修事業について、別紙のとおり回答します。

京都府建設交通部河川課

総合治水担当 075-414-5288

事業継続に関する京都府意見

【河川事業】

事業名	・淀川水系直轄河川改修事業 淀川直轄河川改修事業 桂川直轄河川改修事業 瀬田川直轄河川改修事業 木津川下流直轄河川改修事業 木津川上流直轄河川改修事業
意見	<p>事業継続の対応方針原案（案）に異論はない。</p> <p>なお、事業費増額は府民の負担増につながることから大変遺憾であり、今後の事業実施に当たっては、最新技術を積極的に取り入れ、更なる費用の縮減に努められるとともに、引き続き関係自治体と連携を図りながら事業を推進し早期完成を図られたい。</p> <p>特に、桂川は淀川三川のうち最も治水安全度が低いことから、上下流バランスはもちろん、三川間のバランスも考慮しつつ、優先的に整備すべきであり、京都府管理区間を含めた桂川流域全体の治水安全度が早期かつ着実に向上するよう進められたい。</p>

河整第 1714 号
平成 29 年 11 月 21 日

近畿地方整備局長 様

大阪府知事



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成 29 年 11 月 2 日付け国近整企画 127 号により照会のありました標記について、別紙のとおり回答します。

<担当>
都市整備部 河川室 河川整備課
TEL06-6944-7592

「対応方針（原案）」案については異存ありません。但し、以下の事項を要請します。

＜淀川水系直轄河川改修事業＞

○大阪府域の治水安全度を低下させないよう整備手順に配慮すること。

また、「淀川の減災に係る取組方針」に基づき、堤防強化等の治水対策について、早期に完成すること。併せて、水害対応タイムラインの作成や、避難訓練及び氾濫時の長期湛水への対応計画の策定など、ソフト対策について国が率先して連携を図り、計画的な取組を早期に進めること。

○阪神なんば線淀川橋梁改築事業を早期に完成すること。

○伝法陸閘及び淀川陸閘等の耐震対策に早期に着手すること。

○神崎川の治水安全度を踏まえ、猪名川直轄河川改修事業を実施すること。

○事業の実施にあたっては、より効果的な整備手法の検討を行うとともに、更なるコスト縮減を図ること。

＜淀川総合水系環境整備事業＞

○「寝屋川流域水環境改善計画」に基づき、寝屋川の水環境改善に資するよう、導水を実施すること。

○芥川等の連続性確保に向けた整備を推進すること。

○これまでの整備内容の検証による効果的な整備手法の検討を行うとともに、更なるコスト縮減を図ること。

＜大和川総合水系環境整備事業＞


○「大和川水環境改善計画」に基づき、流域府県・市町村と連携した取組みを着実に推進すること。

○これまでの整備内容の検証による効果的な整備手法の検討を行うとともに、更なるコスト縮減を図ること。

土 第 1527 号
平成 29 年 11 月 21 日

近畿地方整備局長 様

兵庫県知事



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成
に係る意見照会について（回答）

平成 29 年 11 月 2 日付け国近整企画 127 号で照会のありました標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。

【淀川水系直轄河川改修事業】

兵庫県知事の意見

一級河川猪名川の流域は、京都府、大阪府、兵庫県に跨り、特に兵庫県内は尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町など人口・資産の集積が著しい地域である。


ひとたび洪水災害に見舞われると甚大な被害が想定されていることに加え、近年、各地で発生しているゲリラ豪雨などへの対応も喫緊の課題となっている。

このため、猪名川の治水安全度の早期向上は地域の強い願いであり、沿線住民の安全・安心を確保するため、淀川水系河川整備計画等に基づき、目標である戦後最大規模の洪水に対する浸水被害の解消に向けた河道掘削や堤防強化対策など、一層の事業促進を図られたい。

県土第26-25号
平成29年11月16日

国土交通省 近畿地方整備局長 様

三重県知事 鈴木英敬



近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

平成29年11月2日付国近整企画第127号で依頼のありましたこのことにつ
きまして、下記により回答いたします。

記

1 河川事業 淀川水系直轄河川改修事業

回答：対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

意見：本事業は、木津川流域及び名張川流域の治水安全度を向上し、洪水被害を軽
減するために重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしてい
ただき、河川整備計画に基づき効率的な事業執行により、更なるコスト縮減
をお願いします。

2 河川事業 熊野川直轄河川改修事業

回答：対応方針（原案）のとおり、事業継続について異存ありません。

意見：本事業は、洪水被害の軽減と、今後想定される南海トラフ地震における地震・
津波被害を軽減するために重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調
整をしていただき、河川整備基本方針の見直し及び河川整備計画の策定と効率
的な事業執行により、更なるコスト縮減をお願いします。

事務担当
三重県 県土整備部
公共事業運営課 公共事業運営班
TEL 059-224-2915
FAX 059-224-3290
