

国土交通省近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成23年9月27日(火) 21時00分
------	-------------------------

件名	平成23年台風12号により発生した 河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について
----	--

概要	<p>奈良、和歌山両県知事からの要請を受け、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p>赤谷地区、熊野地区の9/27の作業状況 現地作業実施状況資料(別紙参照)</p> <p>現地作業写真の電子データ保存について(近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存フォルダ名 : 20110927 赤谷・熊野 対策工事</li> </ul> <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p>
----	---

取扱い	_____
-----	-------

配布場所	<p>近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 和歌山県政記者クラブ、和歌山建政放送記者クラブ 和歌山県地方新聞協会、田辺記者クラブ</p>
------	--

問い合わせ先	<p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳 (内線86-3624)</p> <p>河川計画課長 吉田 一 亮 (内線86-3611)</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p>
--------	---

## 赤谷地区(土砂ダム)緊急対策工事


工事用道路整備作業(県道)



工事用道路整備作業(県道)



進入路設置作業

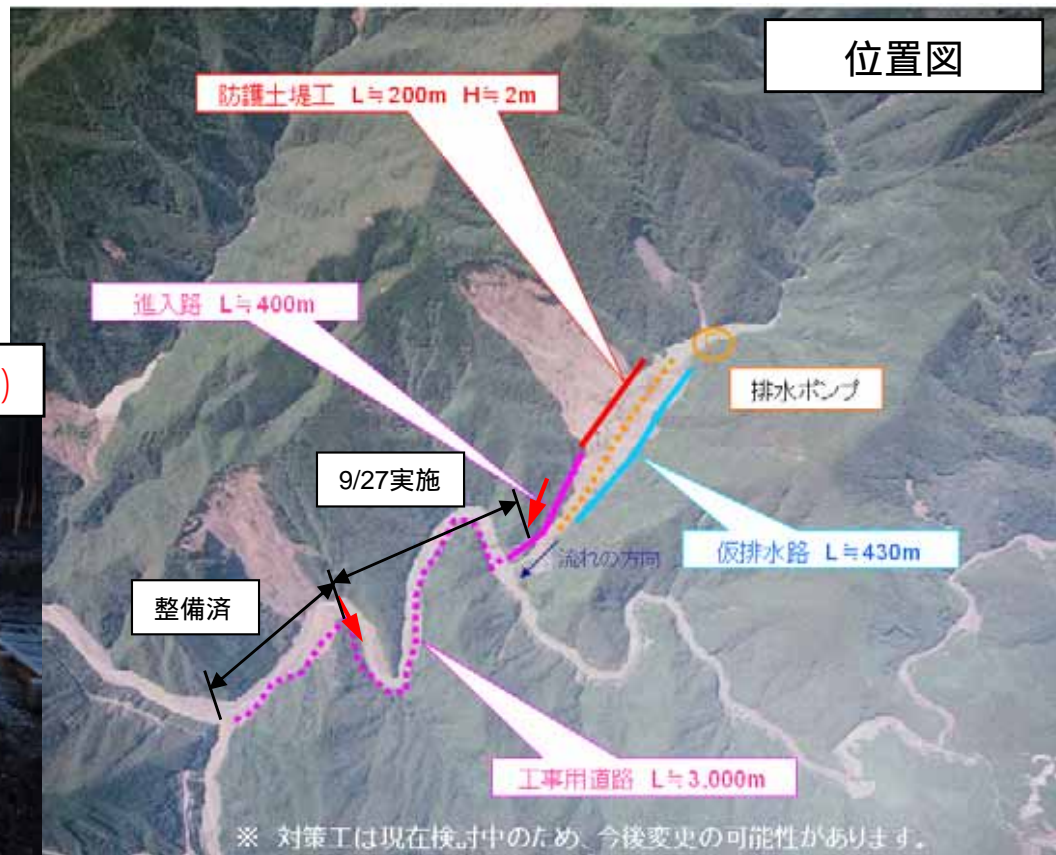

位置図

写真内 は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

### 9月27日(火)の作業内容

- ・工事用道路整備工事(クローラ車のみ  
の進入可能) 完了  
全3000mのうち大きな補修が必要な区間  
900mのうち900m整備完了(100%)
- ・進入路設置工事(4%) 着手  
バックホウ 0.7m3級 3台  
作業員 14名

### (今後の予定)

- ・進入路の完成後、防護土堤及び仮排水路の設置工事に入る予定。
- ・ポンプによる湛水部の排水は、ポンプが設置出来次第開始予定
- ・9/28(水) バックホウ0.7m3級2台、10t級ダンプ(クローラ式)1台追加作業予定

天候に大きく左右されることに留意してください。



## 熊野地区(土砂ダム)緊急対策工事

ポンプ排水状況

排水ポンプ車状況

ポンプ排水状況



写真内 矢印は撮影方向を示す。

### 9月27日(火)の作業内容

- ・進入路整備工事(クローラ車のみでの進入可能) 完了  
400m整備完了(100%)
- ・進入路路盤改良工事(80%)
- ・ポンプ排水 開始
- ・防護土堤工事(10%)  
バックホウ 0.45m3級 5台  
不整地運搬車 6t級 1台  
作業員 27名

### (今後の予定)

- ・進入路の完成後、順次、仮排水路、水叩き工の設置工事に入る予定。
- ・ポンプによる湛水部の排水(排水量4m<sup>3</sup>/分)を継続。

天候に大きく左右されることに留意してください。
