

|              |
|--------------|
| 国土交通省近畿地方整備局 |
| 資料配布         |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 配布日時 | 平成23年10月15日(土)<br>20時30分 |
|------|--------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 件名 | 平成23年台風12号により発生した<br>河道閉塞箇所における緊急工事の実施状況について |
|----|--|

|    |  |
|----|--|
| 概要 | <p>奈良、和歌山両県知事からの要請をうけ、国土交通省近畿地方整備局は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果を踏まえ、決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所について、地域の安全・安心確保のための緊急工事を実施しています。</p> <p>赤谷地区、熊野地区、北股地区、栗平地区、長殿地区の10/15の作業状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各地区とも降雨により10/15は作業を中止しています。</li> <li>・10/16以降の作業予定は、別紙のとおりです。</li> </ul> <p>現地作業写真の電子データ保存について（近畿建設記者クラブ内のパソコンのデスクトップに保存）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保存フォルダ名：20111015 赤谷・熊野・北股・栗平・長殿対策工事</li> </ul> <p>データを取得される際は備え付けの名簿に社名等を記載願います。</p> |
|----|--|

|     |       |
|-----|-------|
| 取扱い | _____ |
|-----|-------|

|      |   |
|------|---|
| 配布場所 | <p>近畿建設記者クラブ<br/>         大手前記者クラブ<br/>         和歌山県政記者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ<br/>         和歌山県地方新聞協会<br/>         奈良県政・経済記者クラブ</p> |
|------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 問い合わせ先 | <p>国土交通省 近畿地方整備局 河川部</p> <p>河川調査官 中込 淳（内線86-3624）</p> <p>河川計画課長 吉田 一 亮（内線86-3611）</p> <p>河川工事課長 下野 公仁（内線86-3711）</p> <p>代表 06-6942-1141</p> <p>直通 06-6945-6355</p> |
|--------|--|

## 赤谷地区(河道閉塞)緊急対策工事

施工:鹿島建設(株)



### 10月15日(土)の作業内容

・降雨のため作業中止

使用機械(10/15現在 現場内)

・油圧ショベル 0.7m<sup>3</sup>級 7台

・油圧ショベル 1.2m<sup>3</sup>級 1台

・クローラダンプ 10t級 4台

・ブルドーザ 7t級 1台

作業員 0名

### (今後の予定)

10/16(日)の予定

・仮排水路設置工事

・ポンプ排水 継続

10/16以降の予定

・ポンプ排水・仮排水路設置工事を進める予定

天候に左右されることに留意してください。

# 熊野地区(河道閉塞)緊急対策工事

施工:(株)大林組

## 上流からの状況



写真内 は左の写真番号を示し、矢印は撮影方向を示す。

### 10月15日(土)の作業内容

・降雨のため作業中止

- 使用機械(10/15現在 現場内)
- 油圧ショベル 0.45m<sup>3</sup>級 6台
- クローラダンプ 6t級 2台
- 10tダンプ 1台
- 作業員 0名

### (今後の予定)


- 10/16(日)の予定
- ・ポンプ排水 継続
- ・仮排水路工事
- ・上池・下池連通工

10/16以降の予定

- ・仮排水路工事を進める予定

天候に左右されることに留意してください。

# 北股地区(河道閉塞)緊急対策工事

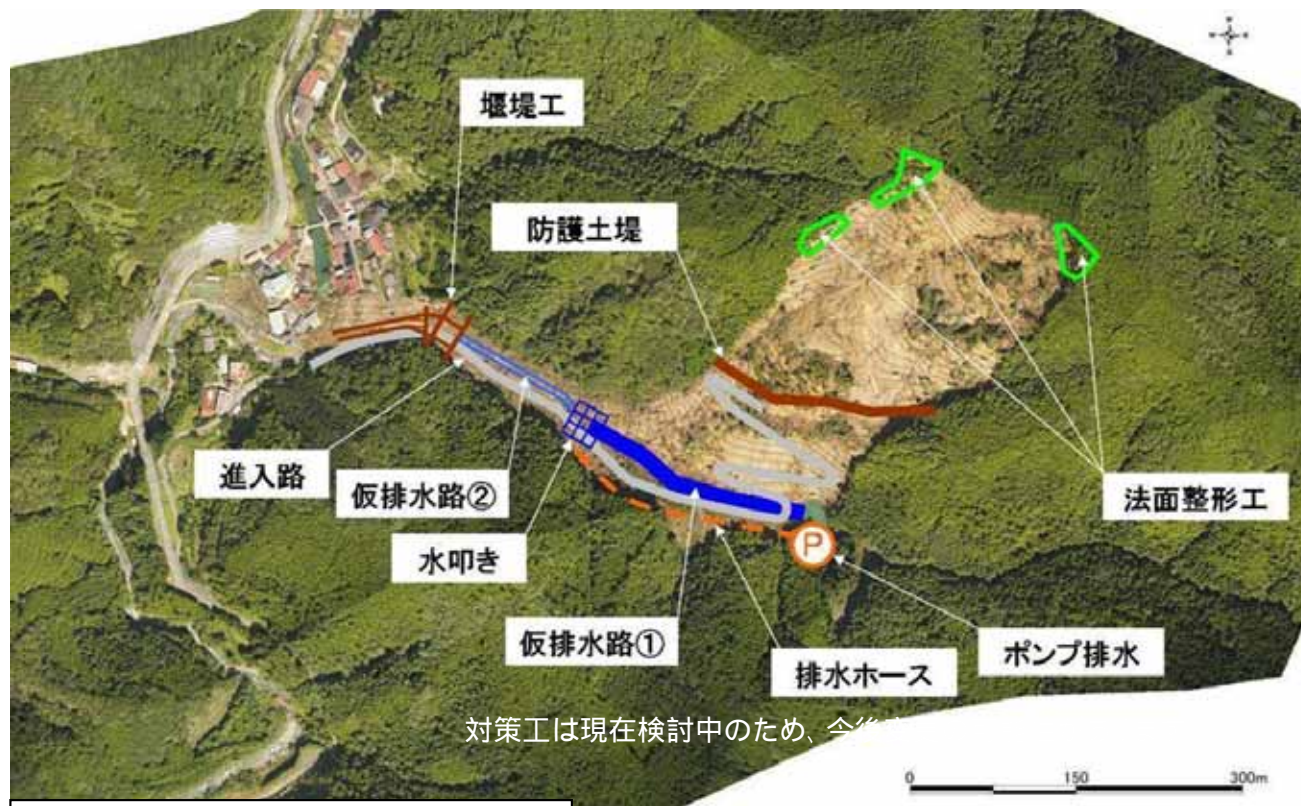

対策工は現在検討中のため、今後

**10月15日(土)の作業内容**

・降雨のため作業中止

---

使用機械(10/15現在)

- ・油圧ショベル 0.7m<sup>3</sup>級 4台
- ・油圧ショベル 0.4m<sup>3</sup>級 1台
- ・油圧ショベル 0.25m<sup>3</sup>級 1台
- ・クローラダンプ 11t積 1台
- 作業員 0名

(今後の予定)

10/16(日)の予定

・15日の降雨の影響により、地盤が軟弱なため、全ての作業を休止予定。

---


10/16以降の予定

・地盤の状態により、進入路設置工事を進める予定

天候に左右されることに留意してください。

# 栗平地区(河道閉塞)緊急対策工事

施工:大成建設(株)

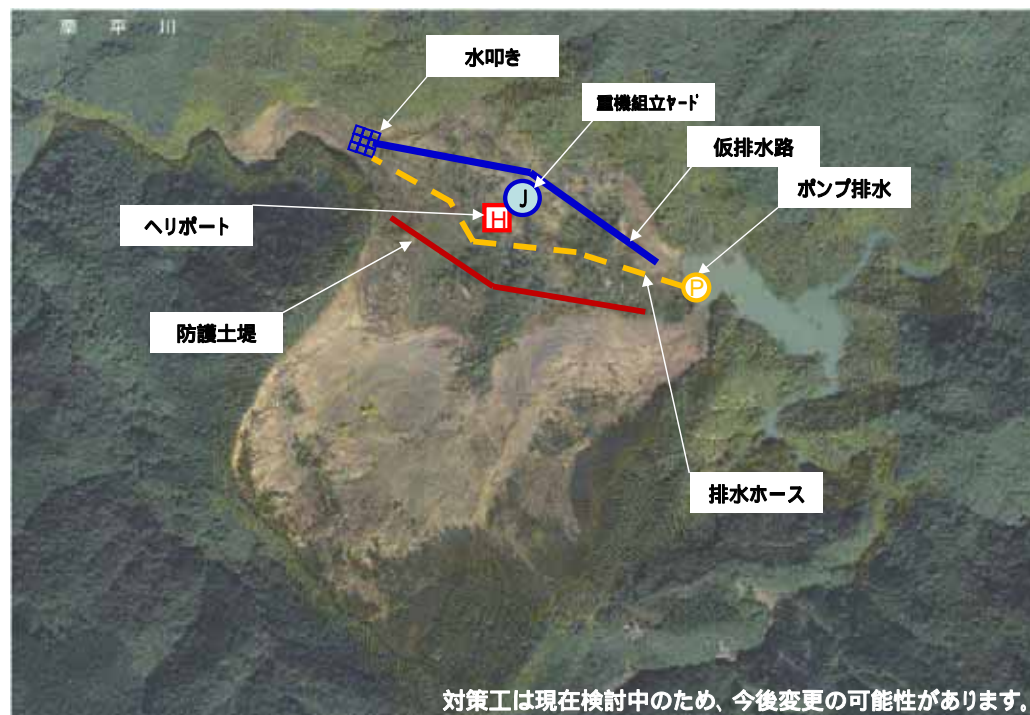

## 10月15日(土)の作業内容

・降雨のため作業中止

使用機械(10/15現在 現場内)

・油圧ショベル 0.1m<sup>3</sup>級 2台

作業員 0名

## (今後の予定)

10/16(日)の予定

- ・重機組立ヤード造成工事
- ・現地へ重機組立ヤード造成用の重機搬入  
(油圧ショベル0.1m<sup>3</sup>級) 2台
- ・倒木伐採工
- ・測量

10/16以降の予定

- ・重機組立ヤード造成工事
- ・現地への重機の搬入・組立を継続(油圧ショベル  
0.45m<sup>3</sup>級 12台)

天候に左右されることに留意してください。

# 長殿地区(河道閉塞)緊急対策工事



| 10月15日(土)の作業内容   | (今後の予定)   |
|--|---|
| <p>・降雨のため作業中止</p> <hr/> <p>使用機械(10/15現在 現場内)</p> <p>・油圧ショベル 0.1m<sup>3</sup>級 2台</p> <p>作業員 0名</p> | <p>10/16(日)の予定</p> <p>・重機組立ヤード造成工事</p> <hr/> <p>10/16以降の予定</p> <p>・重機組立ヤード造成工事</p> <p>・現地への重機の搬入準備(上野地ヘリポート)(油圧ショベル 1.0m<sup>3</sup>級 2台)</p> <p>天候に左右されることに留意してください。</p> |
