

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和2年12月

TOPICS1 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R2.12月 撮影



橋脚工事
A1橋台、P1-P4橋脚は完成しました。
現在、P5橋脚工を行っています。
今後、P6橋脚、A2橋台の本体工事が
始まります。

TOPICS2 米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚他工事

R2.12月 撮影



橋脚工事
P5橋脚の躯体工事が始まりました。
現在は、躯体の配筋を行っています。

TOPICS3 P6橋脚 埋蔵文化財調査

R2.12月 撮影




埋蔵文化財調査
矢倉川高架橋P6橋脚部の埋蔵文化
財調査を行っています。

TOPICS4 米原バイパス彦根トンネル工事

R2.12月 撮影



トンネル工事
彦根トンネル(起点側)の掘削工事を
行っています。

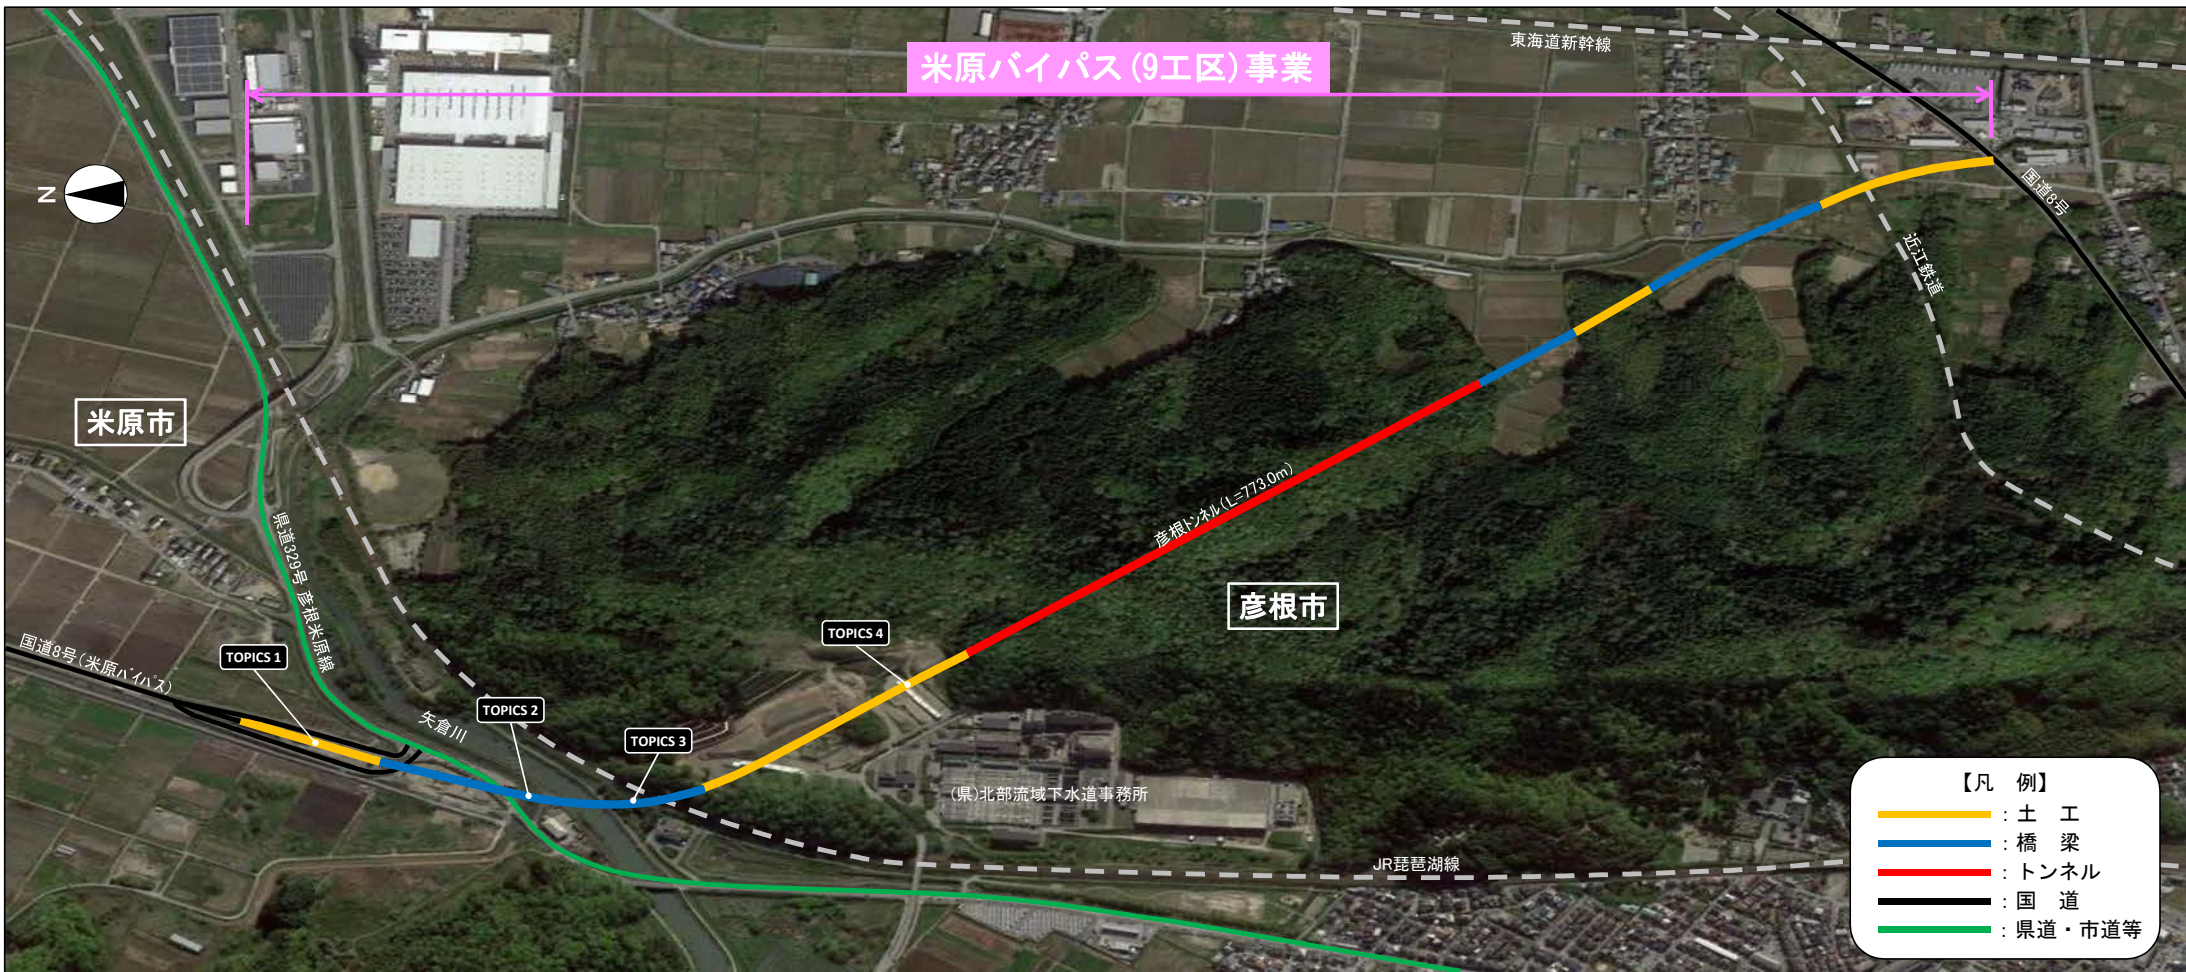

- 【凡 例】
- ：土 工
 - ：橋 梁
 - ：トンネル
 - ：国 道
 - ：県道・市道等

地区名	米原市		彦根市			
	入江地区		松原地区		鳥居本地区	
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工 鋼橋 土工



- 凡 例
- ：未着手
 - ：発注手続中
 - ：施工中
 - ：完 成



A1橋台-P4橋脚



松原地区(流域下水道センター周辺)



彦根トンネル抗口付近(起点側)



彦根トンネル抗口付近(終点側)



近江鉄道交差部(起点側)



近江鉄道交差部(終点側)



国道8号 接続部
