

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和7年7月

TOPICS 1 米原バイパス入江地区他舗装工事 R7.7月撮影

車線切替をして、本線の舗装、管路、排水構造物等の工事を進めます。

TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事、米原バイパス二線橋新設工事、米原バイパス松原地区他改良工事 R7.7月撮影

P5橋脚～A2橋台間の上部工の架設(JR上空を含む)、床版工が完了し、橋梁付属物を進めます。


本線の排水構造物、法面工を進めます。

TOPICS 3 米原バイパス鳥居本高架橋鋼上部工事 R7.7月撮影

本線の舗装工を進めます。

TOPICS 4 米原バイパス佐和山高架橋上部工事、国道8号米原バイパス横断に伴う本体図案他工事 R7.7月撮影

近江鉄道下のボックスカルバート、U型擁壁の躯体工を進めます。

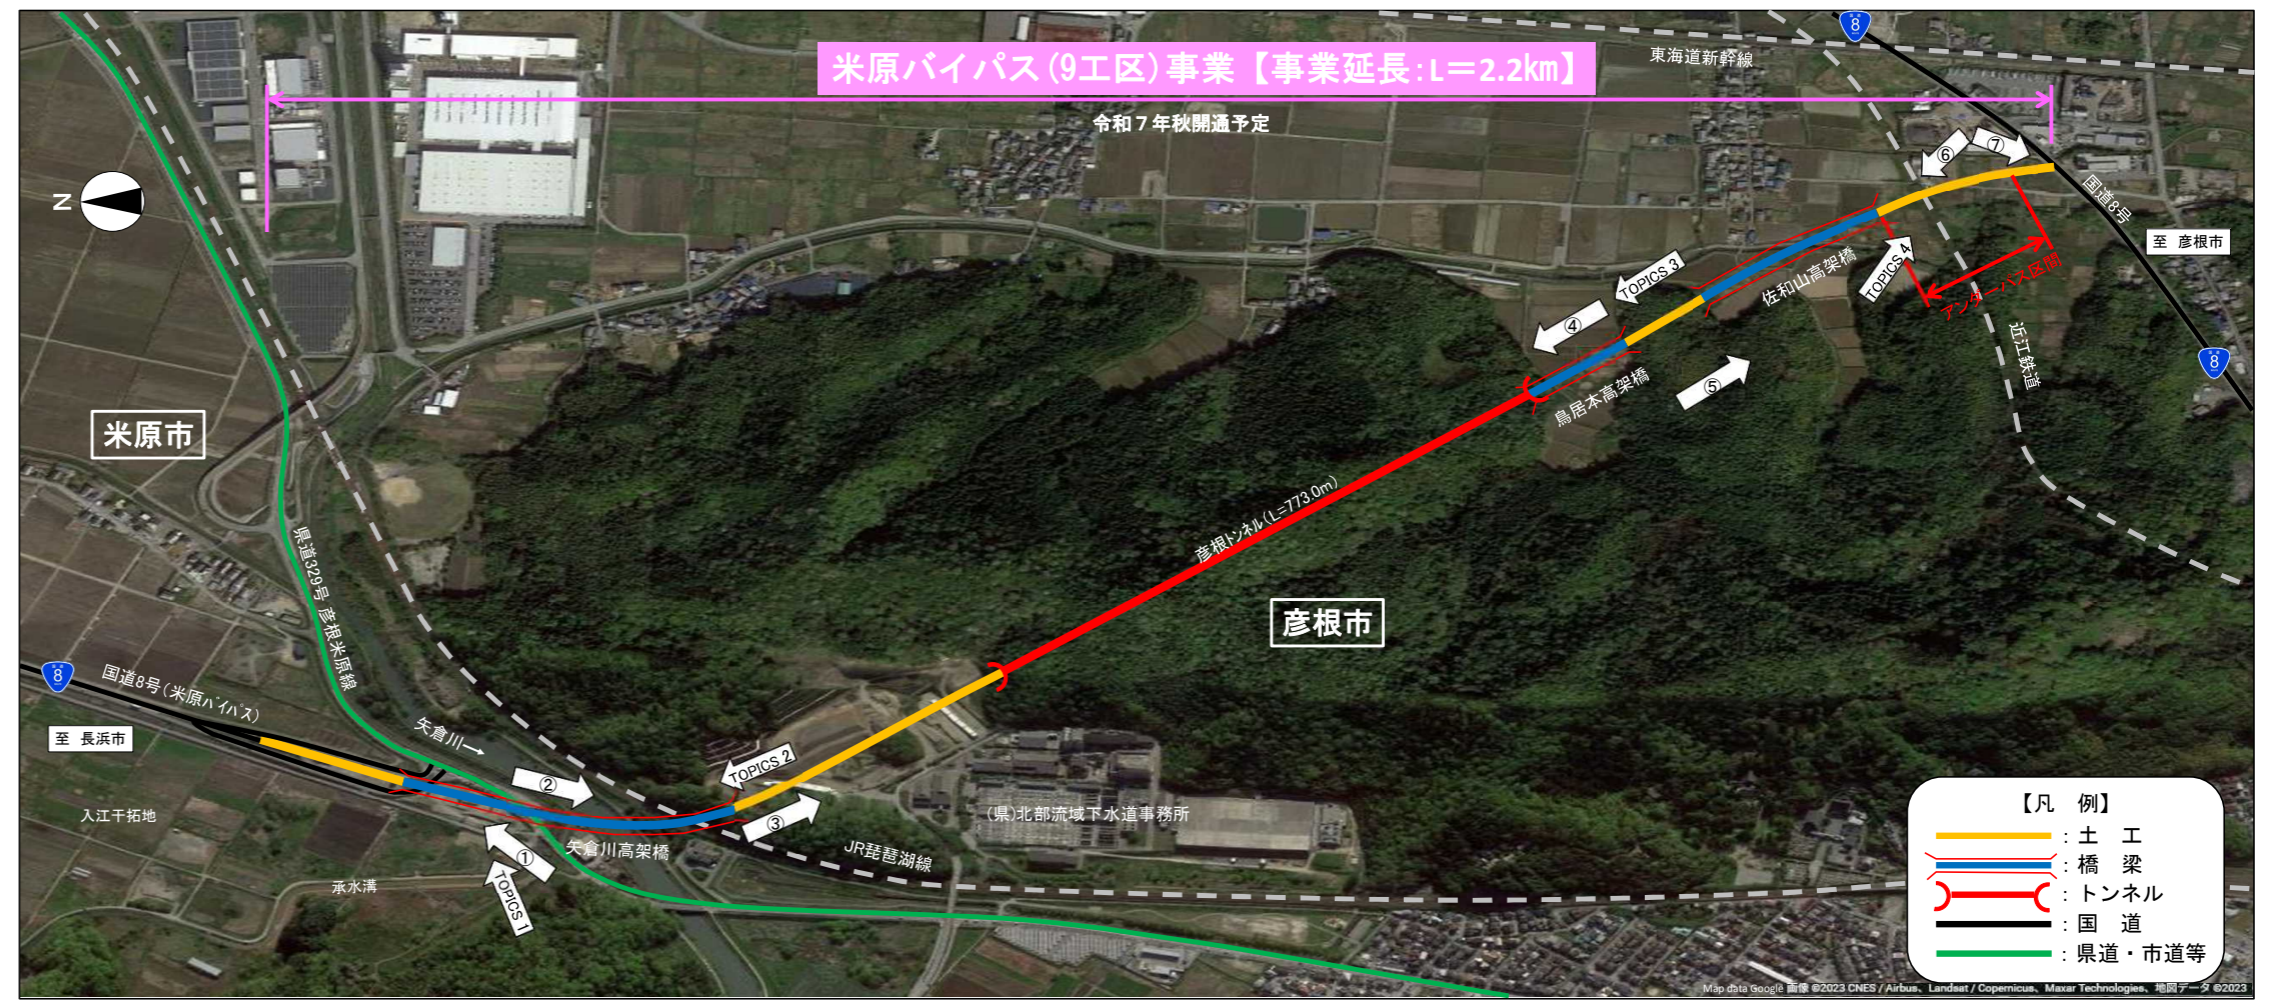

地区名	米原市		松原地区		彦根市	
	入江地区				鳥居本地区	佐和山地区
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工



凡例

- 注進手中
- 施工中
- 完成

① 矢倉川高架橋

② 矢倉川高架橋

③ 松原地区(盛土工)

④ 彦根トンネル坑口付近(終点側)

⑤ 佐和山地区

⑥ 近江鉄道交差部

⑦ 国道8号 接続部

※照明設備、CCTV設備、散水融雪設備等の工事を進めます。
