

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成19年 4月16日 14時30分
------	-----------------------

件名	国道26号紀の川大橋橋梁拡幅工事現場周辺で 地下水の噴出が発生しました。
----	---

概要	<p>4月8日10時30分頃から、国道26号紀の川大橋橋梁拡幅工事現場周辺の河川内で、空気の噴出が発生しています。また、4月11日11時30分頃以降、周辺地区で井戸から空気や地下水の噴出が発生しました。</p> <p>工事との関連は不明ですが、周辺状況を含め調査中であり、現在河川内で実施していた工事を中止しております。</p> <p>なお、4月14日以降、空気や地下水の噴出は減少しつつあることを確認しています。</p>
----	---

取り扱い	テレビ・ラジオ : _____ 新聞 : _____
------	-------------------------------

配布場所	和歌山県政記者クラブ 和歌山県地方新聞記者クラブ 和歌山県政放送記者クラブ
同時配布	_____

問い合わせ先	国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 TEL073-424-2471 副所長 木村 是一 (内線 205)
--------	---

【噴出の発生経緯】

発生日時：平成19年4月8日10時30分頃

経緯：

- 4月8日 10時30分頃 工事施工場所から約150m上流の河川内の1箇所（位置図①）から空気噴出。
- 4月11日 11時30分頃 周辺の畑の井戸1箇所（位置図②）から空気や水が噴出。
- 4月12日 17時00分頃 周辺畑の別井戸1箇所（位置図③）から空気、水が噴出。
- 4月12日 22時00分頃 周辺住宅の床下（位置図④）から空気、水が噴出し家屋に被害が発生。

4月15日17時現在、河川内の噴出及び、井戸、住宅の床下からの噴出については減少しつつあります。

近接工事

工事名：26号紀の川橋拡幅橋梁下部交差点改良工事

工事場所：和歌山県和歌山市中州地先


工期：平成18年3月28日～平成20年3月10日

請負業者：㈱白石 大阪支店

工事概要：本工事は、和歌山県で改良事業を行っている、紀の川右岸線が国道26号に取り付く部分の、国道26号紀の川大橋（3径間）の拡幅を和歌山県から受託して施工しているもので、現在橋脚のケーソン基礎3基（ニューマチックケーソン）を施工中です。

工事は4月12日17時10分から中止して、工事現場周辺の状況および噴出の原因を調査中です。

位置図

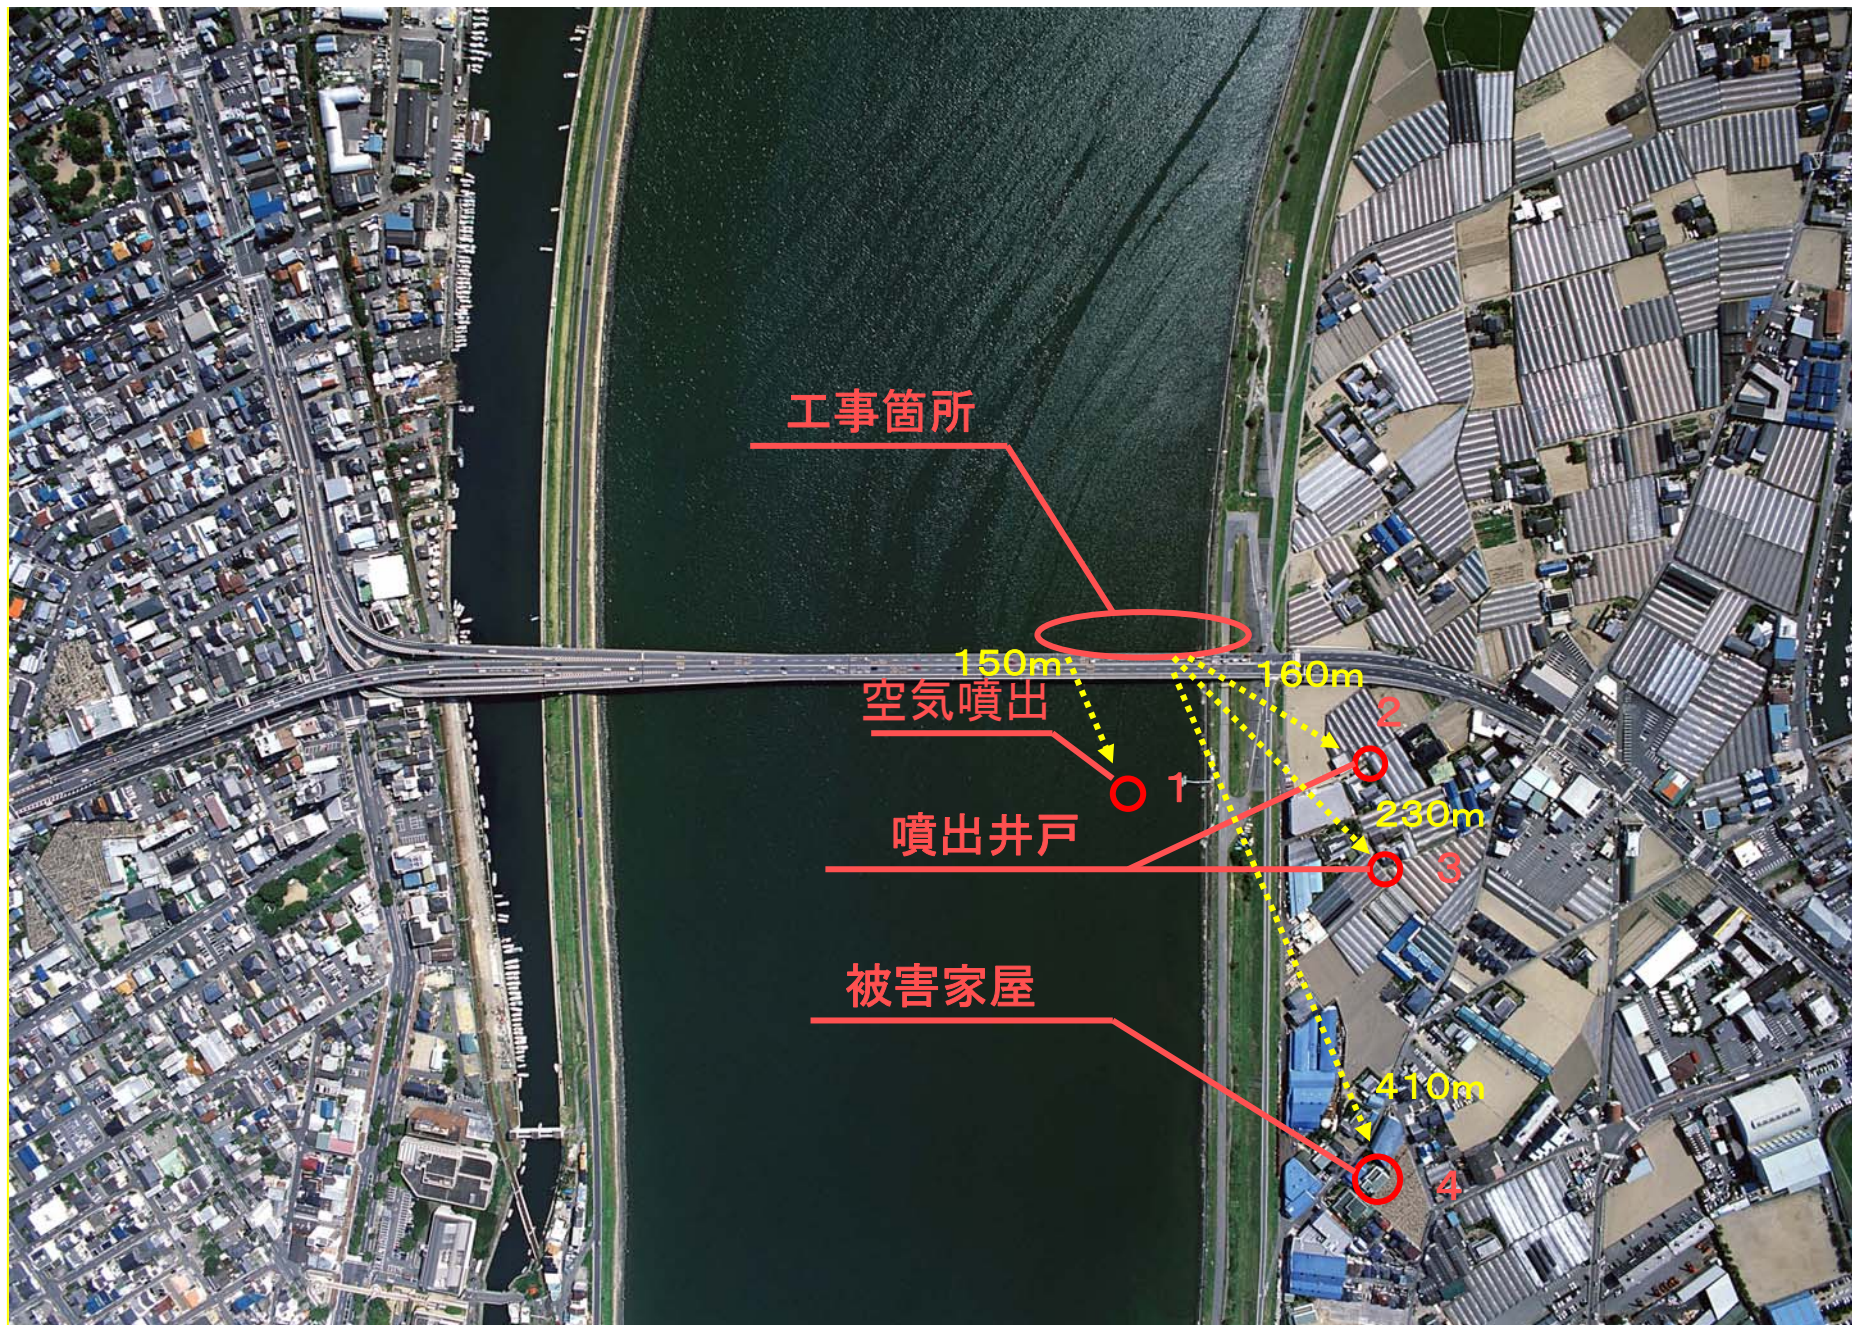


現地状況写真



紀の川大橋橋梁拡幅平面図

橋梁拡幅 L=143.875m

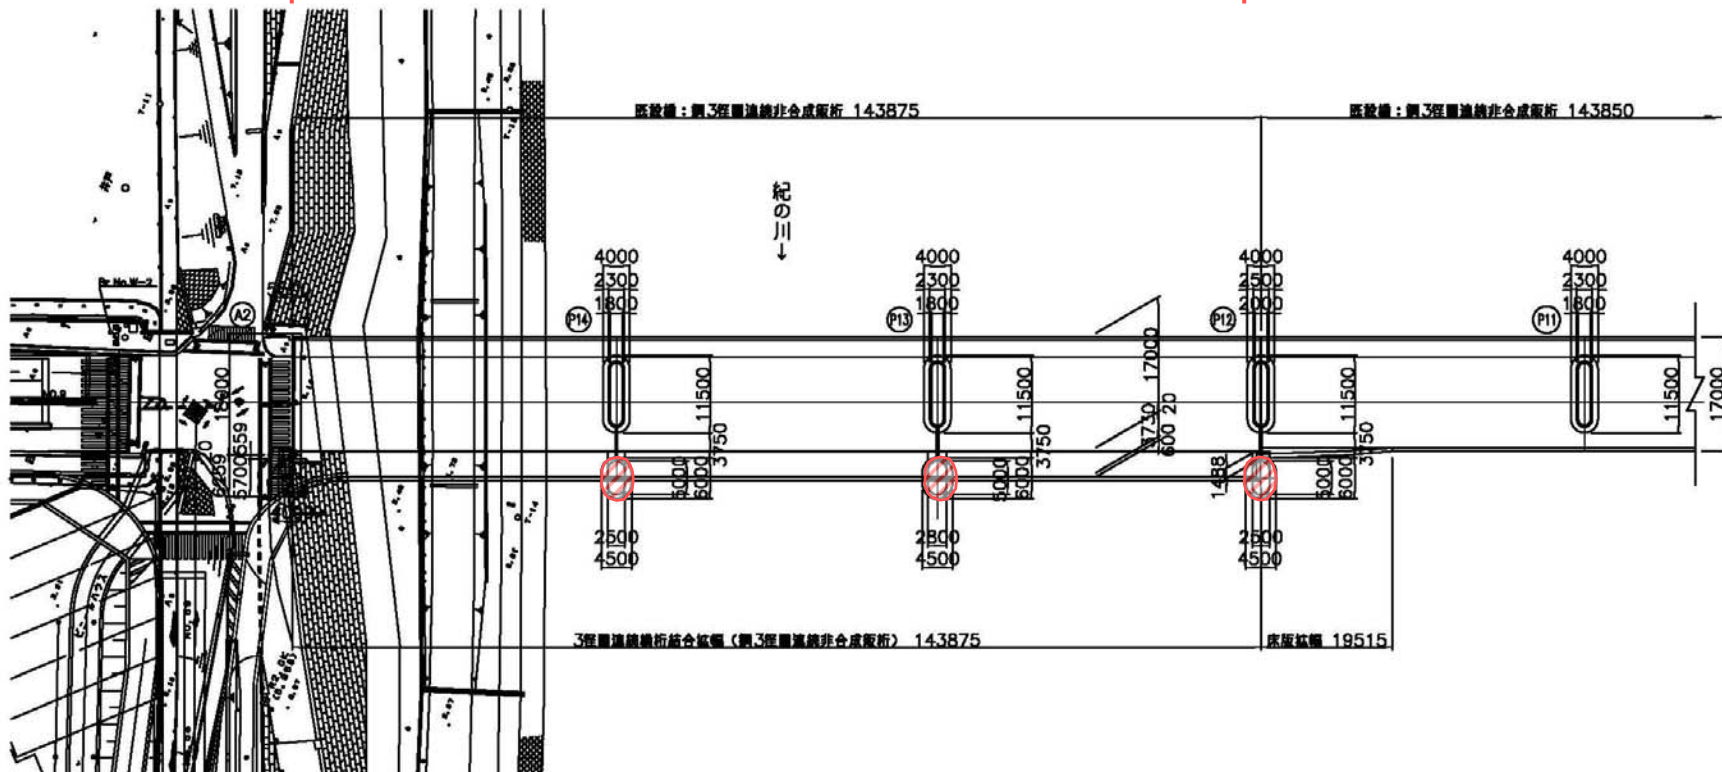

ニューマチックケーソン工法

ニューマチックケーソン工法 全体概要および主要設備

