

令和8年 7月24日 14時00分

近 畿 地 方 整 備 局

淀 川 河 川 事 務 所

木 津 川 市 役 所

## 木津川堤防の不具合について(第3報)

木津川堤防右岸30k付近(京都府木津川市加茂町河原)で発生した、堤防天端の陥没について現地での調査を終え、緊急復旧として改良土による埋め戻しを完了しました。今後は、当該箇所監視を継続するとともに、引き続き、堤防及び樋門の復旧作業を進めて参ります。

### ○概要

木津川堤防右岸30k付近で発生した堤防陥没を受け、陥没箇所周辺における地中レーダーによる空洞調査を実施しました。その結果、陥没箇所の近傍において堤防の「ゆるみ」が確認されました。

空洞調査の結果を受け、陥没箇所及び今回確認された「ゆるみ」箇所において、緊急復旧として改良土による埋め戻しを実施しました。

今後は、当該箇所の変状の進行を監視するため、仮設の監視カメラによるモニタリング等を継続するとともに、引き続き、堤防及び樋門の復旧作業を進めて参ります。

空洞調査の結果及び改良土による埋め戻し作業の状況については別紙1,2を参照下さい。

### ＜取扱い＞

＜配布場所＞近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 京都府政記者クラブ  
学研都市記者クラブ

### ＜問合せ先＞＜堤防の不具合に関すること＞

淀川河川事務所 副所長 矢間 孝司（内線206）  
管理課長 山本 淳（内線331）  
電 話 072-843-2861（代表）

### ＜河原排水樋門に関すること＞


木津川市役所 建設部次長(農政課長) 木下 勝史（内線331）  
農政課長補佐 田崎 裕一（内線335）  
電 話 0774-72-0501（代表）




- 陥没箇所の周辺堤防に対して、地中レーダー探査により、空洞や堤防のゆるみの有無を確認した。
- 陥没箇所上流側の川裏法肩付近(深さ1.2~2.0m)で堤防の「ゆるみ」を確認した。



堤防天端の計測

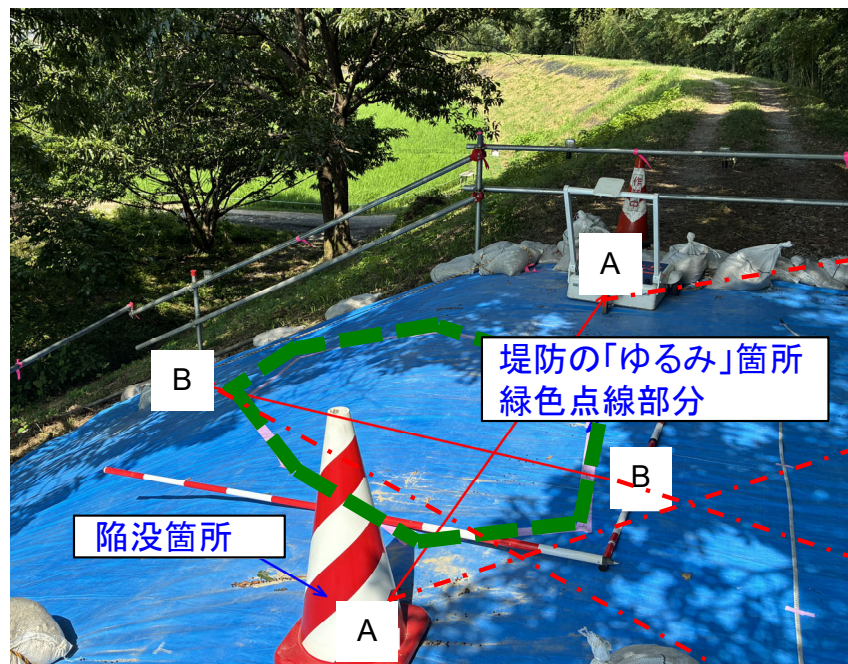

調査結果

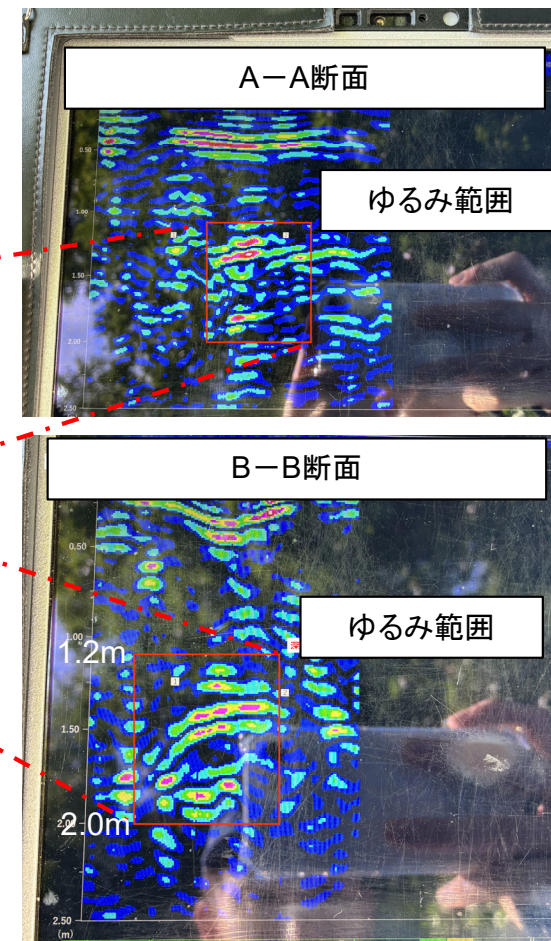

川裏法面の計測





実施前



完了後



改良土による埋め戻し作業実施状況（上流側より撮影）



改良土による埋め戻し作業実施状況（下流側より撮影）
