



大和川保田遊水地掘削築堤他工事【(株)中和コンストラクション】

現在の施工状況

- 付帯道路工について、地先ブロック敷設が完了しました。
- 堤防天端 アスファルト舗装・ライン工事が完了しました。
- 自由勾配側溝の敷設の掘削を行っています。

現況写真 (R6.10.17撮影)



今後の予定

- 保田川水路工 坂路工②(L=約47m)を行っていきます。
- A地区 自由勾配側溝の敷設 (L=約160m)を行っていきます。

大和川 自由勾配側溝 コラム


U字側溝

道路勾配

排水勾配



自由勾配側溝

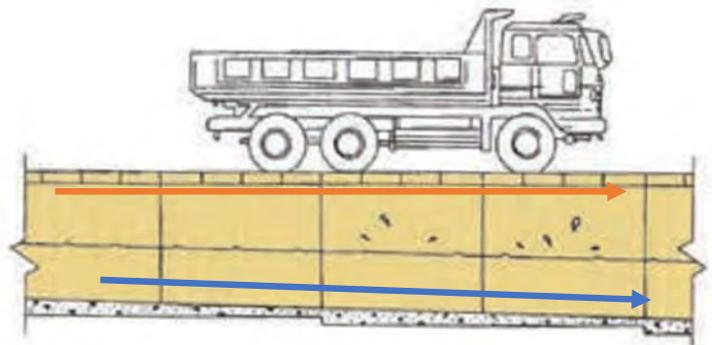

「U字側溝」は、排水用の溝（側溝）の一つです。「U字側溝」の特徴は、地面の傾きと排水勾配が同じになります。



「自由勾配側溝」の特徴は、側溝の天端高さを水平にして、水路床の傾斜を自由に変えられることです。




大和川保田遊水地越流堤他工事【(株)吉田組】

現在の作業状況と今後の予定

○遊水地側の平張コンクリートと大和川側の越流堤本体のブロック張を施工しています。
11月も引き続き平張コンクリートと越流堤本体を施工します。


施工平面図

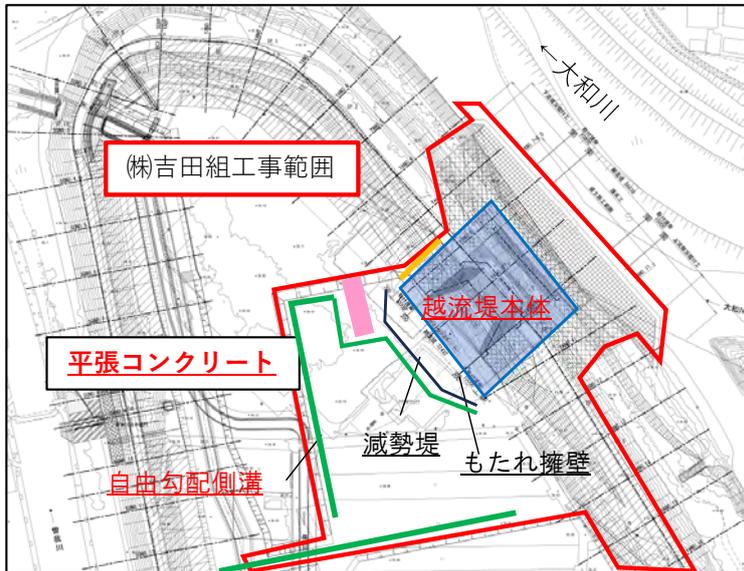

施工状況



施工断面図

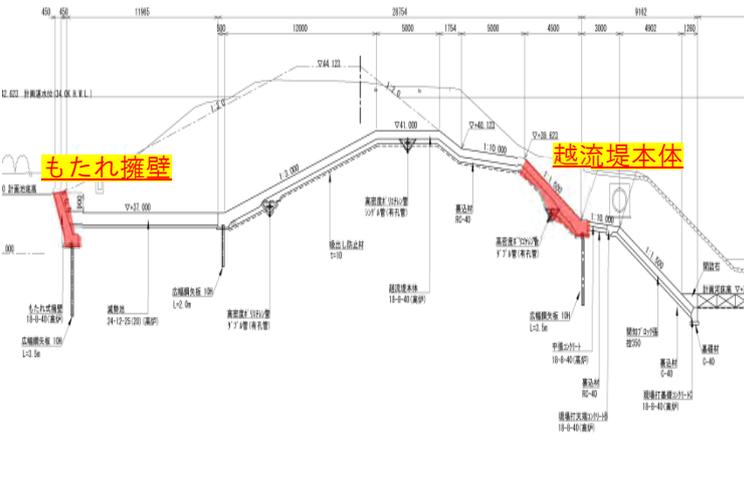

工事名 大和川保田遊水地越流堤他工事
 工種
 測点
 9月度現況写真

大和川保田遊水地水路整備他工事【(株)森下組】

工事概要

新規工事

○遊水地内の水路を整備する工事です。

A地区に**地下水対策工**として路盤整備までを行います。

○内水樋門からの水路をA地区の水路に接続する**導水路工**を施工します。

○**C地区**を**整地**し、**防災調整池**を設置します



地下水対策工

・砕石を敷きます

A地区

導水路工

- ・ICT重機を使用して掘削します
- ・ブロック積みを行い導水路を完成させます

B地区

整地

・基面の掘削及び整正をICT重機で行います

C地区

防災調整池

- ・基面の掘削及び整正をICT重機で行います
- ・砕石を敷均し転圧後、コンクリートを打設します

←大和川

令和6年10月24日撮影



【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
