

窪田遊水地工事ニュース

大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】



工事概要

令和 6 年 4 月以降も継続

- 川裏側は樋門本体中間部を優先し、鉄筋・型枠支保・コンクリート打設を順次行っています。
- 川表側は仮設ブロックマットを設置後、既設矢板取合部～順次本体工を施工します。



工事の流れ

川裏樋門・樋管本体工の施工箇所は以下の3Dイメージ内で赤で示している箇所です。


川表側は法面を保護するための仮設ブロックマットを設置し、均しコンクリートを打設します。既設鋼矢板と本体コンクリートの取合部には変位を吸収する役割を持たせたゴム板（可とう継手）を設置します。

その他、鋼矢板打設や沈下後の充填のためのグラウトホールを設置後、順次本体の施工を行います。

鉄筋組立状況（2月20日時点）



地盤改良・鉄筋組立状況（3月19日時点）

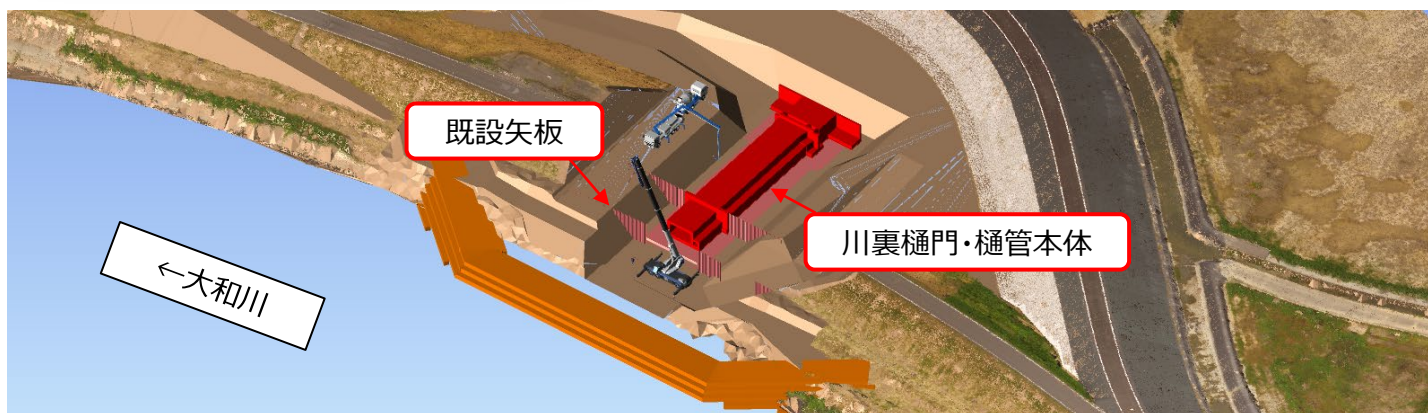

下記QRコードから施工状況の動画をご視聴ください。




3月19日時点



西名阪下道路拡幅工事について



- 西名阪下の町道拡幅工事のため御幸橋北詰～太子橋北詰間の通行止を行っております。
現水路の水の流れを止めないように管を設置し、埋戻しを行います。
- 既設舗装版の一部撤去・旧橋の撤去が完了しました。函渠工・埋戻し・擁壁を順次行います。

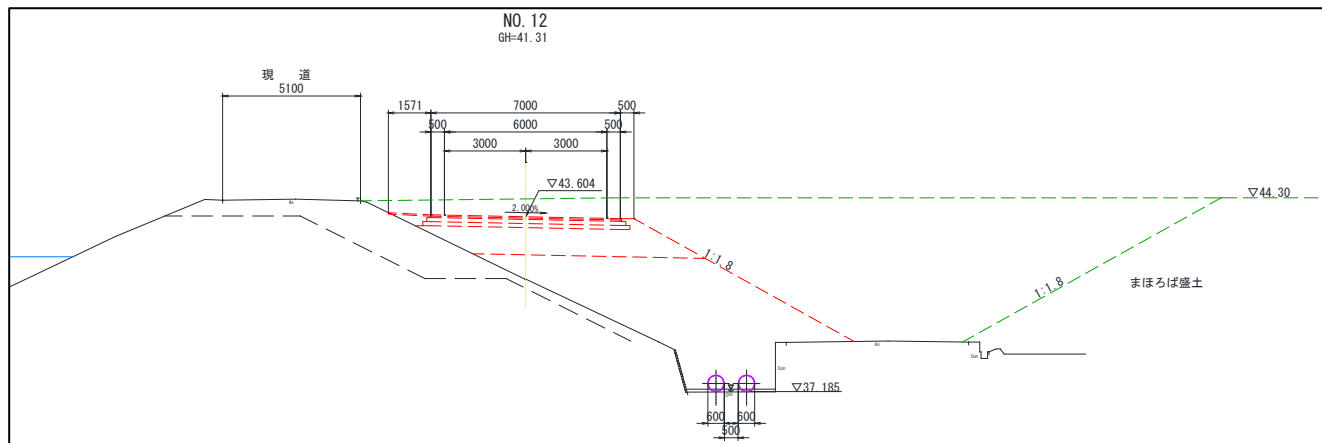

着手前



表土はぎ



掘削



旧橋撤去



町道・まほろば盛土について



- 4月から回転式破碎混合機を使用して遊水地仮置土砂の改質工事を行います。
- 混合機は3月末から搬入組立を行い、計測機器類の精度確認試験を行います。



回転式破碎混合機イメージ

【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
