祝 足羽川ダム　堤体打設 50万m3 達成！！

国土交通省
-足羽川ダム工事事務所-

R7.8.15

〇足羽川ダム本体建設工事は、令和４年11月19日に定礎式を挙行し、これまでコンクリート打設を進めてきました。

〇打設開始から約３年弱で打設量がついに大台の50万ｍ３（一般の25mプール1000杯分）を達成！地元（池田町役場）の皆様とともに、ダム本体工事が順調に進捗していることを確認しました。

〇50万m3は堤体積約67万m3に対して約75%の進捗となり、ダムの高さは96mのうち59mと約61%の進捗となります。

〇昨年度から実施しているRCD工法（スランプ０の硬練りコンクリート）による施工、受注者が開発したプレミアムベルコン（袋状ベルトコンベア）を用いた高速施工に加え、着岩部のRCD施工及び遅延材(打継目処理材)を用いた打設の工夫を行い、コンクリート打設の着実な進捗を図っております。

〇全盛期の今こそ、現場でしか体感できないものがあります！現場まで足を運ぶ価値はあります！終日開放している「ダム本体建設工事展望台」に是非お越し下さい！！

＜ダム断面図＞

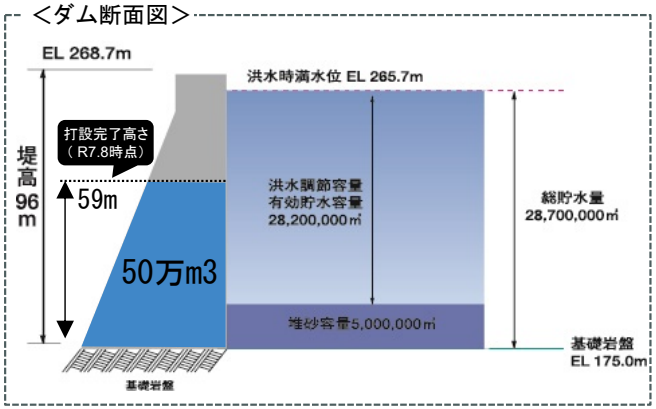

【問合せ先】
国土交通省　近畿地方整備局　足羽川ダム工事事務所
〒９１８－８２３９ 福井県福井市成和１－２１１１　ＴＥＬ　０７７６－２７－０６４２（代表）
