平成27年6月末　工事現場　永平寺大野道路（永平寺IC～上志比IC）

■位置図

■平面図

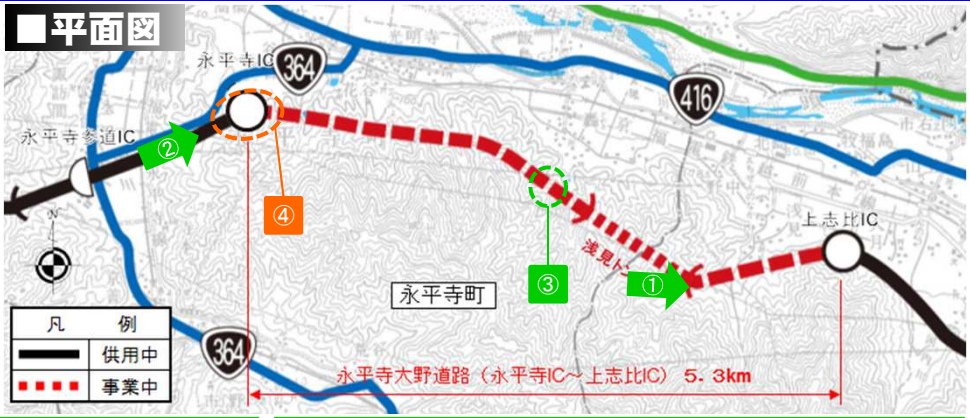

定点写真-1
浅見1号橋(仮称)

定点写真-2
永平寺IC

P1橋脚（西側）

P2橋脚（東側）

定点写真－3:轟4号橋（仮称）

・轟4号橋（仮称）
3径間連続ラーメン箱桁橋　橋長約216m

・張出し状況
P1橋脚（西側）：5/11ブロック（16．5m）
P2橋脚（東側）：4/11ブロック（13．0m）

※張出しは柱頭部からの長さ

Ⓐ

Ⓑ

写真－4:永平寺IC

Ⓐ永平寺IC周辺の改良工事の状況
福井県発注工事と調整しながら工事を進めています。

Ⓑ橋梁下部工事
橋台2基で長さ約20mの場所打杭を各12本ずつ施工します。
