資料2-1

【報告】
各機関の取組状況

令和7年1月20日

第8回熊野川流域治水協議会

区分	実施主体	対策内容	実施主体	流域治水プロジェクト 令和5年度までの取組状況 進捗状況 （1.着手済み、 2.検討中、 3.未着手）	流域治水プロジェクト 令和5年度までの取組状況 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）	流域治水プロジェクト2.0 令和6年度取組状況 進捗状況 （1.着手済み、 2.検討中、 3.未着手）	流域治水プロジェクト2.0 令和6年度取組状況 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）	流域治水プロジェクト2.0 令和7年度取組予定 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	三重県、和歌山県、紀南河川国道事務所	【洪水氾濫対策】 一級河川における改修（河道掘削、堤防強化、護岸整備、輪中堤　等）	三重県	1.着手済み	・河道掘削（板屋川・野添川・相野川・郷原川・那智川 16,660m^3） ・堤防強化（北山川　359.0m）	1.着手済み	・河道掘削（板屋川・野添川・相野川・郷原川・那智川 4,130m^3） ・堤防強化（北山川　60.0m）	・河道掘削（未定） ・堤防強化（北山川　60.0m）
			奈良県	1.着手済み	・河道の堆積土撤去（神納川、川原樋川）	1.着手済み	・河道の堆積土撤去（神納川、川原樋川）	・河道の堆積土撤去（神納川、川原樋川）
			和歌山県	1.着手済み	・輪中堤（熊野川日足地区/R4.12完成） ・輪中堤（熊野川能城山本地区） ・河道掘削2.7万m^3（熊野川本宮地区）	1.着手済み	・輪中堤（熊野川能城山本地区） ・河道掘削0.8万m^3（熊野川本宮地区）	・輪中堤（熊野川能城山本地区） ・河道掘削（熊野川本宮地区）
			紀南河川国道事務所	1.着手済み	・河道掘削（熊野川　鵜殿地区～阿須賀地区　V=120万m^3、鵜殿地区～相筋地区　V=500万m^3、あけぼの地区　河口砂州） ・護岸整備（相野谷川　鮒田地区～大里地区） ・耐震対策（相野谷川　鮒田地区～大里地区）	1.着手済み	・河道掘削（熊野川　新宮市熊野地～紀宝町鵜殿　V=54700m^3、新宮市あけぼの～紀宝町成川　V=16300m^3） ・護岸整備（相野谷川　紀宝町大里地先）	・河道掘削（熊野川　新宮市あけぼの～紀宝町成川　V=42200m^3） ・護岸整備（相野谷川　大里地先）
	熊野市	【洪水氾濫対策】 準用河川における改修（河道掘削　等）	熊野市	1.着手済み	―	1.着手済み	―	―
	三重県、奈良県、和歌山県、近畿中国森林管理局、津水源林整備事務所、和歌山水源林整備事務所、奈良水源林整備事務所	【流域の雨水貯留機能の向上】 森林整備	三重県	1.着手済み	・9箇所	1.着手済み	・3箇所	・4箇所
			奈良県	1.着手済み	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施	1.着手済み	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施
			和歌山県	1.着手済み	・森林整備155.11ha	1.着手済み	・森林整備 約150ha	・森林整備 約150ha
			近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署 三重森林管理署 奈良森林管理事務所	1.着手済み	【新宮市】 下刈8ha 【田辺市】 間伐76ha 【熊野市】 間伐104ha、除伐9ha 【天川村】 間伐32ha、下刈2ha 【野迫川村】 下刈2ha	1.着手済み	【新宮市】 下刈8ha 【田辺市】 間伐14ha 【熊野市】 間伐154ha 【天川村】 下刈2ha 【野迫川村】 下刈2ha	・検討中
			和歌山水源林整備事務所、津水源林整備事務所、奈良水源林整備事務所	1.着手済み	・新植事業22ha、保育事業729ha	1.着手済み	・新植事業29ha、保育事業663ha	・新植事業16ha、保育事業570ha
	三重県、奈良県、和歌山県、近畿中国森林管理局	【流域の雨水貯留機能の向上】 治山事業	三重県	1.着手済み	・1箇所	1.着手済み	・1箇所	・1箇所
			奈良県	1.着手済み	・別紙　流域治水対策における内訳（R7計画）のとおり	1.着手済み	・別紙　流域治水対策における内訳（R7計画）のとおり	・別紙　流域治水対策における内訳（R7計画）のとおり
			和歌山県	1.着手済み	・5箇所（山腹工、渓間工、地すべり防止工）	1.着手済み	・6箇所（山腹工、渓間工、地すべり防止工）	・6箇所（山腹工、渓間工、地すべり防止工）
			近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署 三重森林管理署 奈良森林管理事務所	1.着手済み	【田辺市】 山腹工(3)1.94ha、丸太筋工200m 【十津川村】 山腹工(7)3.71ha、渓間工3基 【天川村】 山腹工(1)0.30ha 【野迫川村】 山腹工(1)0.11ha	1.着手済み	【田辺市】 山腹工(2)0.65ha、渓間工1基、丸太筋工418m 【五條市】 山腹工(1)0.26ha 【十津川村】 山腹工(6)1.37ha、渓間工3基 【天川村】 山腹工(1)0.37ha 【野迫川村】 山腹工(1)0.20ha	・検討中
	三重県、奈良県、和歌山県、紀の川ダム統合管理事務所、電源開発(株)、関西電力(株) など	【流水貯留機能の拡大】 利水ダム等、事前放流の実施・体制構築	奈良県	1.着手済み	・ダム洪水調節機能協議会への参加	1.着手済み	・ダム洪水調節機能協議会への参加	・ダム洪水調節機能協議会への参加
			和歌山県	1.着手済み	・ダム洪水調節機能協議会への参加	1.着手済み	・ダム洪水調節機能協議会への参加	・ダム洪水調節機能協議会への参加
			紀の川ダム統合管理事務所	1.着手済み	・猿谷ダムにおいて試行運用を実施 ・9/1～15は容量確保のため貯水位426mを目標に管理 ・9/16～10/31は、洪水が予想される場合に事前放流を実施	1.着手済み	・猿谷ダムにおいて試行運用を実施	・引続き、猿谷ダムにおいうて試行運用を実施していく
			電源開発(株)	1.着手済み	・2012.6：自主的な取組み「暫定運用」を開始 ・2020.5：治水協定を締結（事前放流等は暫定運用の方法を継続）	1.着手済み	・池原ダム：8/24台風10号接近に伴い基準降雨量超過するもダム水位低く全量を貯留 ・風屋ダム：8/28台風10号接近に伴い基準降雨量超過するもダム水位低く全量を貯留	・事前放流等を継続して実施 ・毎年の運用を検証、課題整理・改善を継続
			関西電力(株)	1.着手済み	・令和2年5月：治水協定の締結 ・令和3年10月：奥吉野発電所治水協力実施要領を策定、提出 ・奥吉野発電所治水協力実施要領に基づく運用を実施	1.着手済み	・奥吉野発電所治水協力実施要領に基づく運用を実施 ・治水協力実績：1回（台風10号：令和6年8月30～31日）	・奥吉野発電所治水協力実施要領に基づく運用を継続実施

区分	実施主体	対策内容	実施主体	流域治水プロジェクト 令和5年度までの取組状況 進捗状況 （1.着手済み、 2.検討中、 3.未着手）	流域治水プロジェクト 令和5年度までの取組状況 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）	流域治水プロジェクト2.0 令和6年度取組状況 進捗状況 （1.着手済み、 2.検討中、 3.未着手）	流域治水プロジェクト2.0 令和6年度取組状況 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）	流域治水プロジェクト2.0 令和7年度取組予定 具体の内容 （整備箇所、整備数量、取組内容など）
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	三重県、奈良県、和歌山県、紀伊山系砂防事務所	【土砂災害対策】 砂防事業	三重県	1.着手済み	・8渓流で砂防堰堤の整備を行い、うち4渓流で整備が完成した。	1.着手済み	・桑谷川、雨東谷、西ノ谷、かぶち谷、原谷の5渓流で砂防堰堤の整備を行う。	・桑谷川、西ノ谷、かぶち谷、原谷の4渓流で砂防堰堤の整備を行う。
			奈良県	1.着手済み	・砂防事業：7件 ・地すべり対策事業：2件	1.着手済み	・砂防事業：7件 ・地すべり対策事業：2件	・砂防事業：7件 ・地すべり対策事業：2件
			和歌山県	1.着手済み	・砂防　萩の谷川(砂防堰堤1基）他10箇所 ・地すべり　伏拝地区(集水井2基）他1箇所	1.着手済み	・砂防　萩の谷川(砂防堰堤1基）他2箇所 ・地すべり　伏拝地区(集水井2基）	・砂防　栗須谷川(砂防堰堤1基）他2箇所 ・地すべり　伏拝地区(集水井2基）
			紀伊山系砂防事務所	1.着手済み	・赤谷地区、他8箇所 （完成：清水地区）	1.着手済み	・赤谷地区、他7箇所 （完成：赤谷地区）	・冷水地区、他6箇所
	奈良県	【土砂災害対策】 流木対策	奈良県	1.着手済み	・透過型堰堤：2基 ・流木捕捉工：1基	1.着手済み	・透過型堰堤：2基 ・流木捕捉工：1基	・透過型堰堤：2基 ・流木捕捉工：1基
	新宮市	【流域の雨水貯留機能の向上】 校庭貯留	新宮市	1.着手済み	・蓬莱グラウンド雨水貯留施設整備事業（工事） 箇所：新宮市徐福地内 内容：貯留面積A=3,500㎡ 貯留量V=1,050㎥（深さH=30cm）	2.検討中	・校庭貯留の候補地は検討しているもの、具体的な整備や時期が未確定	・校庭貯留の候補地は検討しているもの、具体的な整備や時期が未確定
	紀南河川国道事務所	【内水氾濫対策】 排水施設（排水機場等）の整備（増設）	紀南河川国道事務所	1.着手済み	・市田川排水機場増強完了	―	―	―
	新宮市	【内水氾濫対策】 雨水ポンプ場の整備	新宮市	1.着手済み	・市田川水系内水排水ポンプ整備事業 箇所：新宮市下田地内 能力2.0t/s（1.0t/s×2基） 内容：ポンプ場本体工事、機械・電気工事	1.着手済み	左記事業の本体工事、機械・電気・舗装工事	・ポンプ場の運用開始予定
被害対象を減少させるための対策	紀宝町、田辺市、新宮市	【水災害ハザードエリアにおける 土地利用・住まい方の工夫】 土地利用規制・誘導（災害危険区域等）	紀宝町	1.着手済み	・相野谷川流域の一部に災害危険区域を指定し、出水による災害を未然に防止するため、建築制限を行っている	1.着手済み	・相野谷川流域の一部に災害危険区域を指定し、出水による災害を未然に防止するため、建築制限を行っている	・相野谷川流域の一部に災害危険区域を指定し、出水による災害を未然に防止するため、建築制限を行っている
			田辺市	1.着手済み	・田辺市本宮地内に災害危険区域を指定し、建築制限を行っている	1.着手済み	・田辺市本宮地内に災害危険区域を指定し、建築制限を行っている	・田辺市本宮地内に災害危険区域を指定し、建築制限を行っている
			新宮市	1.着手済み	・平成25年度に熊野川出水災害危険区域に関する条例及び規則を作成、熊野川町の一部を災害危険区域（35.22ha）とし、基準高を定めた	1.着手済み	・平成25年度に熊野川出水災害危険区域に関する条例及び規則を作成、熊野川町の一部を災害危険区域（35.22ha）とし、基準高を定めた	・平成25年度に熊野川出水災害危険区域に関する条例及び規則を作成、熊野川町の一部を災害危険区域（35.22ha）とし、基準高を定めた
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	紀宝町	【避難体制等の強化】 地区タイムラインの活用	紀宝町	1.着手済み	・紀宝町タイムライン始動と同時に、5地区11組織の地区タイムラインが始動し、早期避難も含めた防災行動を行っている	1.着手済み	・紀宝町タイムライン始動と同時に、5地区11組織の地区タイムラインが始動し、早期避難も含めた防災行動を行っている	・紀宝町タイムライン始動と同時に、5地区11組織の地区タイムラインが始動し、早期避難も含めた防災行動を行っている
	熊野市、紀宝町、五條市、新宮市、三重県、奈良県、和歌山県、紀南河川国道事務所、津地方気象台、奈良地方気象台、和歌山地方気象台	【避難体制等の強化】 防災教育・啓発活動等の推進	熊野市	1.着手済み	・デジタル式防災行政無線の整備 ・板屋川、熊野川、井戸川流域の住民に防災講話やワークショップを実施し一人ひとりの避難行動計画を作成した	1.着手済み	・デジタル式防災行政無線の運用開始 ・大又川流域住民に防災講話、ワークショップを実施	・デジタル式防災行政無線の運用 ・防災講話、訓練の実施
			紀宝町	1.着手済み	・紀南PTA連合会による防災学習会において、紀伊半島大水害の被害状況などに関するパネル展示を実施	1.着手済み	・各団体の総会や各小中学校の学年単位において、防災に関する講演会や学習会などを実施	・各団体の総会や各小中学校の学年単位において、防災に関する講演会や学習会などを実施
			五條市	1.着手済み	・市内の小中学生を対象に平成23年紀伊半島大水害被災地の視察及び被害の大きさを学ぶ防災学習を実施	1.着手済み	・五條市内の小中学生を対象に平成23年紀伊半島大水害被災地の視察及びその時実際に対応をした方を招いて防災学習を実施	・継続実施
			田辺市	1.着手済み	・各種団体からの希望に応じ防災学習会を実施	1.着手済み	・各種団体からの希望に応じ防災学習会を実施	・各種団体からの希望に応じた防災学習会等の実施
			新宮市	1.着手済み	・小中学校への出前講座の実施。学校教育防災ワーキング会議の実施	1.着手済み	・小中学校への出前講座の実施。学校教育防災ワーキング会議の実施	・小中学校への出前講座の実施。学校教育防災会議の実施
			北山村	1.着手済み	・9月1日に実施	1.着手済み	・防災講演会等を実施	・継続して防災講演会等を実施
			三重県	1.着手済み	・出前講座等による防災知識の普及啓発を実施した	1.着手済み	・出前講座等による防災知識の普及啓発を実施した	・出前講座等による防災知識の普及啓発を継続して実施予定
			奈良県	1.着手済み	・出前講座等による防災知識の普及啓発や防災訓練等を継続して実施	1.着手済み	・自主防犯・防災リーダー研修等による防災知識の普及啓発や防災訓練等を実施	・自主防犯・防災リーダー研修等による防災知識の普及啓発や防災訓練等を継続して実施

区分	実施主体	対策内容	流域治水プロジェクト		流域治水プロジェクト2.0		
			令和5年度までの取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定
			実施主体	進捗状況（1.着手済み、2.検討中、3.未着手）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）	進捗状況（1.着手済み、2.検討中、3.未着手）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	熊野市、紀宝町、五條市、新宮市、三重県、奈良県、和歌山県、紀南河川国道事務所、津地方気象台、奈良地方気象台、和歌山地方気象台	【避難体制等の強化】 防災教育・啓発活動等の推進	和歌山県	1.着手済み	・地域防災リーダー育成のための「紀の国防災人づくり塾」において、洪水・土砂災害対策に係る講義を実施(和歌山市、那智勝浦町) ・警察及び消防、小中学校等での防災授業を実施	1.着手済み	・地域防災リーダー育成のための「紀の国防災人づくり塾」において、洪水・土砂災害対策に係る講義を実施(田辺市) ・警察及び消防、小中学校等での防災授業を実施	・地域防災リーダー育成のための「紀の国防災人づくり塾」において、洪水・土砂災害対策に係る講義を実施 ・警察及び消防、小中学校等での防災授業を実施
			紀南河川国道事務所	1.着手済み	・R5.12.6熊野川中学校防災授業実施 ・事務所HPにて、自助・共助・公助のオンライン学習動画等を公開中	1.着手済み	・R6.11.14熊野川中学校防災授業実施予定 ・事務所HPにて、自助・共助・公助のオンライン学習動画等を公開中	・継続実施
			津地方気象台	1.着手済み	・自治体職員対象の気象防災ワークショップの実施 ・紀宝町タイムラインに伴う連携会議にて気象解説の実施 ・三重県民生委員児童委員協議会の会長研修会や三重県聴覚障害者協会主催のイベントにおいて、防災情報の利活用に関する講話の実施 ・三重県内の小中高における出前講座の実施	1.着手済み	・自治体職員対象の気象防災ワークショップの実施 ・紀宝町タイムラインに伴う連携会議にて気象解説の実施 ・三重県民生委員児童委員協議会の会長研修会や三重県聴覚障害者協会主催のイベントにおいて、防災情報の利活用に関する講話の実施 ・鉄道事業者への出前講座や勉強会の実施（伊勢鉄道、三岐鉄道、四日市あすなろう鉄道） ・三重県内の小中高における出前講座の実施	・自治体職員対象の気象防災ワークショップを実施する予定 ・必要に応じて、紀宝町タイムラインに伴う連携会議にて気象解説を実施する予定 ・要配慮者等に対して、防災情報の利活用に関する普及・啓発活動を実施する予定 ・鉄道事業者への出前講座や勉強会を実施する予定 ・三重県内の小中高における出前講座を実施する予定
			奈良地方気象台	1.着手済み	・教職員や自治体担当者向けの防災気象情報の解説	1.着手済み	・5月に県内防災担当職員や課長級職員に対する防災気象情報の解説をオンラインで実施	・自治体担当者向けの勉強会を実施 ・出前講座や自治体独自のケーブルテレビを用いた防災教育、気象情報の普及啓発を実施
			和歌山地方気象台	1.着手済み	・あらゆる機会をとらえて、啓発活動を実施した	1.着手済み	・あらゆる機会をとらえて、啓発活動を実施している	・引き続き、防災教育・啓発活動等を推進していく
	三重県、奈良県、和歌山県	【土地の水災害リスク情報の充実】 水害リスク空白域の解消	三重県	1.着手済み	・熊野川流域の全ての県管理河川について洪水浸水想定区域図の指定・公表	1.着手済み	―	―
			奈良県	1.着手済み	・中小河川の浸水想定区域図の作成・公表	1.着手済み	・洪水浸水想定区域図閲覧システムの構築・公表	・ハザードマップ作成について流域市町村への働きかけ
			和歌山県	1.着手済み	・新宮川水系21の中小河川を含む県内428の中小河川について洪水浸水想定区域図を公表する	1.着手済み	・新宮川水系21の中小河川を含む県内428の中小河川洪水浸水想定区域図を基に、8市町（新宮市など）がハザードマップを作成できるよう調整を行う	・新宮川水系21の中小河川を含む県内428の中小河川洪水浸水想定区域図を基に、残りの22市町村がハザードマップを作成できるよう調整を行う
	熊野市、紀宝町、田辺市、新宮市	【避難体制等の強化】 洪水ハザードマップの作成・周知及び住民の水害リスクに対する理解促進の取組	熊野市	1.着手済み	・井戸川、産田川・志原川、熊野川・板屋川・熊野宮川・里川・久保川・湊川・大又川・湯谷川・相ヶ谷川・小又川版洪水ハザードマップの作成・周知（HP含む）	1.着手済み	・洪水ハザードマップの周知（HP含む）	・洪水ハザードマップの周知（HP含む）
			紀宝町	1.着手済み	・熊野川、相野谷川、井田川、神内川の洪水ハザードマップの作成・周知（HP含む）	1.着手済み	・熊野川、相野谷川、井田川、神内川の洪水ハザードマップの作成・周知（HP含む）	・熊野川、相野谷川、井田川、神内川の洪水ハザードマップの作成・周知（HP含む）
			田辺市	1.着手済み	・田辺市水防計画（令和5年3月（改訂版）の策定 ・田辺市浸水実績図の作成（令和4年3月）	3.未着手	・具体的な取組はなし	・必要に応じた各種マップ等の作成及び周知等
			新宮市	1.着手済み	・出前講座の実施、家具転倒防止器具取付時の職員による自宅のリスク説明の実施	1.着手済み	・出前講座の実施、家具転倒防止器具取付時の職員による自宅のリスク説明の実施	・出前講座の実施、家具転倒防止器具取付時の職員による自宅のリスク説明の実施
	流域の県・市町村	【避難体制等の強化】 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保	熊野市	1.着手済み	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成及び避難訓練の実施	1.着手済み	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成及び避難訓練の実施	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成及び避難訓練の実施
			紀宝町	1.着手済み	・該当する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成済 ・計画に基づく避難訓練の実施	1.着手済み	・該当する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成済 ・計画に基づく避難訓練の実施	・該当する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成済 ・計画に基づく避難訓練の実施
			御浜町	1.着手済み	・避難確保計画に基づく避難訓練を促進する	1.着手済み	・避難確保計画に基づく避難訓練を促進する	・避難確保計画に基づく避難訓練を促進する
			天川村	3.未着手	―	3.未着手	―	・具体的な策定に向けて事務的に検討していく
			田辺市	1.着手済み	要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施	1.着手済み	要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施	要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施
			新宮市	1.着手済み	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施	1.着手済み	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施	・要配慮者利用施設での避難確保計画の作成、避難訓練の実施

区分	実施主体	対策内容	流域治水プロジェクト			流域治水プロジェクト2.0		
			令和5年度までの取組状況			令和6年度取組状況		令和7年度取組予定
			実施主体	進捗状況（1.着手済み、2.検討中、3.未着手）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）	進捗状況（1.着手済み、2.検討中、3.未着手）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）	具体の内容（整備箇所、整備数量、取組内容など）
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	流域の県・市町村	【避難体制等の強化】 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保	北山村	3.未着手	―	1.着手済み	・要援護者の避難について自治会と協議	・避難確保計画に基づく避難訓練を実施する
			三重県	1.着手済み	・要配慮者利用施設における避難確保計画作成支援	1.着手済み	・要配慮者利用施設における避難確保計画作成支援	・要配慮者利用施設における避難確保計画作成支援
			和歌山県	1.着手済み	・市町村地域防災計画に要配慮者利用施設が記載されていない場合は、適宜指導を行った ・市町村に対し、半年に一度避難確保計画、避難訓練の実施状況の調査を行い、避難確保計画の作成等を促した	1.着手済み	・市町村地域防災計画に要配慮者利用施設が記載されていない場合は、適宜指導を行った ・市町村に対し、半年に一度避難確保計画、避難訓練の実施状況の調査を行い、避難確保計画の作成等を促した	・市町村地域防災計画に要配慮者利用施設が記載されていない場合は、適宜指導を行う ・市町村に対し、半年に一度避難確保計画、避難訓練の実施状況の調査を行い、避難確保計画の作成等を促す
	三重県	排水ポンプ車の配備・運用 【新規】	三重県	1.着手済み	三重県では、洪水が発生した際浸水被害を防止する際には、国土交通省所有排水ポンプ車の運用を依頼していた。しかし、三重県の南部である東紀州地域（紀宝町除く）や伊勢志摩地域での配備はないことから、この地域は空白地域となっていた。そのため、三重県で1台排水ポンプ車を購入して東紀州地方をカバーするため、三重県尾鷲庁舎に1台配備し、今年度の出水に備えている。	1.着手済み	三重県では、洪水が発生した際浸水被害を防止する際には、国土交通省所有排水ポンプ車の運用を依頼していた。しかし、三重県の南部である東紀州地域（紀宝町除く）や伊勢志摩地域での配備はないことから、この地域は空白地域となっていた。そのため、三重県で1台排水ポンプ車を購入して東紀州地方をカバーするため、三重県尾鷲庁舎に1台配備し、今年度の出水に備えている。	来年度は、もう一台三重県伊勢庁舎へ配備することで、さらなる浸水被害防止対策を強化する。
グリーンインフラの取組	紀南河川国道事務所	河口干潟の保全、礫河原の保全、権現河原の歴史景観保全	紀南河川国道事務所	1.着手済み	・河川改修事業において保全	1.着手済み	・河川改修事業において保全	・河川改修事業において保全
	新宮市、紀南河川国道事務所	新宮地区かわまちづくり（池田港地区）（整備済）	紀南河川国道事務所	1.着手済み	・更なる利活用の検討	1.着手済み	・更なる利活用の検討	・更なる利活用の検討
	紀南河川国道事務所	堤防除草における刈草の有効活用	紀南河川国道事務所	1.着手済み		1.着手済み		・継続実施
	和歌山水源林整備事務所、津水源林整備事務所、奈良水源林整備事務所	水源林造成事業による森林の整備・保全	和歌山水源林整備事務所、津水源林整備事務所、奈良水源林整備事務所	1.着手済み	・間伐事業188ha	1.着手済み	・間伐事業227ha	・間伐事業135ha
	奈良県	森林整備による多面的機能（水源涵養・生物多様性）の保全	奈良県	1.着手済み	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施	1.着手済み	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施	・北山・十津川地域における間伐等の森林整備を実施
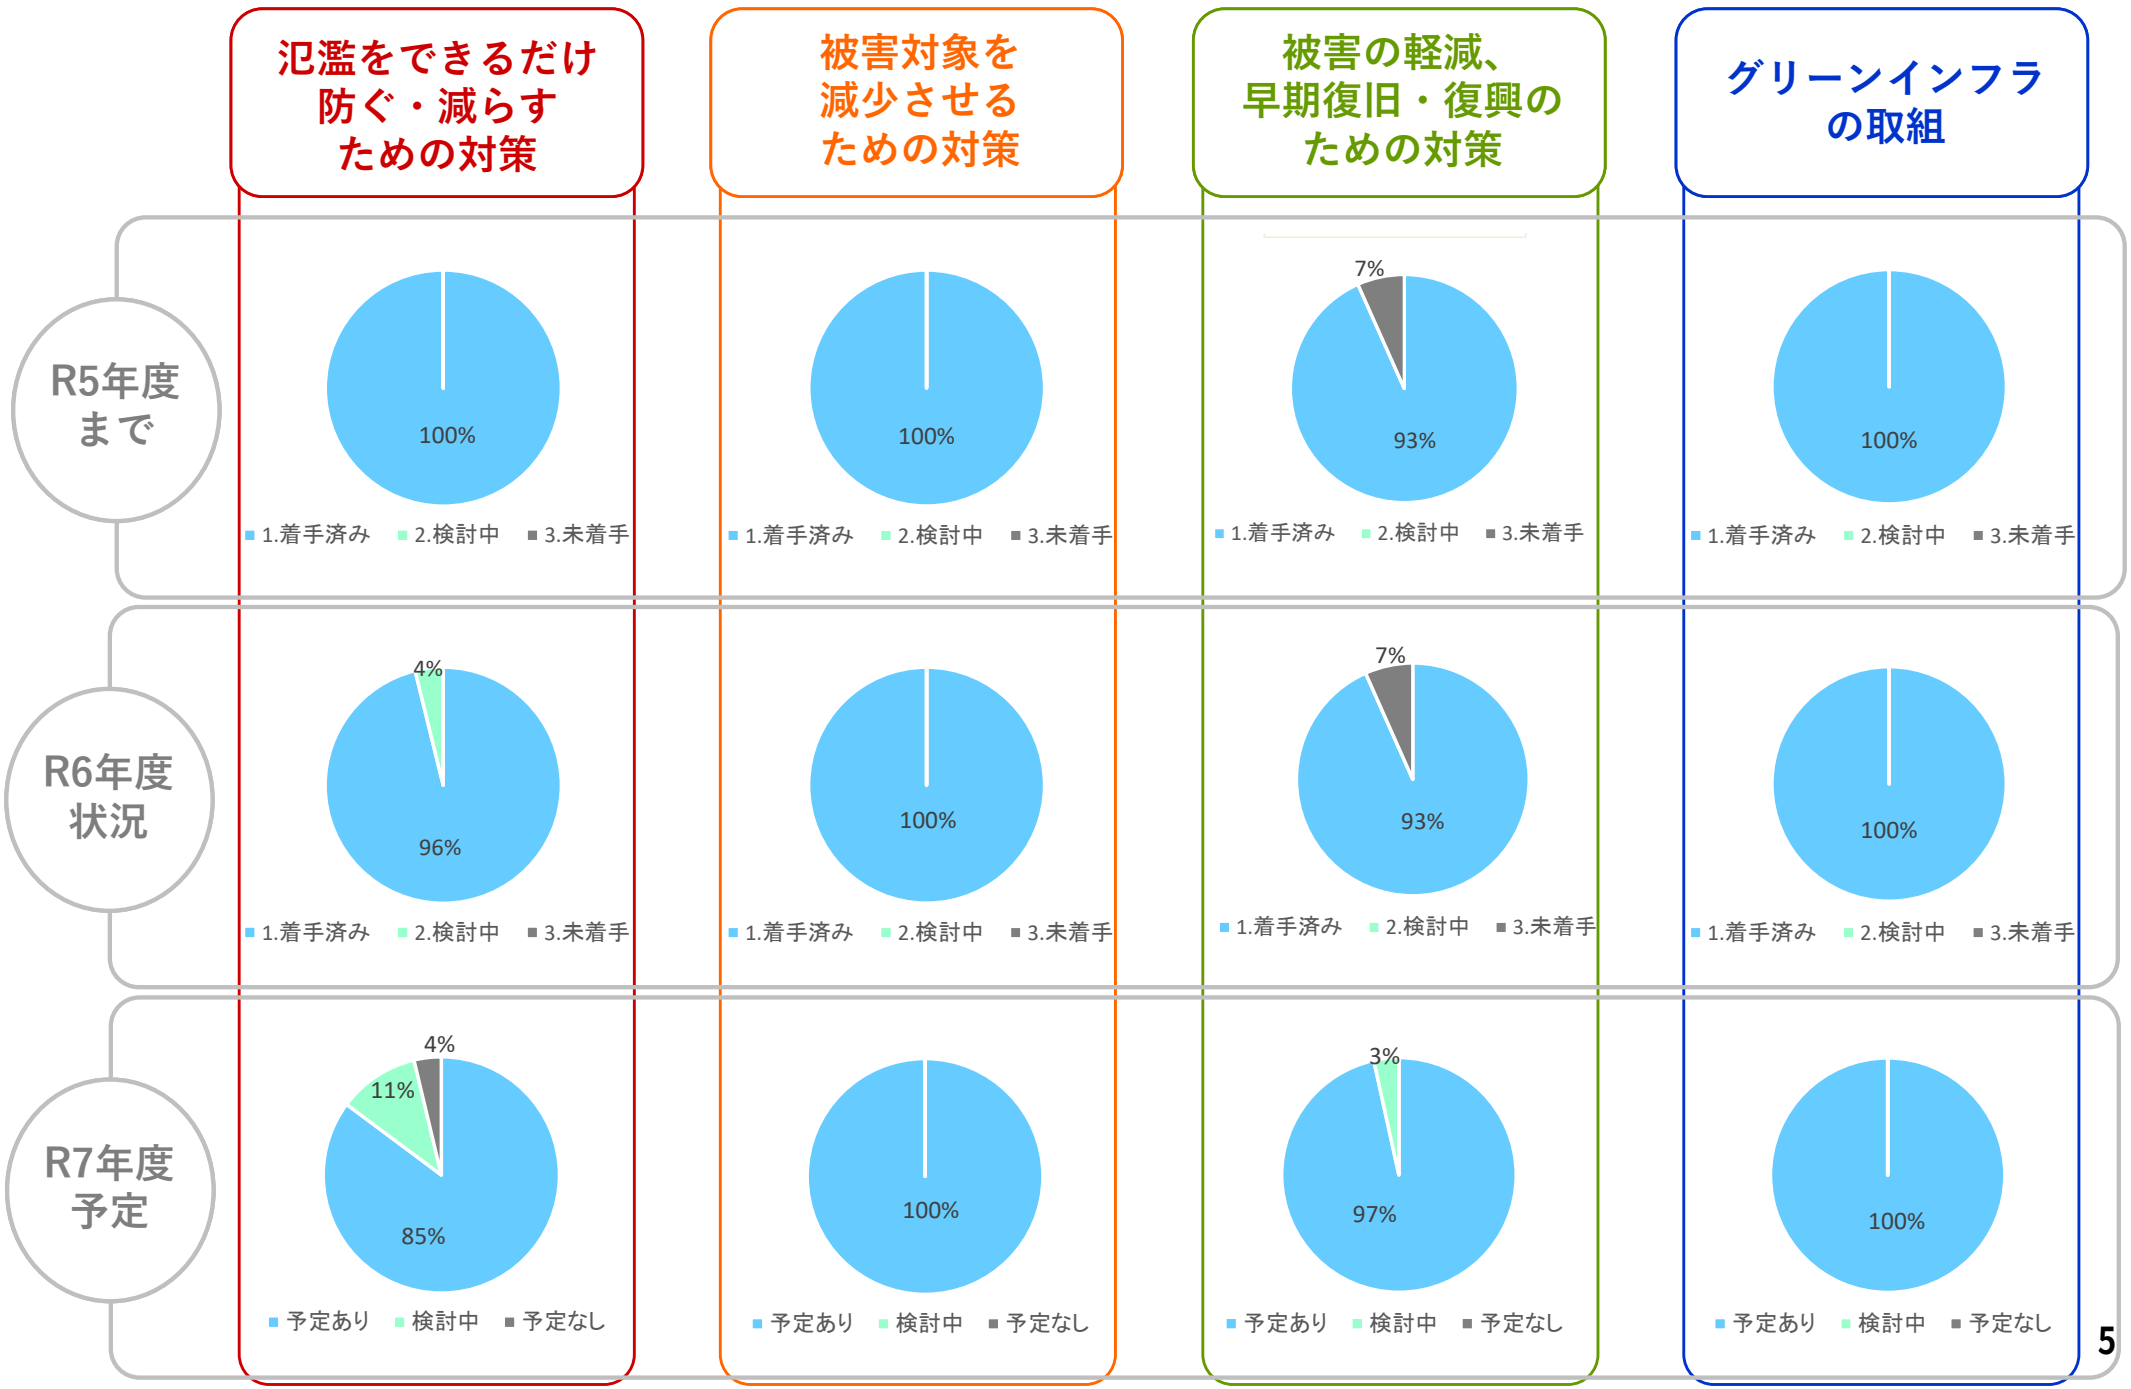
熊野川水系流域治水プロジェクト　取組状況（令和6年10月時点）
