2026．11 第 41 号

窪田遊水地工事ニュース

HPでも閲覧できます

〇窪田遊水地の工事進捗を視覚的に把握いただくため、第36号よりドローンによる空撮写真を掲載しています！

全景（大和川側）



全景（岡崎川側）




R8大和川窪田遊水地越流堤他工事【　株木建設㈱　】



工事概要

・洪水時に、水をためて下流へ流れる水量や内水を減らすための遊水地の越流堤工事とそれに伴う諸工事を行います。
・今月は、工事を進めるための準備を行っています。

断面図

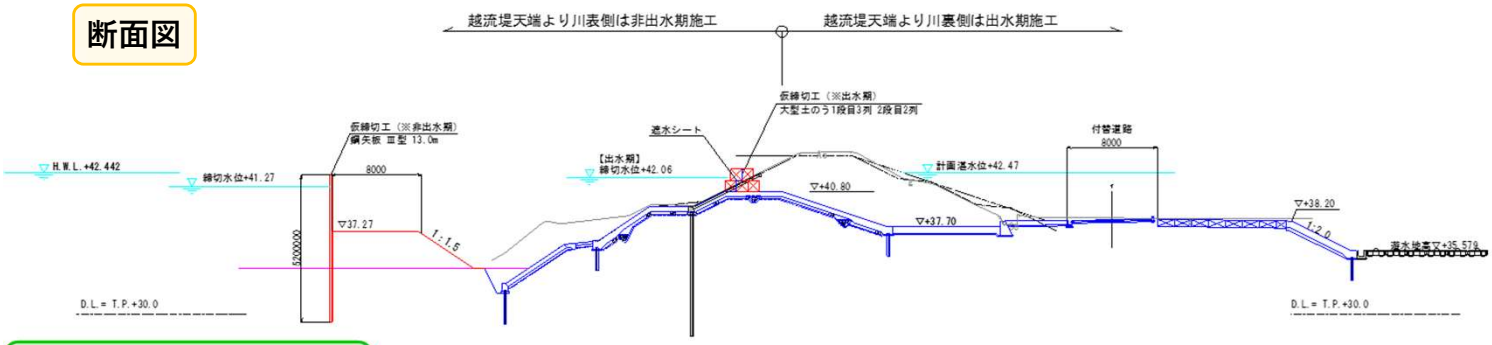

主な作業内容

①仮設工
川の仮締切や仮設道路を作ります。

②護岸・基礎工
現堤防の掘削・越流堤の築堤・法面の防護等を作ります。

③付帯道路工
越流堤の築堤にともなう道路を作ります。

R7大和川窪田遊水地掘削他工事 【株式会社　城内組】

掘削工（ICT）　緑の着色範囲で掘削が完了しています。





迂回道路撤去工完了



水路工（1）完了



北側樋門・翼壁工





工事の進捗

令和8年11月10日時点の進捗

〇掘削工（ICT）
約31,000m3/41,000m3完了。


〇迂回道路撤去工
27,000m3/27,000m3完了。

〇水路工（1）
260m/260m完了。

〇北側樋門 翼壁工
土留･仮締切工 鋼矢板打設。

Ｒ７大和川窪田遊水地北側周囲堤他工事【株式会社　城内組】

盛土工の進捗

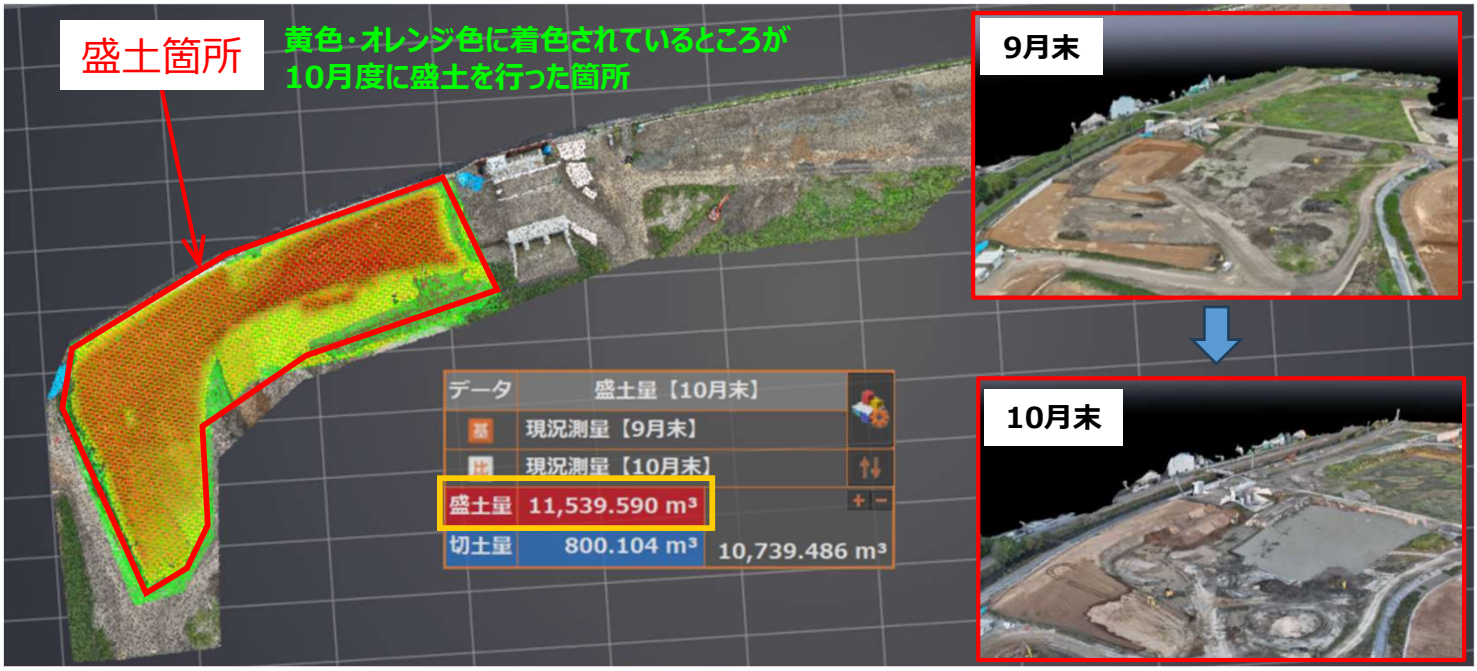

河川土工（盛土工ICT）





樋門上部の盛土





工事の進捗

令和8年10月末日時点での進捗

〇河川土工（盛土工ICT）


約23,250m3/46,000m3完了（10月度：11540m3）

〇樋門上部の盛土(施工完了)

盛土工：1,200m3/1,200m3完了

大型土のう：製作：150袋/150袋完了、 設置150袋/150袋完了

R7大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事【奥村組土木興業㈱】

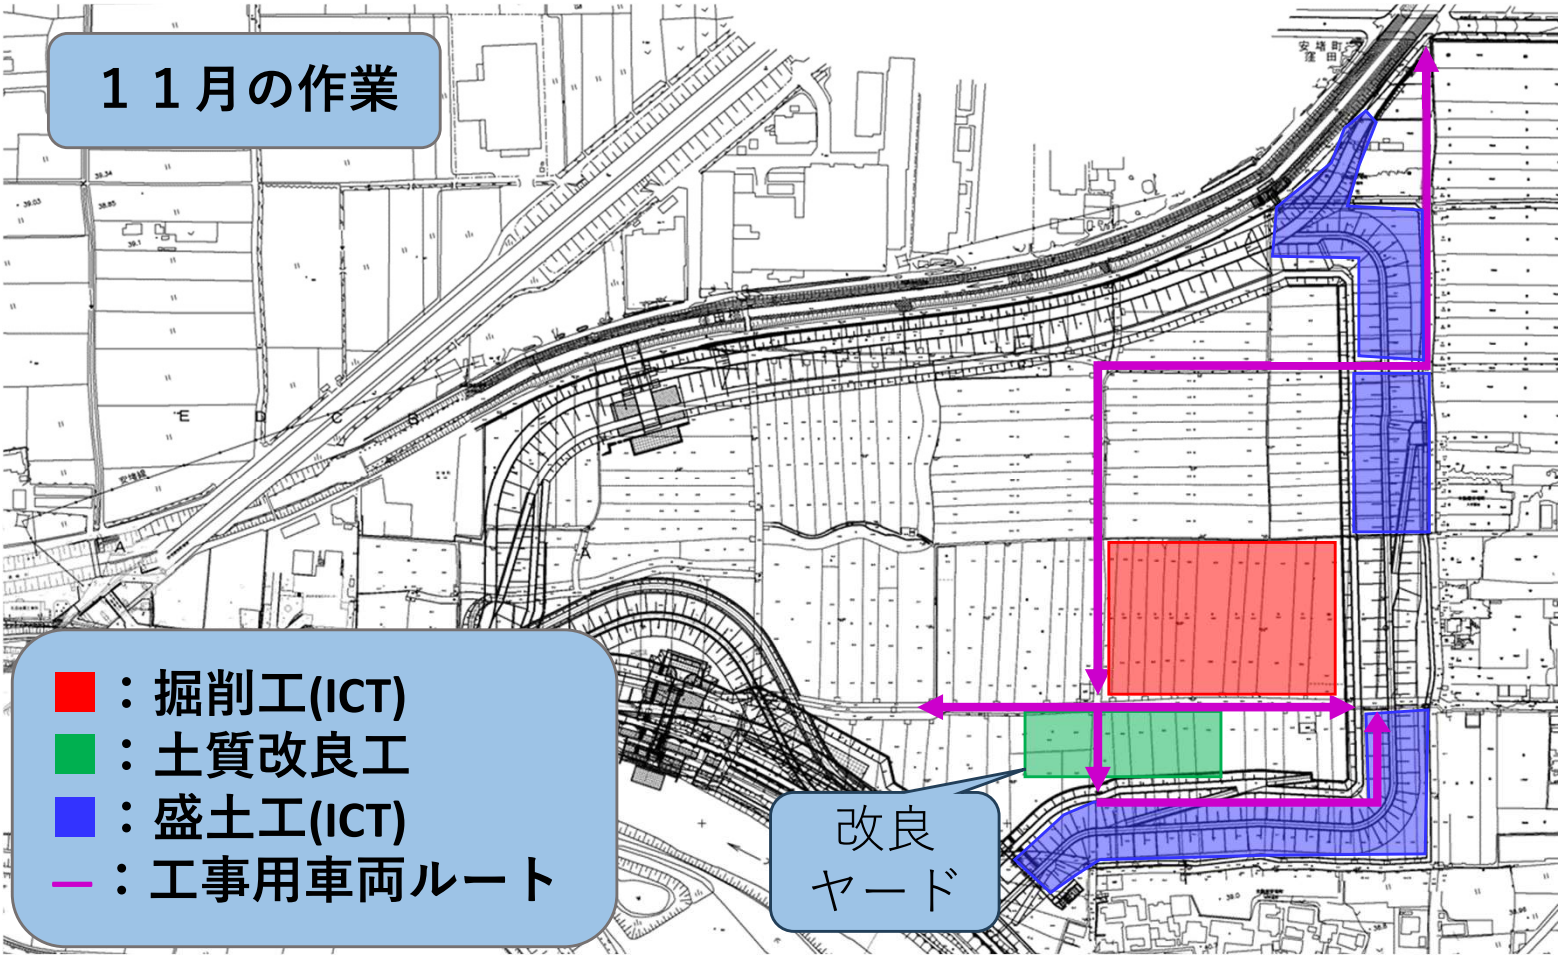

工事概要

★10月に引き続き掘削した土を改良ヤードに運搬します。
★改良した土を盛土場へ運搬、転圧します。



進捗状況写真(前回)




進捗状況写真(今回)

R7大和川窪田遊水地内水取込樋門発電機棟他新築工事【昌栄建設㈱】

12月の工事内容

①排水樋門上屋
完了
②発電機棟
完了、検査

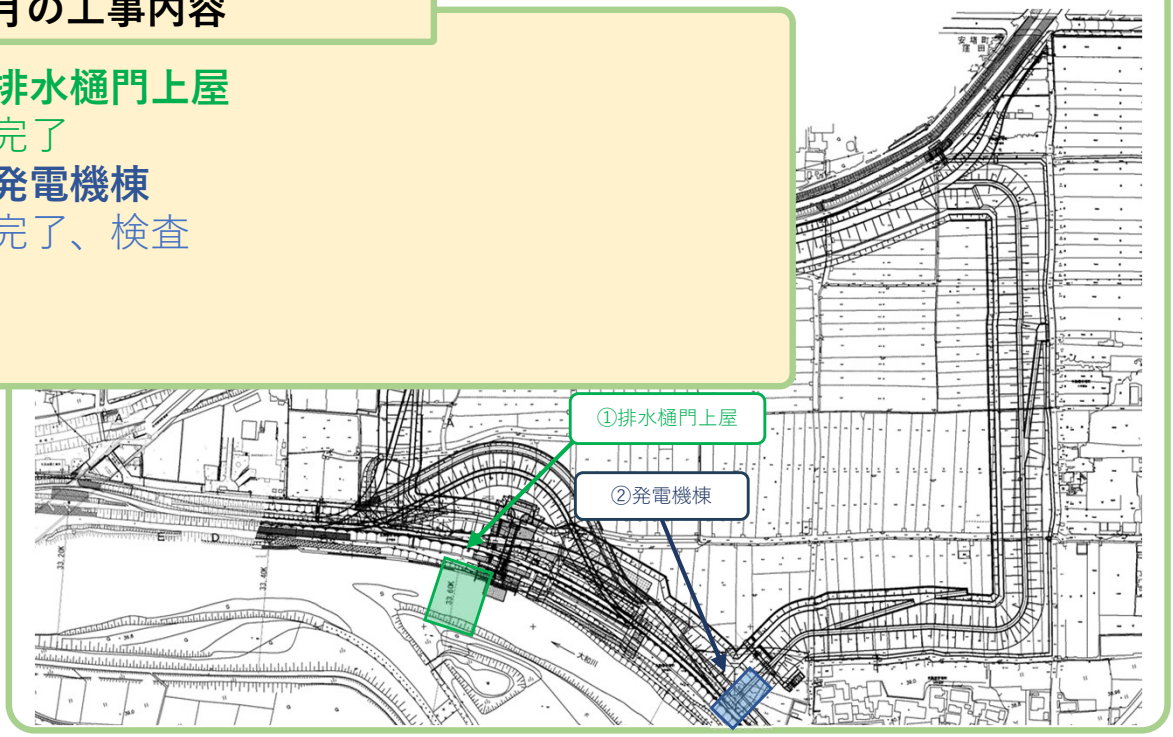

工事の進捗

排水樋門上屋

建築工事完了しました。
設備工事の関係で足場は残っております。





発電機棟

外部壁の左官が終わりました。この後屋根の取付を行い、外壁の塗装をします。
内装は断熱材の張り付けが終わったので、土間コンクリートを打ったあと、塗床をします。



