【すさみ串本道路工事進捗状況】令和6年12月31日時点

①すさみ町江住（小河谷川橋）

②すさみ町里野（里野西池川橋）

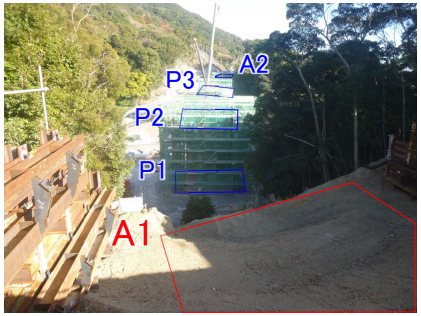

③ すさみ町里野（小河瀬谷川橋）

・A1橋台掘削中（R6年7月）、地盤のひび割れを発見し、A1橋台の工事を中断
・地盤調査（ボーリング調査）を実施のうえ対策工法を検討した結果、直接基礎から杭基礎（深礎杭）へ構造変更。現在、修正設計中。

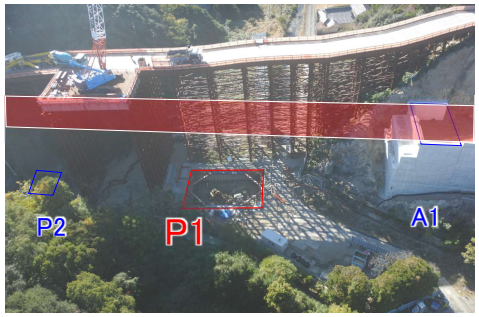

④串本町和深（安指川橋）

・P1橋脚場所打ち杭掘削中（R6年4月）、多数の硬質岩が出現し、時間を要したが硬質岩の対策が完了

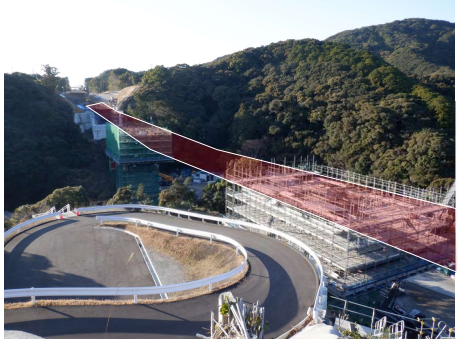

⑤串本町田子（田子川橋）

⑥ 串本町田並（田並川橋）

⑦串本町有田（大山口川橋）

⑧串本町鬮野川（鬮野川橋）

紀南河川国道事務所
