【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 ー 令和８年度の主な作業内容ー①

全体工程

※工程精査中

年目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度

福駅側（西淀川区）
淀川橋梁部
橋梁上線路切替
伝法駅側（此花区）

（凡例）
- 用地測量・取得・借地
- 河川内橋脚、高架橋等
- 河川内橋梁（上部工）
- 撤去工事（旧鉄道施設）

仮上り線切替
仮下り線切替
計画下り線切替
計画上り線切替


上り線：大阪難波行
下り線：尼崎行


各工区の工事

令和８年度の主な作業内容

1工区　淀川北岸線付近から福駅西踏切まで
　躯体構築工、PC桁扛上工など
2工区　福駅西踏切から淀川右岸まで
　場所打ち杭工、躯体構築工、
　福駅建築設備工など
3工区　淀川右岸から河川中心まで
　上部工架設工など
4工区　河川中心から淀川左岸まで
　上部工架設工など
5工区　淀川左岸から正蓮寺川まで
　躯体構築工、PC桁架設工
　伝法駅建築設備工など

工区割り図



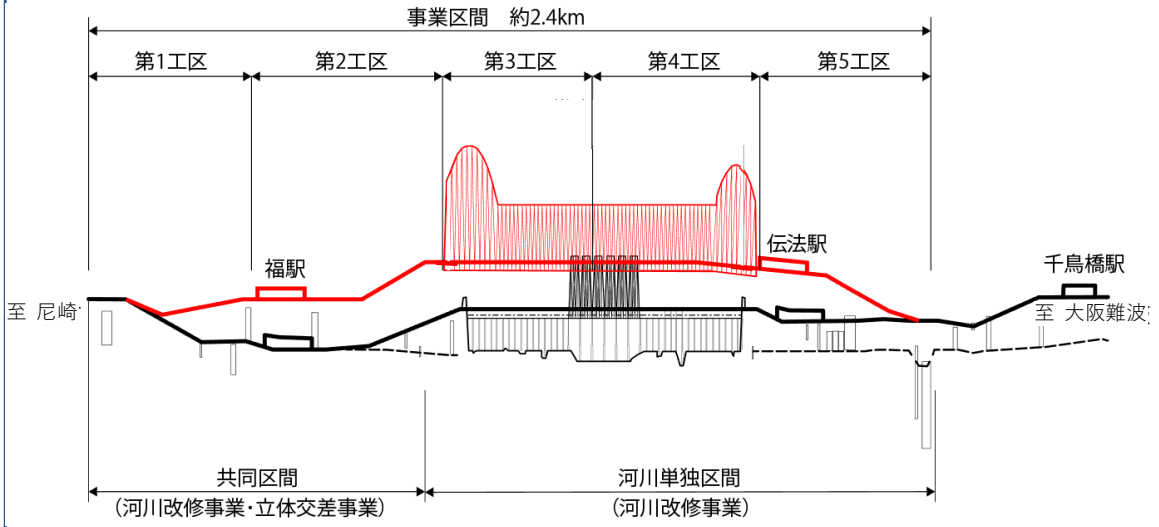


【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 ー 令和８年度の主な作業内容ー②

令和８年度の工事内容

１工区　尼崎方取付部から福駅西方まで
躯体構築工、PC桁扛上工など


２工区　福駅部から淀川右岸まで
場所打ち杭工、躯体構築工、
福駅建築設備工など

計画線平面図

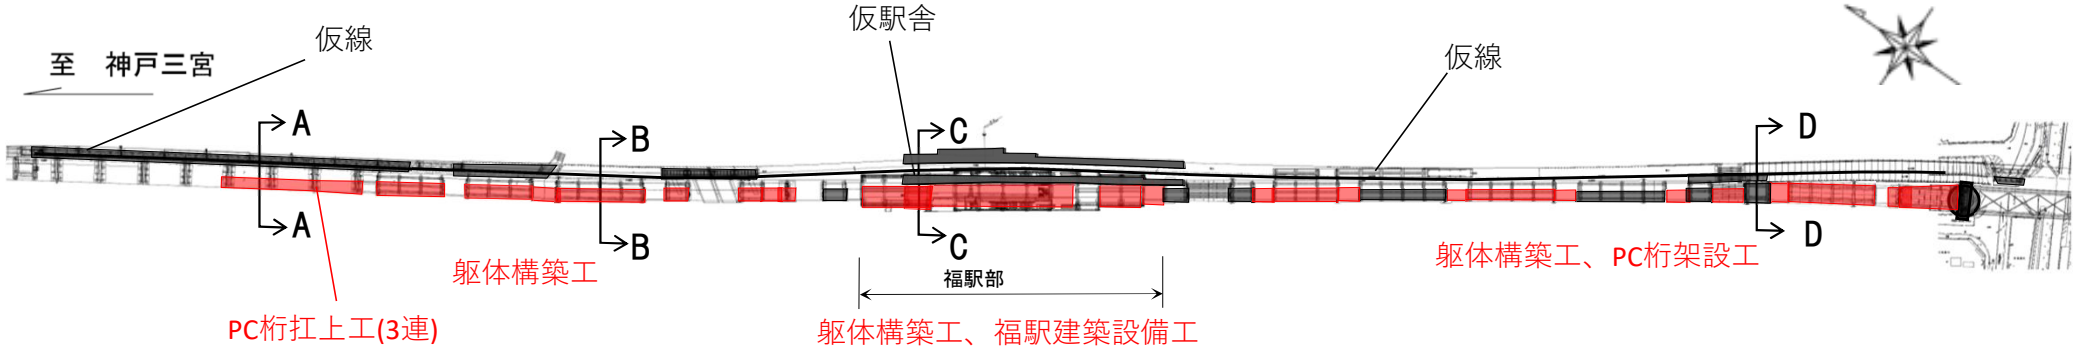


計画線断面図


A-A

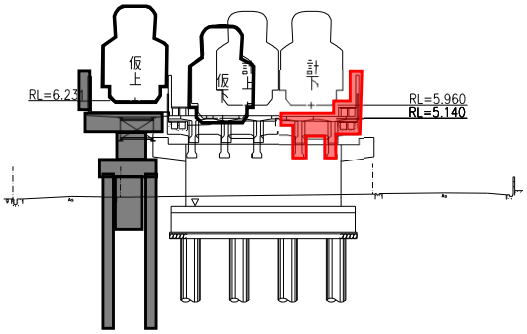

B-B

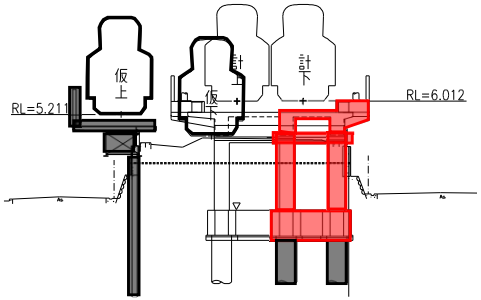


C-C

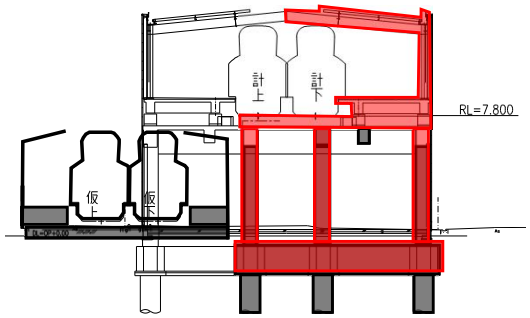

福駅

D-D

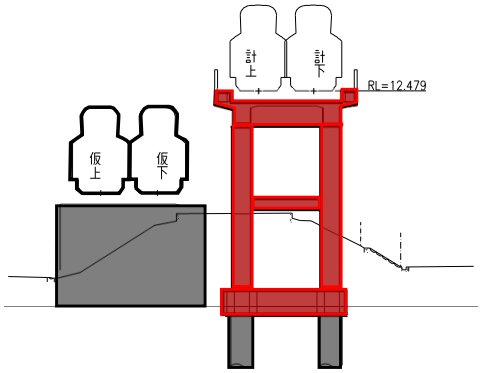

令和7年度まで施工

令和8年度施工


【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 ー 令和８年度の主な作業内容ー③

令和８年度の工事内容


3工区　淀川右岸から河川中心まで
上部工架設工など

4工区　河川中心から淀川左岸まで
上部工架設工など

平面図

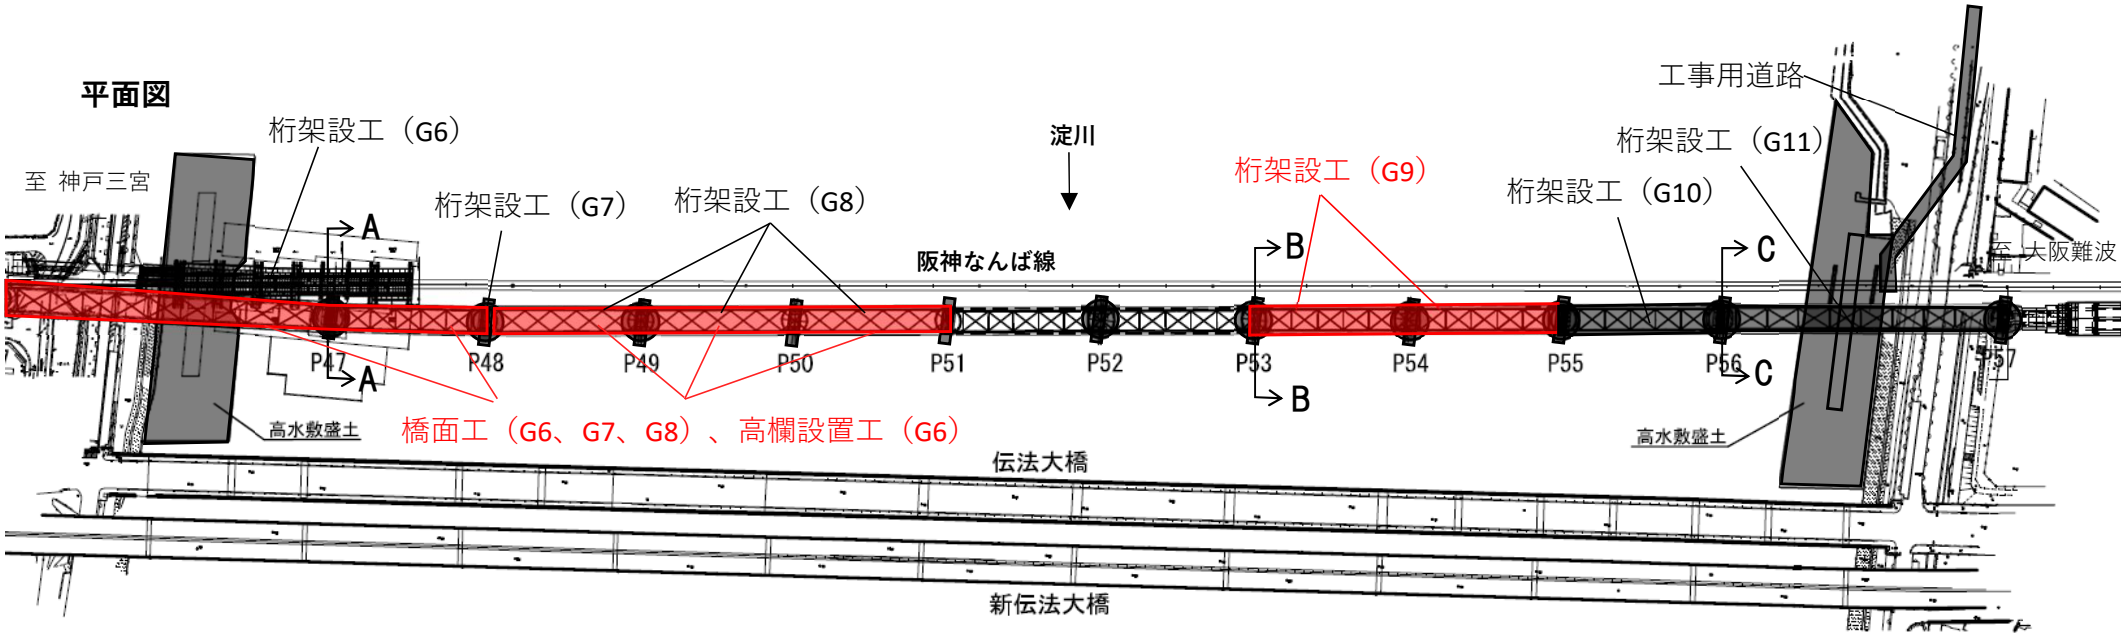


本線断面

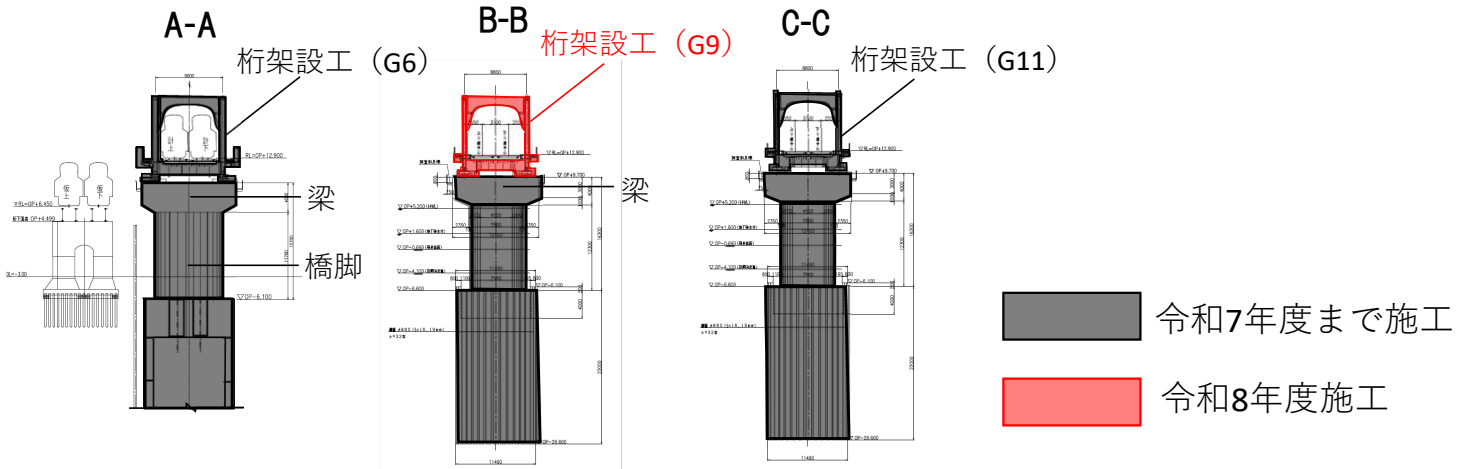


【阪神なんば線淀川橋梁改築事業】 ー 令和８年度の主な作業内容ー④

令和８年度の工事内容


５工区　伝法駅部から大阪難波方面取付部まで
躯体構築工、PC桁架設工、伝法駅建築設備工など

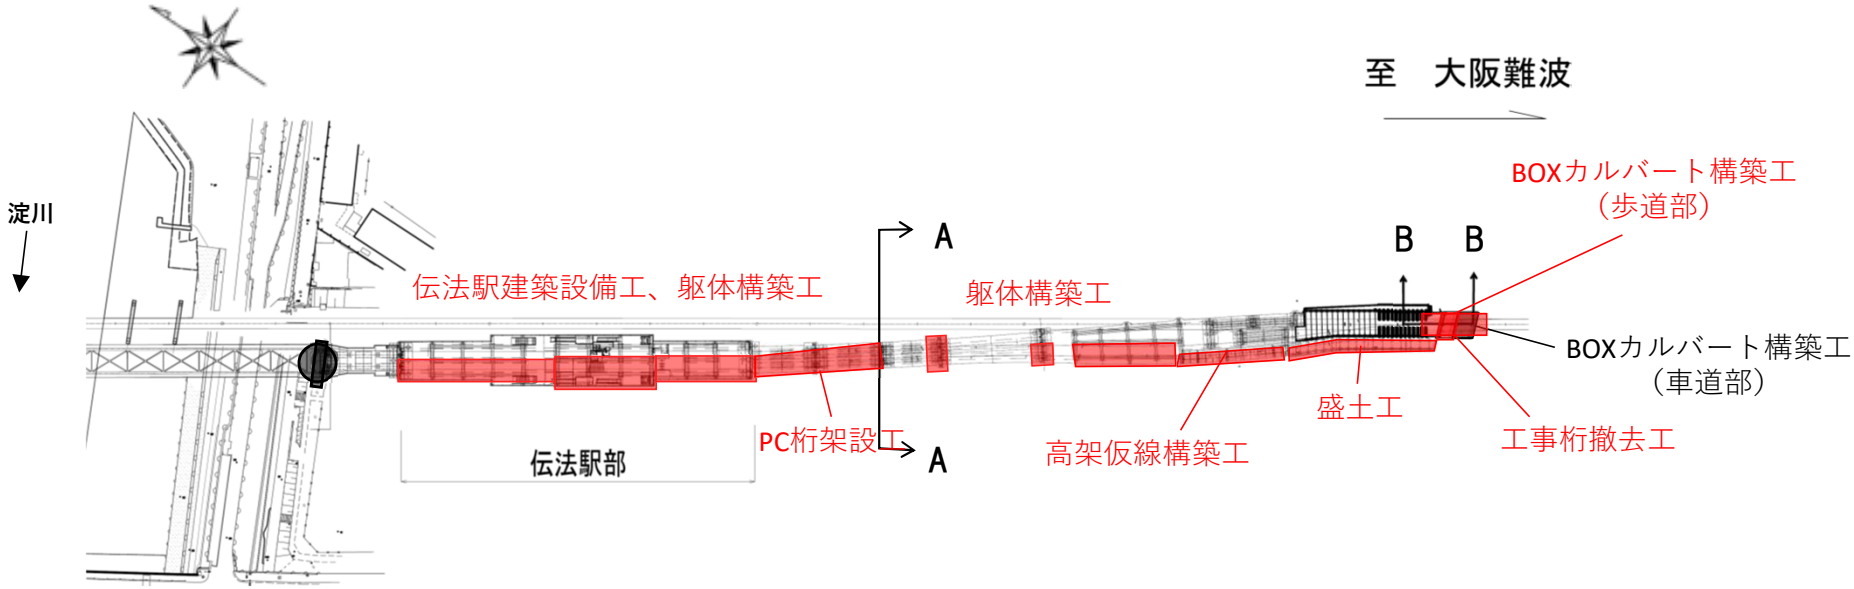

A-A

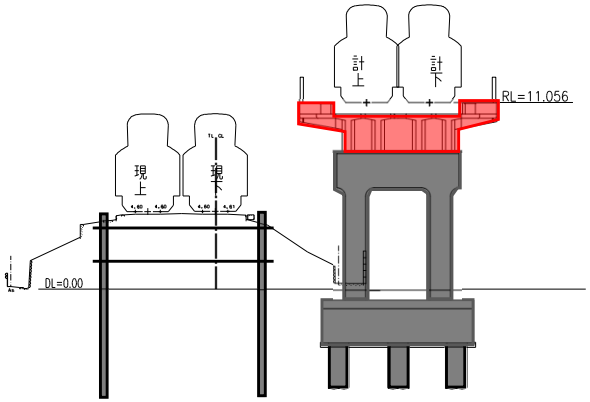

B-B

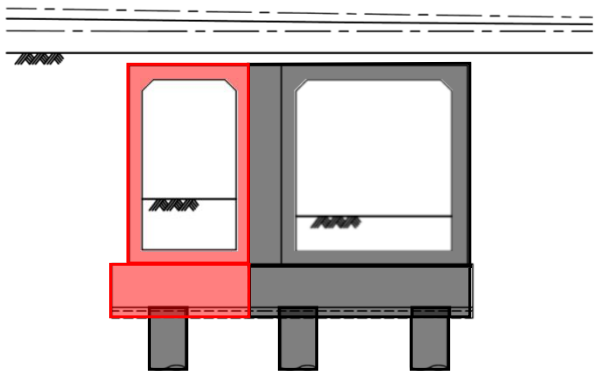

令和7年度まで施工

令和8年度施工
