

# 国道161号湖西道路 災害発生から通行止め解除までの経緯



国土交通省 近畿地方整備局  
**滋賀国道事務所**

令和8年6月26日撮影(発災直後)


令和8年6月26日未明、台風7号に伴う記録的な豪雨（南小松雨量観測所において、6月としては観測史上最大となる時間雨量40mmを記録）により、国道161号湖西道路の志賀IC～真野IC間で倒木や土砂流出が相次いで発生したため、通行止めを実施し、速やかに応急復旧作業に着手しました。その後、土砂流出箇所の復旧工事を完了し、同日午後5時に通行止めを解除しました。

しかしながら、被災箇所周辺の法面点検の結果、志賀IC～和迹IC間に新たな土砂流出のおそれがある箇所を3か所確認したため、安全確保を最優先として、同日午後8時30分から再度通行止めを実施しました。建設会社の皆様に昼夜を問わず緊急工事にご尽力いただいた結果、6月29日午前5時に工事が完了し、通行止めを解除することができました。

国道161号は、北陸地方と京阪神地域を結ぶ重要な幹線道路です。通行止め期間中は、迂回や交通混雑などにより、地域の皆様や道路利用者の皆様に多大なご不便とご迷惑をおかけしました。今回の早期交通開放は、地域の皆様、道路利用者の皆様、関係機関及び復旧工事関係者の皆様のご理解とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。

今後とも、国民の安全・安心と豊かな社会を支えるという使命のもと、「国土の守り手」「地域の守り手」である建設産業・建設業界の皆様と力を合わせ、災害に強い社会基盤の整備と、安全・安心な国民生活の確保に全力で取り組んでまいります。

令和8年7月13日（月）  
滋賀国道事務所長 田崎 祥二

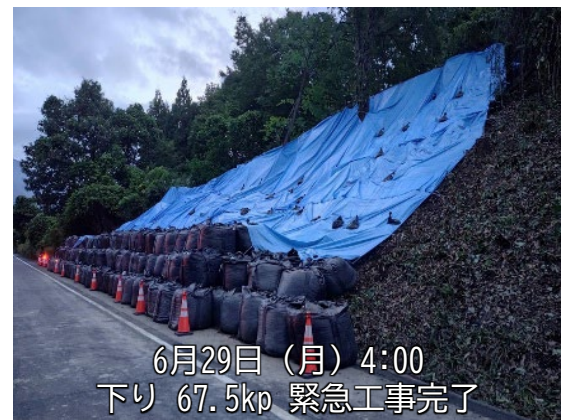

## 概要

### 通行止め実施区間 ① 国道161号 志賀IC～真野IC（上下線）

- ・被災発生日時  
令和8年6月26日（金）午前4時35分頃
- ・被災発生場所  
<4> 国道161号湖西道路 下り 67.5kp付近  
滋賀県大津市栗原 地先
- ・被災状況 倒木

### 通行止め実施区間 ② 国道161号 真野IC～和辻IC（福井行き）

- ・被災発生日時  
令和8年6月26日（金）午前4時46分頃
- ・被災発生場所  
<1> 国道161号湖西道路 上り 69.2kp付近  
滋賀県大津市伊香立下龍華 地先
- ・被災状況 法面の土砂流出


### 通行止め実施区間 ③ 国道161号 志賀IC～和辻IC（京都行き）

- ・法面変状発見日時  
令和8年6月26日（金）午後5時頃
- ・法面変状箇所  
<2> 国道161号湖西道路 下り 66.2kp付近  
滋賀県大津市南船路 地先  
<3> 国道161号湖西道路 下り 66.3kp付近  
滋賀県大津市和邇北浜 地先  
<4> 国道161号湖西道路 下り 67.5kp付近（倒木箇所）  
滋賀県大津市栗原 地先

### 【位置図】



### 【拡大図】

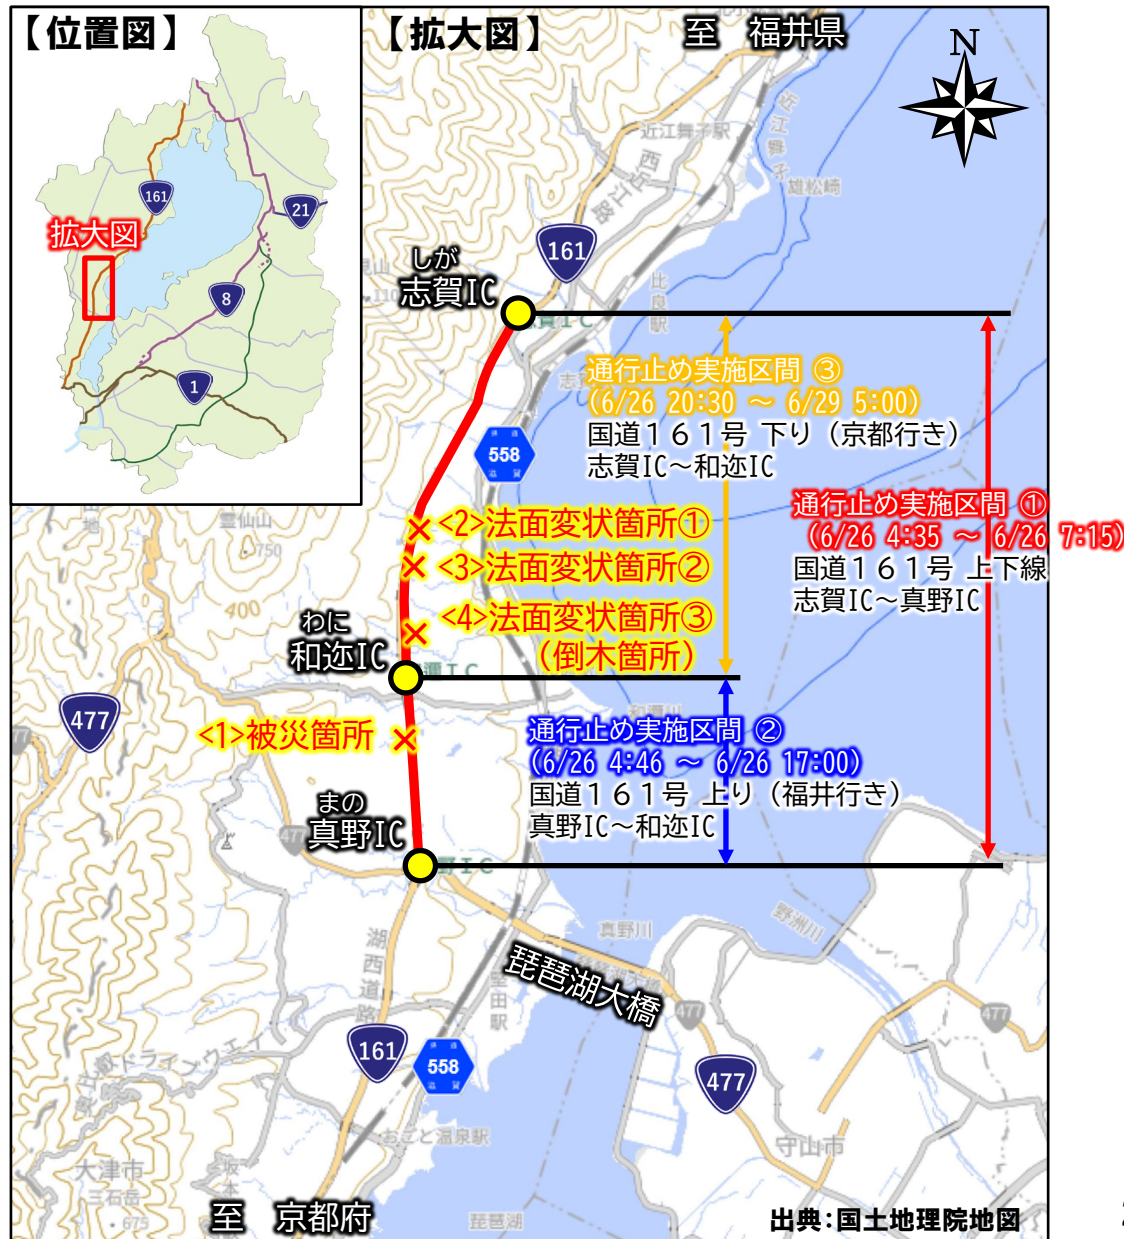


# 災害発生から通行止め解除までの経緯

< 1 > 被災箇所：上り 69.2kp 大津市伊香立下龍華 地先

通行止め区間：国道161号 上り（福井行き）<sup>まの</sup>真野IC～<sup>わに</sup>和迹IC


| 日付       | 時間    | 内容                  |
|----------|-------|---------------------|
| 6月26日（金） | 4:46  | 土砂流出 上り（福井行き）通行止め開始 |
|          | 6:00  | 応急復旧作業開始            |
|          | 14:00 | 法面点検開始              |
|          | 16:30 | 応急復旧完了              |
|          | 17:00 | 上り（福井行き）通行止め解除      |

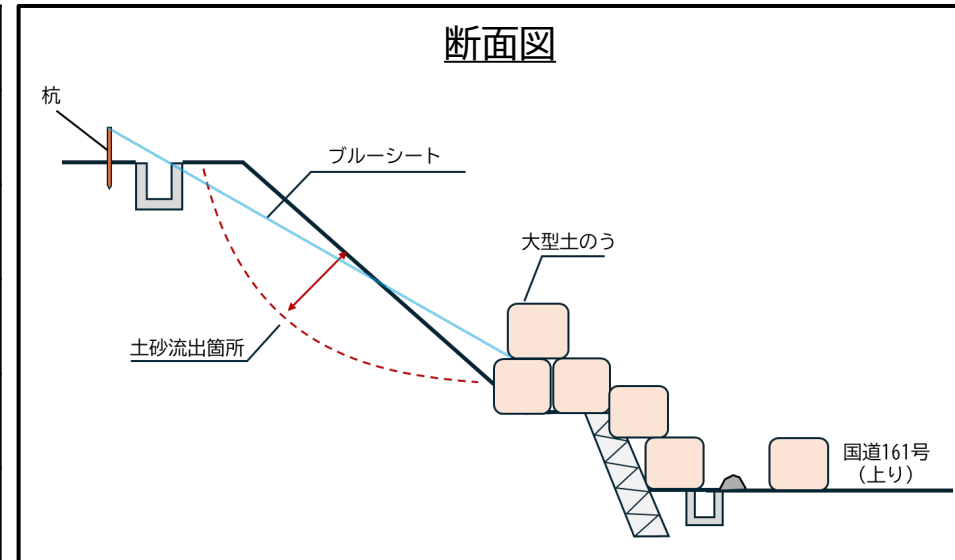

# 災害発生から通行止め解除までの経緯

< 2 > 法面変状箇所：下り 66.2kp 滋賀県大津市南船路 地先  
 通行止め区間：国道161号 下り（京都行き） 志賀IC<sup>しが</sup>～和迹IC<sup>わに</sup>


| 日付       | 時間    | 内容                        |
|----------|-------|---------------------------|
| 6月26日（金） | 15:30 | 法面点検開始（67.5kpの点検と合わせて実施）  |
|          | 18:00 | 法面点検結果を受けての緊急打合せ（事務所・出張所） |
|          | 20:30 | 通行止め、緊急工事開始               |
|          |       |                           |
| 6月29日（月） | 4:00  | 緊急工事完了・出張所による現地確認開始       |
|          | 5:00  | 下り（京都行き）通行止め解除            |

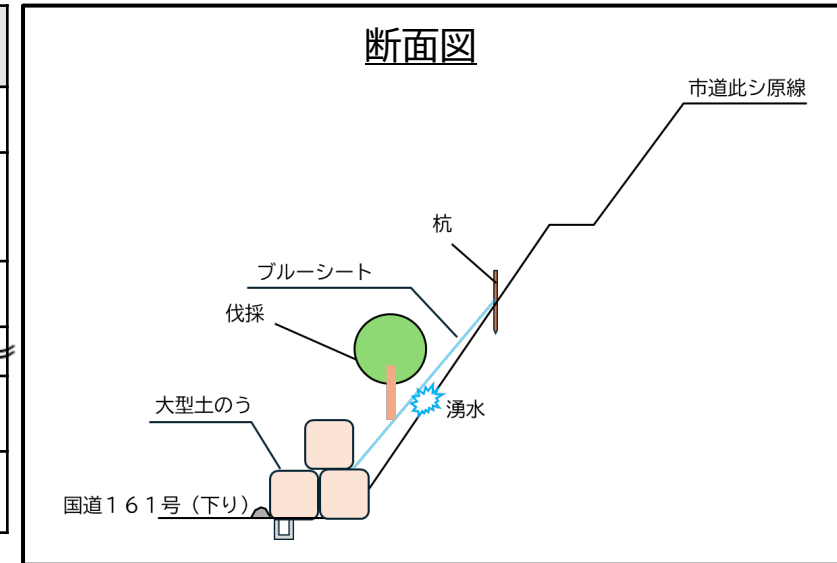

# 災害発生から通行止め解除までの経緯

< 3 > 法面変状箇所：下り 66.3kp 滋賀県大津市和邇北浜 地先  
 通行止め区間：国道161号 下り（京都行き） 志賀IC～和邇IC

| 日付       | 時間    | 内容                        |
|----------|-------|---------------------------|
| 6月26日（金） | 15:30 | 法面点検開始（67.5kpの点検と合わせて実施）  |
|          | 18:00 | 法面点検結果を受けての緊急打合せ（事務所・出張所） |
|          | 20:30 | 通行止め、緊急工事開始               |
|          |       |                           |
| 6月29日（月） | 4:00  | 緊急工事完了・出張所による現地確認開始       |
|          | 5:00  | 下り（京都行き）通行止め解除            |

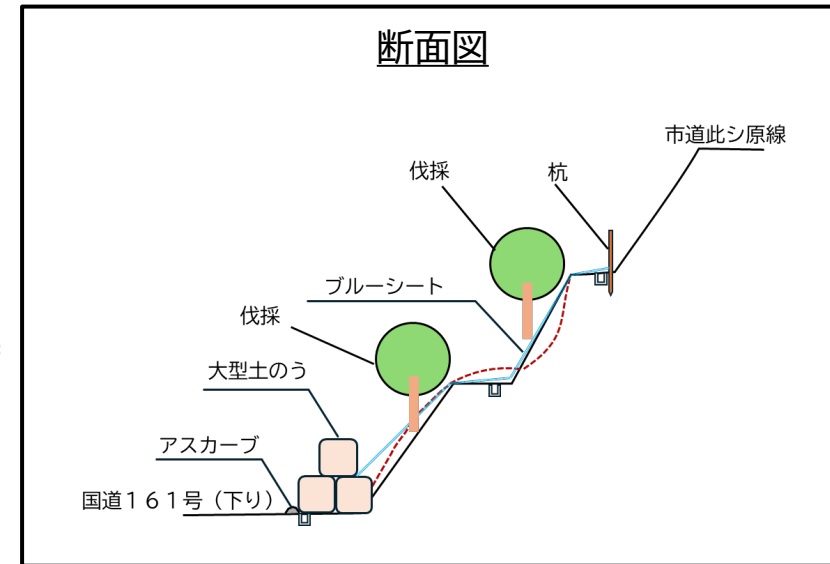


# 災害発生から通行止め解除までの経緯

<4>法面変状箇所：下り 67.5kp 滋賀県大津市和邇北浜 地先

通行止め区間：国道161号 ①上下 志賀IC～真野IC ②下り（京都行き） 志賀IC～和邇IC

| 日付       | 時間    | 内容                            |
|----------|-------|-------------------------------|
| 6月26日（金） | 4:35  | 倒木発生（志賀IC～真野IC 通行止め）          |
|          | 7:15  | 倒木撤去（志賀IC～真野IC 通行止め解除）        |
|          | 15:30 | 法面点検開始                        |
|          | 18:00 | 法面点検結果を受けての緊急打合せ<br>（事務所・出張所） |
|          | 20:30 | 通行止め、緊急工事開始                   |
|          |       |                               |
| 6月29日（月） | 4:00  | 緊急工事完了・出張所による現地確認開始           |
|          | 5:00  | 下り（京都行き）通行止め解除                |

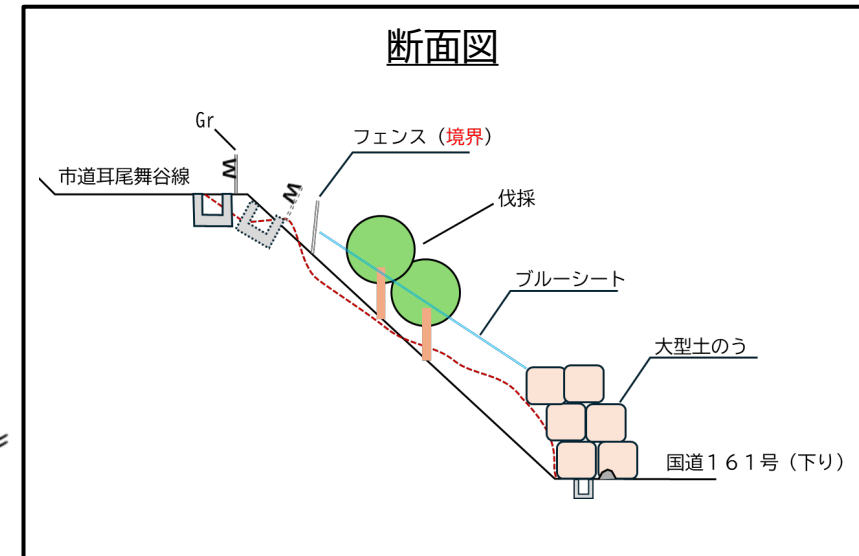

| 会社名                   | 作業内容                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| (株) 松浦組               | 倒木処理、流出土砂撤去、樹木伐採、大型土のう製作及び設置、ブルーシート養生、路面清掃 |
| (株) 平山組               | 樹木伐採、小型土のう製作及び設置、ブルーシート養生                  |
| (株) 仁木総合建設            | 流出土砂受入作業（雄琴基地）                             |
| (株) 大江造園              | 樹木伐採                                       |
| エムアイディ（株）             | 通行止め交通規制                                   |
| (株) 長大テック・(株) 長大設計共同体 | 法面点検                                       |
| ライト工業（株）              | 法面点検                                       |



